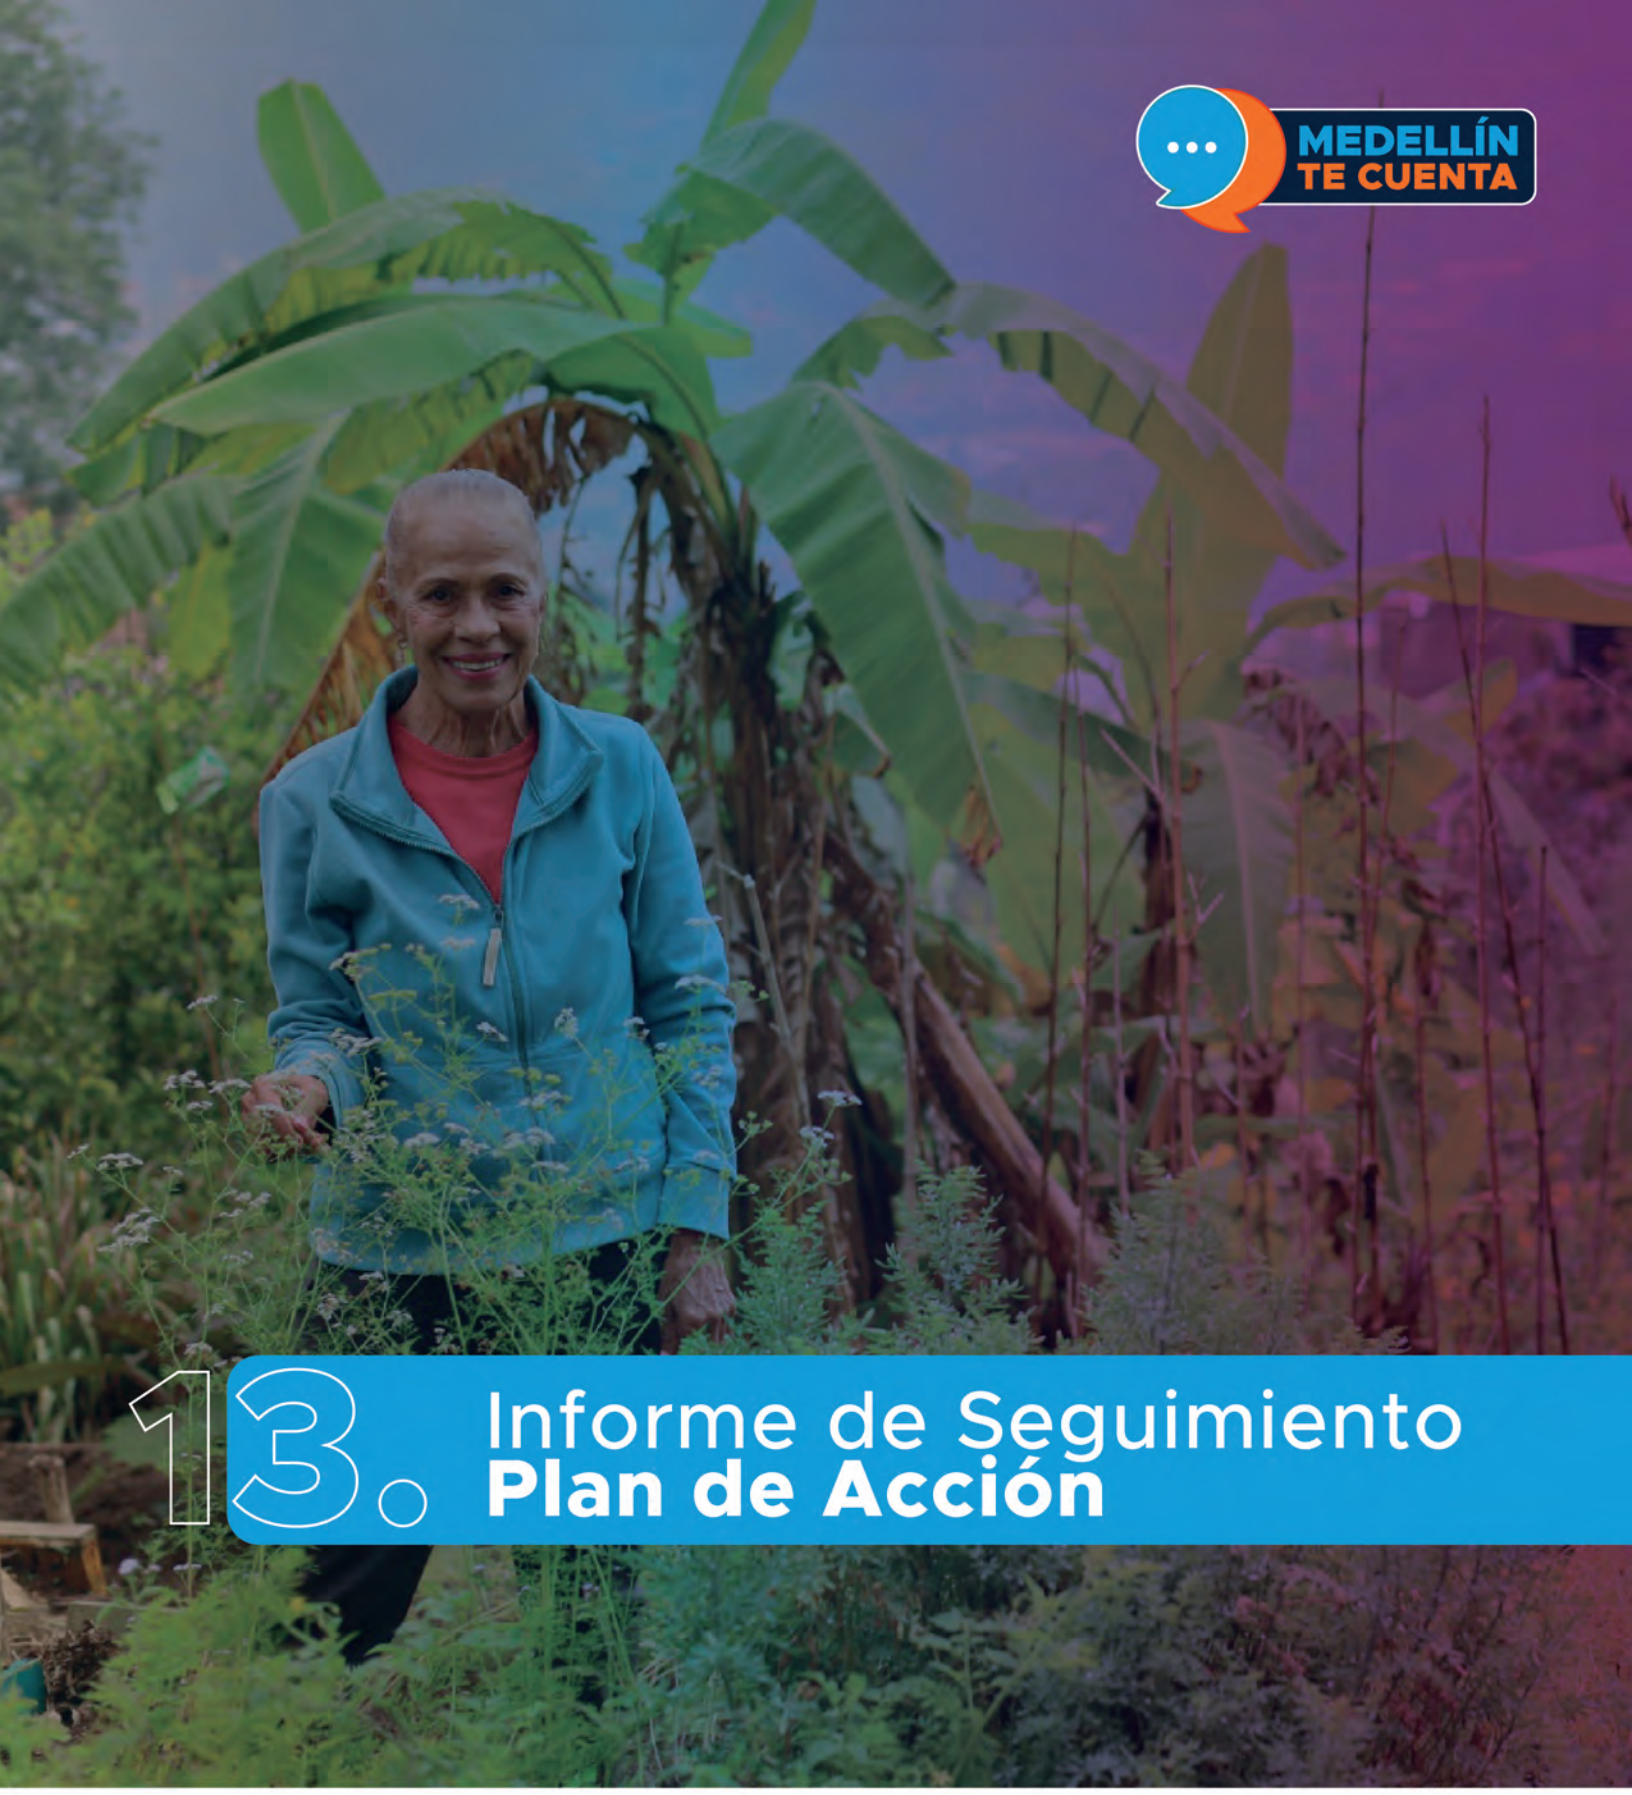


MEDELLÍN TE CUENTA

13. Informe de Seguimiento **Plan de Acción**

Informe de Gestión 2025

Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere 2024-2027
Diciembre 31 de 2025

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Seguimiento del Plan de Acción 2025

Contenido

- Presentación
- Seguimiento Plan de Acción 2025

Presentación

El Plan de Acción constituye un instrumento técnico-operativo de planificación cuya finalidad esencial es realizar el seguimiento, control y verificación de la ejecución de los proyectos de inversión destinados al cumplimiento de las metas anuales establecidas en el Plan de Desarrollo, conforme a las estrategias de implementación y la programación institucional definida para la vigencia.

Desde su fase de formulación, el Plan de Acción se estructura de manera articulada con la misión, funciones sustantivas y responsabilidades estratégicas de las áreas operativas, garantizando la coherencia con las políticas públicas, programas institucionales y proyectos de inversión oficialmente adoptados para el periodo correspondiente.

La información suministrada por cada dependencia de la Administración Distrital constituye el insumo técnico principal para la construcción del Plan de Acción. Este instrumento permite sistematizar, organizar y proyectar las actividades, metas operativas y recursos financieros asociados a cada proyecto de inversión, asegurando condiciones para el monitoreo de resultados, la trazabilidad de la gestión y el cumplimiento de los objetivos misionales institucionales durante la vigencia fiscal.

En consonancia con lo dispuesto en la Ley 152 de 1994, “Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”, el Informe de Plan de Acción correspondiente a cada vigencia incorpora el seguimiento técnico y operativo de los productos, bienes y servicios proyectados para la población, los cuales se materializan a través de los proyectos de inversión asignados a cada una de las dependencias de la Administración Distrital.

El presente informe corresponde al seguimiento al Plan de Acción del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín con corte 31 de diciembre de 2025.

En este, se pueden evidenciar los resultados logrados por las dependencias de la administración central, y por las entidades descentralizadas que reciben transferencias del Distrito como la Biblioteca Pública Piloto, la Agencia para la Educación Superior – Sapiencia, la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - Inder, Institución Universitaria - ITM, la Institución Universitaria Pascual Bravo, el Fondo de Valorización de Medellín – Fonvalmed,

el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - Isvimed, Telemedellín, el Museo Casa de la Memoria, el Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín ESP - APEV y la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas.

Los resultados obtenidos por dichas dependencias y entidades descentralizadas fueron procesados en el módulo de Formulación y Seguimiento de proyectos - Project System en la plataforma corporativa SAP, con los productos bienes o servicios, cumpliendo con los procedimientos técnicos establecidos, para lograr un seguimiento efectivo del desarrollo del proyecto durante la vigencia, así como a la información financiera, el presupuesto inicial, el presupuesto ajustado y la ejecución presupuestal.

Seguimiento Plan de Acción 2025

Para realizar el seguimiento al Plan de Acción, son indispensables los siguientes insumos:

a. La información de la formulación del Plan de Acción para el año 2025 suministrada y actualizada por cada dependencia, en cumplimiento de las disposiciones orgánicas vigentes, con base en el Plan de Desarrollo Distrital 2024 -2027 “Medellín te Quiere”.

b. La Ejecución Financiera de los proyectos de la administración central, corresponde a las cifras oficiales reportadas por la Secretaría de Hacienda y comprende a pagos y facturas a la fecha de corte e incluye las transferencias del Distrito a las entidades descentralizadas, en los proyectos que reciben la incorporación de dichos recursos.

c. La información sobre la cantidad ejecutada es suministrada por cada Dependencia según el avance del proyecto durante el año.

d. Las observaciones corresponden a los registros de notas que cada Dependencia hace para dar claridad sobre los valores reportados o los proyectos en general.

Los datos que se presentan en el reporte del Plan de Acción comprenden lo siguiente:

Campo	Descripción
Dependencia / Entidad Descentralizada	
Nombre	Nombre de la Secretaría o Entidad Descentralizada con recursos del presupuesto Distrital durante la vigencia.
Presupuesto inicial	Monto asignado a la dependencia, expresado en millones de pesos, conforme al Presupuesto Operativo Anual de Inversiones (POAI) para el año

Campo	Descripción
	2025. Este presupuesto fue establecido mediante Acuerdo Distrital 017 del 6 de diciembre de 2024, el cual detalla el Presupuesto General del Distrito para la vigencia fiscal 2025.
Presupuesto Ajustado	Corresponde al presupuesto asignado a la dependencia al momento del corte (31 de diciembre de 2025).
Ejecución Financiera	Presupuesto Ejecutado del Proyecto (pagos y facturas).
Tipo de proyecto	
Iniciativas Institucionales	Proyectos de inversión que se formulan por iniciativa de las secretarías o entidades descentralizadas, para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo.
Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)	Se refiere a proyectos impulsados por la comunidad, los cuales han sido seleccionados y priorizados a través del proceso de planeación local y presupuesto participativo.
Proyectos con saldos no ejecutables	Corresponde a los saldos de los proyectos de destinación específica no ejecutables o el presupuesto de otras vigencias que se conservan hasta tanto los contratos o convenios se liquiden y los saldos sean reintegrados.
Proyectos con ejecución de saldos (vigencia anterior)	Son aquellos proyectos cuyo presupuesto corresponde a ajustes o reservas con productos reportados en la vigencia anterior.
Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida - FMCV	Fondo constituido y reglamentado mediante el Decreto No. 802 de 2014, con el objeto de ejecutar programas y proyectos de beneficio para la ciudad,

Campo	Descripción
	producto de la transformación de UNE EPM telecomunicaciones S.A.
Estructura del Proyecto al Plan de Desarrollo	
Pilar	Código y nombre del Pilar del Plan de Desarrollo.
Componente	Código y nombre del Componente del Plan de Desarrollo.
Programa	Código y nombre del Programa del Plan de Desarrollo.
Proyecto	Código y nombre del proyecto de inversión según el registro en el banco de programas y proyectos del Distrito.
Síntesis Proyecto	Sección que proporciona la información en porcentaje de la eficacia, la ejecución financiera y el cumplimiento físico ponderado del proyecto.
Eficacia Ponderada	Para su cálculo, las eficacias de productos mayores al 100 % se toman como 100 %, con el fin de no generar distorsiones en los resultados.
Ejecución Financiera	Se refiere al porcentaje de la relación expresada en porcentaje, entre la ejecución financiera y el presupuesto ajustado del proyecto.
Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado	Se refiere al porcentaje del cumplimiento ponderado del componente físico y financiero del proyecto de inversión, (cada componente aporta un 50 %).
Información Financiera	Sección que proporciona la información del presupuesto inicial, presupuesto ajustado y el ejecutado a la fecha de corte, expresada en millones de pesos.
Observación Proyecto	Información que complementa las cifras presentadas de cada proyecto de inversión (opcional).

Campo	Descripción
Producto/Bien/Servicio	
Código del P/B/S	Identificación alfanumérica asignada a cada producto, bien o servicio dentro del proyecto desde el sistema SAP. Este código se compone de las dos letras iniciales correspondientes a la dependencia, seguidas de los dos últimos dígitos consecutivos del código del proyecto de inversión, concluyendo con dos letras aleatorias. Este sistema de codificación permite una clasificación única y ordenada de los elementos del proyecto, facilitando la gestión y seguimiento.
Código Ind. Producto DNP	Este código se refiere al indicador específico asignado a los productos de proyectos que han sido evaluados y aprobados en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP).
Nombre P/B/S	Se refiere a la denominación de los productos, bienes o servicios asociados a los proyectos de inversión.
Unidad de Medida	Magnitud específica empleada para cuantificar el producto, bien o servicio asociado a un proyecto. Proporciona un estándar uniforme que facilita la expresión cuantitativa y comparativa de los resultados o entregables.
Cantidad Planeada	Representa la planificación cuantitativa del producto dentro del período anual, sirviendo como referencia para evaluar el progreso y el rendimiento en relación con las metas establecidas.
Cantidad Ejecutada	Avance reportado por la dependencia responsable, para el producto, bien o servicio.
Eficacia Producto	Relación, expresada en porcentaje, entre la cantidad ejecutada y la cantidad planeada.
Descripción P/B/S	Información que detalla la denominación de los productos, bienes o servicios dentro del contexto del proyecto. Su propósito es complementar y enriquecer las cifras programadas, proporcionando detalles adicionales que permiten una comprensión más completa y precisa de la naturaleza y características de cada elemento.
Observación P/B/S	Información del producto, bien o servicio que complementa las cifras programadas (opcional)

El resumen gráfico se compone de:

Gráfico N°1 Ejecución Financiera: Este gráfico presenta una visualización de la ejecución financiera, que comprende el presupuesto inicial, el presupuesto ajustado y la ejecución presupuestal del Distrito como de las entidades descentralizadas. Estos datos se encuentran actualizados según el corte procesado.

Gráfico N°2 Detalle Presupuesto: Este gráfico muestra el detalle del presupuesto en términos de los compromisos (saldo de la totalidad de los registros presupuestales

expedidos con cargo al proyecto), las facturas (son ordenaciones de gasto realizadas con cargo a compromisos adquiridos cuyos pagos no se han realizado), los pagos (son ordenaciones de gasto efectivamente pagadas). El disponible (recursos que no han sido comprometidos y el total en millones de pesos y porcentaje. (del Distrito, Secretaría o Entidad Descentralizada según corresponda).

Gráfico N°3 Ejecución Física: En este gráfico se presenta el porcentaje de ejecución física agregada del Plan de Acción, el cual corresponde a la suma de las eficacias de los proyectos, ponderadas por el presupuesto ajustado a la fecha de corte de la vigencia, se excluyen del cálculo los proyectos que no tienen definidos productos como saldos no ejecutables, los proyectos con ejecución de saldos pendientes de la vigencia anterior, estos últimos en los casos en los cuales dicho saldo se encuentre cancelado totalmente y los proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida – FMCV.

Gráfico N°4 Ejecución Financiera: Este gráfico ilustra el porcentaje de ejecución financiera del Plan de Acción, la cual corresponde al total de pagos y facturas con relación al presupuesto ajustado.

Gráfico N°5 Cumplimiento Físico - Financiero: Este gráfico se refiere al porcentaje del cumplimiento agregado ponderado, de los componentes físico y financiero de los proyectos de inversión con asignación de recursos, (cada componente aporta un 50%).

Conforme al artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, conocido como el Estatuto Anticorrupción. Este informe se encuentra disponible en la página web del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, www.medellin.gov.co La publicación tiene como objetivo llegar a diferentes grupos de interés y también se comparte con los organismos de control social, fiscal, político y de derechos.

A continuación, se presenta la información correspondiente al seguimiento del Plan de Acción, corte 31 de diciembre de 2025, la cual detalla el cumplimiento físico y financiero de los proyectos de inversión, para cada dependencia o entidad descentralizada con asignación de recursos del Distrito.



Seguimiento al Plan de Acción

Plan de Desarrollo 2024 - 2027 Medellín Te Quiere

31 de Diciembre de 2025

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)


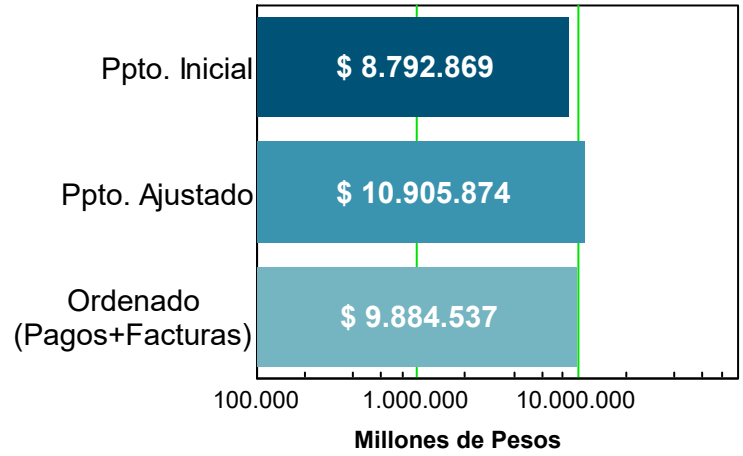


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

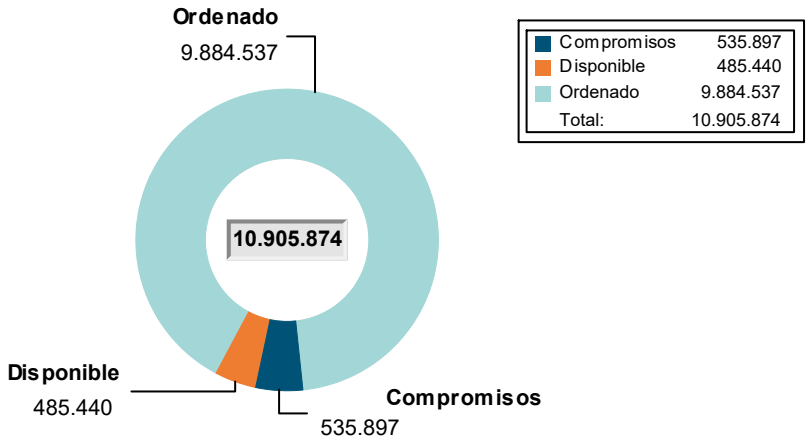

Ejecución presupuestal al mes de Diciembre de 2025, comprende pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

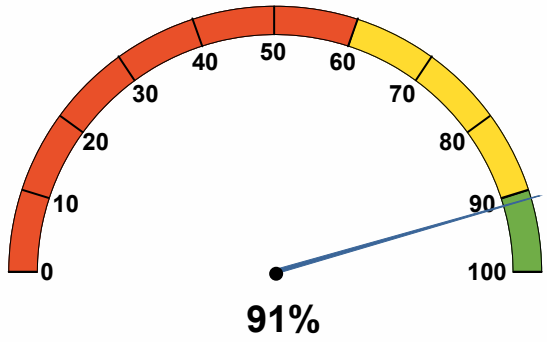


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



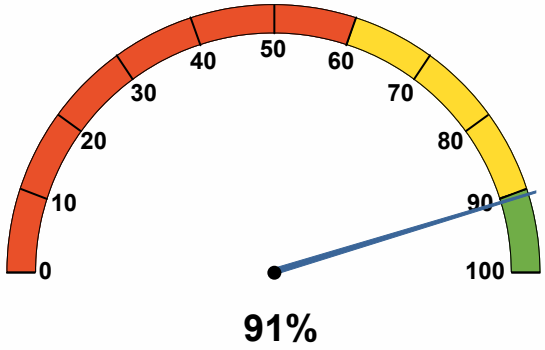



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado (%)

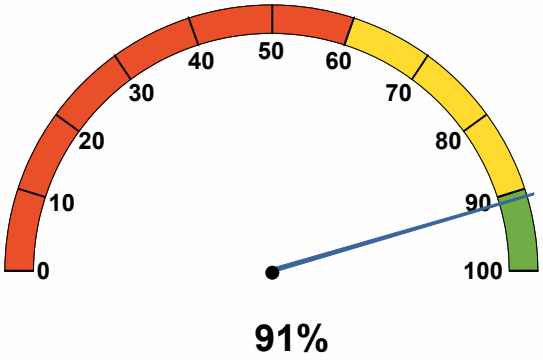


Secretaría Privada


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2025

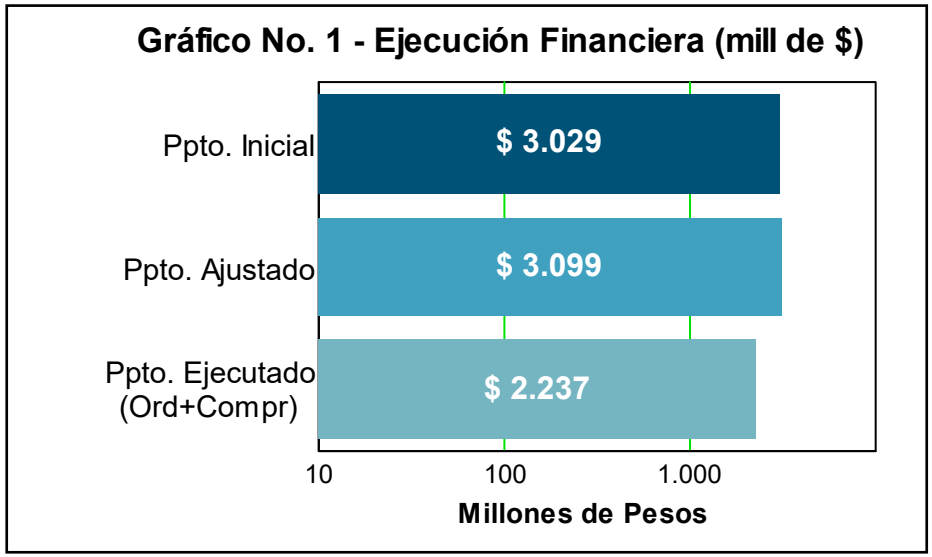


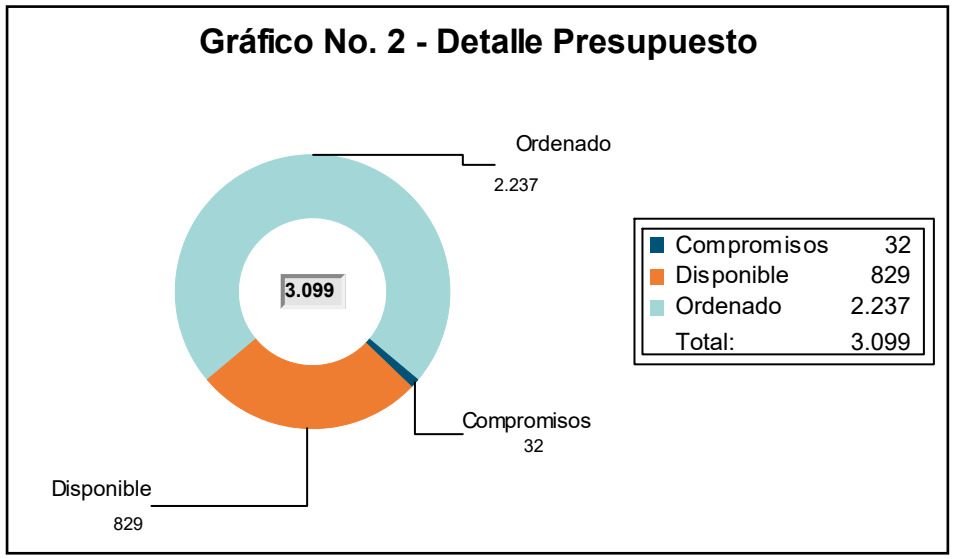

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre de 2025 comprende pagos y facturas

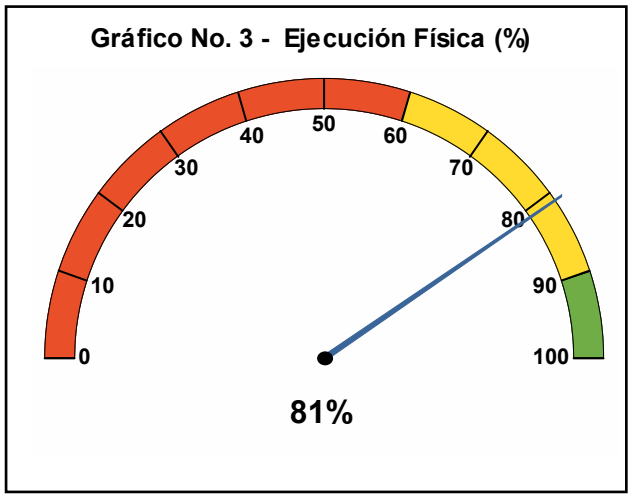

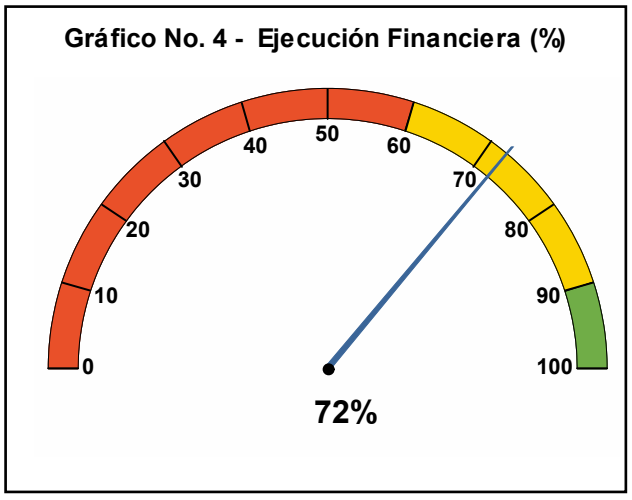

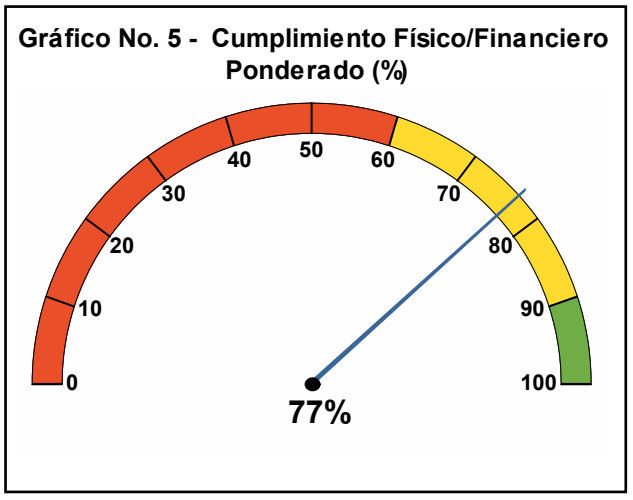

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.4 - Confianza ciudadana en la gestión pública institucional
Programa: 3.4.1 - 99

Proyecto: **240128 -Generación de espacios para fortalecer el relacionamiento alcaldía-ciudadanía**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 78% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 89%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.243 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.243 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.740

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción a la participación ciudadana				
PV28BA Espacios de participación promovidos	**Número**	**55**	**184**	**335%**

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Corresponde a los encuentros generados con la ciudadanía y grupos de interés, garantizando la presencia del Alcalde; comprenden la socialización de la gestión y el abordaje de iniciativas para el desarrollo de la ciudad.

Observación B/P/S: Las realidades de la ciudad y sus dinámicas actuales, demanda la interacción permanente del gobierno local con los grupos de interés del distrito. Para atender a esta exigencia, se realizaron 129 encuentros adicionales a los proyectados para la vigencia. En estos espacios, se contó con la participación de ciudadanos, comunidad educativa, empresarios, entre otros actores.

Proyecto: **240129 -Implementación del modelo de gerencia conglomerado público de medellín y sus instrumentos de gestión**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 33% **Ejec. Financiera :** 58% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 45%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 786 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 786 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 456

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
PV29BA Documentos de lineamientos técnicos realizados	**Número**	**4**	**0**	**0%**

Código. Ind. SUIFP: 459901800

Descripción B/P/S: Corresponde a los siguientes instrumentos del Modelo de Gerencia Conglomerado Público de Medellín: Política de Propiedad, Código de Buen Gobierno, Riesgos a la Propiedad y Rentabilidad social del Conglomerado. Así mismo el producto incluye la actualización de 18 estatutos de las entidades descentralizadas, actualizados a la vocación de CTI.

Observación B/P/S: En relación con la elaboración de los instrumentos de gestión del modelo de gerencia, se ha avanzado en la definición de la Política de Propiedad, cuya estructura (tabla de contenido) ya fue aprobada por la Secretaría Privada. No obstante, el desarrollo de los temas financieros está a cargo de la Secretaría de Hacienda y requiere aprobación final. Los riesgos asociados a esta política solo se analizarán y documentarán una vez que el documento principal esté completo. La versión 3 del Código de Buen Gobierno se está revisando actualmente. Por último, se determinó que la herramienta para medir la rentabilidad social del conglomerado se implementará en otra vigencia.

PV29BB Documentos de evaluación elaborados	**Número**	**8**	**3**	**38%**

Código. Ind. SUIFP: 459900100

Descripción B/P/S: Documentos de seguimiento a los siguientes aspectos: Acuerdo Marco de Relacionamiento, Pilares de Gestión del modelo de Gerencia, Riesgos (modelo y representación en juntas), Direccionamiento Estratégico, Informe de Gobierno Corporativo, Evaluación de Juntas y Madurez del Modelo de Gestión Administrativa del Conglomerado de Medellín en sus entidades.

Observación B/P/S: A la fecha se cuenta con los documentos que dan cuenta de las evaluaciones y seguimientos a aspectos claves del modelo de gerencia, estos son: seguimiento a los pilares, informe anual de gobierno corporativo 2024 y la evaluación de las juntas o consejos directivos. De otra parte, se avanzó significativamente en la proyección del Acuerdo Marco de Relacionamiento, el cual se encuentra para revisión por parte de la Secretaría General, y en otros documentos como las matrices de riesgo y los lineamientos del direccionamiento estratégico. El índice Multidimensional de Gobierno Corporativo, se aplicará en otra vigencia.

PV29BC	**Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente**	**Número**	**36**	**22**	**61%**

Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Corresponde al numero de entidades del conglomerado capacitadas y/o asistidas en temas de Gerencia Pública y Gobierno Corporativo.

Observación B/P/S: Con el propósito de fortalecer los conocimientos en temas de gerencia pública y gobierno corporativo, se ofreció a los directivos y secretarios generales de todas las entidades del conglomerado (36), un ciclo regular de capacitaciones que contó con la participación de 22 de estas organizaciones.

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: **200345 -Administración de la unidad de cumplimiento de los proyectos estratégicos del municipio de medellín**


Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 62 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 33


Proyecto: **200366 -Fortalecimiento del conglomerado y el gobierno corporativo**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7


Secretaría de Comunicaciones


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2025

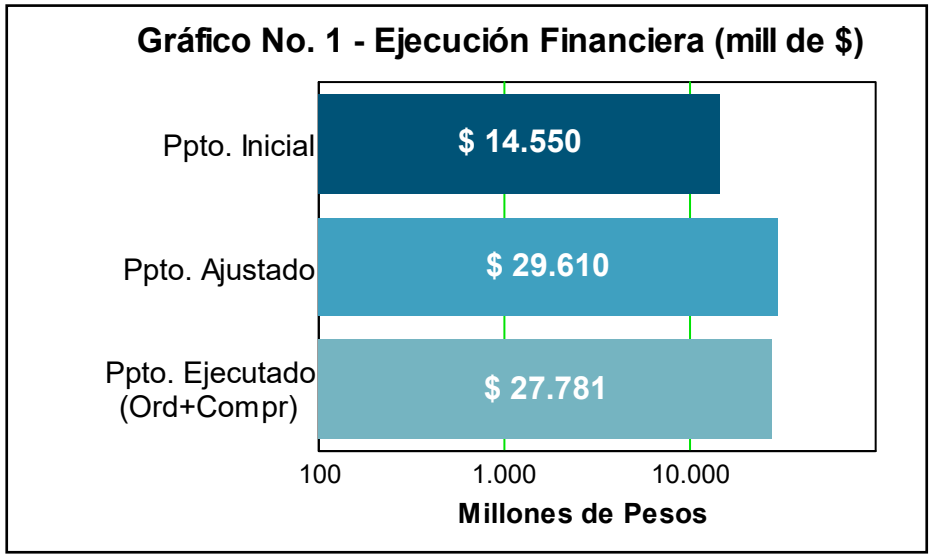


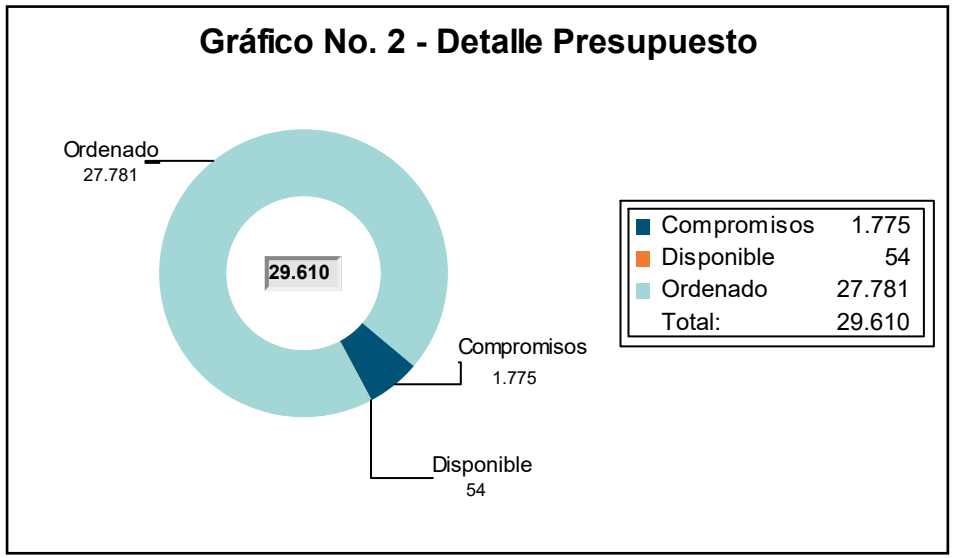

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre de 2025 comprende pagos y facturas

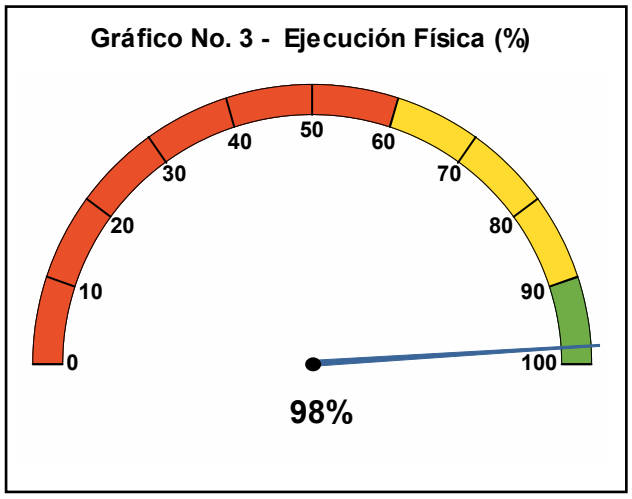

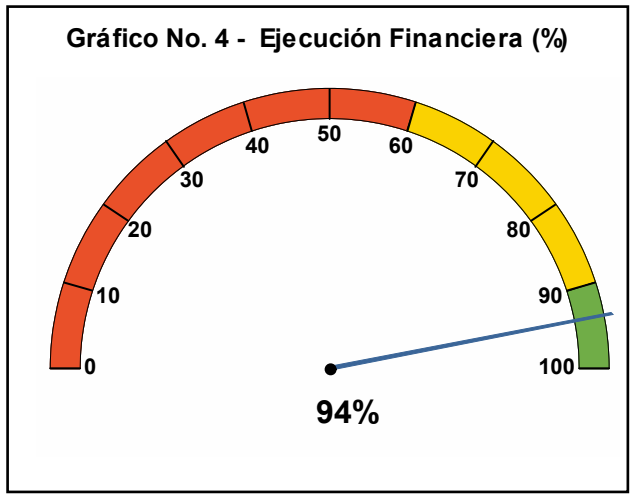

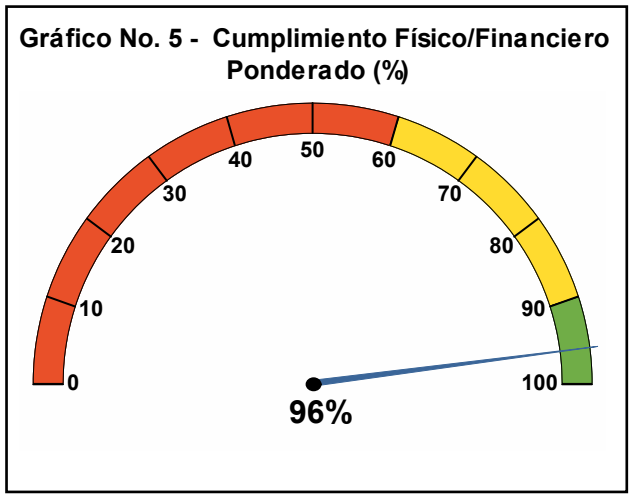

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.2 - Participación ciudadana y control social
Programa: 3.2.4 - Comunicación para la movilización, el fortalecimiento de la participación y la corresponsabilidad ciudadana

Proyecto: **240225 -Desarrollo de estrategias de comunicación para la movilización con redes ciudadanas y procesos y medios de comunicación alternativos independientes, comunitarios y ciudadanos**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.207 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.207 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.180

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
CO25AA Personas capacitadas	**Número**	**300**	**300**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459903000

Descripción B/P/S: Implementación de la escuela de formación para el fortalecimiento de procesos, medios y redes ciudadanas. Realización de jornadas de sensibilización y capacitaciones para promover buenas prácticas entre las redes ciudadanas del Distrito. Realización de actividades formativas e intercambios de ciudad para el fortalecimiento de semilleros de comunicación.

CO25AB Documentos de investigación elaborados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902600

Descripción B/P/S: Realización de estudio de incidencia, consumo y renacimiento de los procesos y medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos.

CO25AD Sistemas de información actualizados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Implementación, actualización y sostenimiento de caracterización de Medios y Procesos Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos - MAICC.

CO25AE Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	**Número**	**65**	**65**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Acompañamiento a los procesos y Medios de Comunicación Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos - MAICC - en el desarrollo de habilidades de gestión. Promoción de alianzas estratégicas para gestión de recursos.

CO25AF Espacios de integración de oferta pública generados	**Número**	**7**	**7**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902900

Descripción B/P/S: Entrega de reconocimientos a procesos y Medios de Comunicación Alternativos, independientes, Comunitarios y Ciudadanos - MAICC. Realización de convocatorias para la implementación de acciones de movilización por parte de los procesos, medios y redes ciudadanas. Generación de espacios de encuentro de los procesos y medios con el Distrito. Creación de redes de intercambio de conocimiento. Participación en espacios de ferias y fiestas institucionales del Distrito.

Componente: 3.4 - Confianza ciudadana en la gestión pública institucional
Programa: 3.4.6 - Comunicación pública para el fortalecimiento de la institucionalidad y la confianza ciudadana

Proyecto: **240223 -Divulgación de programas del plan de desarrollo mediante estrategias de comunicación pública**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 94% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 13.020 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 27.256 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 25.611

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Servicios de información implementados

CO23BA	**Sistemas de información implementados**	**Número**	**28.000**	**29.474**	**105%**

Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Corresponde al número de productos comunicacionales (piezas) desarrolladas y/o direccionadas por la Secretaría de Comunicaciones con el objetivo de difundir los programas del Plan de Desarrollo.

Observación B/P/S: Debido a que las dependencias del Distrito solicitaron un mayor número de producto de comunicación, al planeado inicialmente, se obtuvo una meta por encima de la estipulada para la vigencia 2025, sin embargo esto se traduce en una mayor difusión de los programas del Plan de Desarrollo, sin afectar la ejecución financiera del proyecto.

CO23BB	**Dependencias asistidas técnicamente**	**Número**	**32**	**32**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459903102

Descripción B/P/S: Corresponde al número de dependencias del nivel central de la Administración Distrital que reciben el acompañamiento por parte de la Secretaría de Comunicaciones para lograr que los productos comunicacionales sean claros, oportunos y coherentes con el quehacer misional de la Administración.

Proyecto: 240224 -Implementación de un sistema intregral de información , analítica y toma de decisiones para la gestión de la comunicación pública institucional

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 323 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 255 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 247

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión					
CO24AA	**Sistema de gestión implementado**	**Número**	**0,3**	**0,3**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902300

Descripción B/P/S: Un sistema integral de información, analítica y toma de decisiones que comprende la recepción de solicitudes, aprobación en el Comité Editorial, la definición de público asociado, georreferenciación, valoración de productos y asignación de costos de acuerdo con la estrategia planteada y/o demandada, la asignación de productos o servicios al equipo funcional correspondiente de la secretaría, para evaluación del cumplimiento de indicadores.

CO24AB	**Observatorio implementado**	**Número**	**0,3**	**0,3**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902504

Descripción B/P/S: Sistema para el monitoreo y análisis, identificando tendencias, patrones y temas relevantes en materia de comunicación pública, realizar investigaciones y estudios sobre la comunicación pública, incluyendo la evaluación de campañas y estrategias, la evaluación de impacto, la reputación y el comportamiento; y la generación de recomendaciones sobre estrategias y tácticas efectivas.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana

Componente: 3.2 - Participación ciudadana y control social

Programa: 3.2.4 - Comunicación para la movilización, el fortalecimiento de la participación y la corresponsabilidad ciudadana

Proyecto: 250006 -25pp01-fortalecimi de los procesos y medios de comunicación comunitarios medellín, antioquia, occidente

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 302 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 294

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información actualizado					
CO06BA	**Sistemas de información actualizados**	**Número**	**111**	**111**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Productos de comunicación priorizados por los medios de comunicación comunitarios tales como impresos, programas y microprogramas radiales, contenidos audiovisuales y kits digitales, entre otros.

CO06BB	**Proyectos asistidos técnicamente**	**Número**	**2**	**2**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459903104

Descripción B/P/S: Corresponde a los informes de acompañamiento que se realizan a los medios de comunicación comunitarios de cara a la planeación y ejecución de las actividades priorizadas por la ciudadanía.

CO06BC	**Espacios de integración de oferta pública generados**	**Número**	**23**	**23**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902900

Descripción B/P/S: Acciones de movilización como cineforos, conversatorios, intercambio de experiencias, talleres de formación y semilleros donde las capacidades comunicativas fortalecidas permiten a la ciudadanía comprender, apropiar y difundir temáticas relacionadas con el proyecto de comunicaciones.

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: **200359** - **Fortalecimiento de redes ciudadanas y de dependencias en estrategias para la movilización y la participación**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1

Proyecto: **200410** - **Fortalecimiento y encuentro de procesos y medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos**


Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 22 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6


Proyecto: **200365** - **Asesoría en estrategias comunicacionales para la divulgación del plan de desarrollo**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 569 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 442


Secretaría de Evaluación y Control


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2025

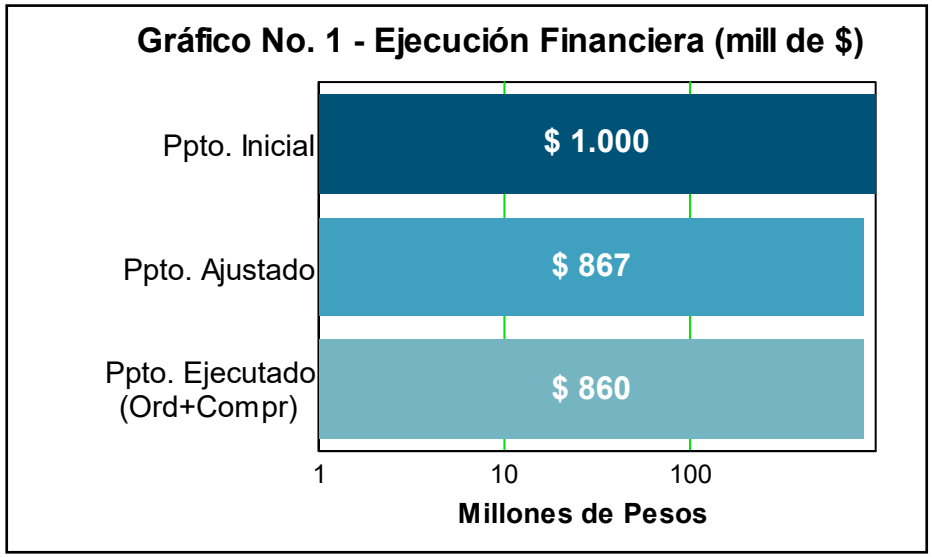


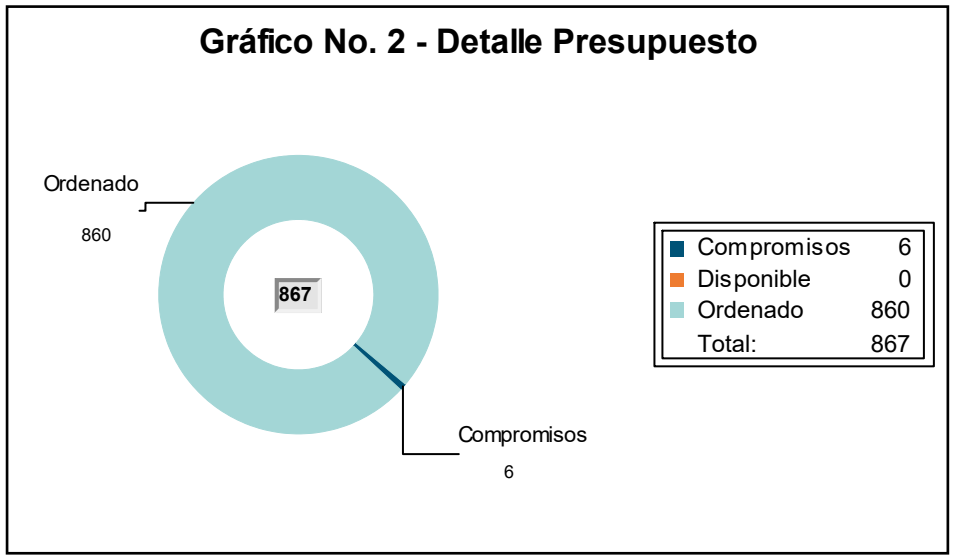

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre de 2025 comprende pagos y facturas

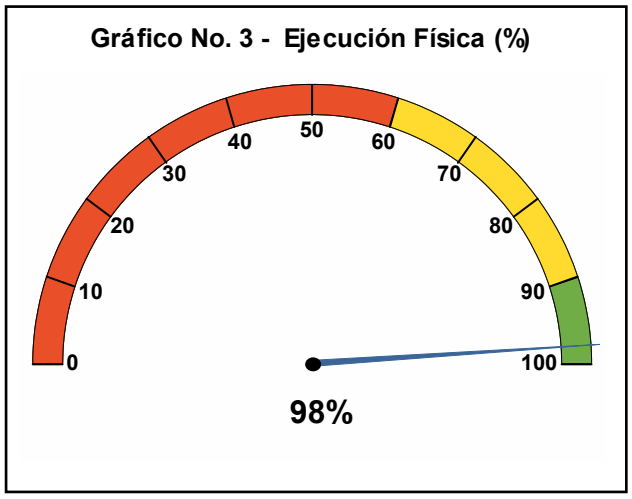

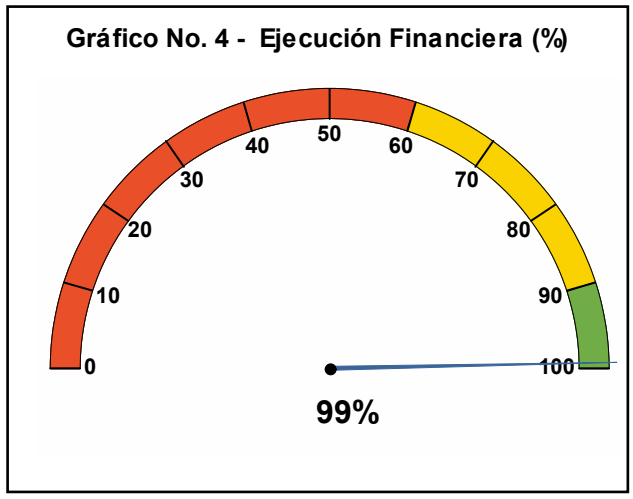

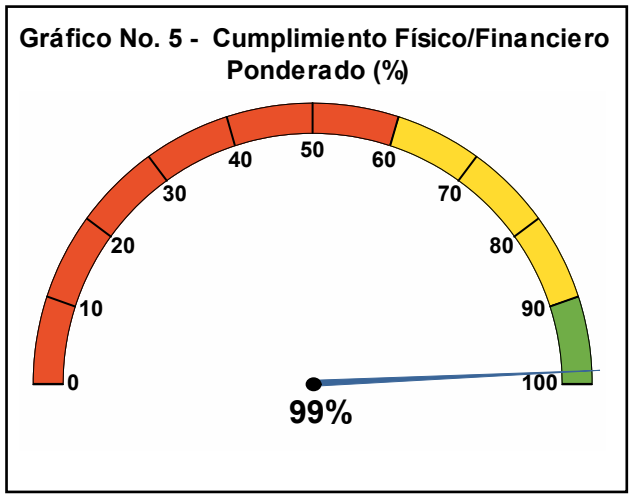

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.4 - Confianza ciudadana en la gestión pública institucional
Programa: 3.4.10 - Protección de los recursos públicos desde el control interno

Proyecto: **240076 - Modernización tecnológica para una auditoría de vanguardia**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 189 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 189

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión				
EV76BB Sistema de gestión implementado	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902300

Descripción B/P/S: Implementaciones al proceso de auditoría interna.

Observación B/P/S: Mejoras en conocimiento y capacidades en TI para fortalecer la función de auditoría. Durante la vigencia se avanzó en la implementación del Módulo AIS-SAP para la secretaria de Evaluación y Control mediante el contrato 4600105426 y aplicar herramientas de análisis y depuración de información de valor de los planes de mejoramiento institucionales mediante contrato 4600105430.

EV76BC Sistemas de información actualizados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Servicios tecnológicos para actualización y seguimiento de información asociada a planes de mejoramiento.

Observación B/P/S: Actualización, mantenimiento y soporte a componentes tecnológicos que apoyan la función de auditoría mediante contrato 4600104642 para la plataforma Audisoft. Componente de Analitycs para generar reportes en tableros de control como Power BI. Parametrización de una nueva clasificación en observaciones (Dimensión y Política MIPG), Generación de script para identificar estatus en cualquier actividad de una auditoría, con alerta para notificar a los auditores y supervisores. Modulo de Planes de Mejoramiento en ambiente de pruebas

Proyecto: **240077 - Innovación de la actividad de auditoría interna como tercera línea, para fortalecer el control interno distrital**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 99% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 664 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 658

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
EV77BD Personas capacitadas	**Número**	**200**	**272**	**136%**

Código. Ind. SUIFP: 459903000

Descripción B/P/S: Fortalecimiento de competencias en asuntos de Auditoría Interna.

Observación B/P/S: El proyecto desarrolla espacios para fortalecer competencias y habilidades necesarias para proporcionar los servicios de auditoría. Se realizó el XII Seminario Internacional de Auditoría Interna en el mes de junio. Así mismo tres conversatorios: 1. Controles de TI y gestión de riesgos de ciberseguridad - Ponente Alex Gacheche - 17 de junio 2. Valoración de los controles aplicados a los riesgos ESG - Ponente Nicolás Jerkovic - 11 de junio 3. Plataforma para la implementación de tecnologías avanzadas en auditoría interna - Ponente Eduardo Marconi - 12 de junio

EV77BE Documentos de evaluación elaborados	**Número**	**1**	**0,98**	**98%**

Código. Ind. SUIFP: 459900100

Descripción B/P/S: Capacidades adicionales para la ejecución del plan anual de auditoría.

Observación B/P/S: Las capacidades adicionales contratadas para apoyar el desarrollo del plan anual de auditoría 2025 representan un 32% del recurso humano destinado a realización de auditorias basadas en riesgos con una ejecución del 97% de los trabajos programados.

EV77BF Sistemas de información implementados **Número** **1** **1** **100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Herramientas de apoyo tecnológico para la gestión de la actividad de auditoría interna actualizadas.

Observación B/P/S: Realizamos adquisición, mantenimiento y soporte a componentes tecnológicos que apoyan la función de auditoría


4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)


Proyecto: **200428 -Mejoramiento del sistema de control interno desde el proceso de auditoría interna**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 14 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 14


Secretaría de Hacienda


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2025

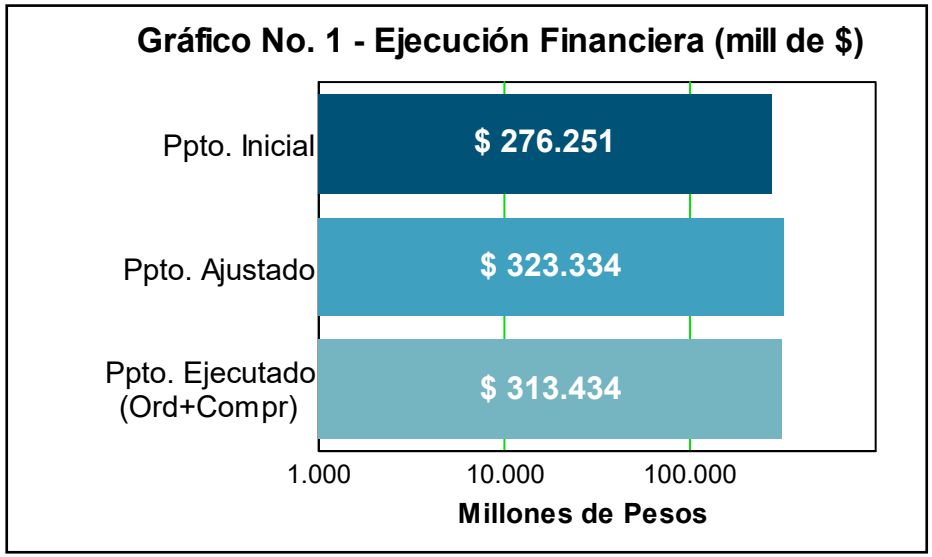


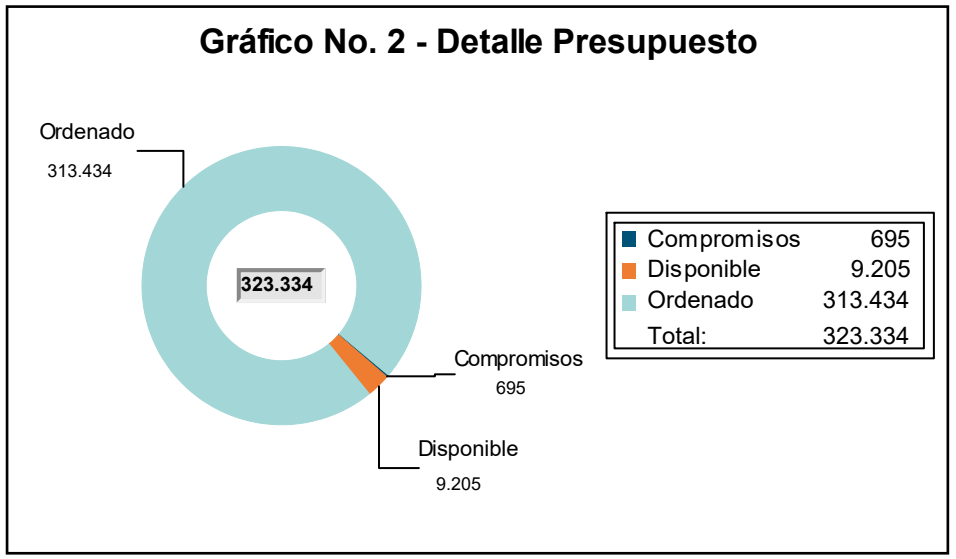

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre de 2025 comprende pagos y facturas

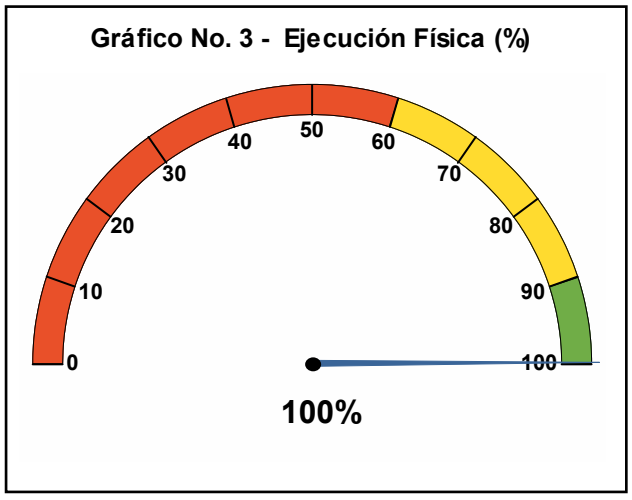

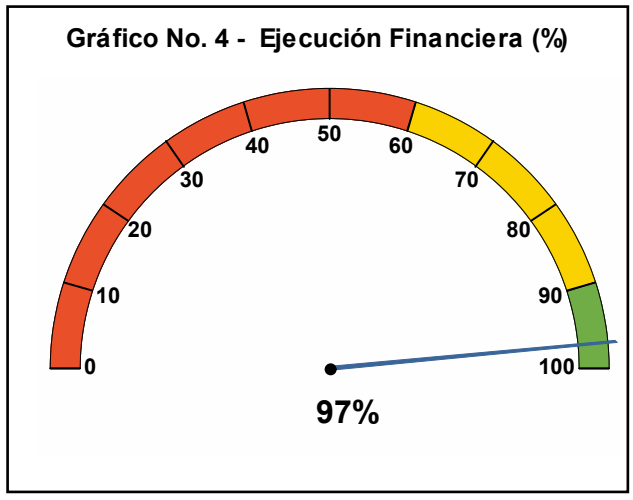

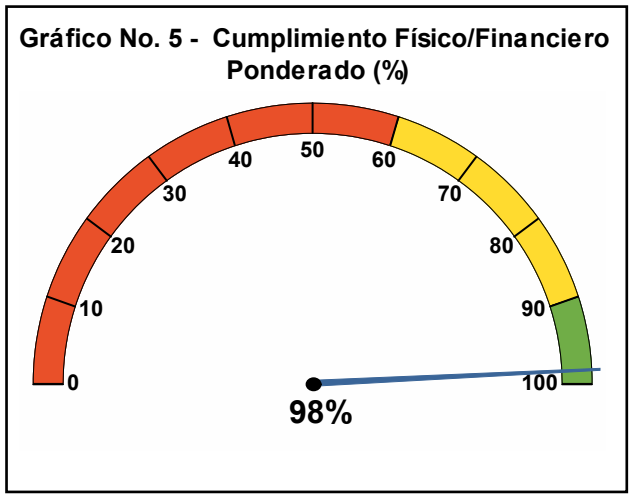

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito
Programa: 3.3.7 - Articulación Distrital con visión regional

Proyecto: **240127 -Servicio de apoyo financiero al área metropolitana del valle de aburrá**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 136.894 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 146.062 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 142.404

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica					
HA27BA	**Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: El producto se refiere al apoyo, con recursos financieros, a una autoridad ambiental para el desarrollo de iniciativas de impacto metropolitano.

Componente: 3.4 - Confianza ciudadana en la gestión pública institucional
Programa: 3.4.3 - Gestión fiscal y financiera de la Hacienda Pública

Proyecto: **240022 -Fortalecimiento financiero metroparques medellin**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 10.350 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 10.350

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de saneamiento fiscal y financiero					
HA22BA	**Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado**	**Porcentaje**	**100**	**100**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459900200

Descripción B/P/S: Fortalecimiento financiero y organizacional de la empresa METROPARQUES

Proyecto: **240195 -Apoyo técnico a los procesos administrativos y de gestión de la hacienda pública**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 9.532 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.993 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.716

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica					
HA95BA	**Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente**	**Número**	**6**	**6**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Consiste en apoyar técnicamente los procedimientos jurídicos, los sistemas de gestión, los procedimientos administrativos, la gestión del riesgo y el mejoramiento continuo en las tres subsecretarías y las 3 unidades transversales de la Secretaría de Hacienda.

HA95BB	**Sistema de gestión documental implementado**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459901700

Descripción B/P/S: Busca garantizar la infraestructura técnica, tecnológica, física y de talento humano que soporta la información y la administración documental del proceso de Hacienda Pública.

Proyecto: 240219 -Desarrollo de estrategias de valoración de inversiones del distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 87% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 94%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 365 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 318

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de información implementados				
HA19BA Sistemas de información implementados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Sistema de información para la valoración y custodia del portafolio de inversiones.

Proyecto: 240220 -Modenización técnologica de los servicios de la hacienda publica

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.336 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.656 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.650

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de información implementados				
HA20BA Sistemas de información implementados	**Número**	**0,2**	**0,2**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Permite medir la cantidad de sistemas de información que se desarrollen e implementen para la mejora de los procesos de la Hacienda Pública.

HA20BB Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	**Porcentaje**	**99,6**	**99,6**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459900700

Descripción B/P/S: Permite medir los recursos y los componentes de la infraestructura tecnológica que sean adquiridos para soportar las necesidades y procesos de la dependencia.

HA20BC Personas capacitadas en uso de tecnologías de información y comunicaciones (tic)	**Número**	**300**	**334**	**111%**

Código. Ind. SUIFP: 459902802

Descripción B/P/S: Mide la cantidad de personas capacitadas en el uso de las tecnologías que se incorporen a los procesos.

Observación B/P/S: Por la experiencia obtenida en capacitaciones anteriores, se había evidenciado una asistencia promedio cercana al 30%, por lo que se estimó que estando la Secretaría compuesta por cera ce 1.000 colaboradores e invitándolos a todos (el 100%) a la capacitación virtual (por Teams), en promedio asistiría 300 personas, pero al enviarse la invitación al 100% de colaboradores, Teams rechazó el envío completo y sólo envió aproximadamente 500 invitaciones, por lo que el índice de asistencia esperando del 30% (para 1.000) se superó al ingresar a la capacitación virtual 334 (de 500 invitados), obteniéndose un índice de 66.8%, superior al esperado del 30% (150 personas), situación que se sale de los escenarios de planificación, por tratarse de un evento con llegadas o ingresos aleatorios que no están al alcance o control del dueño o gestor de la reunión

Proyecto: 240221 -Desarrollo de estrategias de depuración y cobro de la cartera morosa

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 15.503 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 23.522 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 23.263

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Servicio de saneamiento fiscal y financiero

HA21AA	**Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado**	**Porcentaje**	**31,43**	**45,1**	**143%**

Código. Ind. SUIFP: 459900200

Descripción B/P/S: Corresponde al recaudo de vigencias anteriores obtenido de la gestión de cobro.

Observación B/P/S: El desarrollo oportuno de las estrategias definidas y la implementación del alivio tributario establecido en el Acuerdo 046 de 2025 explican el logro superior a la meta.

Proyecto: 240316 -Mejoramiento en el recaudo y gestión de los ingresos tributarios y no tributarios

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 18.441 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 24.267 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 24.221

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de saneamiento fiscal y financiero					
HA16CA	**Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado**	**Porcentaje**	**100**	**100**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459900200

Descripción B/P/S: El programa consiste en la realización de acciones para la determinación de las obligaciones tributarias y la gestión de los ingresos no tributarios. Se realizan programas de fiscalización, apoyo a la gestión de títulos, procesamiento de declaraciones y actualización de la cuenta corriente de ingresos.

Proyecto: 240327 -Fortalecimiento de la gestión financiera de la hacienda pública del distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.633 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 11.146 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 11.146

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de evaluación					
HA27CA	**Documentos de evaluación elaborados**	**Número**	**64**	**64**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459900100

Descripción B/P/S: El producto corresponde a los instrumentos de planificación financiera que se elaboran y/o ajustan tales como: El Marco Fiscal de Mediano Plano, el Plan Financiero y el Presupuesto.

HA27CB	**Documentos de política elaborados**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459903200

Descripción B/P/S: Corresponde al conjunto de instrumentos que apoyan la articulación de los componentes básicos de la planeación del desarrollo, de la planeación financiera y del sistema presupuestal de largo, mediano y corto plazo.

HA27CC	**Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado**	**Porcentaje**	**95**	**95,5**	**101%**

Código. Ind. SUIFP: 459900200

Descripción B/P/S: Corresponde a los saldos contables de relativa antigüedad y aquellos que han sido objeto de hallazgos como resultados de procesos de auditoria externos e internos, entre otros. La información se encuentra registrada en los módulos FI, PSCD y Activos Fijos, generada por las dependencias responsables de los diferentes procesos que alimentan la contabilidad y en proveedores externos, especialmente entidades descentralizadas del orden Distrital.

Observación B/P/S: El equipo logro terminar el plan asignado para el 2025 antes de terminar la vigencia, por ello fue asignada al proyecto una cuenta para tener un avance adicional.

Pilar: 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo

Componente: 4.3 - Movilidad Sostenible e Integral

Programa: 4.3.2 - Transporte público masivo, colectivo e individual

Proyecto: 040320 -Acuerdo metro

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 94% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 86.612 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 93.506 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 87.974

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para la prestación de transporte público masivo de pasajeros				
HA20AB Sistemas de transporte público financiados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 130201200

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a los recursos que se destinan para atender el Acuerdo de Pago Metro, a través del cual se financió el sistema metro de la ciudad.

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: **200173 -Administración del recaudo y la cartera morosa**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 56 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 31

Proyecto: **200219 -Optimización de los excedentes de liquidez**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 30 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 19

Proyecto: **200289 -Asistencia técnica a la gestión de la hacienda pública**


Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 334 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 310


Proyecto: **200294 -Fortalecimiento y control de los ingresos tributarios y no tributarios medellín**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 48 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 30


Secretaría General


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2025

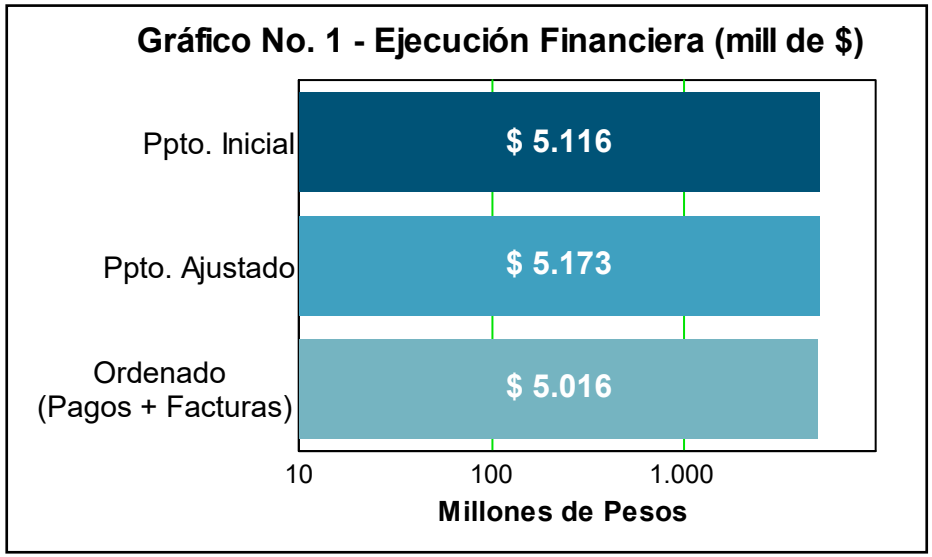


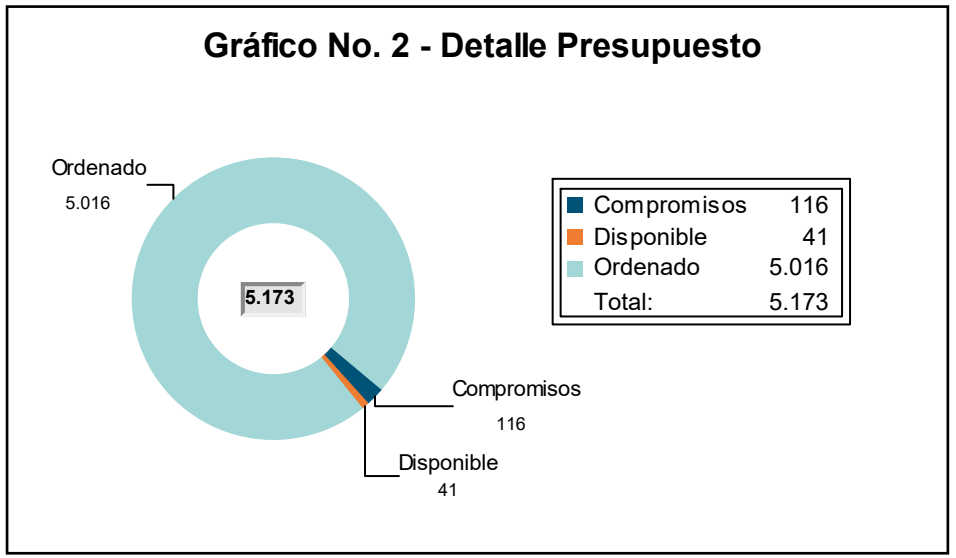

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre de 2025 comprende pagos y facturas

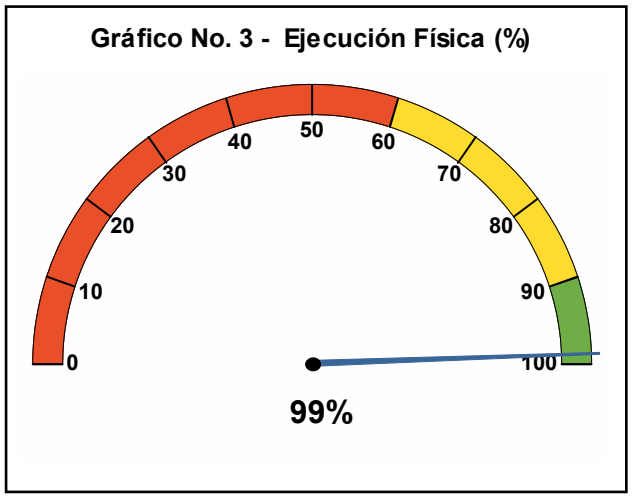

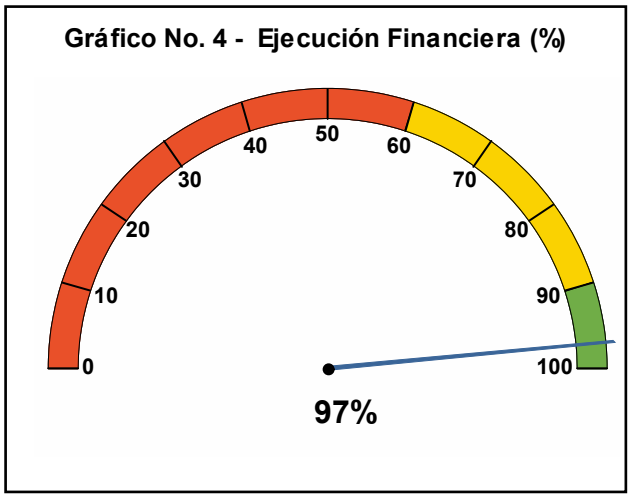

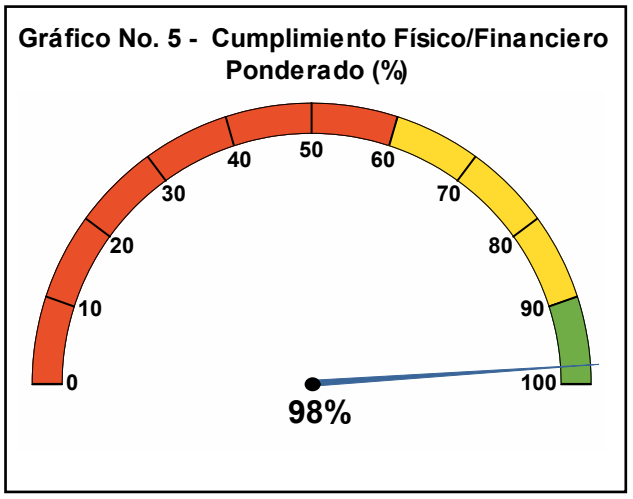

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.4 - Confianza ciudadana en la gestión pública institucional
Programa: 3.4.9 - Gerencia Jurídica Pública

Proyecto: **240272 -Desarrollo de estrategias para la gestión jurídica desde la prevención del daño antijurídico y la defensa del patrimonio público**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.016 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.916 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.885

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
GE72AA Documentos de lineamientos técnicos realizados	**Número**	**50**	**51**	**102%**

Código. Ind. SUIFP: 120500500

Descripción B/P/S: Documentos de lineamientos técnicos relacionados con directrices y espacios de articulación jurídica para el fortalecimiento del direccionamiento jurídico. Estas acciones potencian la retroalimentación jurídica y la representación judicial al interior de la administración central y el conglomerado público, permitiendo la unificación de criterios y estrategias en temas de alto impacto tanto desde el punto de vista de la prevención del daño antijurídico, así como de la defensa jurídica.

Observación B/P/S: Con corte al 31 de diciembre se han realizado 51 lineamientos relacionados con directrices y espacios de articulación jurídica para el fortalecimiento del direccionamiento jurídico.

Proyecto: **240273 -Administración de la información jurídica**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 95% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.100 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.200 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.086

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información actualizado				
GE73AA Sistemas de información actualizados	**Porcentaje**	**100**	**100**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Actualizaciones, mejoras y nuevas funcionalidades y/o herramientas desarrolladas en la vigencia 2025, definidas en la ruta de trabajo del Proyecto Gestión jurídica Digital, aplicables al proceso de gestión jurídica que contribuyen a la gestión, operación y toma de decisiones estratégicas y misionales para la prevención del daño antijurídico y para la defensa del patrimonio público.

Observación B/P/S: Con corte al 31 de diciembre se presenta un avance del 100%, correspondiente a la actualización de las herramientas de información jurídica y al avance en la planeación de las mejoras, nuevas funcionalidades y/o desarrollo para la vigencia 2025.

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: **200215 -Fortalecimiento en la prevención del daño antijurídico y la defensa jurídica**


Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 39 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 34


Proyecto: **200216 -Mejoramiento de herramientas para la información jurídica**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 18 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 11


Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2025

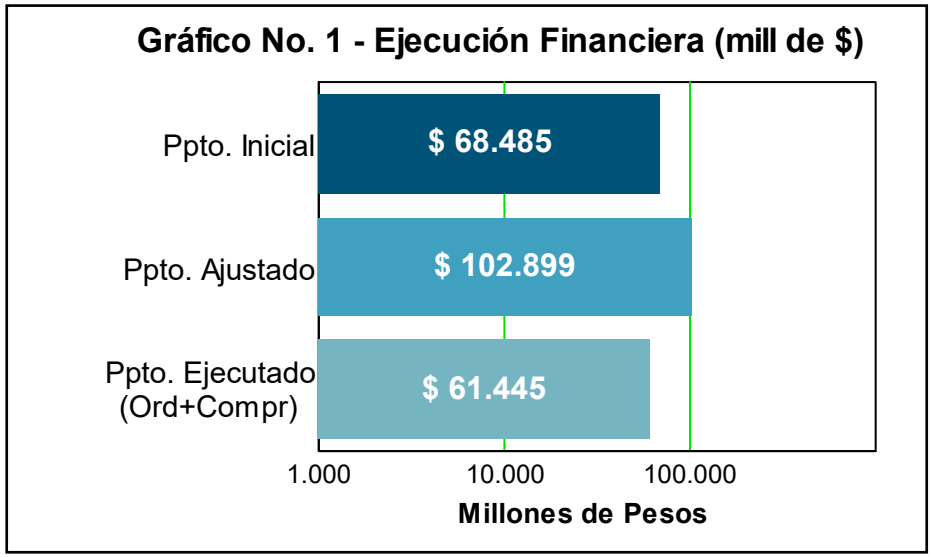


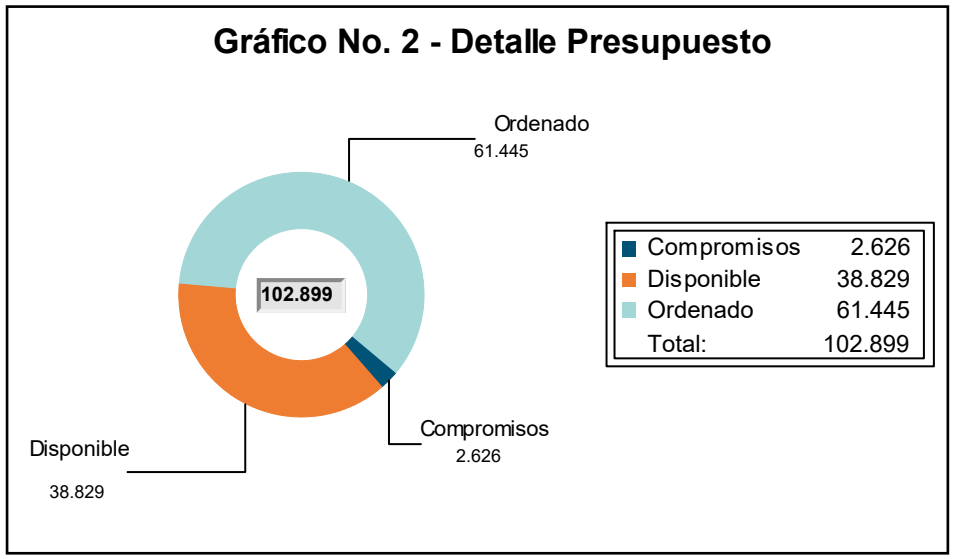

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre de 2025 comprende pagos y facturas

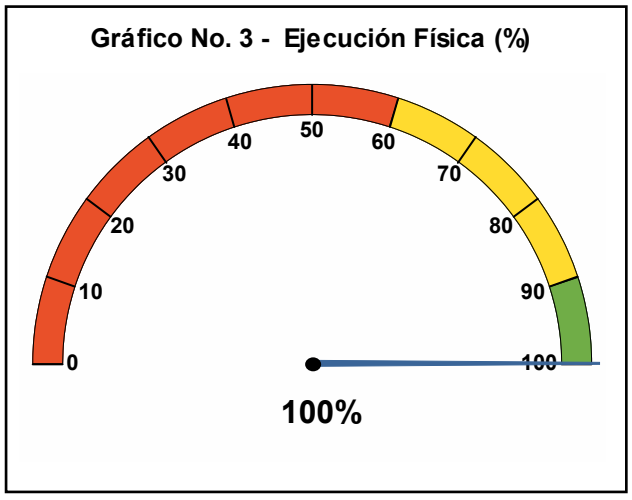

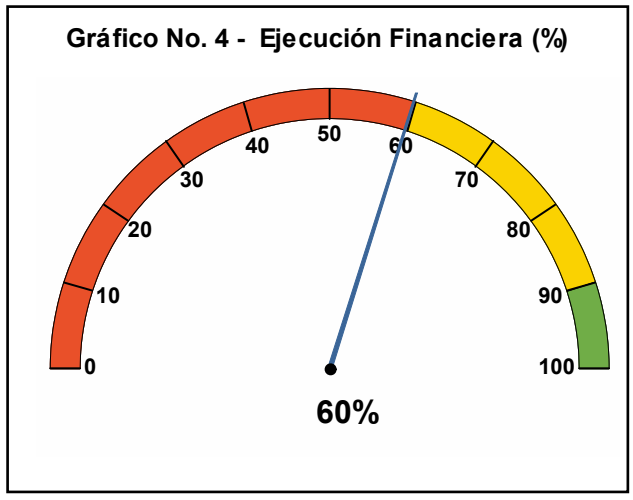

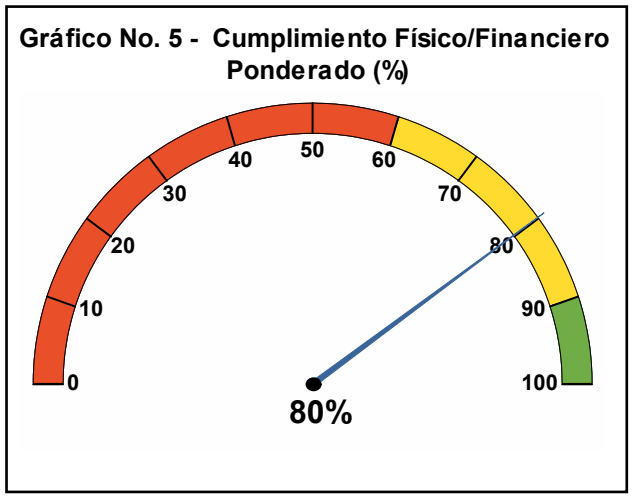

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.4 - Confianza ciudadana en la gestión pública institucional
Programa: 3.4.2 - Fortalecimiento del Sistema Integral de Gestión para mejorar el desempeño institucional

Proyecto: **200194 -Fortalecimiento de las políticas de gestión y desempeño institucional**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión				
GH94AG Sistema de gestión implementado	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902300

Descripción B/P/S: Sistema de Gestión implementado para mejorar la gestión y el desempeño institucional.

Proyecto: **240203 -Optimización del sistema integral de gestión**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 75% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 88%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.747 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.725 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.299

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión				
GH03AA Sistema de gestión implementado	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902300

Descripción B/P/S: Sistema de Gestión implementado para mejorar la gestión y el desempeño institucional.

Programa: 3.4.4 - Fortalecimiento de los servidores públicos para recuperar la confianza institucional

Proyecto: **200195 -Mejoramiento de la gestión documental de las historias laborales**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 50 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 50

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de Gestión Documental				
GH95AA Sistema de gestión documental implementado	**Número**	**2.000**	**2.000**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459901700

Descripción B/P/S: Organización de la información de los expedientes de historias laborales, de los servidores públicos de la Alcaldía de Medellín, para disponer de la documentación

Proyecto: **240196 -Administración de la información de los expedientes laborales**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 94% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.395 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.345 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.265

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de Gestión Documental				
GH96BA Sistema de gestión documental implementado	**Número**	**2.000**	**2.000**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459901700

Descripción B/P/S: Organización de la información de los expedientes de historias laborales, de los servidores públicos de la Alcaldía de Medellín.

Proyecto: 240197 -Desarrollo de estrategias para el desarrollo del talento humano

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 94% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.390 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.284 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.211

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de integración de la oferta pública				
GH97AA Espacios de integración de oferta pública generados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902900

Descripción B/P/S: Integración de espacios que promueven el esparcimiento, vida social y cultural y hábitos de vida saludable a los servidores públicos y su grupo familiar y pensionados del Distrito de Medellín.

Proyecto: 240199 -Mejoramiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 653 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 820 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 811

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
GH99AA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	**Número**	**5.088**	**5.324**	**105%**

Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Intervenciones efectuadas a servidores públicos para la seguridad y salud en el trabajo.

Observación Proyecto: El resultado del indicador Mejoramiento del sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) por medio de actividades de promoción y prevención alcanzó un 105%, debido a que la planta tiene alcance global y la planificación del indicador se realizó con base en una estimación inicial del número de servidores a intervenir durante el período evaluado y se logró intervenir personal que ingreso nuevo en el año 2025, no contemplados inicialmente.

Proyecto: 240201 -Servicio de financiamiento de las necesidades de vivienda para los servidores del distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 55% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 78%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 51.791 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 86.969 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 48.099

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda				
GH01AA Hogares beneficiados con adquisición de vivienda	**Número**	**215**	**235**	**109%**

Código. Ind. SUIFP: 400103100

Descripción B/P/S: Créditos adjudicados a servidores públicos por el Programa de Vivienda del Distrito de Medellín.

Observación Proyecto: La meta se sobrepaso debido a que durante la vigencia se declararon desistimientos, renuncias a créditos otorgados e igualmente hubo personas que legalizaron por menor valor al adjudicado lo que permitió la liberación de presupuesto y por ende la adjudicación de más créditos.

Proyecto: 240205 -Transformación del modelo de practicas en el distrito de medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.656 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.166 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.157

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral				
GH05AA Personas formadas	**Número**	**211**	**341**	**162%**

Código. Ind. SUIFP: 360300200

Descripción B/P/S: Personas formadas para la realización de practicas laborales en el Distrito de Medellín.

Observación Proyecto: Se supero la meta con 341 practicantes en las modalidades de Excelencia y Especifica, ya que todos contaron con remuneración económica durante su proceso de prácticas, esto debido a que en el primer semestre se respondió a un requerimiento de acuerdo sindical con los practicantes Técnicos agentes de transito en vincularlos en la modalidad de excelencia y durante el segundo semestre se inició con el pago del auxilio de transporte para los practicantes de la modalidad específica gracias a la modificación del Decreto reglamentario 0262 de 2023 por el 0379 de 2025.

Programa: 3.4.5 - Transformación de la experiencia de servicio a la ciudadanía en el distrito para aumentar la confianza institucional

Proyecto: 200192 -Fortalecimiento del servicio para mejorar la experiencia del ciudadano

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 558 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 546

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información actualizado				
GH92AA Sistemas de información actualizados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Atención al ciudadano en tramites, servicios y PQRSD.

Proyecto: 240202 -Mejoramiento de la experiencia ciudadana desde la gestión institucional

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 75% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 88%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 7.853 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.978 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.003

Descripción del Avance


Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de integración de la oferta pública				
GH02AA Espacios de integración de oferta pública generados	**Número**	**17**	**17**	**100%**


Código. Ind. SUIFP: 459902900

Descripción B/P/S: Sedes para atención a los ciudadanos desde la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía.


Secretaría de Suministros y Servicios


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2025

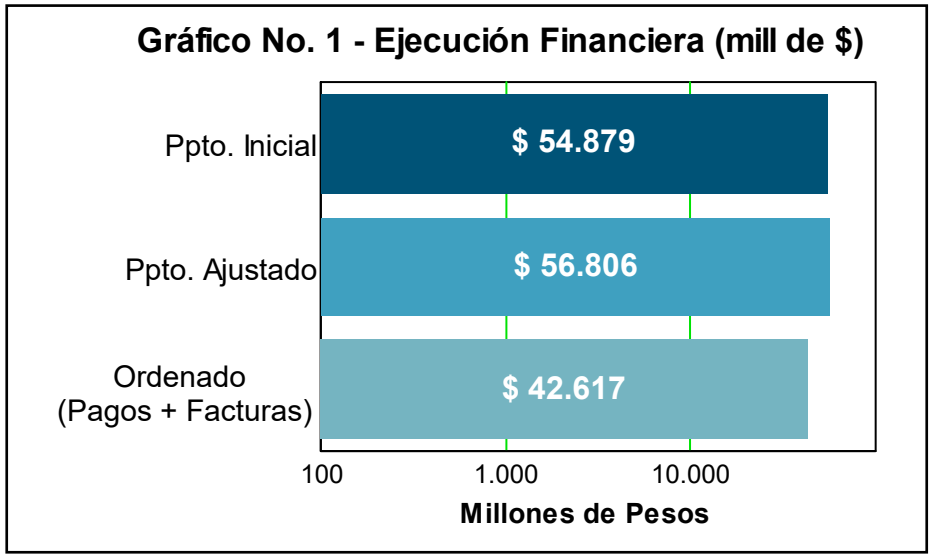


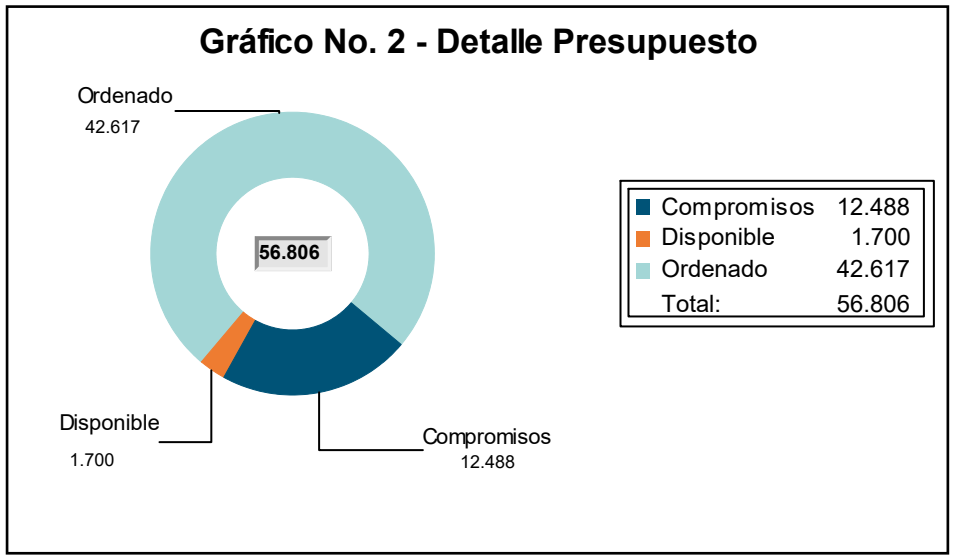

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre de 2025 comprende pagos y facturas

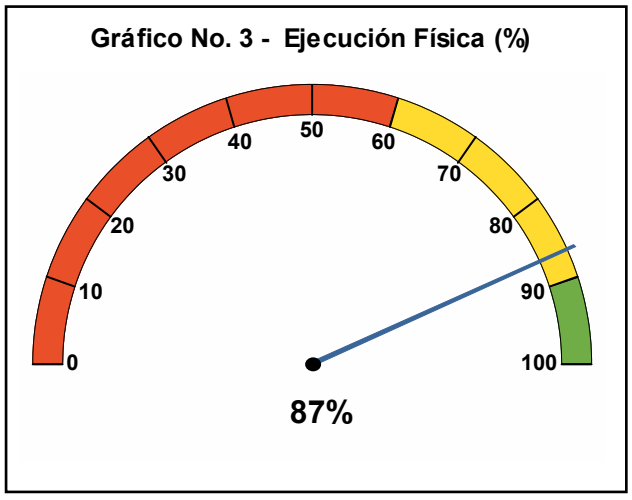

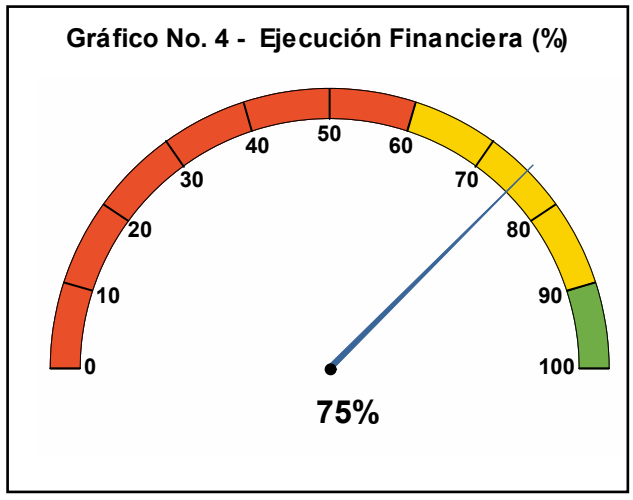

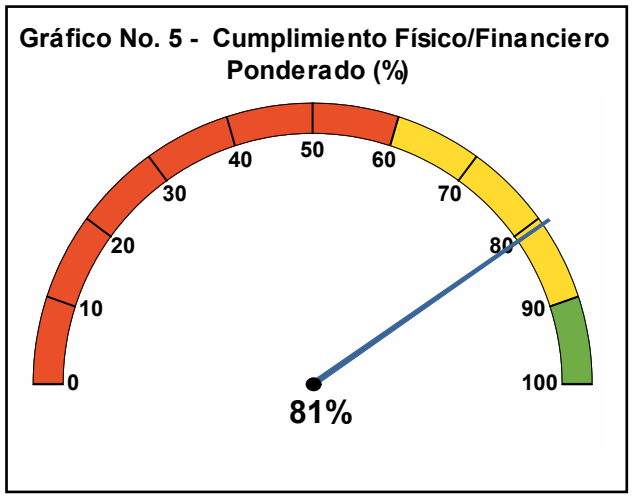

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.4 - Confianza ciudadana en la gestión pública institucional
Programa: 3.4.7 - Gestión eficiente de bienes y servicios

Proyecto: **240146 -Fortalecimiento del abastecimiento estratégico del distrito**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 17.647 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 16.590 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 16.135

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos metodológicos				
SS46BA Documentos metodológicos realizados	**Número**	**1.750**	**1.853**	**106%**

Código. Ind. SUIFP: 459902000

Descripción B/P/S: Corresponde a los procesos contractuales en los que se identifica que se utilizó una de las estrategias del Modelo en la Cadena del Abastecimiento Estratégico.

Observación B/P/S: Durante la vigencia 2025, se adelantaron 1.853 contratos, a los que se les aplicaron las disposiciones o políticas establecidas en los documentos técnicos en compras y contratación elaboradas.

SS46BB Espacios de integración de oferta pública generados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902900

Descripción B/P/S: Corresponde al evento que desarrolla actividades orientadas a dar a conocer los bienes y servicios que adquiere el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y sus entidades descentralizadas.

Observación B/P/S: El evento se realizó el 28 de agosto en el City Hall Club El Rodeo

SS46BC Sistemas de información implementados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Corresponde a un tablero que permita visualizar los datos relacionados con la contratación que realiza el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y del Conglomerado.

Observación B/P/S: En la vigencia 2025, las entidades publicaron en el Buscador de Oportunidades un total de 1.169 procesos, por un valor total de $2.175.128.883.531, el tablero ya se encuentra funcional y operando al 100%.

Proyecto: **240147 -Mantenimiento y administración de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del distrito**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 97% **Ejec. Financiera :** 59% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 78%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 37.232 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 33.675 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 20.036

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Sedes mantenidas				
SS47BA Sedes mantenidas	**Número**	**24**	**24**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459901600

Descripción B/P/S: Corresponde a las intervenciones físicas para conservar y mantener los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín (CAD y sedes externas) incorporando criterios de ecosostenibilidad.

Observación B/P/S: Se atendieron en 2025, las siguientes sedes: Equipo de Seguridad Alimentaria, Bomberos, Planta de Reciclaje, Centro de Discapacidad Belén las Playas, Centro de Integración las Mercedes, Casa de Justicia Santo Domingo, Casa de Justicia 20 de Julio, Vivero Municipal, Unidad de Programas Sociales Especiales (UPSE), Gerencia Étnica, Unidad de Familia Santa Cruz, Bodegas Polo Norte, Gerencia de Diversidad Sexual, Centro Comercial del Libro y la Cultura, Centro de Integración San Cristóbal, Bodega Niquitao, Mas Cerca Castilla, Centro Comercial Bolívar Prado, Sede Obreros de Cobertura, Planta La Iguaná, Casa de Cultura Manrique, Teatro al Aire Libre Pedregal, secretaría de Movilidad y el Centro Administrativo Distrital (CAD)

SS47BB Documentos de lineamientos técnicos realizados | **Número** | **120** | **347** | **289%**

Código. Ind. SUIFP: 459901800

Descripción B/P/S: Corresponde a las intervenciones de disposición, seguimiento y saneamiento de los bienes inmuebles propiedad del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, y que como resultado se generan contratos de arrendamientos, administración del espacio público y comodatos, sumado a los procesos de saneamientos finalizados.

Observación B/P/S: Con corte al 31 de diciembre de 2025, en la Unidad Administración de Bienes Inmuebles se gestionaron 347 documentos de lineamientos técnicos de los 120 planeados.

SS47BC Sistemas de información implementados | **Número** | **2** | **1,8** | **90%**

Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Corresponde a las herramientas y aplicativos requeridos que estén articulados con los ya existentes para desarrollar las actividades de los procesos de mantenimiento y administración de los bienes muebles e inmuebles.

Observación B/P/S: La implementación de la plataforma SIGAI para transporte contratado tiene un avance del 1, implementado al 100% en el Distrito. El módulo de transporte propio se implementaron 4 de los 4 submódulos en pre- producción, planeados para la vigencia y se pasó a productivo e inició implementación el módulo de preoperaciones con un avance del 0,8. Queda pendiente la implementación escalada.

Observación Proyecto: Básicamente la ejecución financiera proporcional para el proyecto 240147, no fue la ideal debido a las características de las intervenciones que en la vigencia 2025 se planearon adelantar, entre ellas y la más importantes, la renovación de más de 100 unidades sanitarias del edificio del CAD, esta, representa una intervención estratégica como parte de las acciones prioritarias de mantenimiento para mejorar las condiciones de consumos y optimización del agua, mejorar la ventilación y garantizar instalaciones más seguras, duraderas y fáciles de mantener. Este proceso de contratación posee ciertas peculiaridades que hacen más tardía su adjudicación y posterior ejecución, como son el inventario y diagnóstico preliminar del estado de los baños, contratación de arquitecto para realizar los diseños, finalización de diseños y elaboración de presupuestos, elaboración y validación de Estudios Previos, entre otras. Adicionalmente se debe tener en cuenta que por la modalidad de contratación, licitación pública, se deben respetar los plazos que indica la ley y también, adelantar el proceso de contratación de la interventoría. Después de adjudicado el contrato se presentaron algunas dificultades para su inicio, asociadas a la conformación del equipo de trabajo por parte del contratista y a las restricciones logísticas del edificio, impidiendo el inicio efectivo de las actividades de obra teniendo en cuenta que es un edificio que tiene alrededor de 2.500 personas y que el equipo de obra debe adaptarse a horarios restringidos, controlar ruidos, polvo y accesos, y mantener estándares de seguridad tanto para los trabajadores como para los servidores

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: **200347 -Administración del abastecimiento innovador, sostenible y social del municipio medellín**


Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0


Proyecto: **200367 -Administración integral de bienes muebles e inmuebles de propiedad del municipio medellín**


Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.534 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.446


Secretaría de Educación


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2025

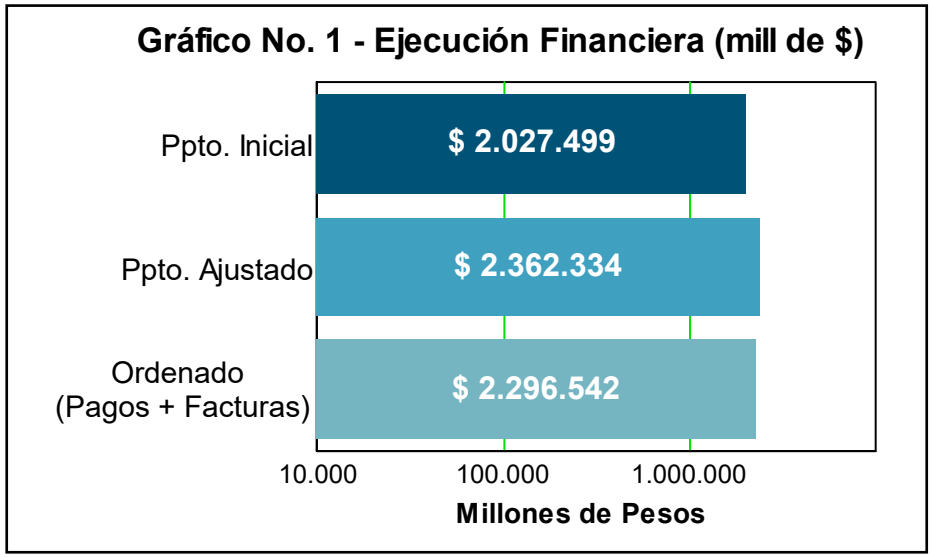

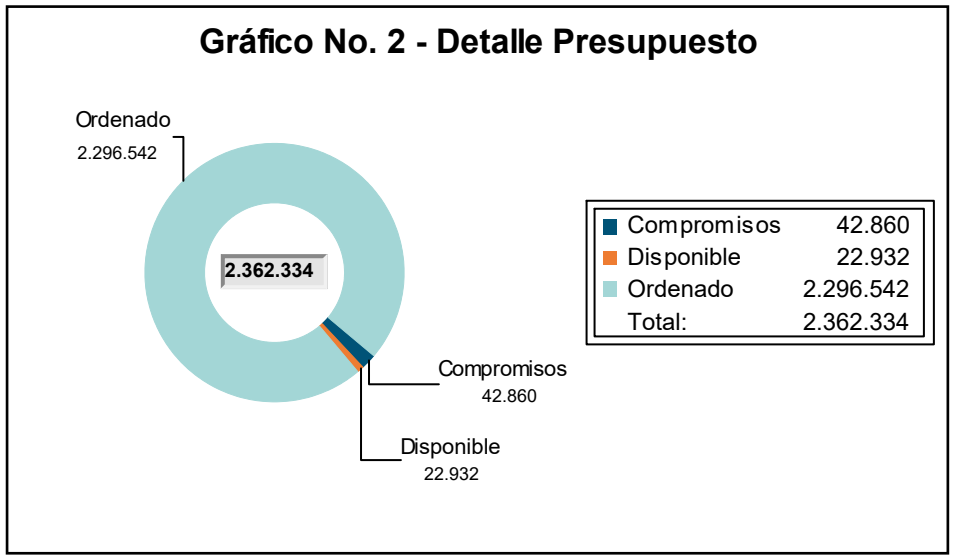

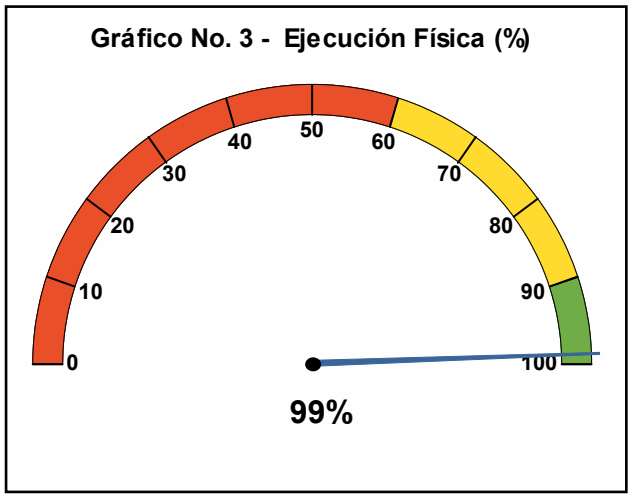

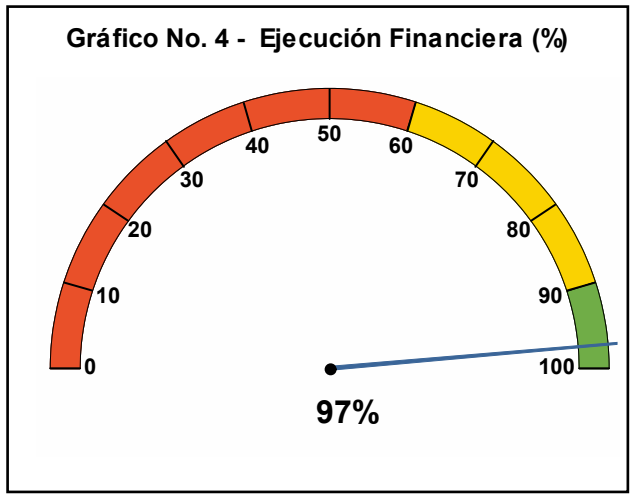

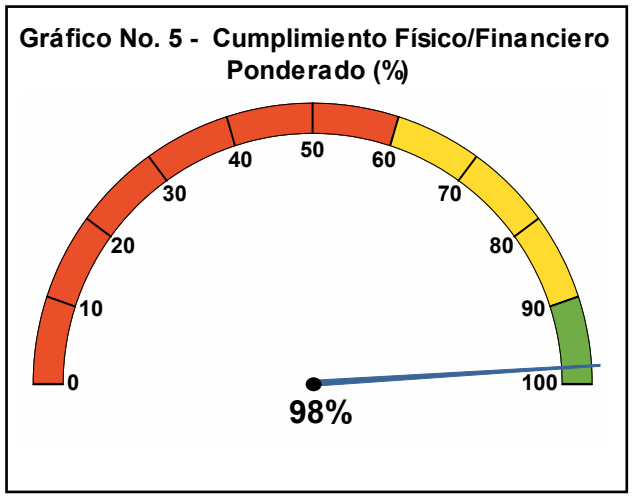

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.2 - Educación para el progreso social
Programa: 1.2.1 - Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria

Proyecto: 240023 -Apoyo técnico y logístico para la gestión administrativa de establecimientos educativos oficiales

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 173.277 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 176.954 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 171.419

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio educativo				
ED23BA Establecimientos educativos en operación	**Número**	**421**	**421**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 220107100

Descripción B/P/S: Garantizar el adecuado funcionamiento de los establecimientos educativos oficiales mediante la contratación y pago de los servicios de: apoyo administrativo -auxiliares, aseo, vigilancia y servicios públicos.

Observación B/P/S: Se garantizó la prestación de los servicios de aseo, cafetería, vigilancia y auxiliares administrativos en el 100% de las sedes educativas oficiales del Distrito.

Proyecto: 240047 -Aportes para el pago de aportes patronales de docentes de establecimientos educativos oficiales

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 130.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 197.067 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 196.390

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio educativo				
ED47BA Establecimientos educativos en operación	**Número**	**229**	**228**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 220107100

Descripción B/P/S: Garantizar el funcia miento de establecimientos educativos oficiales mediante el pago efectivo de los aportes patronales de los docentes, directivos docentes y administrativos en los tiempos establecidos, con calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia.

Observación B/P/S: Los aportes patronales del personal docente se reportaron al FOMAG para la respectiva conciliación, los aportes por el recurso propio se giraron de conformidad; los aportes del personal administrativo de consignaron a cada una de las entidades donde los funcionarios están afiliados.

Proyecto: 240048 -Aportes para el pago de docentes municipales

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 94% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 71.382 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 71.974 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 67.464

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio educativo				
ED48CA Establecimientos educativos en operación	**Número**	**229**	**228**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 220107100

Descripción B/P/S: Garantizar el funcia miento de establecimientos educativos oficiales mediante el pago efectivo de las nóminas del personal docente municipal en los tiempos establecidos con calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia.

Observación B/P/S: El pago de la nómina de los docentes municipales se realizó de acuerdo al cronograma establecido para tal fin en el 100% de los establecimientos educativos oficiales.

Proyecto: 240049 -Aportes para el pago de docentes sgp

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 928.355 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.146.749 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.135.910

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio educativo				
ED49BA Establecimientos educativos en operación	**Número**	**229**	**228**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 220107100

Descripción B/P/S: Garantizar el funcia miento de establecimientos educativos oficiales mediante el pago efectivo de las nóminas del personal docente SGP en los tiempos establecidos con calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia.

Observación B/P/S: El pago de la nómina de los docentes del SGP se realizó de acuerdo al cronograma establecido para tal fin en el 100% de los establecimientos educativos oficiales.

Proyecto: 240050 -Aportes para el pago del personal administrativo de establecimientos educativos oficiales

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 94% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 32.345 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 35.464 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 33.329

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio educativo				
ED50DA Establecimientos educativos en operación	**Número**	**229**	**228**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 220107100

Descripción B/P/S: Garantizar el funcia miento de establecimientos educativos oficiales mediante el pago efectivo de las nóminas del personal administrativo en los tiempos establecidos con calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia.

Observación B/P/S: El pago de la nómina del personal administrativo se realizó de acuerdo al cronograma establecido para tal fin en el 100% de los establecimientos educativos oficiales.

Proyecto: 240054 -Contribución para el acceso gratuito a la educación

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 93% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 25.578 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 37.548 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 37.548

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media.				
ED54FA Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media.	**Número**	**287.248**	**267.869**	**93%**

Código. Ind. SUIFP: 220101700

Descripción B/P/S: Garantizar el acceso de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes a los Establecimientos Educativos Oficiales del Municipio de Medellín, mediante el pago de derechos académicos y servicios complementarios a los estudiantes.

Observación B/P/S: Los recursos de gratuidad del Ministerio de Educación Nacional fueron girados a las instituciones educativas oficiales del Distrito conforme a la Resolución No. 006171 del 27 de marzo de 2025, y las transferencias se efectuaron el 31 de marzo de 2025. Con corte al 30 de noviembre de 2025, se atendieron 267.869 estudiantes con recursos de gratuidad en los establecimientos oficiales que recibieron giros del SGP 2025. Cabe señalar que la Institución Educativa La Asunción no recibió recursos debido a su cierre por problemas de infraestructura, motivo por el cual sus estudiantes fueron reubicados en otras instituciones del Distrito.

Proyecto: 240056 -Desarrollo de estrategias de busqueda territorial, acceso y permanencia en el sistema escolar

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 99% **Ejec. Financiera :** 94% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 71.337 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 68.854 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 64.726

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar				
ED56BA Beneficiarios de transporte escolar	**Número**	**11.000**	**11.104**	**101%**

Código. Ind. SUIFP: 220102900

Descripción B/P/S: Hace referencia al número de beneficiarios de transporte escolar para el fortalecimiento de las estrategias de permanencia en el sistema escolar.

Observación B/P/S: Durante la vigencia 2025 se beneficiaron en total 11.104 estudiantes con el servicio del transporte escolar bajo la modalidad de contratado, los cuales hacen parte de 49 instituciones educativas oficiales del Distrito. Es de anotar que de acuerdo a las dinámicas de los procesos de matrícula, se incrementa o reduce el número de estudiantes beneficiarios por mes.

ED56BB Raciones contratadas	**Número**	**2.700.000**	**2.832.735**	**105%**

Código. Ind. SUIFP: 220102800

Descripción B/P/S: Hace referencia al número de beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para el fortalecimiento de las estrategias de permanencia en el sistema escolar.

Observación B/P/S: Los recursos transferidos por la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) del Ministerio de Educación Nacional para el Programa de Alimentación Escolar ascendieron a $11.455.913.000, con los cuales se proyectó la entrega de aproximadamente 2.700.000 raciones. Estos recursos generaron un rendimiento financiero por $563.187.410, el cual fue reinvertido en su totalidad en el programa, alcanzando un monto total de $12.019.100.410. Como resultado de esta gestión, durante el mes de noviembre se adquirieron 1.334.599 raciones adicionales, logrando un total de 2.832.735 raciones entregadas, lo que representa el cumplimiento de una meta del 105 %tal de 2.832.735 de raciones, obteniéndose una meta del 105%

ED56BC Coberturas obtenidas	**Número**	**380.000**	**450.000**	**118%**

Código. Ind. SUIFP: 220104300

Descripción B/P/S: Hace referencia al número de beneficiarios de la póliza escolar para el fortalecimiento de las estrategias de permanencia en el sistema escolar.

Observación B/P/S: A la fecha se cuenta con la cobertura de 450.000 personas con el servicio de la póliza escolar que ampara a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales y de cobertura ubicadas en zona rural y urbana del Distrito, contra el riesgo de muerte por cualquier causa o lesiones sufridas y gastos médicos.

ED56BD Personas beneficiarias de estrategias de permanencia	**Número**	**287.248**	**273.787**	**95%**

Código. Ind. SUIFP: 220103300

Descripción B/P/S: Hace referencia al número de beneficiarios con estrategias de búsqueda, acceso y permanencia en el sistema escolar diferentes a las convencionales.

Observación B/P/S: Mediante el contrato No. 4600104724 de 2025 se garantizaron acciones de acompañamiento, monitoreo y seguimiento a la permanencia escolar en el 100% de establecimientos educativos oficiales del Distrito, beneficiando a toda la población matriculada en el sector oficial. Dentro de las acciones más relevantes se destacan: -228 Mesas de Permanencia Escolar en las instituciones educativas oficiales del Distrito. -Instalación de la ruta de control de traslados y retiros de estudiantes matriculados en las instituciones educativas oficiales del Distrito.

Proyecto: 240062 -Dotación de elementos de trabajo al personal financiado con sgp

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 0% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 50%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 239 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 239 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Servicios conexos a la prestación del servicio educativo oficial

ED62BA	**Docentes beneficiados**	**Número**	**164**	**164**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 220104400

Descripción B/P/S: Hace referencia a la entrega de suministros de dotación tales como: prendas, conjuntos, calzado, camisetas, y otros elementos indispensables para realizar las labores principales de cada proceso, en los cuales se encuentran docentes, celadores, conductores y personal de aseo pertenecientes al SGP que se encuentran en las instituciones educativas de Medellín.

Observación Proyecto: Con corte al 31 de diciembre de 2025 se reporta un total de 164 servidores beneficiados, alcanzando el 100% de cumplimiento de la meta del indicador para la presente vigencia. Se precisa que las entregas realizadas corresponden al cierre de compromisos adquiridos en las vigencias 2023 y 2024. De manera paralela, los procesos contractuales financiados con recursos de la vigencia 2025 se encuentran en curso, con el fin de continuar con la entrega de la dotación al personal SGP.

Proyecto: 240064 -Fortalecimiento administrativo y de la infraestructura para la gestión educativa

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 33.571 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 32.322 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 32.179

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica					
ED64DA	**Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Corresponde al número de contratos de apoyo a la gestión desarrollados desde el proyecto para el adecuado funcionamiento técnico y asistencia de la secretaría.

Observación B/P/S: El adecuado funcionamiento técnico de la Secretaría se garantiza mediante los contratos suscritos en el marco de este proyecto, los cuales tienen los siguientes objetivos: - Realizar actividades de tesorería en los FSE de las instituciones y centros educativos oficiales. - Desarrollar estrategias en gestión del conocimiento para la promoción, acompañamiento y fortalecimiento de las funciones de la Secretaria de Educación Distrital. - Fortalecer la prestación del servicio técnico y operativo de los procesos de talento humano a través del Sistema de Información Humano. - Operar logísticamente los eventos de la Secretaría de Educación. - Prestar el servicio de transporte terrestre automotor de carga y especial de pasajeros bajo la modalidad de camperos y camionetas (corresponde a 2 contratos). - Prestar Servicios Integrales de Plataforma de Impresión. - Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles (Lote 1: Servicio de mantenimiento a mobiliario). - Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores marca OTIS. - Suministrar formatos preimpresos. - Prestar el servicio de transporte terrestre automotor de carga y especial de pasajeros bajo la modalidad de camperos y camionetas - LOTE 1. - Prestar el servicio de transporte terrestre automotor de carga y especial de pasajeros bajo la modalidad de camperos y camionetas – LOTE 2 - Adición No. 1 al Contrato 4600104764 de 2025, cuyo objeto es "Adquirir soporte, mantenimiento, suscripción y actualización de las licencias del sistema de gestión documental Mercurio". - Adquirir el servicio de almacenaje y custodia de archivos. - Realizar inspección integral, diagnóstico, puesta a punto, mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores marca Mitsubishi. - Adquirir pólizas de seguros del Distrito y conglomerado.

ED64DB	**Sedes mantenidas**	**Número**	**4**	**4**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459901600

Descripción B/P/S: Da cuenta de los mantenimientos de la infraestructura de las sedes propias de la Secretaría de Educación Distrital.

Observación B/P/S: Con corte al 31 de diciembre de 2025, se ejecutaron actividades de mantenimiento de ascensores en la Escuela de Maestros y en MOVA, así como labores de mantenimiento en las sedes administrativas Guillermo Vélez y Edificio Carré, dando cumplimiento a las acciones programadas para la vigencia.

Proyecto: 240065 -Fortalecimiento de la educación complementaria

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 94% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.202 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.971

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				

ED65BA	**Personas beneficiadas con procesos de formación informal**	**Número**	**6.700**	**12.957**	**193%**

Código. Ind. SUIFP: 220104900

Descripción B/P/S: Da cuenta del número de estudiantes de establecimientos educativos oficiales que participan en procesos de fortalecimiento de habilidades y/o competencias en alguna de las 6 rutas del programa Educación Complementaria.

Observación B/P/S: Esta cifra corresponde a la atención integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en las 6 rutas del proyecto Educación Complementaria con recursos ordinarios. A la fecha, la desagregación por rutas es la siguiente: ONU con 439 estudiantes, Robótica con 722, STEM+H con 558, Danza con 1.391, Bilingüismo con 3.606, Medio Ambiente con 1.443, Cultura con 3.956 y Plan de Lectura con 842.

Proyecto: 240068 -Innovación de la estrategia de modelos flexibles para población en extraedad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 69% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 85%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.500 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.041

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio educación formal por modelos educativos flexibles					
ED68CA	**Beneficiarios atendidos con modelos educativos flexibles**	**Número**	**8.500**	**11.822**	**139%**

Código. Ind. SUIFP: 220103000

Descripción B/P/S: Corresponde al número de estudiantes en extra edad en primaria, secundaria y media de establecimientos educativos oficiales que se encuentran en desfase entre la edad y su grado escolar, y que requieren una estrategia pedagógica diferente a la regular como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) para la garantía del derecho a la educación.

Observación B/P/S: Este indicador corresponde al número de estudiantes en extraedad en los niveles de primaria, secundaria y media de los establecimientos educativos oficiales, que presentan un desfase entre su edad y el grado escolar. Estos estudiantes requieren una estrategia pedagógica distinta a la regular, como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), para garantizar su derecho a la educación. El programa está dirigido a poblaciones altamente vulnerables, por lo que se habilitan grupos en cualquier momento del año para atender a personas desplazadas, migrantes, menores trabajadores y población en proceso de restablecimiento de derechos, étnicas y de alta vulnerabilidad. Esto ha generado un aumento en el logro del indicador, superando la meta inicialmente establecida. Fuente: Anexos SIMAT

Proyecto: 240069 -Prestación del servicio educativo en los niveles de preescolar, básica, media y educación de adultos mediante cobertura contratada

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 90% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 94%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 55.901 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 52.871 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 51.560

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media.					
ED69CA	**Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media.**	**Número**	**33.492**	**30.149**	**90%**

Código. Ind. SUIFP: 220101700

Descripción B/P/S: Corresponde al total de estudiantes proyectados de acuerdo al Estudio de Insuficiencia y Limitaciones realizado por el equipo de Acceso, Cobertura y Permanencia que se contratarán con las diferentes entidades no oficiales para la prestación del servicio educativo por cobertura en las modalidades: jóvenes en extra edad y adultos, banco de oferentes, confesiones religiosas y otra población escolar.

Observación B/P/S: De acuerdo con la información reportada por la interventoría designada, el número de cupos a certificar para el período de diciembre de 2025 asciende a 30.149 estudiantes, lo cual equivale al 90% del total de cupos contratados. Es importante precisar que este resultado está sujeto a la demanda efectiva y al proceso de certificación de los cupos, factores que inciden directamente en el nivel de cumplimiento del indicador.

Proyecto: 240070 -Servicio y gestión de inmuebles en comodato y arrendamiento

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 97% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 10.600 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9.937 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 9.792

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio educativo				
ED70DA Establecimientos educativos en operación	**Número**	**29**	**28**	**97%**

Código. Ind. SUIFP: 220107100

Descripción B/P/S: Corresponde a la administración y pago de inmuebles en estado de comodatos y arrendamientos para la garantía de la prestación del servicio educativo.

Observación B/P/S: Con corte al 31 de diciembre de 2025, se reportan 28 establecimientos educativos con contrato de arrendamiento vigente para garantizar la prestación del servicio educativo. Se precisa que el Distrito de Medellín adquirió, mediante compra, las mejoras de los inmuebles donde opera la I.E. Bello Oriente, lo cual dio lugar a la terminación anticipada del respectivo contrato de arrendamiento para el funcionamiento del establecimiento educativo. Esta situación explica que el resultado del indicador se encuentre por debajo de la meta proyectada para la vigencia.

Programa: 1.2.2 - Calidad y pertinencia desde preescolar hasta postsecundaria

Proyecto: **240051 -Asesoría y asistencia a líderes estudiantiles de establecimientos educativos oficiales**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 301 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 301 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 301

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
ED51BA Personas beneficiadas con procesos de formación informal	**Número**	**1.450**	**1.489**	**103%**

Código. Ind. SUIFP: 220104900

Descripción B/P/S: Hace referencia al número de líderes estudiantiles electos (contralores escolares, líderes de mediación escolar, personeros estudiantiles y representantes de los estudiantes al consejo directivo) y egresados de establecimientos educativos oficiales y no oficiales acompañados con acciones formativas en el desarrollo de las competencias y habilidades ciudadanas al interior de los establecimientos educativos.

Observación B/P/S: Durante diciembre de 2025 se cumplió el indicador de formación para líderes estudiantiles electos, alcanzando las 5 horas previstas mediante actividades de sensibilización y formación. Este proceso incluyó la ceremonia de posesión como espacio de apropiación del rol y la finalización del componente formativo desarrollado por la Universidad EAFIT. Asimismo, se realizaron acciones dirigidas a líderes estudiantiles egresados, entre las que se destaca el evento de cierre del ciclo de formación el 13 de diciembre y una jornada virtual el 17 de diciembre, en articulación con Sapiencia, enfocada en liderazgo, salud mental, gestión emocional y habilidades comunicativas.

ED51BB Documentos de planeación para la educación inicial, preescolar, básica y media emitidos	**Número**	**250**	**260**	**104%**

Código. Ind. SUIFP: 220100100

Descripción B/P/S: Corresponde al número de Planes de Transformación Sostenible, de establecimientos educativos oficiales y no oficiales, acompañados a través de la asesoría y asistencia técnica en las diferentes etapas que componen en el Plan: Etapa diagnóstica – Necesidad de transformación: identificar de manera participativa una situación problemática sentida por la comunidad educativa, y a la cual los líderes estudiantiles puedan aportar desde sus propias capacidades para su solución. Etapa de construcción del Plan de Transformación Sostenible: definir las estrategias para transformar la problemática a través de una propuesta escrita que responda a las preguntas contenidas en el Plan de Transformación Sostenible. Etapa de transformación de la realidad: implementar en equipo el Plan de Transformación Sostenible y medir su impacto.

Observación B/P/S: Se continuó con la revisión de los PTS entregados, dando cumplimiento al indicador, mediante el cual se acompañó, motivó y orientó de manera más pertinente la formulación, construcción e implementación de los respectivos PTS. Además, se identificaron subsanaciones, oportunidades de mejora y logros, y se realizaron devoluciones con el fin de motivar la continuidad del proceso para el año 2026. Este acompañamiento comprendió 232 PTS y 28 PTS KIDS, para un total de 260.

Proyecto: **240053 -Consolidación del enfoque educativo stem+h en los establecimientos educativos oficiales**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 982 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 982

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de apoyo a la implementación de modelos de innovación educativ				
ED53BA Establecimientos educativos apoyados para la implementación de modelos de innovación educativa	**Número**	**60**	**60**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 220104700

Descripción B/P/S: Se refiere al número de establecimientos educativos oficiales que implementan y desarrollan metodologías de enseñanza integradas en los campos de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas y Humanidades (STEM+H). Este enfoque promueve una educación interdisciplinaria, centrada en la resolución de problemas reales y el pensamiento crítico, combinando las competencias técnicas con las humanísticas.

Observación B/P/S: Se cuenta con 60 establecimientos educativos oficiales que implementan y desarrollan metodologías de enseñanza integradas en los campos de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas y Humanidades (STEM+H).

ED53BB Personas beneficiadas con procesos de formación informal	**Número**	**6.500**	**9.242**	**142%**

Código. Ind. SUIFP: 220104900

Descripción B/P/S: Se refiere al número de estudiantes matriculados en establecimientos educativos oficiales que reciben instrucción y entrenamiento en competencias relacionadas con el uso de tecnologías digitales. Este indicador se construye a partir de la implementación de propuestas de formación en distintos formatos (talleres, cursos, seminarios, semilleros, certificaciones, bootcamps, coaching y similares), realizados tanto intracurricular como extracurricularmente. El objetivo es propender por el desarrollo de habilidades en el manejo de software y hardware, el uso seguro y responsable de internet, programación básica, así como mejorar la capacidad para utilizar herramientas digitales (front, back, de contenido, comunicativas, marketing) en la resolución de problemas.

Observación B/P/S: Durante la vigencia 2025 se formaron 9.242 estudiantes de instituciones educativas oficiales en habilidades digitales. La meta se superó en 51% por encima de lo proyectado, dada la buena gestión realizada con aliados estratégicos y la motivación de los estudiantes en diferentes programas, principalmente aquellos que comprenden la IA y la programación.

Proyecto: 240058 -Desarrollo de estrategias para la calidad y pertinencia educativa

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 98% **Ejec. Financiera :** 88% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 93%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.044 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.801

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación				
ED58EA Documentos de planeación para la educación inicial, preescolar, básica y media emitidos	**Número**	**65**	**66**	**102%**

Código. Ind. SUIFP: 220100100

Descripción B/P/S: Brindar asesoría y asistencia técnica a los Establecimientos Educativos oficiales para la actualización de los Proyectos Educativos Institucionales - PEI.

Observación B/P/S: El cumplimiento de este indicador, con corte al 31 de diciembre de 2025, corresponde a 66 instituciones educativas oficiales. Es importante destacar que estas instituciones realizaron un total de 192 actualizaciones en sus documentos institucionales, entre los cuales se incluyen el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE), el Manual de Convivencia, los Planes de Área, los Proyectos Pedagógicos y los demás componentes del PEI . En consecuencia, el cumplimiento del indicador alcanza un 103% de cumplimiento, superando la meta establecida para el período.

ED58EB Personas beneficiadas con procesos de formación informal	**Número**	**3.000**	**3.158**	**105%**

Código. Ind. SUIFP: 220104900

Descripción B/P/S: Brindar formación a estudiantes de Establecimientos Educativos oficiales en el desarrollo de competencias para el fomento de la calidad y pertinencia educativa.

Observación B/P/S: En el periodo correspondiente al año 2025, se reporta un cumplimiento total del promedio acumulado del 105%, resultado de actividades lúdico- pedagógicas donde participan estudiantes con sus respectivos docentes y comunidad educativa de las diferentes IEO. Este porcentaje se logró gracias a la articulación con diferentes dependencias públicas y privadas del Distrito de Medellín, desde la Gestión Ambiental de la SED con: Emvarias, Subsecretaria de Protección y Bienestar Animal, Secretaría de Salud, Centro de Adopción y Bienestar Animal (La Perla), AMVA, Secretaria de Inclusión Social Familia y Derechos humanos, Jardín Botánico, Fundación epm, Comfama y entre diferentes estrategias y programas de la SED. A través de jornadas académicas y lúdicas, con las siguientes temáticas: sociabilización ambiental, Residuos sólidos (Rs), manejo integral de fauna silvestre, Buenas prácticas ambientales, etc. y salidas pedagógicas (La Perla, Comfama).

ED58EC	**Entidades y organizaciones asistidas técnicamente**	**Número**	**65**	**71**	**109%**

Código. Ind. SUIFP: 220100600

Descripción B/P/S: Asistir técnicamente a los Establecimientos Educativos Oficiales mediante la actualización de los Planes Escolares de Gestión del Riesgo.

Observación B/P/S: El indicador fue alcanzado durante el año 2025, evidenciando un avance significativo en la implementación de los Planes de Gestión del Riesgo actualizados. Este resultado superior a la meta se explica por el fortalecimiento del acompañamiento técnico continuo a las instituciones, que permitió acelerar la actualización de los documentos, garantizar la activación oportuna de los equipos responsables y promover la conformación y formación de brigadas. Estas acciones generaron una mayor apropiación del proceso por parte de la comunidad educativa y ampliaron la cobertura inicialmente prevista, lo que se tradujo en un incremento en la capacidad de respuesta y preparación ante situaciones de riesgo, superando así los objetivos planeados para el periodo evaluado.

ED58ED	**Establecimientos educativos apoyados para la implementación de modelos de innovación educativa**	**Número**	**7**	**12**	**171%**

Código. Ind. SUIFP: 220104700

Descripción B/P/S: Asesorar y asistir técnicamente el programa reconocimiento SER MEJOR en los Establecimientos Educativos.

Observación B/P/S: Se acompañaron 12 instituciones educativas con asesorías y asistencias técnicas del Programa de Reconocimientos Ser Mejo

ED58EE	**Entidades territoriales con seguimiento y evaluación a la gestión**	**Número**	**25**	**22**	**88%**

Código. Ind. SUIFP: 220101500

Descripción B/P/S: Realizar auditorías de otorgamiento, seguimiento y renovación en la NTC ISO 9001 o 21001 en Establecimientos Educativas Oficiales.

Observación B/P/S: Durante la vigencia 2025 se implementaron modelos de gestión bajo los estándares NTC ISO 9001 y NTC ISO 21001 en las instituciones educativas oficiales del Distrito. Inicialmente, se tenía programado el acompañamiento a 25 instituciones educativas que venían adelantando el proceso; sin embargo, las instituciones Madre María Mazzarello y María de los Ángeles Cano se retiraron del mismo. Por su parte, la Institución Educativa Lola González fue atendida mediante la modalidad de transferencia directa de recursos al establecimiento educativo. Las situaciones descritas incidieron en el cumplimiento total del indicador, afectando el logro del 100 % de la meta establecida.

Proyecto: 240059 -Desarrollo de estrategias para la promoción de factores protectores y prevención de riesgos psicosociales

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 17.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 23.921 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 23.896

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media				
ED59DA Entidades y organizaciones asistidas técnicamente	**Número**	**229**	**228**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 220100600

Descripción B/P/S: Brindar atención psicosocial a los miembros de las comunidades educativas para la prevención y creación de entornos protectores.

Observación B/P/S: Desde el Programa Escuela Entorno Protector se realizaron atenciones en el 100% de las Instituciones Educativas Oficiales (228, ya que la IE La Asunción no contó con matrícula activa para el 2025), que permitieron generar entornos protectores.

ED59DB	**Personas beneficiadas con procesos de formación informal**	**Número**	**4.000**	**115.851**	**2.896%**

Código. Ind. SUIFP: 220104900

Descripción B/P/S: Hace referencia al número de participaciones de las comunidades educativas en temáticas inherentes a la convivencia escolar, derechos humanos sexuales y reproductivos, crianza humanizada, alianza familia escuela, entre otros.

Observación B/P/S: En los procesos de formación relacionados con las temáticas de este indicador se evidenció un total de 115.851 participaciones en las acciones realizadas por los profesionales del programa con las comunidades educativas. Es necesario indicar que debido a la reestructuración realizada al programa al finalizar la vigencia 2024, se presentó un incremento de profesionales en el territorio, lo que redunda en una mayor capacidad de atender y asesorar a las instituciones educativas así como a sus comunidades educativas, por tanto, esto se refleja en el resultado de este indicador.

ED59DC	**Entidades y organizaciones asistidas técnicamente**	**Número**	**229**	**228**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 220100600

Descripción B/P/S: Brindar acompañamiento y hacer seguimiento en la implementación y fortalecimiento de los proyectos educativos que promuevan la vinculación entre la familia y la escuela.

Observación B/P/S: Desde el Programa Escuela Entorno Protector se realizó asesoría y asistencia técnica en el 100% de las Instituciones Educativas Oficiales (228, ya que la IE La Asunción no cuenta con matrícula activa para el 2025), para el fortalecimiento de los proyectos transversales obligatorios, entre ellos el Proyecto Familia Escuela.

Proyecto: 240060 -Desarrollo y fortalecimiento de las competencias acádemicas en estudiantes oficiales

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.081 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.868

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de evaluación de la calidad de la educación inicial, preescolar, básica y media					
ED60BA	**Estudiantes evaluados con pruebas de calidad educativa**	**Número**	**24.282**	**24.282**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 220107300

Descripción B/P/S: Realizar experiencias evaluativo-formativas de diagnóstico, seguimiento y validación de competencias y apoyo de pruebas oficiales para estudiantes.

Observación B/P/S: En el caso de los simulacros de validación y diagnóstico, se alcanzó el cumplimiento avanzado en los tres niveles de intervención. En el primer nivel, se garantizó la participación de 10.282 estudiantes de grado 11° en el simulacro de validación y 10.000 estudiantes de grado 10° en el simulacro diagnóstico y los 4.000 en el simulacro de seguimiento de grado 11° En el segundo nivel, correspondiente a la aplicación de las pruebas, estas fueron realizadas por la totalidad de los estudiantes mencionados, y se cuenta con los textos pedagógicos que orientan las acciones de mejora en las Instituciones Educativas. En cuanto al tercer nivel, se llevaron a cabo las etapas posteriores, que incluyen la devolución de resultados individuales y el desarrollo de jornadas de acciones de mejora con los estudiantes en sus respectivos establecimientos educativos.

ED60BB	**Docentes y agentes educativos de educación inicial, preescolar, básica y media beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades**	**Número**	**1.533**	**1.533**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 220107400

Descripción B/P/S: Realizar jornadas de mejora continua y evaluación por competencias para la preparación de los docentes en pruebas estandarizadas.

Observación B/P/S: El indicador responde a los 1.095 docentes convocados a las sesiones de acciones de mejora, dirigidas a los grados 3°, 5° y para aquellos de 10° y 11°, en las áreas de Matemáticas, Lectura Crítica e Inglés. Dichas sesiones se llevaron a cabo los días 26 y 28 de junio de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., y el 30 de junio de 8:00 a.m. a 12:00 m. en ITM Fraternidad. Además, a 170 atendidos, en la jornada de Experiencias Significativas desde una Educación Centrada en Competencias – Docentes de Ciencias Naturales del 2 de julio en Colmayor y a los 268 directivos docentes que participación del encuentro de socialización de la Estrategia a Inicios de año.

ED60BC	**Estudiantes vinculados a procesos de orientación vocacional**	**Número**	**54.000**	**54.592**	**101%**

Código. Ind. SUIFP: 220106600

Descripción B/P/S: Brindar procesos formativos para orientar vocacionalmente a estudiantes de educación básica y media.

Observación B/P/S: En el marco de la orientación vocacional, 6.997 estudiantes contaron con material premarcado en las instituciones, realizando la prueba TOVO en el mes de octubre. Estudiantes con experiencias de aprendizaje y orientación vocacional territorial, en total 1.478 consolidados; con experiencias CTeI 773 participantes y 592 con certificación; 1.410 participantes de Experiencia Reto y 7.760 participantes de la formación en CTeI con la Universidad de Antioquia. En cuanto al proceso de orientación vocacional, 14.209 estudiantes de grado 9° participaron de la jornada de orientación vocacional para elegir la media técnica a la cual desean ingresar en el próximo año; 10.686 estudiantes en 10° y 10.687 estudiantes en 11° participaron en los respectivos procesos de orientación vocacional gracias a su formación en Media Técnica.

Proyecto: **240066 -Fortalecimiento de la educación media de los estudiantes oficiales en el ambito de las tic y la económia digital**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 88% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 92%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 8.800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9.107 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 8.842

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
ED66BA Personas beneficiadas con procesos de formación informal	**Número**	**27.000**	**23.653**	**88%**

Código. Ind. SUIFP: 220104900

Descripción B/P/S: Se refiere al número de estudiantes matriculados en establecimientos educativos oficiales que están involucrados en programas de educación técnica a nivel medio. Estos programas están diseñados para desarrollar habilidades prácticas y competencias específicas que son relevantes para las necesidades del sector productivo.

Observación B/P/S: Un total de 23.653 estudiantes matriculados en 219 Instituciones Educativas Oficiales (IEO) recibieron formación en programas de media técnica a través de entidades como el SENA, ITM, IUPB, Colegio Mayor, Comfenalco, CESDE, UPB y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid. No obstante, el indicador no se ha cumplido en su totalidad debido a diversas contingencias, tales como problemas de infraestructura, una formalización inadecuada de la media técnica y la baja calidad de algunos programas ofrecidos por los operadores. Fuente: Anexos SIMAT.

Programa: 1.2.3 - Escuela incluyente y equitativa

Proyecto: **240055 -Desarrollo de estrategias de atención diferencial a estudiantes para un distrito inclusivo y diverso**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 23.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 23.351 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 23.291

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media				
ED55BA Establecimientos educativos oficiales con acompañamiento en el marco de las estrategias de calidad educativa	**Número**	**229**	**228**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 220100602

Descripción B/P/S: Hace referencia al número de establecimientos educativos oficiales con acompañamiento permanente (asistencia técnica, asesoría y capacitación a docentes y familias) para la implementación del enfoque de educación inclusiva en la gestión escolar para garantizar la atención diferencial a estudiantes.

Observación B/P/S: Al cierre del 31 de diciembre, 228 instituciones educativas oficiales del Distrito implementaron estrategias orientadas a la atención diferencial de los estudiantes. De las 230 instituciones oficiales, la Institución Educativa La Asunción permanece temporalmente cerrada debido a procesos de acreditación y a adecuaciones en su sede, con el propósito de garantizar la adecuada prestación del servicio educativo. Por su parte, la Institución Educativa Montecarlo no contó con un docente de apoyo pedagógico de planta ni recibió acompañamiento profesional por parte del programa U.A.I. Cabe resaltar que, a la misma fecha, 16 instituciones educativas oficiales disponen de docentes de apoyo pedagógico de planta, mientras que las restantes son atendidas mediante profesionales vinculados al programa U.A.I.

ED55BB Personas beneficiarias de estrategias de permanencia	**Número**	**14.500**	**16.644**	**115%**

Código. Ind. SUIFP: 220103300

Descripción B/P/S: Hace referencia al número de estudiantes en situación de vulnerabilidad (discapacidad, talentos y/o capacidades excepcionales, trastornos del aprendizaje y/o del comportamiento y apoyo académico especial por condición de enfermedad) matriculados en establecimientos educativos oficiales del Distrito atendidos con estrategias y apoyos especializados.

Observación B/P/S: Durante la vigencia 2025 se atendieron 16.644 estudiantes matriculados en establecimientos educativos oficiales del Distrito con: discapacidad, trastornos, capacidades y talentos excepcionales y necesidades de apoyo académico especial por condición de enfermedad. Fuente: Anexos SIMAT

ED55BC Beneficiarios atendidos con modelos educativos flexibles	**Número**	**250**	**249**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 220103000

Descripción B/P/S: Hace referencia a la población estudiantil que presenta discapacidad física, sistémica, trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual, discapacidad múltiple, discapacidad sensorial visual, discapacidad sensorial, discapacidad auditiva, discapacidad mental psicosocial, y a su vez condición de enfermedad; los cuales por su condición, no pueden asistir de manera presencial a un establecimiento educativo oficial y que son atendidos con la prestación del servicio educativo formal a través del programa educación virtual asistida en modalidad BLENDED.

Observación B/P/S: Durante la vigencia 2025 se atendieron 249 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que presentan discapacidad o condición de enfermedad; los cuales por su condición, no pueden asistir de manera presencial a un establecimiento educativo oficial y son atendidos con la prestación del servicio educativo formal a través del programa educación virtual asistida en modalidad BLENDED.

Programa: 1.2.4 - Maestro ciudadano ejemplar

Proyecto: **240057 -Desarrollo de estrategias para el bienestar docente**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.553 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.549

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Centros culturales adecuados				
ED57DA Funcionarios apoyados	**Número**	**6.500**	**6.549**	**101%**

Código. Ind. SUIFP: 459903800

Descripción B/P/S: Hace referencia al número de docentes y directivos docentes que participan, al menos una vez, en programas de bienestar laboral. Estos programas deberán incluir actividades y servicios diseñados para mejorar la calidad de vida, la salud física y mental, el equilibrio trabajo-vida personal y el ambiente de trabajo del personal educativo; además, debe pretender la satisfacción de las necesidades de los servidores docentes y directivos docentes, concebidas en forma integral en sus aspectos: biológico, psicosocial, espiritual y cultural, dando prioridad a las necesidades de subsistencia y jerarquizando las necesidades de superación

Observación B/P/S: Durante el año 2025 se evidenció una participación creciente de docentes y directivos docentes en los programas de bienestar laboral, alcanzando un total de 6.549 participantes en diversas actividades, entre las que se destacan la asistencia técnica al COPASST, el acompañamiento a recomendaciones médico-laborales, la conmemoración del Día del Servidor Público, los procesos de inducción y reinducción, así como la realización de momentos de bienestar institucional, entre otras acciones. Este comportamiento positivo se explica por la continuidad en la implementación de las estrategias del programa, así como por el fortalecimiento de los mecanismos de divulgación, acceso y ampliación de la cobertura, lo cual ha contribuido a una mayor apropiación y participación por parte de los docentes y directivos.

ED57DB Personas capacitadas	**Número**	**2.800**	**3.832**	**137%**

Código. Ind. SUIFP: 459903000

Descripción B/P/S: Da cuenta del número de docentes y directivos docentes beneficiados con acciones para el mejoramiento de su salud mental. Estas acciones pueden incluir programas de apoyo psicológico, talleres de manejo del estrés, yoga, danza, pintura, salud emocional, actividades de bienestar emocional, promoción de hábitos de vida saludables e intervenciones para la prevención del burnout, con el fin de reducir el estrés, prevenir el agotamiento profesional y mejorar el entorno educativo en el Distrito, asegurando una educación de calidad y un ambiente laboral saludable.

Observación B/P/S: Para la vigencia 2025, el indicador de salud mental alcanzó un logro de 3.832 docentes y directivos docentes beneficiados a través de actividades orientadas al fortalecimiento de la salud mental, tales como momentos de bienestar institucional, acciones de mejoramiento del clima laboral, estrategias dirigidas a docentes prejubilados, entre otras. El sobrecumplimiento del indicador se explica por la implementación progresiva y sostenida de acciones enfocadas en la promoción, prevención y atención en salud mental, así como por la alta demanda y favorable acogida de las estrategias desarrolladas por parte de la comunidad educativa.

Proyecto: **240063 -Formación continua de maestros, directivos y agentes educativos desde la propuesta pedagógica de mova**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.230 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.080

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Servicio de educación informal

ED63BA	**Personas beneficiadas con procesos de formación informal**	**Número**	**2.500**	**2.982**	**119%**

Código. Ind. SUIFP: 220104900

Descripción B/P/S: Mide el desarrollo profesional y la actualización continua de los docentes, directivos docentes y agentes educativos a través de su participación en programas de formación continua superiores a 12 horas, con el fin de mejorar la calidad educativa, impulsar la innovación pedagógica, y fortalecer la capacidad de gestión y liderazgo en los establecimientos educativos oficiales del Distrito.

Observación B/P/S: Durante el 2025, se formaron 2.982 docentes, directivos docentes y agentes educativos participantes en procesos de formación de más de12 horas. Estas formaciones se desarrollaron en el marco de los procesos contractuales orientados a la implementación de los Programas de Formación de: Rectores Líderes Transformadores (RLT), Modelo Primed, las líneas de investigación educativa y reflexión metodológica. Todas estas acciones incidieron en el sobrecumplimiento del indicador y se enmarcan en la Política Pública de Formación de Maestros establecida mediante el Acuerdo 019 de 2015.

ED63BB	**Docentes y agentes educativos de educación inicial, preescolar, básica y media beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades**	**Número**	**60**	**60**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 220107400

Descripción B/P/S: Da cuenta del número de docentes y directivos docentes beneficiados con procesos de formación posgradual (becas) en estudios de maestría y doctorado que estén validados en Colombia, con el fin de mejorar la calidad de la educación en el Distrito, impulsar la innovación pedagógica y fortalecer las capacidades de liderazgo y gestión educativa en las instituciones.

Observación B/P/S: Se reportan 60 docentes y directivos docentes beneficiados con formación posgradual (becas).

Programa: 1.2.5 - Escuela inteligente: Ambientes inspiradores para el aprendizaje

Proyecto: 200401 -Mantenimiento y adecuación de establecimientos educativos oficiales

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 72% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 86%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 683 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 492

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Infraestructura educativa mantenida					
ED01AB	**Sedes mantenidas**	**Número**	**21**	**28**	**133%**

Código. Ind. SUIFP: 220106200

Descripción B/P/S: Se pretende realizar intervención en mantenimiento de establecimientos educativos oficiales.

Observación B/P/S: Con corte al 31 de diciembre de 2025, se reporta la entrega a satisfacción de 28 establecimientos educativos intervenidos en el marco del contrato interadministrativo N° 4600095806 de 2022. Las intervenciones fueron ejecutadas durante la vigencia 2024 y los establecimientos fueron entregados a la comunidad educativa en la vigencia 2025. El sobrecumplimiento del indicador obedece a las eficiencias obtenidas en la ejecución del contrato.

Proyecto: 240019 -Construcción ,mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura educativa de la ciudad medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 330.314 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 342.515 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 335.053

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Infraestructura educativa mejorada					
ED19AB	**Sedes educativas mejoradas**	**Número**	**58**	**67**	**116%**

Código. Ind. SUIFP: 220105200

Descripción B/P/S: Realizar el mejoramiento de infraestructura física a cargo de la Secretaría de Educación.

Observación B/P/S: A través de la ejecución del contrato interadministrativo N° 4600095806 de 2022, se logró realizar intervenciones de mejoramiento en 67 sedes educativas durante la vigencia 2025. El sobrecumplimiento del indicador obedece a las eficiencias obtenidas en la ejecución del contrato.

ED19AC Estudios y diseños de infraestructura educativa elaborados | **Número** | **3** | **3** | **100%**

Código. Ind. SUIFP: 220103900

Descripción B/P/S: Realizar el mejoramiento de infraestructura física a cargo de la Secretaría de Educación.

Observación B/P/S: Con corte al 31 de diciembre de 2025, se reporta la finalización de los estudios y diseños de 3 sedes educativas correspondientes a proyectos de megacolegios, dando cumplimiento a la meta establecida para el indicador. Este resultado se alcanzó en el marco del contrato interadministrativo N° 4600102588 de 2024, mediante el cual se adelantó la elaboración de estudios, diseños y los respectivos procesos de licenciamiento para las sedes educativas Conrado González Mejía, Hernán Toro Agudelo y Municipal San Javier.

ED19AD Sedes mantenidas | **Número** | **60** | **70** | **117%**

Código. Ind. SUIFP: 220106200

Descripción B/P/S: Realizar mantenimiento de obras físicas de la infraestructura educativa a cargo de la Secretaría de Educación.

Observación B/P/S: Al cierre de la vigencia 2025, se informa que la atención de los establecimientos educativos se ejecutó mediante la adición al contrato interadministrativo N° 4600095806 de 2022, a través de la cual se realizó la entrega a satisfacción de 70 sedes educativas mantenidas durante la presente vigencia. El sobrecumplimiento del indicador obedece a las eficiencias obtenidas en la ejecución del contrato.

Proyecto: 240052 -Consolidación del ecosistema digital educativo

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 76% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 88%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 28.099 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 26.566 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 20.132

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios tecnológicos				
ED52BA Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	**Porcentaje**	**100**	**100**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459900700

Descripción B/P/S: Brindar soporte a la infraestructura tecnológica de los establecimientos educativos oficiales, mediante la prestación del servicio de conectividad, licenciamientos básicos y especializados y mejoramiento de la infraestructura de red.

Observación B/P/S: Con corte al 31 de diciembre, se brindó soporte a la infraestructura tecnológica del 100% de las sedes educativas oficiales a través de la prestación del servicio de conectividad, licenciamientos básicos y especializados y mejoramiento de la infraestructura de red.

ED52BB Sistemas de información implementados | **Número** | **2** | **2** | **100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Implementar formación y apropiación en herramientas digitales para la comunidad educativa.

Observación B/P/S: Con corte al 31 de diciembre de 2025, se da cumplimiento a la meta del indicador prevista para la vigencia, mediante la implementación del Megaportal Educativo, en el marco del Ecosistema Digital Educativo, el cual incorpora procesos de mentoría virtual y presencial, conforme a la ejecución del contrato N.° 4600105621. Adicionalmente, desde el Laboratorio de Innovación se desarrolló el sistema de información de gestión educativa PERSEO, en ejecución del contrato N.° 4600104165.

Proyecto: 240061 -Dotación de ambientes inspiradores para el aprendizaje

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 67% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 83%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 57.701 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 52.735 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 35.253

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Infraestructura educativa dotada				
ED61BA Sedes dotadas	**Número**	**133**	**137**	**103%**

Código. Ind. SUIFP: 220106900

Descripción B/P/S: Hace referencia al número de sedes educativas oficiales dotadas con: dotación básica escolar de mobiliario, material didáctico – pedagógico, implementos básicos para funcionamiento y dispositivos electrónicos en el marco de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional

Observación B/P/S: Durante la vigencia 2025 se cumple la meta del indicador, mediante la dotación integral de 137 sedes educativas del Distrito. Las entregas se realizaron de acuerdo con las necesidades identificadas en cada sede e incluyeron elementos para aulas de clase, oficinas administrativas, bibliotecas, aulas de sistemas, menaje, equipos de restaurante y mobiliario para restaurantes y comedores escolares, contribuyendo al fortalecimiento de ambientes educativos adecuados y funcionales para los niños, niñas y jóvenes, así como para la comunidad educativa en general.

Programa: 1.2.8 - Distrito bilingüe

Proyecto: **240067 -Fortalecimiento de la enseñanza del inglés para estudiantes y docentes oficiales**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 92% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.170 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.989

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio educativos de promoción del bilingüismo					
ED67EA	Estudiantes beneficiados con estrategias de promoción del bilingüismo	Número	8.330	9.598	115%

Código. Ind. SUIFP: 220103400

Descripción B/P/S: Hace referencia al número de estudiantes de establecimientos educativos oficiales sensibilizados y fortalecidos en el aprendizaje del idioma extranjero, mediante la implementación de talleres de inmersión, campamentos, clubes de conversación, proyectos lingüísticos, cursos de formación con recursos y aplicativos digitales y programas de cualificación en el idioma.

Observación B/P/S: Durante la vigencia 2025 se brindó formación a 9.598 estudiantes en el marco de los contratos suscritos con la UDEA y el ITM cuyo objeto era fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en lenguas extranjeras dirigidos a estudiantes de los Establecimientos Educativos Oficiales del Distrito. El sobrecumplimiento del indicador obedece a la alta demanda de los estudiantes en los procesos de aprendizaje.

ED67EB	Docentes beneficiados con estrategias de promoción del bilingüismo	Número	486	587	121%

Código. Ind. SUIFP: 220106000

Descripción B/P/S: Hace referencia al número de docentes y directivos docentes de establecimientos educativos oficiales beneficiados con estrategias metodológicas y didácticas para la enseñanza del idioma extranjero y segunda lengua, proyectadas desde la capacitación en el uso de plataformas digitales y la cualificación para fortalecer la suficiencia en el idioma a través de cursos cortos, foros, congresos, inmersiones, acompañamiento técnico y talleres.

Observación B/P/S: Durante la vigencia 2025 se brindó formación a 587 docentes y directivos docentes en el marco de los contratos suscritos con la UDEA y el ITM cuyo objeto era fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en lenguas extranjeras dirigidos a docentes y directivos de los Establecimientos Educativos Oficiales del Distrito.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico

Componente: 1.2 - Educación para el progreso social

Programa: 1.2.1 - Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria

Proyecto: **250027 -25pp99-formación en habilidades digitales a estudiantes de establecimientos educativos oficiales medellin**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 219 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 219

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
ED27AC Personas beneficiadas con procesos de formación informal	**Número**	**55**	**720**	**1.309%**

Código. Ind. SUIFP: 220104900

Descripción B/P/S: Brindar formación en habilidades digitales a estudiantes de los establecimientos educativos oficiales de las comunas 5, 9 y 90, mediante formación en el Vivero del Software. Con este proceso, se busca promover la educación digital en el distrito.

Observación B/P/S: El proyecto culminó con la formación de 720 personas en procesos relacionados con el desarrollo de habilidades digitales. Inicialmente, se había proyectado un proceso formativo para 55 estudiantes, ya que se partió de una propuesta presentada por un operador diferente. Sin embargo, la Fundación Marina Orth presentó a la Secretaría una propuesta formativa intensiva que permitió ampliar la cobertura y atender a un mayor número de estudiantes y docentes. Gracias a ello, en el mes de octubre se llevó a cabo el Bootcamp de Habilidades Digitales, logrando así un impacto significativamente superior al esperado.

Proyecto: 250029 -25pp70-apoyo transporte escolar comuna 70

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 97% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 886 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 886

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar				
ED29AI Beneficiarios de transporte escolar	**Número**	**1.100**	**1.070**	**97%**

Código. Ind. SUIFP: 220102900

Descripción B/P/S: Ofrecer a los estudiantes del corregimiento de Altavista, servicio de transporte escolar incentivando su permanencia en el sistema educativo.

Observación B/P/S: Durante la vigencia 2025 se beneficiaron en total 1.070 estudiantes con el servicio del transporte escolar mediante recarga de tarjeta cívica. Es de anotar que de acuerdo a las dinámicas de los procesos de matrícula, se incrementa o reduce el número de estudiantes beneficiarios por mes.

Programa: 1.2.2 - Calidad y pertinencia desde preescolar hasta postsecundaria

Proyecto: 250028 -25pp99-fortalecimie de la escuela entorno protector medellin

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 785 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 785

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Alumnos Atendidos				
ED28AN Alumnos atendidos	**Número**	**19.555**	**30.079**	**154%**

Código. Ind. SUIFP: 220108600

Descripción B/P/S: Acompañar a las instituciones educativas de las comunas 8 y 9 en la transformación de la escuela en entorno protector. Desde los mecanismos de prevención, promoción, atención y seguimiento contribuyendo al mejoramiento de los ambientes de aprendizaje, al buen vivir en la escuela y a la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una comunidad protectora.

Observación B/P/S: Se brindó acompañamiento a 30.079 estudiantes de las instituciones educativas oficiales de las comunas 8 y 9 en la transformación de la escuela en entorno protector. El incremento del indicador obedece a las fluctuaciones de la matricula de las comunas beneficiadas.

Proyecto: 250030 -25pp03-implementación de la feria de servicios educativos para los estudiantes de establecimientos oficiales medellin

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 96% **Ejec. Financiera :** 95% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 95%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 600 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 570

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
ED30AM Personas beneficiadas con procesos de formación informal	**Número**	**1.371**	**1.311**	**96%**

Código. Ind. SUIFP: 220104900

Descripción B/P/S: Proporcionar a los estudiantes de la comuna 3, la orientación y las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas sobre su futuro académico, a través de la realización de la feria de oferta de servicios educativos.

Observación B/P/S: Se brindó orientación vocacional a 1.311 estudiantes de grado décimo (10) de las instituciones educativas oficiales de la comuna 3 para la construcción de su proyecto de vida, brindando herramientas que desarrollen fortalezas claves para la construcción de este como hilo conductor y como eje estructurador de los procesos de formación profesional, de emprendimiento y de productividad.

Programa: 1.2.5 - Escuela inteligente: Ambientes inspiradores para el aprendizaje

Proyecto: **230010 -24pp99-fortalecimiento de los procesos de media técnica**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.215 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.215

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados				
ED10AA Ambientes de aprendizaje dotados	**Número**	**20**	**20**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 220107000

Descripción B/P/S: Dotar con material tecnológico las IEO para el desarrollo de la media técnica de los estudiantes de las comunas 3, 7 y 9.

Observación B/P/S: Los computadores fueron adquiridos por la Secretaría para las instituciones educativas de las comunas 3,7 y 9.

Proyecto: **240001 -24pp2-suministro de computadores a las instituciones educativas oficiales**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.254 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.254

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Infraestructura educativa dotada				
ED01AD Sedes dotadas	**Número**	**12**	**12**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 220106900

Descripción B/P/S: Suministrar equipos de computo a las instituciones educativas oficiales de la comuna 2.

Observación B/P/S: Los computadores fueron adquiridos por la Secretaría para las sedes educativas de la comuna 2.

Proyecto: **250026 -25pp99-fortalecimien de los procesos de media tecnica medellín**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.247 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.247

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados

ED26AF	**Ambientes de aprendizaje dotados**	**Número**	**31**	**31**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 220107000

Descripción B/P/S: Dotar con material didáctico, pedagógico, tecnológico o de mobiliario en espacios estructurados para el aprendizaje significativo a los estudiantes de las comunas 3, 8 Y 9.

Observación B/P/S: Las transferencias se hicieron efectivas en la segunda semana de agosto. Por su parte los rectores de las instituciones beneficiadas realizaron las compras de las dotaciones para sus respectivas Medias técnicas.

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto:	**200395**	**-Prestación del servicio educativo por cobertura**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 144	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 132	
Proyecto:	**200396**	**-Fortalecimiento de las estrategias de permanencia en el sistema escolar**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 5.645	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 5.645	
Proyecto:	**200409**	**-Fortalecimiento institucional para la gestión educativa**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 2.583	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 2.570	
Proyecto:	**200441**	**-Asistencia administrativa y operativa de las instituciones educativas oficiales**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 3.600	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 3.463	
Proyecto:	**200442**	**-Administración del pago de servicios públicos de establecimientos educativos oficiales**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 24	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0	
Proyecto:	**200350**	**-Implementación de la prueba estandarizada medellín 4.0**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 42	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0	
Proyecto:	**200385**	**-Implementación de eventos ser+stem para la cuarta revolución industrial**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 11	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0	
Proyecto:	**200387**	**-Formación cualificada de maestros, directivos y agentes educativos**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 232	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 232	
Proyecto:	**200408**	**-Implementación de estrategias de bienestar a docentes y directivos docentes**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 254	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0	
Proyecto:	**200399**	**-Fortalecimiento tecnológico, soporte y conectividad de las sedes educativas oficiales**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 2.070	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 2.070	
Proyecto:	**200400**	**-Dotación de ambientes institucionales de aprendizaje en los establecimientos educativos oficiales**					

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 2.021	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 2.021

5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Proyecto: 130619 -Mcv-campus universitario sapiencia (itm,pascual bravo, colegio mayor)

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 1.873	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 85

Proyecto: 130620 -Mcv-universidad virtual @medellin


Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 405	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 44


Proyecto: 130658 -Mcv-centro de formación e innovación para el maestro

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 306	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 248


Secretaría de Participación Ciudadana


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2025

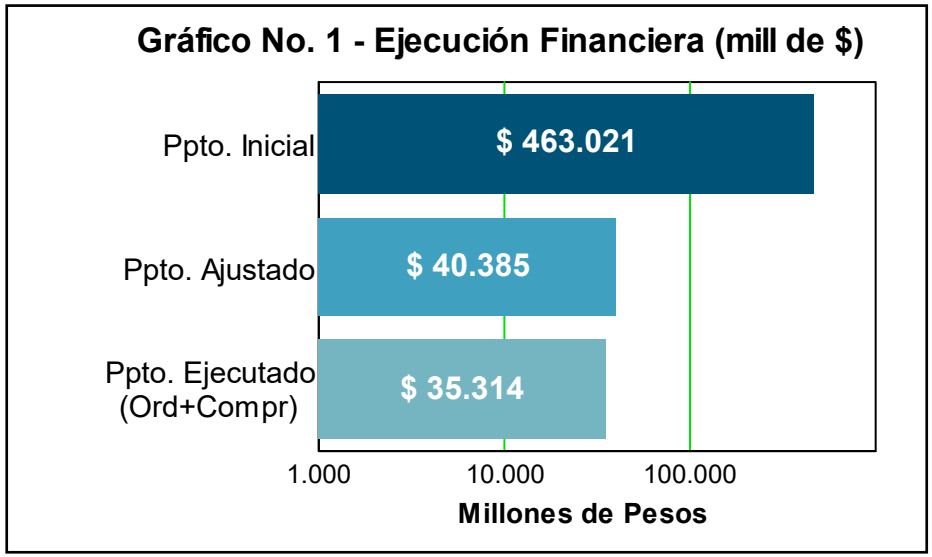


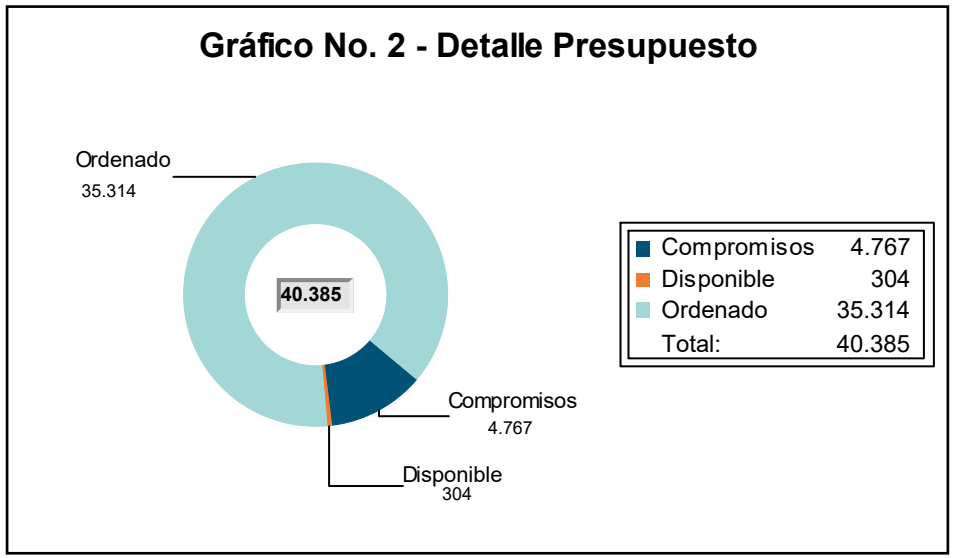

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre de 2025 comprende pagos y facturas

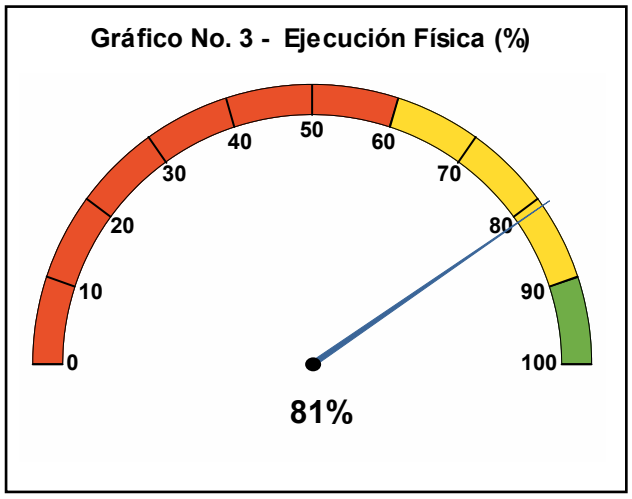

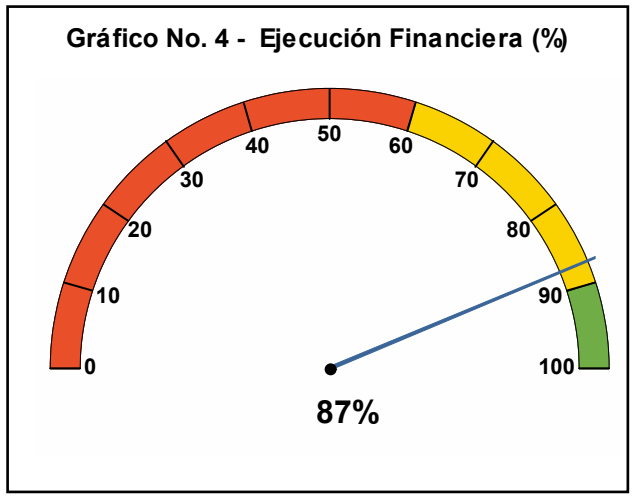

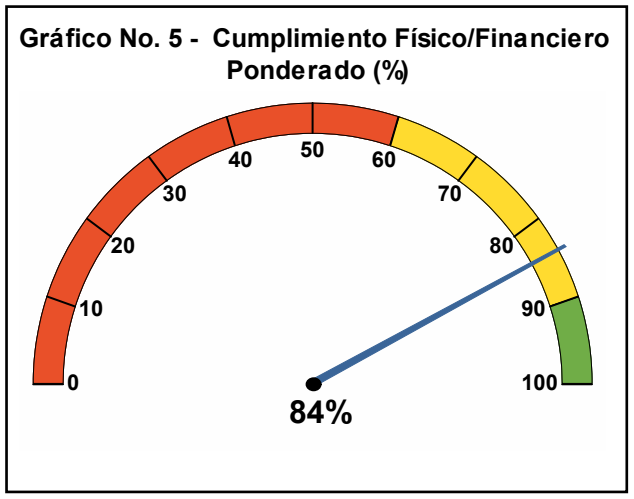

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.2 - Participación ciudadana y control social
Programa: 3.2.1 - Promoción y garantía del derecho a la participación ciudadana incidente

Proyecto: **240183 -Apoyo técnico a nuevas expresiones ciudadanas, agendas y repertorios de participación**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 96% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 372 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 327 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 314

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
PC83BA Personas capacitadas	**Número**	**60**	**72**	**120%**

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Mujeres formadas a través de la Estrategia Creemos en las Mujeres Lideresas, orientada al fortalecimiento de sus capacidades de liderazgo, participación e incidencia en los espacios y procesos de participación ciudadana.

Observación B/P/S: A través del contrato interadministrativo No. 4600105013 con la Universidad de Antioquia, se formaron 72 mujeres mediante el Colaboratorio para la Participación y la Incidencia Política de las Mujeres Lideresas, superando la meta en 12 participantes

PC83CA Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas	**Número**	**2**	**2**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450203800

Descripción B/P/S: Acciones desarrolladas para promover la garantía de derechos, a través de procesos de sensibilización en enfoque de género y la socialización del Protocolo de atención y prevención de la violencia política en razón del género, orientadas al reconocimiento, prevención y atención de estas situaciones en los escenarios de participación ciudadana.

Observación B/P/S: El logro da cuenta de la implementación de las estrategias de sensibilización en enfoque de género y la socialización del protocolo de atención y prevención de la violencia política en razón del género.

PC83DA Espacios de participación promovidos	**Número**	**3**	**3**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Corresponde a los espacios impulsados para fortalecer la participación ciudadana y la incidencia social, a través de intercambios de experiencias, foros sobre agendas ciudadanas y ferias realizadas anualmente en el marco de la Estrategia Nuevas Ciudadanías, como escenarios de diálogo, articulación y construcción colectiva.

Observación B/P/S: Para la vigencia se realizaron dos intercambios de experiencias, en el marco de la semana de la participación se realizó la feria de las nuevas ciudadanías (organizaciones) y el foro de agendas ciudadanas.

Proyecto: **240186 -Control social a la gestión pública en el territorio**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 487 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 482

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción a la participación ciudadana				
PC86CA Espacios de participación promovidos	**Número**	**406**	**413**	**102%**

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Corresponde a las Organizaciones, Instancias, Veedurías e Instituciones participantes de la formación en Rendición de Cuentas ORSO , la elección representante Suplente Veedurías CDPC y encuentros pedagógicos en control social a la gestión pública y rendición de cuentas.

Observación B/P/S: El avance corresponde a las Organizaciones, Instancias, Veedurías e Instituciones participantes de la formación en Rendición de Cuentas ORSO Comuna 6, la elección representante Suplente Veedurías CDPC y encuentros pedagógicos en control social a la gestión pública y rendición de cuentas.

PC86DA	**Personas capacitadas**	**Número**	**7.790**	**7.800**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas participantes de la formación en Rendición de Cuentas ORSO, la elección representante Suplente Veedurías CDPC y encuentros pedagógicos en control social a la gestión pública y rendición de cuentas.

Observación B/P/S: El avance corresponde a las personas participantes de la formación en Rendición de Cuentas ORSO Comuna 6, la elección representante Suplente Veedurías CDPC y encuentros pedagógicos en control social a la gestión pública y rendición de cuentas.

Proyecto: 240187 -Desarrollo de estrategias de formación ciudadana de participación incidente

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 98% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.725 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.691 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.646

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal					
PC87BA	**Personas capacitadas**	**Número**	**3.080**	**2.981**	**97%**

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas capacitadas mediante las estrategias formativas de Nada de Nervios y del Centro de Orientación Pedagógica (COP)

Observación B/P/S: El reporte corresponde a las personas capacitadas mediante las siguientes estrategias formativas: Pedagogía PP: 104, Nada de nervios: 2385 y COP: 492

PC87CA	**Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas**	**Número**	**35**	**35**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: Corresponde a las asesorías realizadas desde la estrategia del Centro de Orientación Pedagógica (COP)

Observación B/P/S: El reporte corresponde a 35 asesorías realizadas desde la estrategia del Centro de Orientación Pedagógica (COP)

Proyecto: 240189 -Implementación de estrategias de gestión del conocimiento e información en participación

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 410 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 396 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 389

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de investigación					
PC89CA	**Documentos de investigación elaborados**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450203000

Descripción B/P/S: Se corresponde con documento investigación sobre las prácticas de participación de las mujeres en los procesos de planeación participativa. Construcción de un artículo basado en ejercicios de investigación colaborativa.

Observación B/P/S: El avance corresponde al desarrollo de la fase de planeación, ajuste de formularios y al diseño muestral detallado y documentado.

PC89DA	**Espacios de participación promovidos**	**Número**	**20**	**25**	**125%**

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Corresponde a la realización de espacios de participación desde territorios vibrantes (Encuentros Territoriales y REDINT) y espacios de difusión y apropiación del IPCM.

Observación B/P/S: El avance reportado contempla el desarrollo de estrategias de apropiación del índice de participación ciudadana, a través de actividades de acercamiento y abordaje de datos de interés según grupo de valor. Dada la coyuntura de la aplicación de encuestas para la quinta medición, se acordó con el Equipo de Apoyos las Juntas Administradoras Locales realizar encuentros con cada una de las JAL para abordar los resultados del IPCM y motivar el diligenciamiento de la quinta medición, lo que posibilitó realizar 18 actividades con miembros de las JAL que no estaban contempladas. Como consecuencia, el indicador presentó una variación positiva superior a la meta proyectada para el periodo, resultado coherente con la necesidad institucional de asegurar la calidad, cobertura y participación efectiva en la medición del IPCM.

Proyecto: 240190 Implementación de la política pública y sistema distrital de participación

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 851 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 720 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 706

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción a la participación ciudadana				
PC90CA Espacios de participación promovidos	**Número**	**4**	**4**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: El valor estadístico se mide con las siguientes acciones: 1 Desarrollo e implementación de la estrategia de socialización y apropiación de la Política Pública de Participación Ciudadana (PPPC), tanto a nivel interno como territorial. 1 Implementación de los instrumentos del MISE-PC para el seguimiento a los indicadores de producto y de resultado, incluyendo la elaboración de reportes e informes técnicos. 1 Acompañamiento y fortalecimiento al Consejo Distrital de Participación Ciudadana (CDPC) como instancia asesora del Sistema de Participación. 1 Desarrollo de los escenarios de seguimiento y evaluación de la Política Pública de Participación Ciudadana, en el marco del MISE-PC.

Observación B/P/S: En la implementación de la PPPC – Estrategia territorial (socialización y apropiación) se participó en el evento Medellín para todas, orientado a la socialización y fortalecimiento territorial. En el marco del MISE-PC, se realizó acompañamiento técnico a las dependencias corresponsables y se elaboró el informe del primer semestre sobre los resultados de la implementación de la Política Pública. Respecto a la implementación del SDPC, se llevaron a cabo las sesiones ordinarias del CDPC entre enero y octubre, se realizó la reunión del Centro de Pensamiento Estratégico y se avanzó en la actualización del mapa de actores. Así mismo, se desarrollaron 21 encuentros en el marco de los SLPC. En relación con la Semana de la Participación, se avanzó en la planeación y coordinación de los eventos programados para su realización, se ejecutaron acciones orientadas a la identificación, sistematización y visibilizarían de buenas prácticas de innovación para la participación ciudadana.

PC90DA Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	**Número**	**23**	**25**	**109%**

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: Corresponde a las instancias de participación ciudadana que, durante la vigencia, reciben asistencia técnica y acompañamiento institucional para el fortalecimiento de su funcionamiento, la mejora de sus capacidades para la incidencia y el ejercicio efectivo de sus roles en el marco del Sistema Distrital de Participación Ciudadana.

Observación B/P/S: Se brindó asistencia a las instancias de participación, como resultado de este acompañamiento, se entregó a cada una un plan de mejoramiento construido de manera conjunta, con el fin de que dicho plan fuera incorporado en sus planes de trabajo para abordar las debilidades identificadas y potenciar sus capacidades.

PC90EA Personas capacitadas	**Número**	**30**	**30**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas que participan en las estrategias formativas desarrolladas por el Consejo Distrital de Participación Ciudadana (CDPC), orientadas al fortalecimiento de conocimientos, habilidades y capacidades para el ejercicio de sus funciones de ley como principal instancia de participación Ciudadana.

Observación B/P/S: Se culminó el proceso formativo realizado en articulación con la Universidad de Antioquia, mediante seis sesiones orientadas al desarrollo de los objetivos del CDPC y al fortalecimiento de las competencias en incidencia y participación ciudadana donde se certificaron 25 personas. Adicionalmente, durante el mes de octubre se formaron cinco personas mas que no hicieron parte del primer proceso formativo.

Proyecto: 240191 Innovación pública y social en la transformación territorial

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 360 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 314 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 311

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción a la participación ciudadana				
PC91BA Espacios de participación promovidos	**Número**	**54**	**55**	**102%**

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Corresponde a la implementación de laboratorios de con-creación ciudadana con organizaciones y colectivos sociales y, a laboratorios para ideación y prototipado en el abordaje de retos estratégicos.

Observación B/P/S: El reporte corresponde a la realización de laboratorios en el reto de ciudad 2025. A través de este proceso se desarrollaron 2 sesiones de ideación y 4 de prototipado, con 4 grupos conformados para el desarrollo de las ideas seleccionadas, alcanzando un total de 12 laboratorios ejecutados.

PC91CA Personas capacitadas	**Número**	**50**	**50**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Se relaciona con encuentros pedagógicos relacionados con la innovación social, pública y democrática con diferentes grupos de valor.

Observación B/P/S: Corresponde a las personas participantes en el proceso de acompañamiento y formación de la alianza con UPB a MUSAS y a las personas capacitadas mediante Red de Investigadores Territoriales- REDINT

Programa: 3.2.2 - Organizaciones sociales y comunales motores de la democracia participativa local

Proyecto: **240182 -Apoyo integral a las organizaciones y redes sociales**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.867 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.017 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.997

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción a la participación ciudadana				
PC82BA Espacios de participación promovidos	**Número**	**16**	**17**	**106%**

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: El valor planeado corresponde a la asistencia integral que se brindará a 16 redes de organizaciones sociales para fortalecer sus capacidades internas y promover su reconocimiento en espacios estratégicos, fomentando su sostenibilidad y articulación con actores clave del territorio.

Observación B/P/S: El valor reportado corresponde a la asistencia integral brindada a 17 redes de organizaciones sociales para fortalecer sus capacidades internas y promover su reconocimiento en espacios estratégicos, fomentando su sostenibilidad y articulación con actores clave del territorio.

PC82CA Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	**Número**	**250**	**253**	**101%**

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: El valor estadístico planeado corresponde al número de organizaciones sociales caracterizadas o actualizadas en la plataforma ARCO, asesoradas, visibilizadas y capacitadas en diferentes temáticas, de acuerdo a sus necesidades, para el fortalecimiento de sus capacidades organizativas y de gestión.

Observación B/P/S: El valor estadístico reportado corresponde al número de organizaciones sociales caracterizadas o actualizadas en la plataforma ARCO, asesoradas, visibilizadas y capacitadas en diferentes temáticas, de acuerdo a sus necesidades, para el fortalecimiento de sus capacidades organizativas y de gestión.

PC82DA Sistemas de información actualizados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450201700

Descripción B/P/S: El valor estadístico planeado corresponde al mantenimiento y uso del sistema de información ARCO en cada período, para gestionar el registro, la caracterización, información y trámites de las organizaciones sociales.

Observación B/P/S: El avance da cuenta del mantenimiento y uso del sistema de información ARCO en cada período, para gestionar el registro, la caracterización, información y trámites de las organizaciones sociales.

Proyecto: **240188 -Fortalecimiento de la gestión de los organismos de acción comunal en el territorio**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 88% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 94%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.679 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.615 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.289

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
PC88BA Personas capacitadas	**Número**	**1.000**	**1.000**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: El valor estadístico planeado corresponde a personas capacitadas en el marco del proyecto de fortalecimiento de los Organismos de Acción Comunal. Fortaleciendo el proceso de cualificación de líderes y miembros comunales, en áreas clave como liderazgo, gestión administrativa, resolución de conflictos, desarrollo comunitario, para lograr una mayor cohesión social, entre otros

Observación B/P/S: El avance corresponde a personas capacitadas en el marco del proyecto de fortalecimiento de los Organismos de Acción Comunal. Fortaleciendo el proceso de cualificación de líderes y miembros comunales, en áreas clave como liderazgo, gestión administrativa, resolución de conflictos, desarrollo comunitario, para lograr una mayor cohesión social.

PC88CA Espacios de participación promovidos	**Número**	**800**	**1.018**	**127%**

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: El valor estadístico planeado corresponde al número de actuaciones realizadas a los Organismos de Acción Comunal, distribuidas en procesos de vigilancia (resoluciones de personería, inscripción de dignatarios, reformas estatutarias, registros, desistimientos, asesorías, acompañamientos, capacitaciones y constancias de territorio), de inspección (auditorías e informes finales) y de control (actos administrativos e informes finales).

Observación B/P/S: El logro da cuenta del número de actuaciones realizadas a los Organismos de Acción Comunal, distribuidas en procesos de vigilancia (resoluciones de personería, inscripción de dignatarios, reformas estatutarias, registros, desistimientos, asesorías, acompañamientos, capacitaciones y constancias de territorio), de inspección (auditorías e informes finales) y de control (actos administrativos e informes finales). Dado que hasta el mes de septiembre había plazo para radicar estatutos actualizados por parte de los OAC, se incrementó las solicitudes y peticiones relacionadas con este requerimiento

PC88DA Sistemas de información actualizados	**Número**	**2**	**2**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450201700

Descripción B/P/S: El valor estadístico planeado corresponde al uso y actualización de la información, de dos sistemas de información: ARCO, empleado para el diagnóstico y caracterización de los Organismos de Acción Comunal, y ArcGIS, utilizado para la georreferenciación y análisis territorial de dichos organismos. Posibilitando integrar información organizativa y espacial para fortalecer la gestión comunitaria.

Observación B/P/S: El avance a la fecha de corte corresponde al uso de dos sistemas de información: ARCO, empleado para el diagnóstico y caracterización de los Organismos de Acción Comunal, y ArcGIS, utilizado para la georreferenciación y análisis territorial de dichos organismos. Posibilitando integrar información organizativa y espacial para fortalecer la gestión comunitaria.

PC88EA Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	**Número**	**125**	**125**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: El valor estadístico planeado corresponde al número de Organismos de Acción Comunal diagnosticados, que reciben asistencia técnica a través de asesorías y capacitaciones, acompañado de procesos de fomento y promoción mediante planes de acción, comodatos, articulaciones, rendición de cuentas, premios y brigadas comunales.

Observación B/P/S: El logro reportado corresponde al número de Organismos de Acción Comunal diagnosticados, que han recibido asistencia técnica a través de asesorías y capacitaciones, acompañado de procesos de fomento y promoción mediante planes de acción, comodatos, articulaciones, ejecución de presupuestos participativos, rendición de cuentas, premios y brigadas comunales.

Proyecto: 240192 -Mantenimiento de la infraestructura de espacios de participación en el territorio

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 41% **Ejec. Financiera :** 89% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 65%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.943 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.921 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.611

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Salón comunal adecuado				

PC92CA	**Salones comunales adecuados**	**Número**	**38**	**0**	**0%**

Código. Ind. SUIFP: 450200300

Descripción B/P/S: Este valor estadístico garantiza las condiciones óptimas de infraestructura para su uso; por consiguiente, se consolida contabilizando exclusivamente aquellas intervenciones en las sedes que hayan alcanzado un 100% de ejecución, asegurando así que el reporte refleje las obras de mejoramiento totalmente finalizadas y entregadas al servicio de la comunidad.

Observación B/P/S: Debido a que los recursos para los mantenimientos salieron por los proyectos 230046 y 250007, las sedes cuyo mantenimiento se encuentre al 100% serán reportadas a través de dichos proyectos.

PC92DA	**Salones comunales dotados**	**Número**	**13**	**3**	**23%**

Código. Ind. SUIFP: 450200800

Descripción B/P/S: El valor estadístico se mide con las entregas de bienes muebles a sedes realizadas mediante Acta de Entrega y Contrato de Comodato. Solo se contabiliza la sede, sin importar el número de bienes muebles entregados.

Observación B/P/S: Se realizaron 3 entregas de dotación de bienes muebles a los salones comunales, mediante los contratos de comodato CONTRATO DE COMODATO N A00143 DE 2024 y CONTRATO N A00391 DE 2025

PC92EA	**Espacios de participación promovidos**	**Número**	**202**	**202**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Los Espacios de participación promovidos se benefician y fortalecen mediante el aseguramiento de sus condiciones operativas y jurídicas, proceso que se ejecuta a través de acciones específicas como la realización de visitas de supervisión a bienes muebles e inmuebles, el pago de facturas de servicios públicos o la formalización y ampliación de contratos de comodato; por consiguiente, el valor estadístico de este indicador refleja el alcance de dicha promoción contabilizando cada sede como una unidad única.

Observación B/P/S: En el periodo de corte se promovieron espacios de participación ciudadana con la realización de visitas a 160 bienes inmuebles, seguimiento de bienes muebles de 140 contratos (únicos,), el pago de 21 facturas de servicios públicos y la ampliación de 2 comodatos de bienes inmuebles. Sin embargo, entre estos procesos y actividades se identificaron cruces (acciones a varias sedes),por lo que al depurar la información y consolidar se da un total de 196 acciones únicas. Para el mes de diciembre se espera que se llegue a la meta de 202 acciones únicas.

Programa: 3.2.3 - Transparencia y democratización de la planeación del desarrollo local y el presupuesto participativo

Proyecto: **240184 -Apoyo técnico y material a las juntas administradoras locales**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 93% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.457 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.011 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.599

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
PC84BA **Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas**	**Número**	**21**	**21**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: El valor estadístico planeado corresponde al apoyo que se brinda a las Juntas Administradoras Locales (JAL), mediante la asignación de recurso humano desde el nivel territorial y profesional, así como de apoyos técnicos y logísticos relacionados con honorarios, pólizas, servicios públicos, transporte, telefonía, dotación, entre otras acciones que aseguran su adecuado funcionamiento y desarrollo

Observación B/P/S: El logro da cuenta del apoyo brindado a las Juntas Administradoras Locales (JAL), mediante la asignación de recurso humano desde el nivel territorial y profesional, así como de apoyos técnicos y logísticos relacionados con honorarios, pólizas, servicios públicos, transporte, telefonía, dotación, entre otras acciones que aseguran su adecuado funcionamiento y desarrollo

PC84CA	**Espacios de participación promovidos**	**Número**	**21**	**21**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: El valor estadístico planeado corresponde al número de acciones de incidencia adelantadas por las 21 Juntas Administradoras Locales (JAL), las cuales se evidencian a través de la entrega de documentos de planeación, actas de definición de la necesidad, compilación de soportes del procedimiento, realización de eventos y presentación de informes ejecutivos.

Observación B/P/S: El logro corresponde al número de acciones de incidencia adelantadas por las 21 Juntas Administradoras Locales (JAL), las cuales se evidencian a través de la entrega de documentos de planeación, actas de definición de la necesidad, compilación de soportes del procedimiento, realización de eventos y presentación de informes ejecutivos. Estos avances permiten contabilizar el desarrollo integral de las acciones de incidencia y reflejan el grado de cumplimiento de las metas establecidas en el plan de acción.

Proyecto: 240185 -Consolidación del sistema de seguimiento y evaluación a la planeación del desarrollo local y presupuesto participativo

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 93% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 998 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 877 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 819

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
PC85CA Personas capacitadas	**Número**	**50**	**50**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Se capacitarán usuarios internos en seguimiento y evaluación de proyectos

Observación B/P/S: El logro da cuenta de 50 usuarios internos capacitados en seguimiento y evaluación de proyectos de presupuesto participativo.

PC85DA Espacios de participación promovidos	**Número**	**25**	**25**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Se promoverán 21 espacios de rendición de cuentas y 4 espacios de articulación con la Mesa MES.

Observación B/P/S: Se realizó el diseño la estrategia de rendición de cuentas con su plan de acción, el plan de comunicaciones y se ejecutaron 21 espacios de rendición de cuentas, uno por cada comuna y corregimiento, 4 espacios de socialización de resultados de las rendiciones de cuentas, una con la Mesa de enlace y seguimiento, otra con Organismos de control, otra con veedurías y una con el CDPC, para dar cumplimiento así a los 25 espacios.

PC85EA Sistemas de información actualizados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450201700

Descripción B/P/S: Se desarrollará un nuevo sistema de información para el seguimiento a los proyectos ejecutados con recursos de PP.

Observación B/P/S: Se logro un avance del 100% en el desarrollo del modulo de seguimiento físico y financiero de proyectos financiados con recursos del programa de PDL y PP, con el propósito de consolidar, en una única plataforma, la información relacionada con la ejecución física y presupuestal de los proyectos priorizados por la ciudadanía, garantizando trazabilidad, transparencia y eficiencia en la gestión institucional. El módulo está compuesto por tres submódulos funcionales interrelacionados —Proyectos, Administrador y Reportes— que operan sobre una base de datos unificada, permitiendo la interoperabilidad entre dependencias y la generación automatizada de reportes. Funciones principales: • Registrar información detallada de cada proyecto (código, nombre, dependencia, comuna, estado y objetivos). • Cargar y actualizar avances físicos por actividad o meta, con control de fechas y responsables. • Registrar la ejecución presupuestal por rubros, fuentes de financiación y tipo de gasto. • Generar alertas automáticas por desviaciones entre metas físicas y ejecución financiera. • Mantener el historial de modificaciones presupuestales (adiciones, reducciones, otrosí). • Consolidar la información de ejecución para su consulta en los submódulos Administrador y Reportes. Se cuenta ya con el submódulo de reportes que estaba pendiente y la landing page.

Proyecto: 240193 -Mejoramiento de la presupuestación participativa y el desarrollo local

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.215 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.577 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.433

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
PC93BA Personas capacitadas	**Número**	**1.000**	**1.232**	**123%**

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Ciudadanos capacitados en las diferentes fases de la ruta de la planeación local y el presupuesto participativo para su participación efectiva en el proceso.

Observación B/P/S: 1232 personas se capacitaron en las diferentes fases de la Ruta de la Planeación del Desarrollo Local y el Presupuesto Participativo

PC93DA	**Espacios de participación promovidos**	**Número**	**168**	**168**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Los espacios de participación se miden a través de los siguientes momentos por cada comuna y corregimiento: Instrumento anual de gestión Talleres de recolección de insumo Difusión de proyectos Promoción y movilización Jornada de priorización Acompañamiento de actores Pedagogía PP Rendición de cuentas.

Observación B/P/S: Se realizaron 168 espacios de participación alrededor de las diferentes fases de la ruta como son: Instrumento anual de gestión, recolección de insumos, difusión de proyectos, acompañamiento de actores, pedagogía pp, promoción y movilización, priorización participativa y rendición de cuentas.

PC93EA	**Procesos electorales realizados**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450202500

Descripción B/P/S: Se realizarán las votaciones para la priorización de proyectos.

Observación B/P/S: Se adelantaron los Instrumentos Anuales de Planeación - IAG, en la fase de Planeación Participativa, se realiza pedagogía en cuanto a la planeación participativa; se realizo la difusión de proyectos y la promoción y movilización, y entre los meses de agosto y septiembre se llevó a cabo la priorización participativa.

PC93FA	**Sistemas de información actualizados**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450201700

Descripción B/P/S: Se realizará la actualización del sistema para las votaciones de priorización de proyectos.

Observación B/P/S: 1. Cambios Generales en la Plataforma • Kit Visual: Se implementó un rediseño completo del kit visual de la plataforma, mejorando la experiencia de usuario y la coherencia gráfica. • Captcha: Se optimizó el sistema de toma del captcha, garantizando mayor confiabilidad y usabilidad. • Formulario de Registro: El formulario dejó de ser un único bloque y pasó a un esquema de pasos (steps), facilitando la navegación y reduciendo errores en el diligenciamiento. • Validaciones por Fecha de Nacimiento: Se agregaron controles adicionales desde la fecha de nacimiento para prevenir inconsistencias en el registro. • Integración con Registraduría: Se ajustaron los procesos de validación con la Registraduría, con el objetivo de evitar sobreconsumo de recursos y optimizar el rendimiento. • Autorización de Datos Personales: Se modificó la visualización, redacción y aceptación del consentimiento para el uso de datos personales, haciéndolo más claro para los usuarios. • Validación Biométrica: Se mejoraron las características funcionales y parámetros del sistema biométrico para aumentar la precisión en la autenticación. • Proceso OTP: Se eliminó el paso de recepción del código OTP como requisito para continuar. Ahora la validación es automática, dejando el OTP únicamente como requisito final para la terminación del registro. • Autocomplete de Campos: Se implementó autocompletado en el paso de datos sociodemográficos, reduciendo tiempos de diligenciamiento. • Visualización de Proyectos: Se mejoró la presentación de los proyectos disponibles para la votación. • Validación de Proyectos Votados: Se agregaron mecanismos de control para evitar duplicidades o inconsistencias en la selección de proyectos. • Mensaje de Éxito: Al finalizar el proceso de votación se incluyó un mensaje de confirmación y éxito. 2. Apartado de Jurados • Validación de Duplicidad de Voto: Se modificó el sistema de control para que, al ingresar el documento, se valide la duplicidad del voto antes de diligenciar toda la información. 3. Administración • Dashboards: Se actualizaron los tableros de presentación de información, ofreciendo visualizaciones más claras y dinámicas. • Tablas de Reportes: Se reemplazaron las tablas informativas de reportes por versiones más completas y organizadas. • Visualización por Día: Se ajustó la forma en que se presenta la información diaria, facilitando el análisis. • Botón de Inicio de Votaciones: Se modificó la funcionalidad y visualización del botón de inicio, haciéndolo más intuitivo. Conclusión: Las actualizaciones implementadas en Vota PP 2025 apuntan a mejorar la experiencia del usuario, optimizar la seguridad y robustecer las herramientas de administración, garantizando un sistema más eficiente, confiable y amigable.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana

Componente: 3.2 - Participación ciudadana y control social

Programa: 3.2.1 - Promoción y garantía del derecho a la participación ciudadana incidente

Proyecto: **230048 -24pp99-fortalecimiento de instancias y promoción de la participación y la movilización ciudadana.**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 3% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 51%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 421 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 12

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción a la participación ciudadana				
PC48AM Espacios de participación promovidos	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Corresponde al número de actividades a desarrollar en los territorios, donde se promueven espacios de participación a través de la comunicación, la movilización ciudadana y la articulación entre actores del desarrollo. C2(3)-3-4-5(2)-6-7-8-9-14(3)-50-60.

Observación B/P/S: Corresponde al número de actividades desarrolladas para promover espacios de participación a través de la comunicación, la movilización ciudadana y la articulación entre actores del desarrollo, en la comuna 6.

Observación Proyecto: La meta del valor estadístico corresponde al espacio promovido a través de espacios de participación y comunicación, movilización ciudadana y articulación entre actores del desarrollo de la comuna 6. Es preciso señalar, que el presupuesto del proyecto contempla además la reserva de recursos de actividades realizadas en la vigencia 2024, de las que solo se tenía pagos pendientes, los cuales estaban sujetos a la presentación de soportes, en este sentido el valor ejecutado corresponde a lo que se logró conciliar con el contratista en la ejecución presupuestal del proyecto.

Proyecto: 250008 -25pp99-consolidación de las escuelas de participación ciudadana para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 90% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 95%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.423 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.172

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal					
PC08CA	Personas capacitadas	Número	847	847	100%

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Personas que participan de los proceso formativos para la participación ciudadana y se vinculan a escenarios de participación incidente.

Observación B/P/S: Corresponde a las personas participantes en los procesos formativos para la participación priorizados PP 2024 para ejecución 2025

Programa: 3.2.2 - Organizaciones sociales y comunales motores de la democracia participativa local

Proyecto: 230046 -24pp99- fortalecimiento a organizaciones sociales, comunitarias y juntas administradoras locales

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 82% **Ejec. Financiera :** 70% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 76%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.718 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.900

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica					
PC46AH	Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	Número	93	93	100%

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: Corresponde al número de instancias asistidas y apoyadas en el marco del proceso de fortalecimiento realizado a las Juntas Administradoras Locales, Organismos comunales, Redes y organizaciones sociales.

PC46AI	Espacios de participación promovidos	Número	49,25	49,25	100%

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Corresponde al número de iniciativas realizadas por las Juntas Administradoras Locales, Organismos comunales, Redes y organizaciones sociales en el marco del proceso de fortalecimiento.

PC46AJ	Personas capacitadas	Número	469	469	100%

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Corresponde al número de personas formadas a través de procesos formativos realizados en el marco del proceso de fortalecimiento.

PC46AK	Oficinas para la atención y orientación ciudadana dotadas	Número	10,5	3	29%

Código. Ind. SUIFP: 450201500

Descripción B/P/S: Corresponde al número de sedes para la atención y orientación ciudadana dotadas con bienes muebles, según lo priorizado.

Observación B/P/S: Actualmente nos encontramos a la espera de la viabilidad técnica y administrativa de las organizaciones receptoras, para proceder con la entrega de dotación.

Proyecto: **250007 -25pp99-fortalecimien a organizaciones sociales y comunitarias medellín**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 53% **Ejec. Financiera :** 83% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 68%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9.856 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 8.193

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
PC07BA Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	**Número**	**309**	**247,76**	**80%**

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: Corresponde al número de instancias asistidas y apoyadas en el marco del proceso de fortalecimiento realizado a las Juntas Administradoras Locales, Organismos comunales, Redes y organizaciones sociales.

Observación B/P/S: El reporte corresponde al avance del proceso de fortalecimiento de las organizaciones sociales y de los Organismos comunales de las comunas priorizadas, teniendo en cuenta el desarrollo de las etapas de acompañamiento y los planes de trabajo.

PC07CA Oficinas para la atención y orientación ciudadana adecuada	**Número**	**11,5**	**3**	**26%**

Código. Ind. SUIFP: 450201000

Descripción B/P/S: Corresponde al número de oficinas para la atención y orientación ciudadana dotadas.

Observación B/P/S: El reporte corresponde al mantenimiento de 3 sedes sociales en la comuna 14: Sede Social Loba el Garabato, Sede Social Loma los Gonzales, Sede social Manila. Se encuentra en fase precontractual el mantenimiento de las 3 sedes restantes: Sede social el Compromiso y Granizal (C1) y Sede Ávila (C9)

Programa: 3.2.3 - Transparencia y democratización de la planeación del desarrollo local y el presupuesto participativo

Proyecto: **240194 -Administración de los recursos del fondo de presupuesto participativo**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 0% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 50%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 439.643 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos normativos				
PC94BA Documentos normativos realizados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450202600

Descripción B/P/S: Se elaborará resolución de traslado de recursos a cada una de las dependencias responsables de la ejecución de proyectos de PP.

Observación B/P/S: Se elaboraron once decretos de traslado de recursos a cada una de las dependencias responsables de la ejecución de proyectos de PP para el año 2025.

Observación Proyecto: La ejecución financiera registra en 0% toda vez que el recurso del proyecto se traslada a cada dependencia de acuerdo a los resultados de la jornada de priorización de proyectos

Proyecto: **250009 -25pp99-fortalecimien al plan de trabajo de las juntas administradoras locales en el territorio medellín**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 94% **Ejec. Financiera :** 92% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 93%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.227 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.124

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				

PC09BA	**Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas**	**Número**	**6**	**5,63**	**94%**

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: El avance corresponde a la fase de planeación y concertación de cronogramas y actividades previo a la ejecución, con las Juntas Administradoras Locales, para posterior revisión y aprobación de planes de trabajo y planes de acción.

Observación B/P/S: El reporte corresponde al avance de la ejecución de los planes de trabajo de las 6 JAL de cada una de las comunas priorizadas.

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto:	**200086**	**-Diseño e implementación de un modelo de innovación social colaborativo para la participación**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 41	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0	
Proyecto:	**200247**	**-Consolidación escuela de formación para la participación democrática**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 31	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 13	
Proyecto:	**200255**	**-Fortalecimiento de las alianzas estratégicas y el sistema de información y gestión del conocimiento para la participación**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 13	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0	
Proyecto:	**200257**	**-Fortalecimiento de nuevas expresiones ciudadanas para la participación**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 1	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 1	
Proyecto:	**200260**	**-Fortalecimiento de los grupos de valor para el control social y la gestión transparente**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 37	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 2	
Proyecto:	**200261**	**-Formulación e implementación de la política pública de participación ciudadana**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 1	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0	
Proyecto:	**200262**	**-Protección y promoción del derecho a la participación ciudadana y la movilización social**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 9	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 8	
Proyecto:	**230047**	**-24pp99-consolidación de las escuelas de participación ciudadana para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 109	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 60	
Proyecto:	**200251**	**-Asistencia técnica y acompañamiento a organizaciones y redes sociales**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 2	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0	
Proyecto:	**200252**	**-Mejoramiento de la infraestructura de innovación social – centros de participación zonal**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 103	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 39	
Proyecto:	**200254**	**-Mejoramiento de los organismos de acción comunal-líderes del desarrollo barrial**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 95	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 30	

Proyecto: **200258 -Asistencia técnica y material a las juntas administradoras locales**


Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 192 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 83


Proyecto: **200259 -Fortalecimiento de la gestión del presupuesto participativo**


Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 154 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 83


Secretaría de Cultura Ciudadana


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2025

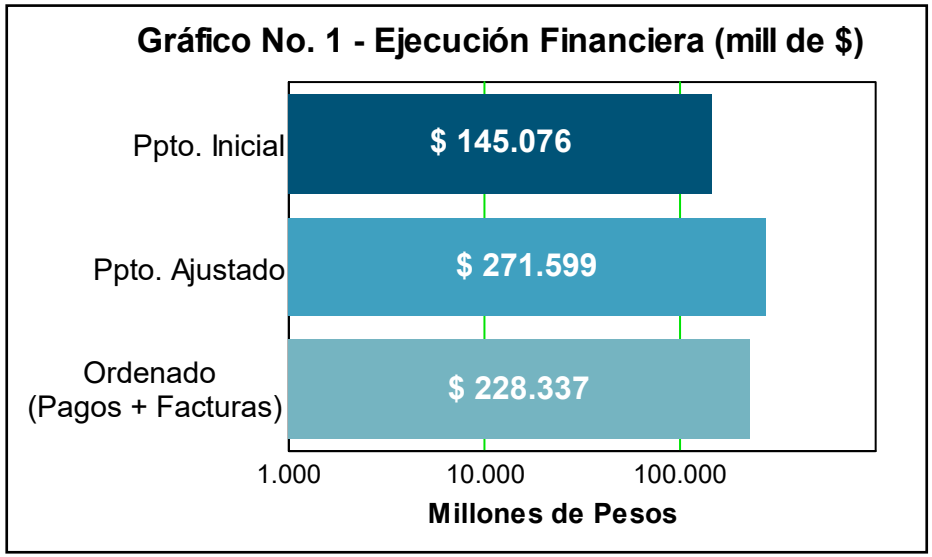

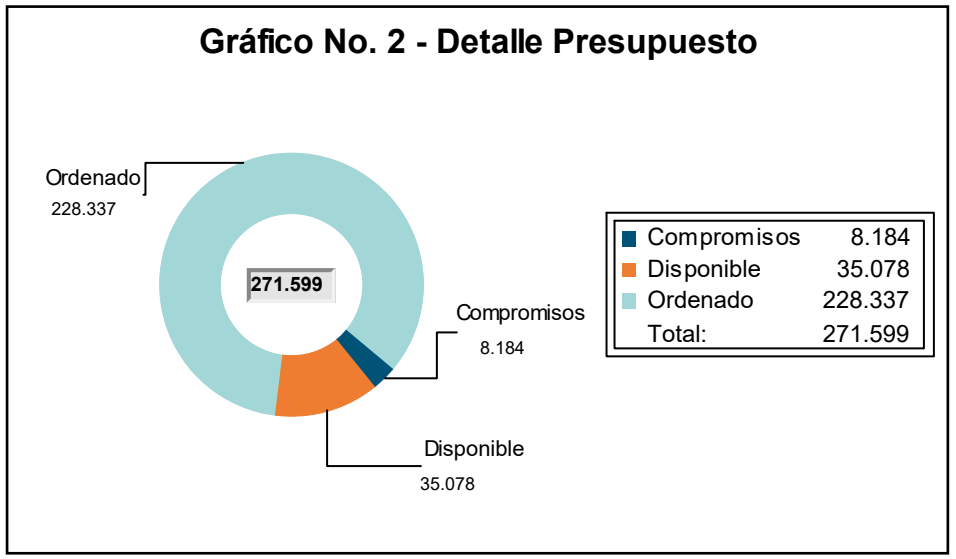

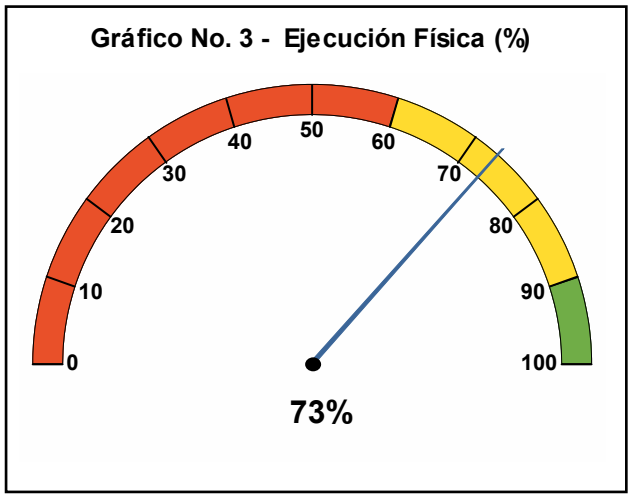

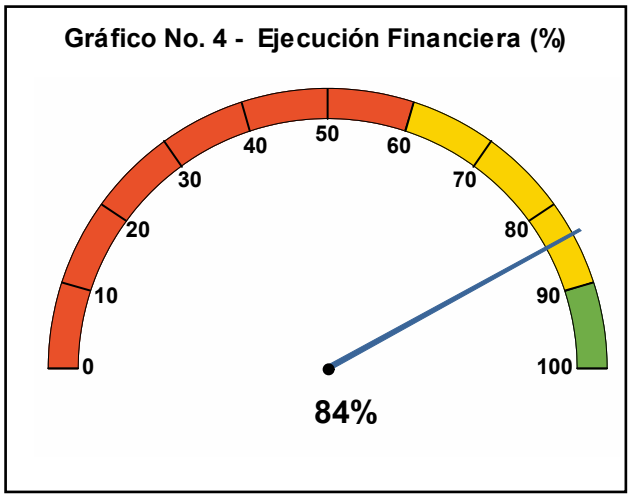

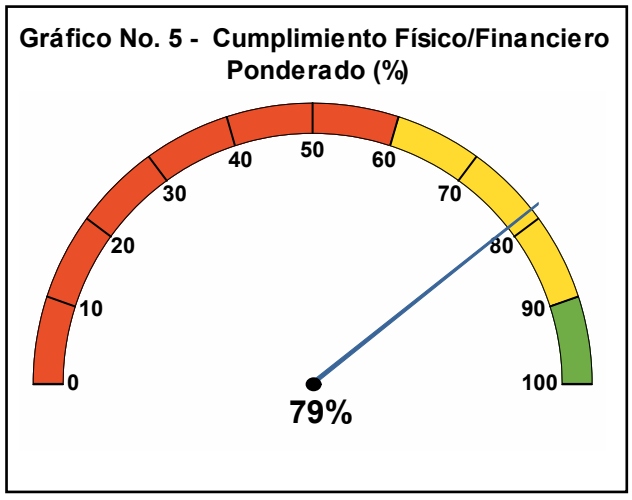

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.5 - Arte y cultura al alcance de todos
Programa: 1.5.1 - Estrategia Cultura Ciudadana Medellín

Proyecto: **240252 - Implementación de estrategias y políticas de cultura ciudadana**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 99% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.428 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.244

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de actividades culturales				
CU52AD Eventos de promoción de actividades culturales realizados	**Número**	**464**	**458**	**99%**

Código. Ind. SUIFP: 330105300

Descripción B/P/S: Eventos, actividades culturales y estrategias realizadas para promocionar las buenas prácticas de cultura ciudadana entre los habitantes de la ciudad.

Observación B/P/S: Hemos fortalecido las prácticas sociales de respeto, convivencia y confianza ciudadana, gracias a diversas acciones culturales. Logramos difundir iniciativas que promueven la confianza ciudadana, la convivencia armónica, el orgullo por nuestra ciudad. Desarrollamos acciones culturales y pedagógicas dirigidas a niños y población vulnerable, generando espacios seguros de encuentro y aprendizaje.

Programa: 1.5.2 - Fortalecimiento de la planeación cultural del Distrito

Proyecto: **240256 - Fortalecimiento de la planeación y seguimiento a la gestión cultural**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 900 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.312 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.312

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación				
CU56BA Documentos de planeación realizados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459901900

Descripción B/P/S: Documento desarrollado en el marco del proceso de actualización del Plan Decenal de Cultura.

Observación B/P/S: Realizamos el levantamiento de la línea base y se construyó el Plan de acción para 2026, para realizar el seguimiento y evaluación al Plan Decenal de Cultura 2025- 2035. articulado al Plan de Desarrollo "Medellín Te Quiere" 2024 - 2027 y a sus programas e indicadores; además a los instrumentos de política pública a nivel local y nacional.

CU56BB Documentos de investigación elaborados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902600

Descripción B/P/S: Documento de investigación asociado a evaluación de intervención de políticas públicas para cultura.

Observación B/P/S: Logramos recopilar y analizar datos sobre la participación ciudadana en los diferentes eventos y programas culturales, la percepción de la cultura ciudadana, la gestión cultural distrital, se implementó la Encuesta de Cultura Ciudadana 2025 y se hizo seguimiento y evaluación de las Políticas Públicas que se encuentran articuladas con el Plan de Desarrollo "Medellín Te Quiere" 2024 -2027.

CU56BC Sistemas de información implementados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Continuar con el funcionamiento del Sistema de Información Cultural de la ciudad.

Observación B/P/S: Realizamos la sistematización de información, como instrumento para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo "Medellín Te Quiere" 2024 - 2027, con la recopilación soportes de la ejecución de las actividades que evidencian el cumplimiento de los indicadores en el 2025.

Proyecto: 240258 -Fortalecimiento del sistema distrital de cultura

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 96% **Ejec. Financiera :** 88% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 92%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 400 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 400 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 352

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía				
CU58BA Encuentros realizados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 330107400

Descripción B/P/S: Encuentro realizado de promoción del Sistema Distrital de Cultura.

Observación B/P/S: Realizamos el 11° Foro de Cultura "Gobernanza y sostenibilidad cultural en Medellín", con invitados del Ministerio de las Culturas, la coordinación de la Maestría en Gestión Cultural de UdeA, el Clúster de Industrias Culturales y Creativas, agentes del sector y consejeros de cultura. Se abordaron los temas de planeación cultural y economías creativas y culturales.

CU58BB Consejos apoyados	**Número**	**23**	**21**	**91%**

Código. Ind. SUIFP: 330107408

Descripción B/P/S: Apoyo de los procesos desarrollados por el Sistema Distrital de Cultura.

Observación B/P/S: Acompañamos y activamos 21 espacios de participación del Sistema Distrital de Cultura. Se impulsó su articulación con las agendas del desarrollo local a través de 185 sesiones, logrando la gestión e incidencia territorial y sectorial. No cumplimos la meta debido a la transición en elección de nuevos consejeros, y algunos espacios no sesionaron en 2025.

Programa: 1.5.3 - Mantenimiento y dotación de las infraestructuras culturales del Distrito

Proyecto: 200095 -Mantenimiento y dotación de equipamientos culturales

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 90% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 95%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 988 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 893

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Sedes mantenidas				
CU95IA Sedes mantenidas	**Número**	**7**	**17**	**243%**

Código. Ind. SUIFP: 459901600

Descripción B/P/S: Sedes dedicadas a la enseñanza y promoción cultural y artística de la ciudad a las cuales se les realiza procesos de mantenimiento preventivo o correctivo, buscando garantizar la continuidad en la prestación del servicio.

Observación B/P/S: Se cierra el año con 17 infraestructuras intervenidas con obras eléctricas y civiles.

Proyecto: 240251 -Mejoramiento y dotación de equipamientos culturales

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 50% **Ejec. Financiera :** 80% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 65%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 10.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.854 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.903

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural

CU51BC Infraestructura cultural intervenida | **Número** | **20** | **0** | **0%**

Código. Ind. SUIFP: 330106800

Descripción B/P/S: Equipamientos culturales dedicados a la enseñanza y promoción cultural y artística de la ciudad, a los cuales se les realiza procesos de mantenimiento preventivo o correctivo, buscando garantizar la continuidad en la prestación del servicio.

Observación B/P/S: El contrato inició ejecución a finales de año, por lo que no se hicieron intervenciones a los equipamientos. Se espera que para el primer semestre de 2026 se logren intervenir, de acuerdo con las necesidades de cada uno de éstos.

CU51BD Infraestructuras culturales dotadas | **Número** | **2** | **5** | **250%**

Código. Ind. SUIFP: 330112700

Descripción B/P/S: Equipamientos culturales dedicados a la enseñanza y promoción cultural y artística de la ciudad, a los cuales se les realiza la dotación, buscando garantizar la continuidad en la prestación del servicio.

Observación B/P/S: Se lograron dotar con equipos de cómputo los parques biblioteca Santo Domingo, San Javier, Guayabal, San Antonio de Prado y Belén, lo cual permitirá continuidad de la oferta de servicios en dichos espacios.

Proyecto: 240253 -Fortalecimiento de las artes escénicas y la infraestructura cultural

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 50% **Ejec. Financiera :** 3% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 27%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.553 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 35.143 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.171

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Centros culturales adecuados

CU53BA Centros culturales adecuados | **Número** | **12** | **0** | **0%**

Código. Ind. SUIFP: 330109000

Descripción B/P/S: Equipamientos dedicados a las artes escénicas a los cuales se les realiza procesos de intervención, buscando la continuidad en la prestación del servicio.

Observación B/P/S: Si bien realizó el otorgamiento de estímulos para los proyectos beneficiarios de convocatoria de infraestructura (estudios y diseños: 2 / Compra: 3 / Dotación: 5 / Construcción: 1); estos proyectos aún no han iniciado ejecución de sus proyectos, por tal razón no se cuentan aun como "centros culturales adecuados".

CU53BB Estímulos otorgados | **Número** | **500** | **498** | **100%**

Código. Ind. SUIFP: 330105400

Descripción B/P/S: Incentivo económico entregado a personas y grupos que se dedican al desarrollo de actividades artísticas y culturales, por medio de una convocatoria pública que facilita el acceso y promoción artística en la ciudad.

Observación B/P/S: El acumulado final, luego de hacer cierre a corte de 31 de diciembre, fue de 498 estímulos otorgados con Recursos de Ley de Espectáculos Públicos (LEP) en las líneas de producción y circulación.

Proyecto: 240259 -Construcción de espacios para el arte y la cultura

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 50%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 39.600 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 38.764 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 38.484

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Centros culturales construidos

CU59AC Centros culturales construidos | **Número** | **1** | **0** | **0%**

Código. Ind. SUIFP: 330108800

Descripción B/P/S: Corresponde a la edificación de infraestructura para el desarrollo de las artes audiovisuales, cinematográficas, las prácticas artísticas y culturales.

Observación Proyecto: Actualmente se adelantando la estructuración del proceso licitatorio para avanzar en la construcción del equipamiento, la cual está proyectada iniciar en el primer semestre de 2026.

Programa: 1.5.4 - Bibliotecas, lectura, memoria y patrimonio

Proyecto: 240245 -Fortalecimiento de los servicios bibliotecarios

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 95% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 19.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 31.843 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 30.227

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios bibliotecarios				
CU45BA Usuarios atendidos	**Número**	**2.000.000**	**2.402.103**	**120%**

Código. Ind. SUIFP: 330108500

Descripción B/P/S: Usuarios atendidos en los servicios prestados por el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín en cada una de sus unidades de información.

Observación B/P/S: Logramos atender a 2.402.103 usuarios del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, superando la meta proyectada para la vigencia. Este resultado se explica por el fortalecimiento de la oferta de servicios bibliotecarios, culturales y educativos, el aumento en el uso de espacios y servicios presenciales y digitales, y la mayor demanda ciudadana durante el segundo semestre del año.

Proyecto: 240250 -Fortalecimiento del plan de lectura, escritura y oralidad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.756 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.711

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de actividades culturales				
CU50CA Eventos de promoción de actividades culturales realizados	**Número**	**4**	**4**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 330105300

Descripción B/P/S: Desarrollo de eventos de promoción del Plan de Lectura, escritura y oralidad en la ciudad.

Observación B/P/S: Realizamos cuatro (4) eventos de promoción de la lectura, la escritura y la oralidad en la ciudad: Primer Festival del Libro Infantil, 19a Feria Popular Días del Libro, 17a Parada Juvenil de la Lectura, 19a Fiesta del Libro y la Cultura.

CU50CB Publicaciones realizadas	**Número**	**7**	**8**	**114%**

Código. Ind. SUIFP: 330110000

Descripción B/P/S: Proceso de convocatoria para la promoción de nuevas publicaciones literarias en la ciudad.

Observación B/P/S: Se publicaron los siguientes títulos: i) Escalpelo; ii) Formas de abrazar un objeto. iii) Nace música la noche. iv) La creación de un cerebro lector – Mirar distinto – Colaboratorio LEO. v) Metáforas del corazón. vi) Tejerse otra piel. vii) Y La vida se alimenta de la vida. viii) El libro de la Fiesta del Libro - El Principito.

Proyecto: 240254 -Fortalecimiento del archivo histórico de medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 900 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.347 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.308

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de preservación del patrimonio bibliográfico y documental				
CU54AC Bienes bibliográficos y documentales preservados	**Número**	**50.000**	**50.000**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 330200600

Descripción B/P/S: Proceso de restauración de bienes bibliográficos y documentos frente a los cuales se desarrolla acciones de restauración y conservación.

Observación B/P/S: Cumplimos la meta de 50.000 folios de documentos históricos preservados con procesos archivísticos y de conservación. El indicador recoge las actividades técnicas e intelectuales, de conservación, restauración, digitalización y descripción documental realizadas sobre los acervos documentales patrimoniales custodiados en el Archivo Histórico de Medellín.

Proyecto: 240255 -Conservación y apropiacion social de memoria y patrimonio cultural

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 94% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.835 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.655

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de intervención al patrimonio material mueble				
CU55BA Obras restauradas	**Número**	**70**	**70**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 330205100

Descripción B/P/S: Obras restauradas que hacen parte del patrimonio de la ciudad.

Observación B/P/S: Realizamos acciones de mantenimiento y conservación sobre las obras de arte público del Distrito, orientadas a garantizar su preservación, estabilidad y adecuado estado físico, contribuyendo a la protección, valoración y permanencia de estos bienes culturales en el espacio público.

CU55BB Procesos de salvaguardia efectiva del patrimonio inmaterial realizados	**Número**	**6**	**6**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 330204900

Descripción B/P/S: Actividades de promoción para la protección del patrimonio inmaterial de la ciudad realizadas.

Observación B/P/S: Ejecutamos procesos de salvaguardia efectiva para resguardar y promover el patrimonio cultural del Distrito: 1. Cultura silletera 2. Intervención estético-artística Archivo Histórico de Medellín 3. Espiral de las Memorias y los patrimonios culturales 4. Exposiciones itinerantes 5. Estímulos 6. Ecosistema Digital del Patrimonio.

Programa: 1.5.5 - Fomento artístico y cultural

Proyecto: 240100 -Apoyo a la prestación del servicio del parque explora

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 93% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.809 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.553

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero al sector museos				
CU00AE Estímulos otorgados	**Número**	**12**	**12**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 330206900

Descripción B/P/S: Beneficios económicos que se ven representados en condiciones adecuadas de aseo, servicios públicos y vigilancia, permitiendo el buen funcionamiento del Parque y brindar una experiencia exitosa a las personas que asisten a este.

Observación B/P/S: Se brindó la asistencia en servicios públicos, vigilancia y aseo al Parque Explora por cada mes del año.

Proyecto: 240237 -Desarrollo de acciones y estímulos a favor del sector cultural y creativo

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 7.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.450 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.424

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural				

CU37AB Estímulos otorgados		**Número**	**310**	**315**	**102%**

Código. Ind. SUIFP: 330105400

Descripción B/P/S: Incentivo económico entregado a personas y grupos, que se dedican al desarrollo de actividades artísticas y culturales, por medio de una convocatoria pública que facilita el acceso y promoción artística en la ciudad.

Observación B/P/S: Otorgamos 315 estímulos, superando levemente la meta anual y alcanzando un 101,6 % de ejecución. El excedente de cinco estímulos corresponde a la línea de jurados, cuya planeación no es exacta, dado que la designación de jurados depende del número de participantes que avanzan a la etapa de evaluación, información definida tras la etapa de verificación de documentos.

Proyecto: 240247 -Consolidación de eventos y agenda cultural de ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 23.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 61.802 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 60.550

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de actividades culturales				
CU47AD Eventos de promoción de actividades culturales realizados	**Número**	**33**	**33**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 330105300

Descripción B/P/S: Eventos de promoción cultural y artística realizados en la ciudad.

Observación B/P/S: Se realizaron 12 Mercados Artesanales "Sanalejo", así como La celebración del Mes de la Danza, Audiciones Altavoz, Festival de Tango, Festival de Circos, Festival de la Trova, Medellín Urbana Fest, Feria de las Flores, Altavoz, Festiafro, Montecristo, Medellín Marcha Musical, Miradas, Bandas y Chirimías, Mitos y Leyendas, Festival de Navidad, Entre cuerdas y acordeones, Danzamed, Bienales, 350 años de Medellín, 40 años del Palacio de Justicia, y Caiga Pues.

Proyecto: 240248 -Administración red de casas de cultura

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 95% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.923 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9.073 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 8.663

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de circulación artística y cultural				
CU48AA Contenidos culturales en circulación	**Número**	**600**	**640**	**107%**

Código. Ind. SUIFP: 330107300

Descripción B/P/S: Contenidos culturales y artísticos desarrollados o en circulación en la Red de Casas de Cultura de Medellín.

Observación B/P/S: Con nuestras líneas de fomento y oferta de servicios realizamos talleres de formación artística, recorridos comunitarios, agenda artísticas, alianzas comunitarias y conversatorios, posibilitando el cumplimiento de la meta. Estas actividades corresponden a 10 Casas de Cultura, Oficinas de Cultura en 3 Uvas, 2 Teatros, 1 Centro de Desarrollo Cultural (Moravia) y 7 Laboratorios de Producción Sonora.

Proyecto: 240257 -Consolidación de la cinemateca distrital

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.233 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.226

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de circulación artística y cultural				
CU57AE Contenidos culturales en circulación	**Número**	**650**	**815**	**125%**

Código. Ind. SUIFP: 330107300

Descripción B/P/S: Contempla contenidos culturales en circulación de la Cinemateca y otras acciones de exhibición itinerante, además de actividades de formación como clases maestras, conversatorios, talleres y articulaciones con otras entidades.

Observación B/P/S: Para el avance y cierre del proyecto se presentan unas cifras muy positivas, que destacan la gestión de un mayor numero de actividades por encima de la meta establecida con un impacto significativo en las comunas y corregimientos del Distrito.

Programa: 1.5.6 - Formación y prácticas artísticas y culturales

Proyecto: **240246 -Desarrollo de la red de practicas artisticas y culturales**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 92% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 12.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 22.196 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 20.525

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales				
CU46AF Cursos realizados	**Número**	**5**	**5**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 330108700

Descripción B/P/S: Hace referencia a cada uno de los procesos de formación y práctica artística asociados a las Redes de Prácticas Artísticas y Culturales: Red de Músicas, Red de Artes Plásticas, Red de Audiovisuales, Red de Danzas, y Red de Artes Escénicas.

Observación B/P/S: Se desarrollaron los procesos en cada una de las 5 redes pertenecientes a la Red de Prácticas artísticas y Culturales: Red de Música (con 28 escuelas operando), Red de Danza (con 6 procesos), Red de Creación Escénica (con 10 procesos), Red de Artes Plásticas (4 procesos) y Red de Audiovisuales (4 procesos), alcanzando 52 que lograron dar cobertura a todo el Distrito.

Proyecto: **240249 -Desarrollo de estrategia de formación de públicos**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.500 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.463

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural				
CU49AF Personas beneficiadas	**Número**	**164.328**	**173.698**	**106%**

Código. Ind. SUIFP: 330112200

Descripción B/P/S: Personas que aprovechan de manera directa los espacios, actividades y manifestaciones culturales, frente a los cuales se hace un incentivo directo para el desarrollo de la necesidad del consumo de productos culturales.

Observación B/P/S: Se propició el acceso libre de la ciudadanía a museos y teatros mediante la adquisición de boletas, la entrega de estímulos a la Mesa de Museos para que promovieran el acceso libre a sus experiencias, y el arrendamiento del Teatro Metropolitano y el Teatro pablo Tobón Uribe. Este fue resultado del trabajo articulado con las entidades aladas, permitiendo impactar a 173.698 ciudadanos del Distrito.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico

Componente: 1.5 - Arte y cultura al alcance de todos

Programa: 1.5.4 - Bibliotecas, lectura, memoria y patrimonio

Proyecto: **250031 -25pp99-protección del patrimonio material e inmaterial comunas 3, 4 y 12**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 94% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 47%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 383 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 360

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de actividades culturales.				
CU31AE Actividades culturales realizadas en museos del ministerio de cultura	**Número**	**4**	**0**	**0%**

Código. Ind. SUIFP: 330204400

Descripción B/P/S: Actividades de promoción para la protección del patrimonio material e inmaterial realizadas en los territorios.

Observación Proyecto: El proceso de memoria y patrimonio en las comunas 3, 4 y 12 avanza de manera satisfactoria en su etapa de planeación, con la definición y consolidación de las acciones a desarrollar. Actualmente se articulan los componentes técnicos y logísticos, proyectando la realización de actividades y la ejecución física del proceso para enero de 2026.

Programa: 1.5.5 - Fomento artístico y cultural

Proyecto: **230039 -24pp99-apoyo a la agenda e iniciativas culturales y artísticas**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 99% **Ejec. Financiera :** 94% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.058 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.936

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de actividades culturales				
CU39BA Eventos de promoción de actividades culturales realizados	**Número**	**235**	**233**	**99%**

Código. Ind. SUIFP: 330105300

Descripción B/P/S: Espacios de proyección y promoción del talento artístico, y a la disposición para la presentación de las expresiones artísticas y culturales de las comunas y corregimientos.

Observación B/P/S: Se finaliza la ejecución de eventos, de los cuales, 2 eventos del corregimiento 70 no se ejecutan por la calamidad pública declarada por la ola invernal. El contrato con Plaza Mayor de la vigencia 2024 se encuentra cerrado en su totalidad.

Proyecto: **250043 -25pp99-fortalecimie de los procesos e iniciativas artísticas y culturales comuna 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, corregimiento 60, 70 y 90.**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 48% **Ejec. Financiera :** 92% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 70%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 23.142 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 21.333

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de actividades culturales				
CU43BA Eventos de promoción de actividades culturales realizados	**Número**	**127**	**85**	**67%**

Código. Ind. SUIFP: 330105300

Descripción B/P/S: Espacios de proyección y promoción del talento artístico, y a la disposición para la presentación de las expresiones artísticas y culturales de las comunas y corregimientos.

Observación B/P/S: Se ejecutaron 85 eventos en diferentes territorios de la ciudad, de los cuales 2 para diciembre ya habían tenido fecha de inicio previa en otros meses (EVENTO ARTÍSTICO PARQUE DE BOLIVAR y EVENTOS BARRIALES C10). Se espera culminar la ejecución en el primer semestre de 2026.

CU43BB Estímulos otorgados	**Número**	**190**	**232**	**122%**

Código. Ind. SUIFP: 330105400

Descripción B/P/S: Incentivo económico entregado a personas y grupos que se dedican al desarrollo de actividades artísticas y culturales, por medio de una convocatoria pública que facilita el acceso y promoción artística en los territorio

Observación B/P/S: En la convocatoria de Estímulos, 232 proyectos beneficiados realizaron muestras de resultados abiertas al público en los territorios priorizados, presentaron sus informes finales y completaron la ejecución del 100% de las propuestas con el acompañamiento de los profesionales y del equipo de comunicaciones, gestionando el desembolso total. Dos (2) estímulos no se ejecutaron en su totalidad.

CU43BC Cursos realizados	**Número**	**237**	**0**	**0%**

Código. Ind. SUIFP: 330108700

Descripción B/P/S: Procesos de enseñanza, aprendizaje y sensibilización en diferentes áreas y modalidades, a través de talleres de formación artística y cultural realizados en los territorios.

Observación B/P/S: En diciembre logramos la instalación de 61 talleres y el inicio de clases en 44 de ellos. Para asegurar la finalización del proyecto, el contrato con el Pascual Bravo se amplió hasta mayo 2026. Los talleres pendientes serán instalados e iniciarán actividades durante febrero.

CU43BD Encuentros realizados	**Número**	**78**	**21**	**27%**

Código. Ind. SUIFP: 330107400

Descripción B/P/S: Espacios de proyección, promoción y fortalecimiento del sector artístico y cultural realizados en los territorios.

Observación B/P/S: Se avanzó en la ejecución del componente, logrando el desarrollo de 21 encuentros priorizados en la vigencia. La comuna 10 y la comuna 13 quedaron cerradas satisfactoriamente, mientras que se registran avances significativos en las comunas 3, 8 y 9, mediante la implementación y seguimiento de los respectivos planes de trabajo.

Programa: 1.5.6 - Formación y prácticas artísticas y culturales

Proyecto: **230041 -24pp99-fortalecimiento y formación artística y cultural**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 96% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.455 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.354

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales				
CU41BB Cursos realizados	**Número**	**172**	**172**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 330108700

Descripción B/P/S: Procesos de enseñanza, aprendizaje y sensibilización en diferentes áreas y modalidades, a través de talleres de formación artística y cultural realizados en los territorios.

Observación B/P/S: Se ejecutó bajo el contrato interadministrativo de prestación de servicios 4600101668 de 2024 con el ITM y ya terminó desde el mes de junio la ejecución física.

CU41BC Encuentros realizados	**Número**	**169**	**169**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 330107400

Descripción B/P/S: Espacios de proyección, promoción y fortalecimiento del sector artístico y cultural realizados en los territorios

Observación B/P/S: Se realizaron todas las acciones planeadas para el desarrollo del proceso de centro de investigación cultural, el cual culminó con la entrega de productos audiovisuales, la realización de acciones de intervención artística y el proceso de entrega de repositorios digitales.

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: **200096 -Desarrollo de estrategias de convivencia, diversidad y cultura ciudadana**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 46 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 28

Proyecto: **200104 -Apoyo al sistema municipal de cultura**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1


Proyecto:	**200087**	**-Fortalecimiento del sistema de bibliotecas medellín**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 22	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 22
Proyecto:	**200093**	**-Desarrollo del plan de lectura, escritura y oralidad**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 45	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 40
Proyecto:	**200099**	**-Administración del archivo histórico**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 4	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 4
Proyecto:	**200100**	**-Recuperación y restauración del patrimonio cultural**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 92	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 92
Proyecto:	**200101**	**-Desarrollo de estrategias de visibilización y apropiación del patrimonio**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 1	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 1
Proyecto:	**200081**	**-Implementación de estrategias de economía creativa y cultural**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 88	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 49
Proyecto:	**200089**	**-Desarrollo de eventos e iniciativas culturales de ciudad**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 1.163	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 1.159
Proyecto:	**200090**	**-Desarrollo de convocatorias públicas en arte y cultura**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 45	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 45
Proyecto:	**200091**	**-Consolidación de la red casas de la cultura**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 72	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 66
Proyecto:	**200094**	**-Asistencia a la prestación del servicio del parque explora**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 120	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 120
Proyecto:	**200088**	**-Consolidación red de prácticas artísticas y culturales medellín**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 27	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 27


5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Proyecto:	**130421**	**-Mcv-escuelas medellín vive la música**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 95	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 35


Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2025

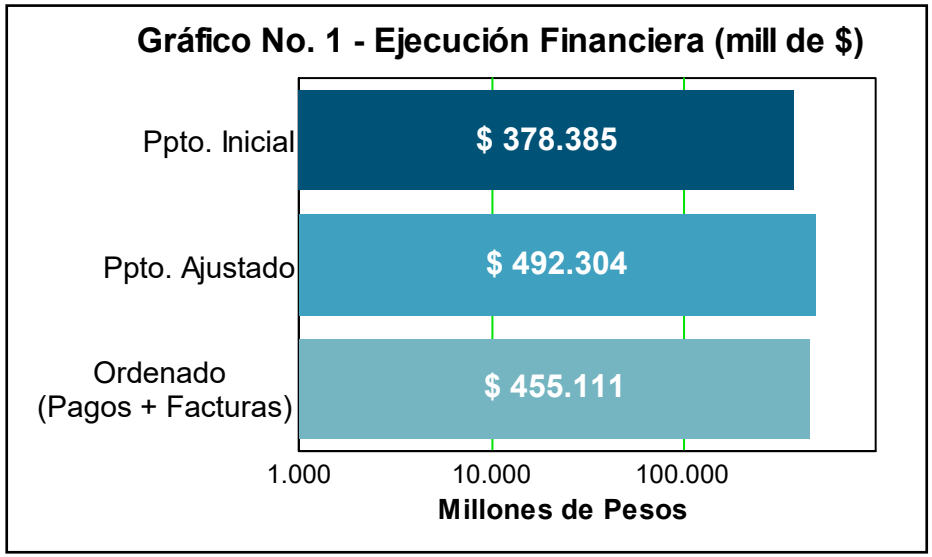


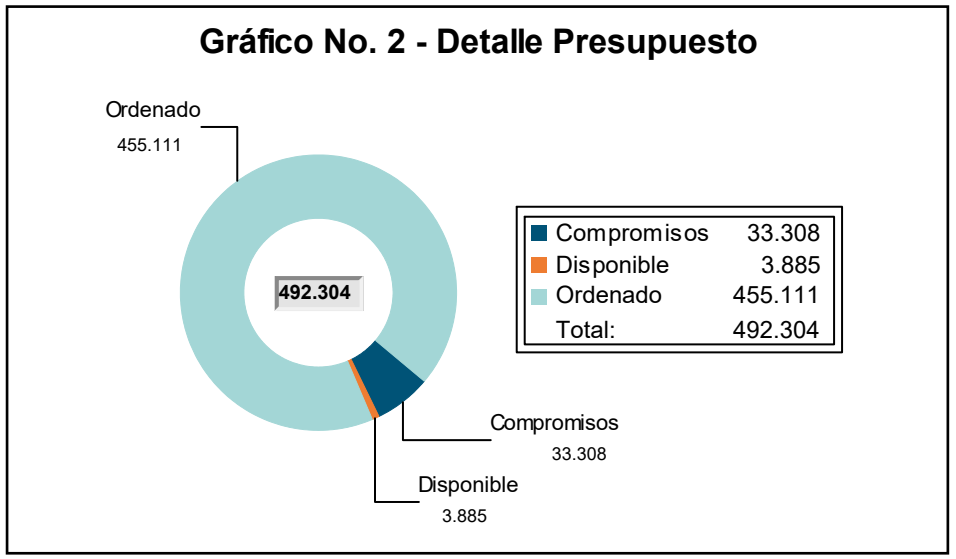

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre de 2025 comprende pagos y facturas

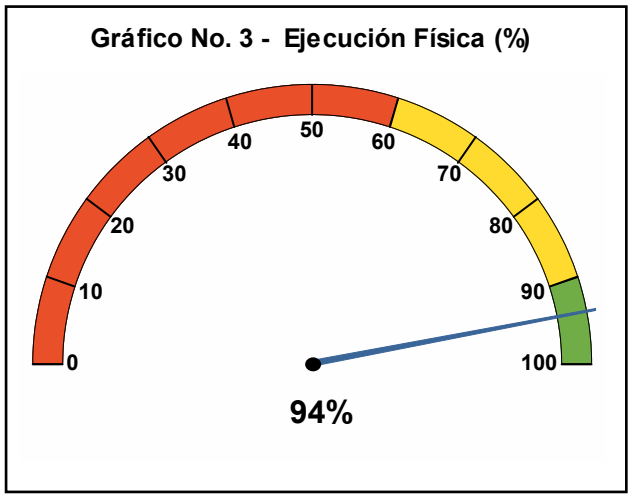

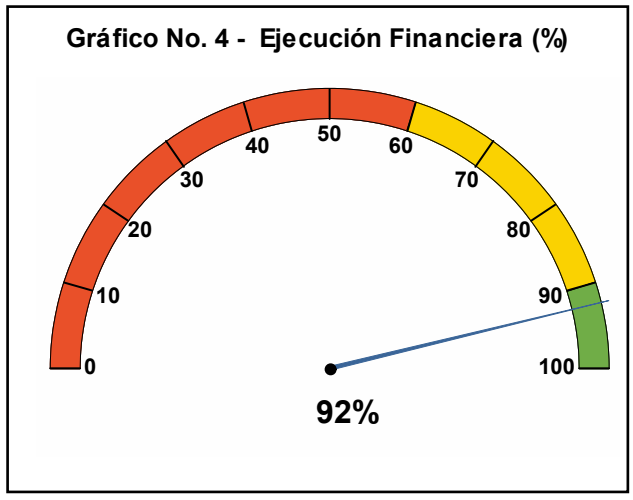

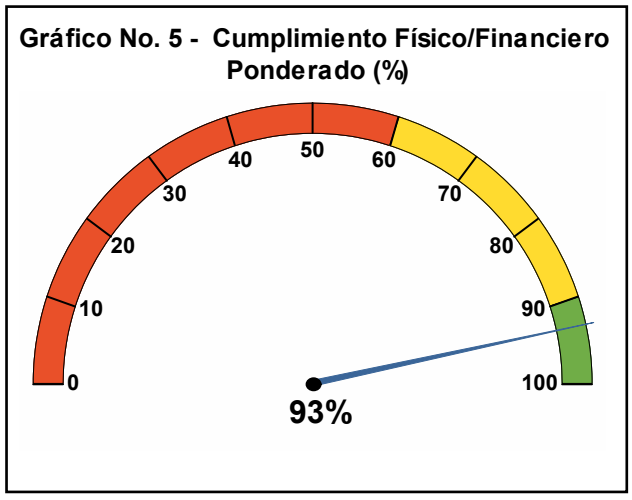

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.1 - Primera infancia para un Buen Comienzo
Programa: 1.1.1 - Nutrir para sanar, sanar para crecer

Proyecto: **240152 -Fortalecimiento nutricional de niñas y niños de primera infancia y madres gestantes y lactantes para el desarrollo integral**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 90% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 95%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 24.727 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 18.142 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 16.317

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de atención integral a la primera infancia				
BC52AA Niños y niñas atendidos en servicio integrales	**Número**	**18.500**	**19.494**	**105%**

Código. Ind. SUIFP: 410200100

Descripción B/P/S: Comprende niñas y niños de 0 a 6 años cumplidos, con malnutrición por déficit o por exceso: riesgo de desnutrición aguda, desnutrición aguda moderada, desnutrición aguda severa; riesgo de sobrepreso, sobrepeso y obesidad; desnutrición crónica en menores de 2 años; mujeres gestantes con bajo peso gestacional y mujeres lactantes con delgadez; niñas y niños mayores de 5 años en riesgo o en delgadez.

Observación B/P/S: En 2025, se identificaron 19.494 personas sujetos de intervención, que incluyen casos de niñas y niños con diagnóstico de riesgo de desnutrición o desnutrición aguda, riesgo o desnutrición crónica en menores de 2 años, riesgo o delgadez, mujeres con bajo peso para la edad gestacional y lactantes con delgadez. Como respuesta, se inició atención de manera integral, incluyendo la entrega de raciones alimentarias en los casos requeridos.

Programa: 1.1.2 - Ecosistema para la Primera Infancia

Proyecto: **240149 -Mejoramiento a la atención integral de madres gestantes y lactantes y sus niñas y niños en el entorno familiar**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 44.620 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 54.260 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 54.260

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable				
BC49AA Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	**Número**	**26.747**	**30.733**	**115%**

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a niñas, niños, mujeres gestantes y mujeres lactantes matriculados en Buen Comienzo y beneficiados a través de la modalidad familiar.

Observación B/P/S: Se fortaleció el modelo de atención con énfasis en las competencias partentales, incluyendo nuevas atenciones en salud, doulas para promover el parto humanizado y la lactancia materna exclusiva, velando por el estado nutricional a través de la entrega paquetes alimentarios y acompañamiento en la construcción de saberes que contribuyen al desarrollo integral. Se ampliaron los cupos de atención para la modalidad familiar Buen Comienzo, de 20.000 a 23.000, gozando de gran acogida por parte de la ciudadanía, aumentando la atención a la población migrante.

Proyecto: **240150 -Fortalecimiento a la atención integral de niñas y niños en la primera infancia**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 94% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 231.667 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 313.923 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 294.723

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de atención integral a la primera infancia				
BC50AA Niños y niñas atendidos en servicio integrales	**Número**	**87.174**	**88.080**	**101%**

Código. Ind. SUIFP: 410200100

Descripción B/P/S: Corresponde a niñas y niños, matriculados en Buen Comienzo y beneficiados a través de la modalidad institucional y los matriculados en las diferentes modalidades de ICBF

Observación B/P/S: Logramos la atención de 88.080 niñas y niños de 0 a 5 años en las modalidades familiar e institucional del programa Buen Comienzo e ICBF, entregando alimentación con un aporte del 80% en el requerimiento nutricional, brindándoles atención integral a través de acompañamiento nutricional, psicosocial, educación inicial, proceso pedagógico, seguimiento al desarrollo y gestión en salud, entre otros.

Proyecto: 240151 -Fortalecimiento administrativo y de la infraestructura física para la atención de la primera infancia

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 68.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 70.191 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 68.488

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Infraestructura para educación inicial construida				
BC51AA Aulas nuevas para la educación inicial construidas	**Número**	**0,17**	**0,17**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 220102200

Descripción B/P/S: Corresponde al número de nuevas sedes construidas en el marco del Acuerdo 48 de 2014- POT de Medellín las cuales se regirán a partir de las actuaciones definidas en el mismo. Se entenderá como construcción, la generación de nuevas áreas de equipamientos que garanticen una mayor oferta y promuevan la equidad territorial a través de nuevas sedes de Buen Comienzo, ya sean Jardines Infantiles o Centros infantiles que garanticen nuevos cupos y la ampliación cuantitativa de la prestación del servicio. Para construcción requiere de varios procesos tales como: Estudios y diseños, licenciamiento y obra. Estos procesos se tendrán en cuenta como avances, pero solo se cumplirá el indicador en el momento de finalización y entrega de la obra. Para este indicador se excluyen las ampliaciones, estas se tendrán en cuentan en los mejoramientos y adecuación

Observación B/P/S: Se avanzó en la construcción del Jardín Infantil Buen Comienzo-JIBC Palmitas del corregimiento Palmitas; JIBC Libertad de comuna 8 Villa Hermosa y JIBC Chambacú en el corregimiento de San Cristóbal con actividades preliminares como cimientos y estructura. Por su parte, el JIBC Pascual Bravo en comuna 7 Robledo, inició demolición de roca para la construcción. Continúa el proceso para el inicio de los proyecto de los JIBC: Alfonso López en comuna 5 Castilla; , Primavera Norte en comuna 2 Santa Cruz; Santa Eufrasia, en comuna 13 y Popular N° 1.

BC51AB Aulas para la educación inicial mejoradas	**Número**	**7**	**7**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 220102300

Descripción B/P/S: Hace referencia a la cantidad de sedes mejoradas y/o adecuadas de acuerdo a las actuaciones definidas en el POT de Medellín, Acuerdo 48 de 2014. Para los espacios públicos y equipamiento, se entenderán los mejoramientos o recuperaciones como la restauración, adecuación, rediseño y recuperación de espacios como intervención para la cuantificación de la infraestructura actual que implican la remoción y cambios de elementos arquitectónicos o estructurales. Comprende acciones orientadas a recobrar o restaurar los atributos espaciales, para recuperar sus condiciones originales y recomponer los elementos que por diseño o intervenciones inadecuadas no están acordes con las características tipológicas de cada espacio, optimizando sus características físicas y estéticas, aprovechando al máximo el área que posee y su potencial como área para la prestación de servicios a la primera infancia. Las acciones de mejoramiento y/o adecuación, se realizarán únicamente a sedes propias, del Distrito de Medellín. El indicador se entenderá como cumplido con las actas de entrega de obra de los proyectos. Se excluyen los mantenimientos periódicos de las sedes las cuales implican acciones de reparación continuas o preventivas.

Observación B/P/S: Garantizando las mejores condiciones de infraestructura, se realizaron intervenciones en pintura, impermeabilización de terrazas, cubiertas recreativas, adecuación de pisos, gramas sintéticas y ampliación de una sala de atención en los jardines infantiles Buen Comienzo: Versalles, Moravia, Aures, Carpinelo, Altos de San Juan, Castilla y Calasanía. Estas intervenciones garantizaron espacios pedagógicos seguros y adecuados, cumpliendo con los estándares técnicos requeridos para la prestación del servicio.

BC51AC Establecimientos educativos en operación	**Número**	**30**	**30**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 220107100

Descripción B/P/S: Corresponde a las sedes de Buen Comienzo a las cuales se les paga los servicios genéricos; servicios públicos, vigilancia, telecomunicaciones, mantenimiento y otros servicios o productos que garanticen el correcto funcionamiento de las mismas.

Observación B/P/S: Se realizó el pago de los servicios públicos e internet de los comodatos a cargo de la Unidad, garantizando el correcto funcionamiento para la adecuada prestación del servicio

Proyecto: 240153 -Desarrollo de estrategias de revisión y seguimiento a la política pública de pr

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 50% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 73%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 9.371 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.946 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.676

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
BC53AA Documentos de lineamientos técnicos en política y atención integral de niños, niñas y adolescentes realizados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 410203501

Descripción B/P/S: Corresponde a la entrega y consolidación de los documentos del plan de trabajo para la vigencia, asociados a la ruta de seguimiento a la implementación y actualización de la Política Pública de Primera Infancia del Distrito, los cuales integran insumos clave para el avance del proceso, incluyendo la versión definitiva del diagnóstico situacional y el documento estratégico de la política, entre otros.

Observación B/P/S: Se elaboró documento de avance del modelo de seguimiento con una primera versión de teoría del cambio, matriz de procesos roles y soportes y batería de indicadores, actualmente en revisión por el DAP. Estos productos constituyen el insumo técnico base para el avance de la implementación y actualización de la Política Pública de Primera Infancia.

BC53AB Agentes educativos cualificados	**Número**	**4.400**	**0**	**0%**

Código. Ind. SUIFP: 410200300

Descripción B/P/S: Este valor estadístico recoge el número de agentes educativos de Buen Comienzo que participan en procesos de cualificación dirigidos a fortalecer sus habilidades y competencias para brindar atención integral a la Primera Infancia de acuerdo al plan de formación para la vigencia

Observación B/P/S: El valor estadístico no cuenta con reporte, toda vez que las acciones de cualificación realizadas durante el periodo fueron financiadas con recursos de otro proyecto de inversión, obedeciendo ajustes de la programación presupuestal de la vigencia.

Observación Proyecto: Las acciones de cualificación no cuentan con ejecución debido que fueron financiadas a través de una fuente de inversión alterna.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico

Componente: 1.1 - Primera infancia para un Buen Comienzo

Programa: 1.1.2 - Ecosistema para la Primera Infancia

Proyecto: 250011 -25pp03-fortalecimie de la atención integral a la primera infancia comuna 3

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 75% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 86%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 591 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 572

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media.				
BC11AA Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media.	**Número**	**75**	**75**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 220101700

Descripción B/P/S: Se beneficiarán 75 niñas y niños de 2 a 5 años de edad de la comuna 3 Manrique, a través del fortalecimiento de la Atención Integral con horario flexible, en una sede existente.

Observación B/P/S: Para la vigencia se contó con la matricula y asistencia permanente de las 75 niñas y niños en la modalidad flexible del Centro Infantil Versalles, de la comuna 3 Manrique, alcanzando total de cobertura.

BC11AB Aulas para la educación inicial mejoradas | **Número** | **2** | **1** | **50%**

Código. Ind. SUIFP: 220102300

Descripción B/P/S: Busca fortalecer la atención de aproximadamente 520 niñas y niños a través del mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura física de 2 sedes existentes de Comuna 3 Manrique (CI Ser y Hacer Carambolas y JI BC Montecarlo de propiedad del Distrito).

Observación B/P/S: En la sede Jardín Infantil Montecarlo, se realizaron acciones de mantenimiento general en cubiertas, pisos, pintura y redes eléctricas, fortaleciendo la infraestructura para la atención integral de la primera infancia en comuna 3. El avance es del 50% dado que, si bien se cuenta con avance en la contratación del mantenimiento del CI Carambolas, aún no se culmina la ejecución del recurso asignado.

Observación Proyecto: El proyecto registra un avance tras la adición de recursos PP al contrato interadministrativo con la EDU; sin embargo, al no tener completo el proceso de intervención física para el mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura física de 1 de las sedes priorizadas en la comuna 3, no se logra registrar cumplimiento total de la mejora en la presente vigencia.

Proyecto: 250012 -25pp99-construcción de jardines infantiles

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 50%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.792 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.792

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Infraestructura para educación inicial construida				
BC12AA Aulas nuevas para la educación inicial construidas	**Número**	**3**	**0**	**0%**

Código. Ind. SUIFP: 220102200

Descripción B/P/S: Se busca apoyar la construcción de la infraestructura física de tres nuevos jardines infantiles: La Libertad, ubicado en la comuna 8 Villa Hermosa; Comuna 50 San Sebastián de Palmitas, ubicado en la CL 137 y Chambacú, que se construirá en la CL 66 #143-67 o, en su defecto, en el lote asignado dentro del corregimiento comuna 60.

Observación B/P/S: Durante la vigencia, se avanzó en la construcción del Jardín Infantil Buen Comienzo-JIBC Palmitas del corregimiento Palmitas; JIBC Libertad de comuna 8 Villa Hermosa y JIBC Chambacú en el corregimiento de San Cristóbal con actividades preliminares como cimientos y estructura. No se registra avance toda vez que la entrega de las obras se realizará en la siguiente vigencia.

Observación Proyecto: Actualmente se ejecuta contrato con la EDU a través del cual se avanzó en la construcción del Jardín Infantil Buen Comienzo-JIBC Palmitas, JIBC Libertad y JIBC Chambacú con actividades preliminares como cimientos y estructura; sin embargo, debido a los tiempos de maduración técnica propios de los proyectos de infraestructura, la finalización de las obras se realizará en la siguiente vigencia, manteniendo la continuidad de la ejecución física hasta su entrega definitiva.

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 200392 -Mejoramiento de la situación nutricional de madres gestantes, lactantes y niños menores de 6 años

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.998 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.998

Proyecto: 200389 -Fortalecimiento del servicio de atención integral a madres gestantes y lactantes

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 241 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: 200390 -Servicio de atención integral a niños y niñas en la primera infancia


Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 17.194 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.268


Proyecto:	200391 -Fortalecimiento de ambientes asociados a la atención de la primera infancia				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 17	Ejec. Financiera (mill de $): $ 17

Proyecto:	230032 -24pp03-dotación a los centros infantiles, jardines infantiles y centros flexibles comuna 3				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 11	Ejec. Financiera (mill de $): $ 0


Secretaría de Salud


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2025

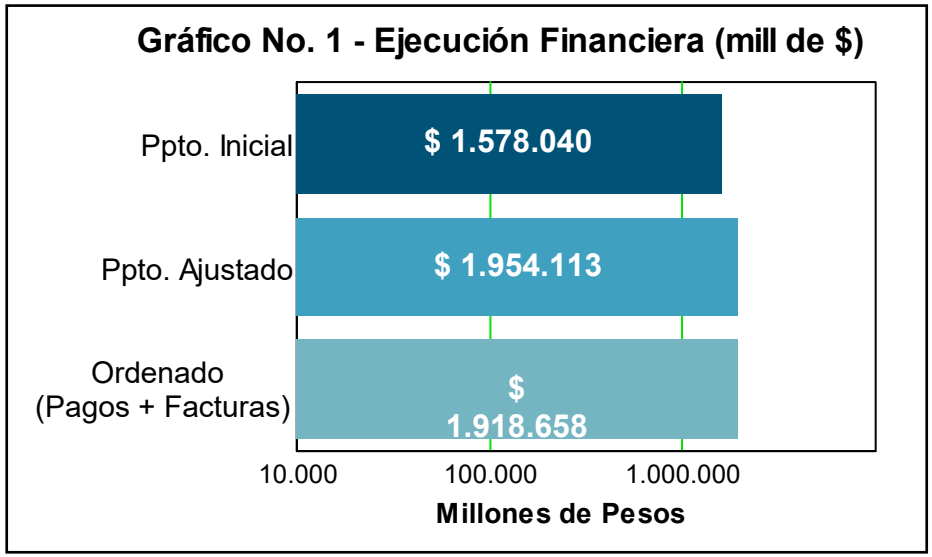


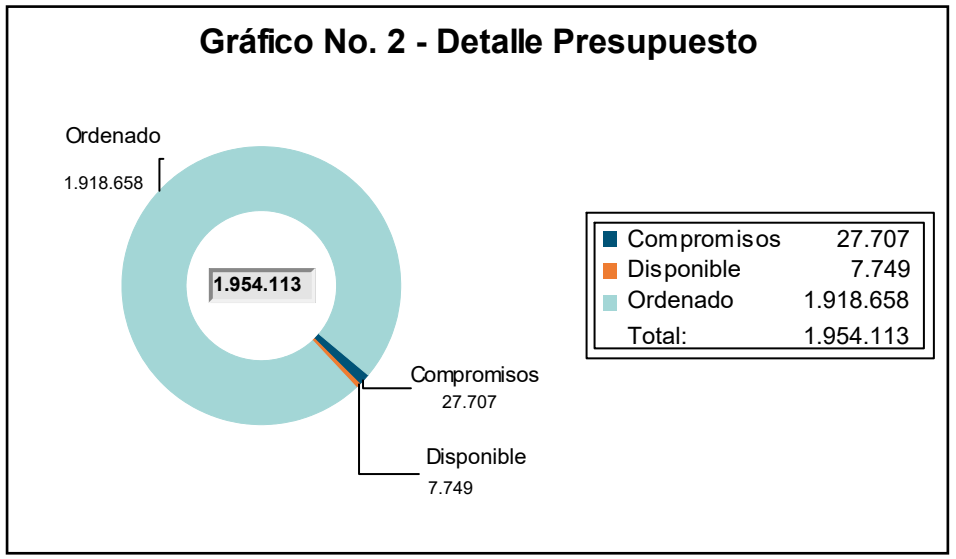

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre de 2025 comprende pagos y facturas

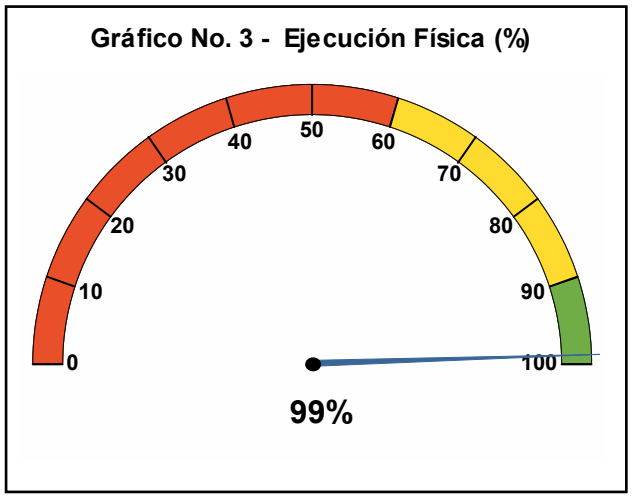

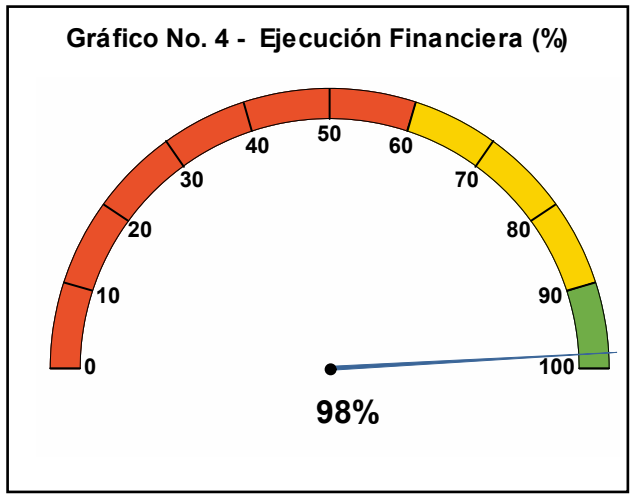

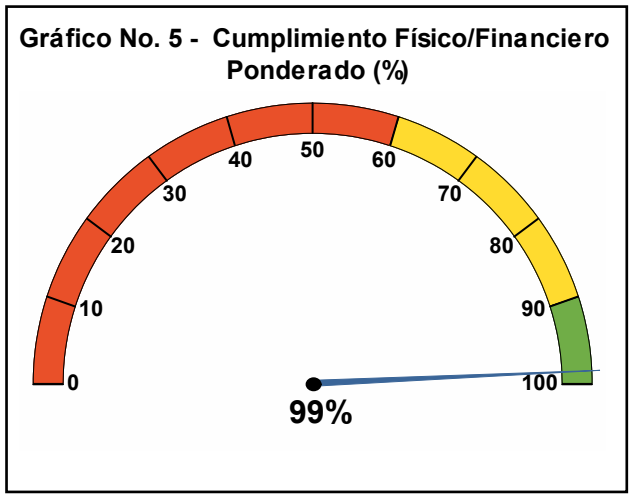

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente
Componente: 2.1 - Salud para el bienestar físico y mental
Programa: 2.1.1 - Medellín Te Quiere Saludable

Proyecto: **200191 -Desarrollo de la estrategia medellín me cuida salud medellín**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 54% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 77%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.601 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.953

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Biológicos, biosimilares y medicamentos de síntesis de interés en salud pública				
SL91BJ Unidades suministradas	**Número**	**3**	**3**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 190115500

Descripción B/P/S: Corresponde a: Corresponde a: *Actividad 2.4.1.1 Programa PAI: 3 meses de ejecución, *Actividad 2.4.1.2 Telemetría: 3 meses.

Observación B/P/S: Implementación del PAI

SL91BK Evaluaciones de riesgo realizadas	**Número**	**393**	**707**	**180%**

Código. Ind. SUIFP: 190115000

Descripción B/P/S: Corresponde a: *Actividad 3.1.1.1 ETAFI: Familias gestionadas: 393, *Actividad 3.1.1.2. Interventoría: 1.

Observación B/P/S: En enero, realizó un fortalecimiento de la estrategia territorial mediante el aumento del recurso humano destinado a la gestión de hogares. Este incremento fue posible gracias a la redistribución de recursos existentes, lo que permitirá ampliar la capacidad operativa de los Equipos Básicos de Salud y mejorar la cobertura y seguimiento familiar.

Proyecto: **240233 -Desarrollo de la estrategia medellin te quiere saludable**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 99% **Ejec. Financiera :** 93% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 38.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 50.968 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 47.405

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles				
SL33BA Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas	**Número**	**32.000**	**31.394**	**98%**

Código. Ind. SUIFP: 190503100

Descripción B/P/S: Corresponde a la actividad: *1.1.1.1 Realizar la gestión de los riesgos en salud identificados en las familias.

Observación B/P/S: Se cierra el año 2025 con 31394 familias gestionadas, cumpliendo en un 98,1% el indicador. Al tratarse de un indicador acumulativo, se plantea para la próxima vigencia cumplir con el 2% restante.

SL33BB Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales implementadas	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 190502200

Descripción B/P/S: Corresponde a las actividades: Implementar la política publica Distrital de salud mental, Brindar apoyo técnico en implementación de política pública salud mental. Realizar intervenciones breves en salud mental. Desarrollar la estrategia de línea amiga. Desarrollar la estrategia escuchaderos. Desarrollar dispositivos comunitarios en prevención y mitigación de consumo de sustancias psicoactivas.

Observación B/P/S: Para el año 2025 se cumplió un 100% el indicador gracias a la implementación de estrategias de salud mental como los Escuchaderos, centros de escucha en salud mental, acompañamiento a I.E., gestión de familias; Familias Fuertes y Resilientes y línea amiga identificando riesgos en salud mental, se realizó sesión del comité distrital de salud mental y adiciones y sus mesas técnicas; además, se contó con los profesionales de apoyo para la implementación de la política.

SL33BC	**Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 190502100

Descripción B/P/S: Corresponde a : * estrat prevención embarazo adolescente: Aseso anticoncepción, Implantes subdérmico. *estrat prevención infecciones transmisión sexual: Pruebas VIH, sífilis o Hepatitis B,Asesoría pruebas rápidas. * apoyo planeación, ejecución y seguimiento estrat prevención embarazo adolescente e Infecciones transmisión sexual * estrategia ruta materno perinatal.* apoyo a planeación, ejecución y seguimiento Ruta Materno Perinatal

Observación B/P/S: Para el año 2025 se dio cumplimiento a las acciones enmarcadas en la dimensión de derechos sexuales y derechos reproductivos y la ruta materno perinatal a través de Medellín Te Quiere Saludable y profesionales de apoyo.

SL33BD	**Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas**	**Número**	**9**	**9**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 190502700

Descripción B/P/S: Corresponde a los meses de Implementación del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

Observación B/P/S: Se continua con la implementación del programa ampliado de inmunizaciones con su respectivo seguimiento y monitoreo de cadena de frio.

SL33BE	**Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes implementadas**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 190502300

Descripción B/P/S: Corresponde a: *Realizar tamizajes riesgo cardiovascular, auditivos, visuales, encuestas riesgo de canceres priorizados *Brindar apoyo en planeación, ejecución y seguimiento plan estratégico riesgo cardiovascular y cancer.* Dllar estrategia estilos vida saludable comunitaria y universidades. *Brindar apoyo técnico en el dllo de la estrategia universidades saludables. * Ejecutar política pública Salud Bucal.

Observación B/P/S: Se cumple con la meta del indicador en un 100% gracias a que se cumplieron las metas establecidas para las actividades detalladas como tamizajes de riesgo cardiovascular, se contó con profesionales de apoyo y se implementaron las estrategias de Estilos de vida saludable.

SL33BF	**Campañas de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos implementadas**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 190502800

Descripción B/P/S: Corresponde a:*Realizar valoraciones nutricionales en niños, niñas y adolescentes de 2 a 17 años de edad en los diferentes entornos a través de Medellín Te Quiere Saludable.

Observación B/P/S: Para el período se contó con un cumplimiento del indicador superior al 120% gracias a las actividades de gestión del riesgo en seguridad alimentaria y nutricional que se continuaron desarrollando en toda la vigencia.

SL33BG	**Estrategias de promoción de la salud implementadas**	**Número**	**1**	**0,93**	**93%**

Código. Ind. SUIFP: 190505400

Descripción B/P/S: Corresponde a: * Realizar intervenciones educativas en salud mental y convivencia social, SSR, VS CNT, VSCT, Seguridad alimentaria y nutricional. Saluda ambiental, SST, materno perinatal, enfoque étnico: (Salud mental, Salud sexual, Visa saludable, EVS, Vida saludable. Salud bucal, SAN, Salud ambiental, SST, Maternoperinatal, Enfoque étnico).

Observación B/P/S: Para el 2025 se dio un cumplimiento del 93% del indicador que equivale a 60477 actividades educativas en todas las dimensiones de la salud Pública.

Proyecto: 240234 -Fortalecimiento de capacidades técnicas en salud con enfoque en atención primaria y salud pública

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 80% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 90%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.600 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.594

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de investigación				
SL34BA Asistencias técnicas realizadas	**Número**	**60**	**61**	**102%**

Código. Ind. SUIFP: 190505000

Descripción B/P/S: Realizar asistencia técnica y evaluación en la implementación de las rutas integrales de atención a las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios –EAPB - e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPS-

Observación B/P/S: Para la vigencia 2025 se cumple con la meta del indicador en un 101% impactando 61 EAPB e IPS en temas de salud pública y atención primaria en salud.

SL34BB Asistencias técnicas realizadas	**Número**	**9.750**	**5.924**	**61%**

Código. Ind. SUIFP: 190505000

Descripción B/P/S: Realizar asistencia técnica y capacitaciones en la gestión integral de la salud pública y la atención primaria en salud a personal del área de la salud.

Observación B/P/S: Obtuvimos un cumplimiento del 61% frente a la meta planeada capacitando personal en salud en la gestión integral de la Salud pública y la atención primaria en salud, a través de las diferentes actividades de asesoría y asistencia técnica. No logramos la meta del año, sin embargo, para la próxima vigencia se ha generado un plan de mejora que nos permitirá a través del presupuesto asignado ampliar la cobertura en las estrategias a desarrollar.

Programa: 2.1.2 - Administración y gestión del aseguramiento en salud

Proyecto: **200174 -Administración de la prestación del servicio de salud a la población no afiliada sin capacidad de pago**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 94% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.128 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.056

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de Salud prestados a población pobre en lo no cubierto por subsidios.				
SL74DA Personas pobres con servicios de salud prestados.	**Porcentaje**	**25**	**25**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 190110000

Descripción B/P/S: Porcentaje correspondiente a la atención a demanda de la población pobre no asegurada- PPNA en el primer trimestre de la vigencia 2025 con recursos de reserva presupuestal de la vigencia 2024.

Proyecto: **240226 -Apoyo administrativo para la prestación de servicios de salud a la población pobre y vulnerable no afiliada**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 70% **Ejec. Financiera :** 47% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 59%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.700 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.259 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.016

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de atención en salud a la población				
SL26DA Personas atendidas con servicio de salud	**Número**	**12.600**	**8.838**	**70%**

Código. Ind. SUIFP: 190600400

Descripción B/P/S: Corresponde al numero de Población Pobre No Asegurada-PPNA atendidas con servicios de primer nivel de complejidad, según la facturación entregada por las Instituciones Prestadores de Servicios de Salud-IPS.

Observación B/P/S: Se realizó la auditoria de la prestación de servicios de salud, del mes de diciembre de 2025, en la red pública municipal de primer nivel de complejidad. El pago de las atenciones se realizará mes vencido. Durante el mes de diciembre de 2025 se atendieron 884 personas y al igual que durante todo el año 2025, fue menor a lo planeado, lo cual puede ser debido a la disminución a la demanda de los servicios de primer nivel de complejidad; por la afiliación de la PPNA, la regularización de los migrantes venezolanos o por el fenómeno migratorio (incremento del regreso de los migrantes a su país de origen).

Proyecto: 240227 -Fortalecimiento de la cultura de la seguridad social en salud

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 84% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 92%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 216 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 182

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación				
SL27FA Personas afiliadas al régimen subsidiado	**Número**	**2.000**	**2.000**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 190604400

Descripción B/P/S: Corresponde al número de personas sensibilizadas en cultura de la seguridad social.

Observación B/P/S: Se ejecutó y dio cumplimiento con la realización del evento de la Semana de seguridad social.

Proyecto: 240228 -Mantenimiento y gestión del aseguramiento en salud

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.426.492 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.563.281 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.561.261

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación				
SL28AA Personas afiliadas al régimen subsidiado	**Número**	**792.825**	**858.705**	**108%**

Código. Ind. SUIFP: 190604400

Descripción B/P/S: Número de personas efectivamente beneficiadas en la financiación de su aseguramiento por el proyecto. Se calcula el promedio de personas que mensualmente se encuentran con afiliación activa al régimen subsidiado, evidenciado en el informe estadístico de BDUA.

Observación B/P/S: A pesar de nuevas actividades de depuración, se obtuvo un incremento de los afiliados con corte al mes anterior, con lo que se continúa superando la meta.

Proyecto: 240229 -Fortalecimiento de la supervisión del acceso a los servicios de salud

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 69% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 85%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 350 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 422 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 292

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de auditoría y visitas inspectivas				
SL29BA Auditorías y visitas inspectivas realizadas	**Número**	**135**	**140**	**104%**

Código. Ind. SUIFP: 190301600

Descripción B/P/S: Realizar visitas de auditoría a las EPS y a las IPS que forman parte de la red para garantizar el acceso y la prestación de los servicios de salud, identificando barreras existentes, instaurando planes de mejoramiento y realizando seguimiento según los resultados.

Observación B/P/S: Se realizaron 3 visitas priorizadas, para un total de 140 visitas con corte a 31 de diciembre, se supera en 5 visitas, la meta del producto programado para esta vigencia, toda vez que esta mismas fueron visitas adicionales priorizadas por la Secretaria de salud, de acuerdo a la necesidad por situaciones que generaron barreras de acceso a la población, en las IPS de la ciudad.

Programa: 2.1.3 - Gestión del acceso a los servicios de salud

Proyecto: 180008 -Reposición - unidad hospitalaria buenos aires etapa ii fase ii

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 87% **Ejec. Financiera :** 66% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 77%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 259 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 171

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Infraestructura hospitalaria de nivel 2 construida y dotada				
SL08BC Infraestructuras hospitalarias de nivel 2 construidas y dotadas	**Número**	**1**	**0,87**	**87%**

Código. Ind. SUIFP: 190110700

Descripción B/P/S: Corresponde a Interventoría para continuar con el recibo de los ítems definidos en el estudio previo, así como de aquellos que serán adquiridos con los recursos generados por eficiencias.

Observación B/P/S: En la vigencia 2022 finalizó el proceso constructivo de la Unidad Hospitalaria Buenos Aires, con la terminación del contrato No. 4600096090 de 2022, cuyo alcance comprendía la adquisición de equipos y/o bienes para el fortalecimiento de la atención en salud de la zona centro-oriental. Con dicha finalización se dio por concluida la medición del indicador correspondiente. A la fecha de terminación del contrato, se registró un avance en las compras realizadas por parte de la ESE Metrosalud del 90,24 %, y un avance recibido y validado por la interventoría del 88,56 %.

Proyecto: 200198 -Fortalecimiento de la red pública para el acceso a los servicios de salud

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 89% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 95%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 909 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 813

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo para la dotación hospitalaria				
SL98BB Elementos de dotación hospitalaria adquiridos	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 190602600

Descripción B/P/S: Corresponde a brindar apoyo para el mejoramiento operativo del servicio de salud mental de Metrosalud, que requiere fortalecimiento.

Proyecto: 200200 -Fortalecimiento del sistema de emergencias médicas

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 88% **Ejec. Financiera :** 0% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 44%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 739 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de atención en salud pública en situaciones de emergencias y desastres				
SL00BA Personas en capacidad de ser atendidas	**Número**	**22.292**	**19.624**	**88%**

Código. Ind. SUIFP: 190503000

Descripción B/P/S: Corresponde a los pacientes que se requiere direccionar a través del Centro Integrado de Gestión al Acceso (CIGA).

Observación B/P/S: La meta reportada en el mes de enero corresponde solo a los pacientes orientados por ciga. Los pacientes atendidos por aph se reportan en el nuevo proyecto. La reserva se ejecutó en el mes de enero.

Proyecto: 240230 -Fortalecimiento de estrategias para el acceso a los servicios de salud

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 55.767 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 207.715 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 206.686

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

SL30BA	**Instituciones financiadas para la atención en salud a la població**	**Número**	**6**	**6**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 190603500

Descripción B/P/S: Corresponde a servicios o sedes de IPS públicas financiadas para el mejoramiento en el acceso a los servicios de salud (servicios de Salud Mental, Materno perinatal, Pediatría, y/o sedes CISAMF, E.S.E Metrosalud, Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín y/o HGM).

Observación B/P/S: Se ejecutaron convenios de desempeño 2025, para: fortalecer la gestión financiera y mejorar la oportunidad y acceso a los servicios de salud con: METROSALUD, HGM y CHICM.; y para mejorar el acceso a los servicios de salud materno perinatal, personas con problemas y trastornos mentales, y la sede Cisamf con Metrosalud.

Proyecto: 240231 -Fortalecimiento de la calidad en la prestación de servicios de salud

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 99% **Ejec. Financiera :** 74% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 86%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 400 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 451 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 332

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud				
SL31BA **Instituciones prestadoras de servicios de salud asistidas técnicamente**	**Número**	**200**	**214**	**107%**

Código. Ind. SUIFP: 190602900

Descripción B/P/S: Número de IPS y/o EAPB con asesoría y/o asistencia técnica sobre el mejoramiento de la calidad en salud.

Observación B/P/S: Se supero el indicador por encima de la meta establecida, debido a que se realizó asistencia técnica adicional a 14 sedes de la ESE Metrosalud, que no estaban programadas inicialmente, pero que se requirió a raíz de la visita de auditoría a la red de ips contratadas para la atención de la población no asegurada (PNA). Anexo calidoscopio.

SL31BB	**Documentos de evaluación realizados**	**Número**	**53**	**52**	**98%**

Código. Ind. SUIFP: 190604000

Descripción B/P/S: Número de sedes de las IPS contratadas, para la atención a la población PPNA, con seguimiento y evaluación de dicha atención.

Observación B/P/S: la planeación de visitas estaba programada hasta el mes de noviembre, se realizaron durante el año 52 de las 53 visitas programadas a la red contratada a la cual asiste la población no asegurada, no se realizó la visita del centro de salud de campo Valdés en cual se encontraba cerrado durante el año sin atenciones a usuarios.

Proyecto: 240232 -Desarrollo de la estrategia del sistema de emergencias médicas

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 86% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 93%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 22.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 31.360 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 27.026

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción a la participación ciudadana				
SL32BA **Personas atendidas en centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres**	**Número**	**22.225**	**26.111**	**117%**

Código. Ind. SUIFP: 190504200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas atendidas que ingresan a través del número único de seguridad de emergencias 123-CRUE Medellín como consecuencia de accidentes de tránsito, emergencias médicas, emergencias y desastres de origen natural y antrópico.

Observación B/P/S: El valor que se reporta es dinámico teniendo en cuenta que no es posible proyectar la ocurrencia de un número exacto de accidentes de tránsito, emergencias médicas y/o desastres mensuales y depende de factores coyunturales. De esa forma y como se explicó en la observación de seguimiento: "El número de atenciones es mayor al presupuestado debido al aumento progresivo de población, vehículos y la falta de políticas consistentes, principalmente de movilidad". El resultado demuestra que mediante la eficiencia del recurso se logró atender más eventos de los presupuestados. Anexo informe mensual de gestión de la central de monitoreo para la referencia, contra referencia y atención de urgencias En el nuse-123- Modulo salud

Programa: 2.1.4 - Vigilancia en salud pública

Proyecto: **200209 -Implementación de la estrategia en vigilancia epidemiológica de eventos de interés en salud pública**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 88% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 94%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.171 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.035

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de vigilancia y control de las políticas y normas técnicas, científicas y administrativas expedidas por el Mini				
SL09CA Entidades territoriales con vigilancia y control realizados	**Número**	**5**	**5**	**100%**
Código. Ind. SUIFP: 190305000				
Descripción B/P/S: Corresponde a las actividades de cooperación técnica, referencias técnicas brindadas a las UPGD de la ciudad, publicaciones y comités de vigilancia (COVE MUNICIPAL, IAAS y PROA).				
SL09CB Acciones y medidas especiales ejecutadas	**Número**	**1.465**	**1.465**	**100%**
Código. Ind. SUIFP: 190301500				
Descripción B/P/S: Corresponde a actividades de vigilancia epidemiológica en el entorno comunitario (IEC, evento TBFR, evaluación neurológica, seguimiento a contactos, BAC, BAI, entrega de medicamentos, análisis de morbimortalidad, muestras, punto de vacunación y monitoreo, visitas a poblaciones especiales, vigilancia intensificada de lesiones por pólvora, Vigilancia Centinela y de los eventos maternoperinatales y de infancia).				
SL09CC Productos de comunicación difundidos	**Número**	**21**	**21**	**100%**
Código. Ind. SUIFP: 190304700				
Descripción B/P/S: Corresponde a los Comités de vigilancia epidemiológica comunitarios en las 16 comunas y 5 corregimientos, socializar el comportamiento de los EISP y la ejecución de programas y proyectos de salud pública, Estrategia Par Comunitario.				
SL09CD Informes de evento generados en la vigencia	**Número**	**1**	**1**	**100%**
Código. Ind. SUIFP: 190303100				
Descripción B/P/S: Corresponde a estudios de brote, vigilancia en eventos y acciones emergentes no previsibles que ponen en riesgo la salud pública, comunicación del riesgo y gestión de Información de muestras en SIVIGILA.				

Proyecto: **240235 -Control, eliminación y erradicación de los eventos de interés en salud pública (eisp) y de las emergencias de salud pública de interés internacional (espii)**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 83% **Ejec. Financiera :** 92% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 87%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 7.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 10.740 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 9.833

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de investigación				
SL35AA Asistencias técnicas realizadas	**Número**	**682**	**348**	**51%**
Código. Ind. SUIFP: 190505000				
Descripción B/P/S: Corresponde a las visitas de Cooperación técnica en las Unidades Primarias Generadoras de Datos UPGD para garantizar la vigilancia Epidemiológica de acuerdo a los lineamientos del Instituto Nacional de Salud.				

Observación B/P/S: El avance corresponde a las visitas de Cooperación técnica realizadas a las Unidades Primarias Generadoras de Datos UPGD IPS del Distrito para el acompañamiento técnico y la gestión de los 109 eventos de interés en salud pública. La ejecución de las actividades está sujeta a notificación de dichos eventos de interés en salud pública. Se registra una ejecución por debajo del 100% por situaciones extraordinarias relacionadas con brotes epidemiológicos (ej. Tosferina, Mpox, dengue, varicela) y otros eventos que requirieron investigaciones de campo y acciones inmediatas de salud pública, lo cual implicó reorientar el recurso humano y operativo hacia la contención y análisis de dichos brotes, reduciendo la disponibilidad para las visitas programadas.

SL35AB	**Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas**	**Número**	**22.535**	**27.918**	**124%**

Código. Ind. SUIFP: 190502700

Descripción B/P/S: Corresponde a las intervenciones de vigilancia epidemiológica, prevención y control para los diferentes eventos inmunoprevenibles, como investigaciones epidemiológicas de campo, toma de muestras, búsqueda activa comunitaria, entre otras.

Observación B/P/S: El avance corresponde a la vigilancia epidemiológica en los entornos familiar, institucional y comunitario (se realizan investigaciones epidemiológicas de campo por médico y profesional, evaluación neurológica, seguimiento a contactos, búsquedas activas comunitarias, Búsqueda activa institucional en todos las clínicas, hospitales y Unidades informadoras del Distrito, toma de muestras de eventos de interés en salud pública, gestión del punto de vacunación de bloqueo y monitoreo de vacunación, visitas a poblaciones especiales incluidas las estaciones de policía, cárceles, ancianatos, albergues y la vigilancia intensificada de lesiones por pólvora así como la Vigilancia Centinela de infección respiratoria aguda del Distrito). La ejecución de las actividades está sujeta a notificación de los eventos de interés en salud pública. Corresponde a las Intervenciones de vigilancia epidemiológica prevención y control para los diferentes eventos inmunoprevenibles.

SL35AC	**Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas implementadas**	**Número**	**248**	**261**	**105%**

Código. Ind. SUIFP: 190502600

Descripción B/P/S: Corresponde a las intervenciones de vigilancia epidemiológica prevención y control para las diferentes enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas. Comprende la vigilancia epidemiológica en los entornos familiar, institucional y comunitario, propiciando el diagnóstico oportuno, la adherencia al tratamiento, cortar cadenas de transmisión, mitigar el daño, y reducir la mortalidad evitable.

Observación B/P/S: Avance corresponde a las acciones de vigilancia epidemiológica para la atención de los brotes de eventos de interés en salud pública ocurridos en los entornos familiar, institucional y comunitario propiciando el diagnóstico oportuno, la adherencia al tratamiento, cortar cadenas de transmisión, mitigar el daño, y reducir la mortalidad evitable. La ejecución de las actividades está sujeta a notificación de los eventos de interés en salud pública.

SL35AD	**Entidades territoriales con servicio de suministro de insumos para el manejo de eventos de interés en salud pública**	**Número**	**2.202**	**1.243**	**56%**

Código. Ind. SUIFP: 190502900

Descripción B/P/S: Entrega de medicamentos (profilaxis, vacunas y tratamientos) a pacientes y/o contactos. Incluye la gestión de insumos del PAI para su almacenamiento, dispensación y aplicación, la compra y dispensación de medicamentos para profilaxis, tratamiento para la pediculosis, entre otros, y la disposición de elementos e insumos necesarios para la bioseguridad.

Observación B/P/S: El avance corresponde a las actividades de dispensación y entrega de medicamentos e insumos (vacunas PAI, tratamientos (tuberculosis, malaria, leishmania, hansen, IRAG) y profilaxis (antibióticos indicados para cortar cadenas de transmisión acorde al evento intervenido) en individuos, familias e instituciones de Salud del Distrito acorde a los protocolos de vigilancia epidemiológica del INS y guías de manejo del Ministerio de Salud. La ejecución de las actividades está sujeta a notificación de los eventos de interés en salud pública. Se registra una ejecución por debajo del 100% por situaciones extraordinarias. Relacionadas con brotes epidemiológicos (ej. Tosferina, Mpox, dengue, varicela) y otros eventos que requirieron investigaciones de campo y acciones inmediatas de salud pública, lo cual implicó reorientar el recurso humano y operativo hacia la contención y análisis de dichos brotes.

SL35AE	**Estrategias de promoción de la participación social en salud implementadas**	**Número**	**11**	**11**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 190504900

Descripción B/P/S: Comités de Vigilancia Epidemiológica COVECOM y ReVcom. Articulación con la comunidad que favorece el intercambio educativo relacionado con eventos de interés en salud pública. El objetivo de la REVCOM es dar respuesta al lineamiento nacional mediante el cual personas de la comunidad pueden identificar síntomas que se consideran señales de posibles eventos de interés en salud pública.

Observación B/P/S: El avance corresponde a las actividades realizadas en la comunidad para la identificación y prevención de riesgos relacionados con eventos de interés en salud pública y su participación en el sistema de vigilancia epidemiológica del Distrito, se incluyen las 16 comunas y los 5 corregimientos.

SL35AF	**Personas en capacidad de ser atendidas**	**Número**	**700**	**533**	**76%**

Código. Ind. SUIFP: 190503500

Descripción B/P/S: Corresponde a las actividades de vigilancia en eventos y acciones emergentes no previsibles que ponen en riesgo la salud pública. Actividades que la Secretaría de Salud solicite para la atención de alertas o emergencias epidemiológicas, condiciones de riesgo, vigilancia de nuevos eventos. Incluye la compra de insumos, medicamentos y biológicos o apoyo logístico para las actividades de terreno.

Observación B/P/S: El avance corresponde a las estrategias realizadas para la identificación, prevención y gestión del riesgo en salud publica dirigido a eventos con potencial epidémico o pandémico que ponen en riesgo la salud colectiva que ocurren de manera imprevista en el Distrito. La ejecución de las actividades está sujeta a notificación de los eventos de interés en salud pública. Se registra una ejecución por debajo del 100% por situaciones extraordinarias relacionadas con brotes epidemiológicos (ej. Tosferina, Mpox, dengue, varicela) y otros eventos que requirieron investigaciones de campo y acciones inmediatas de salud pública, lo cual implicó reorientar el recurso humano y operativo hacia la contención y análisis de dichos brotes, reduciendo la disponibilidad para las visitas programadas.

SL35AG	**Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas**	**Número**	**12**	**12**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 190502100

Descripción B/P/S: Visitas de cooperación técnica a UPGD en eventos de interés en salud pública materno perinatales (mortalidad y morbilidad materna extrema, defectos congénitos, mortalidad perinatal y neonatal tardía, sífilis gestacional, sífilis congénita, transmisión materno infantil de VIH y hepatitis B, mortalidad en menor de cinco años por infección respiratoria aguda, enfermedad diarreica aguda y desnutrición).

Observación B/P/S: El avance corresponde al análisis de la información para la gestión del riesgo de los eventos materno perinatales y la vigilancia integrada de la mortalidad en menores de 5 años, unidades de análisis, asistencia técnica a instituciones, seguimiento a casos de gestantes con morbilidad extrema y mortalidad materna, sífilis congénita, hepatitis B, transmisión de VIH materno perinatal, hipotiroidismo congénito, defectos congénitos y desnutrición en menores de 5 años. La ejecución de las actividades está sujeta a notificación de los eventos de interés en salud pública

Programa: 2.1.5 - Salud ambiental

Proyecto: 200204 -Desarrollo de la estrategia de prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 85% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 93%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 493 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 420

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonos					
SL04CA	**Municipios con acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis realizadas**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 190303800

Descripción B/P/S: Corresponde a la ejecución de acciones de promoción, prevención, vigilancia y control en: ZOONOSIS (vacuna antirrábica ; seguimiento agresión rábica, visitas

Proyecto: 200205 -Desarrollo de la estrategia de gestión integral de riesgos sanitarios

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 78% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 89%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 454 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 354

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de auditoría y visitas inspectivas					
SL05CB	**Auditorías y visitas inspectivas realizadas**	**Número**	**89**	**89**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 190301600

Descripción B/P/S: corresponde a: visitas Instalaciones Acuáticas de Inmersión y Estructuras Similares =950; visitas IVC con seguridad química=210; visitas IV almacenamiento agua consumo humano=270; visitas de inspección ocular de factores de seguridad sanitaria=9850.

Proyecto: 240242 -Control de factores de riesgo asociados a vectores y zoonosis que afectan la salud

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 63% **Ejec. Financiera :** 74% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 69%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.063 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.159 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.085

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
SL42AA Municipios con acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis realizadas	**Número**	**1**	**0,63**	**63%**

Código. Ind. SUIFP: 190305700

Descripción B/P/S: Corresponde a la ejecución de acciones de promoción, prevención, vigilancia y control en: ZOONOSIS (vacuna antirrábica ; casos seguimiento agresión rábica, visitas IV sanitaria_veteri_afines, visitas IVC - Inspección vigilancia y control - Roedor) y VECTORES (vigilancia entomovirologica, vectores transmisores enfermedades , PYP enfermedades vectoriales).

Observación B/P/S: Se cumple la meta programada inicialmente de 110.000 animales a vacunar, 800 visitas de inspección y vigilancia a establecimientos veterinarios y afines y 1500 inspecciones a sectores críticos con presencia de roedores, para la vigencia 2025. Se planeó una ejecución adicional, ampliando de esta manera la meta, pero no fue posible ejecutar el recurso. No fue posible el recurso para la ampliación de la meta/ Se realizaron acciones de vigilancia entomovirológica con la identificación de mosquitos y evaluación viral de adultos, monitoreo de ovitrampas y levantamiento de índices entomológicos. Dado que la incidencia de dengue cayo un 70 % con respecto al año 2024, con lo que disminuyó la demanda, disminuyó la actividad de control, afectando el avance en el producto.

Proyecto: 240243 Implementación de la politica integral de salud ambiental

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 88% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 94%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.117 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.239 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.085

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de implementación de estrategias para el fortalecimiento del contro social en salud				
SL43BA Estrategias para el fortalecimiento del control social en salud implementadas	**Número**	**3**	**3**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 190302500

Descripción B/P/S: Corresponde a las estrategias de implementación de la PISA, Análisis de los efectos en salud asociados a condiciones ambientales, movilización social y promoción y prevención de los efectos en salud por condiciones ambientales y sanitarias.

Observación B/P/S: En 2025 se realizó seguimiento a la política integral de salud ambiental, simposio de salud ambiental y se avanzó en la construcción de la agenda en salud ambiental. también se realizó el análisis de los efectos en salud asociados a ruido y calidad del aire. Se realizaron tomas culturales sobre el ruido y asesoría y asistencia técnica a las IPS sobre ruido y salud.

SL43BB Auditorías y visitas inspectivas realizadas	**Número**	**6.333**	**8.203**	**130%**

Código. Ind. SUIFP: 190301600

Descripción B/P/S: Corresponde a las visitas para intervenir factores de riesgo sanitarios y ambientales relacionados con ruido, seguridad química y el entorno.

Observación B/P/S: 8 visitas ruido y 1 medición con su respectivo informe / se realizaron 16 visitas en atención a solicitudes sanitarias / Se realizaron 9 visitas en seguridad química.

Proyecto: 240244 Implementación de la inspección, vigilancia y control de factores de riesgos en salud a sujetos de interes sanitario

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 81% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 91%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.320 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.471 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.635

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Servicio de vigilancia y control sanitario de los factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios q

SL44BA	**Municipios especiales 1,2 y 3 con vigilancia y control sanitario real y efectivo en su jurisdicción, sobre los factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que pueden generar riesgos para la población realizados**	**Número**	**1.630**	**1.672,09**	**103%**

Código. Ind. SUIFP: 190304200

Descripción B/P/S: corresponde a realizar: IV sanitario factores de riesgo en establecimientos y espacios de competencia; gestión de la recolección y disposición productos decomisados en establecimientos abiertos al público; apoyo logístico en transporte para IVC; apoyo logístico telefo_Celu para IVC; gestión de insumos de preimpresos para IVC; procesos sancionatorios y notificación a establecimientos infractores.

Observación B/P/S: se realizan 174 visitas a establecimientos y espacios de uso y consumo de bienes y/o servicios con factores de riesgo asociados a alimentos, bebidas y condiciones ambientales.

SL44BB	**Auditorías y visitas inspectivas realizadas**	**Número**	**2.093**	**2.214**	**106%**

Código. Ind. SUIFP: 190301600

Descripción B/P/S: corresponde a realizar: visitas IV a establecimientos generadores de residuos; IV a Instalaciones Acuáticas de Inmersión; IV sistemas abastecimiento de agua para consumo humano.

Observación B/P/S: En noviembre se cumplió la meta de 1200 establecimientos generadores de residuos visitados en la vigencia 2025. Se realizaron 901 visitas de IVC a estructuras de agua de uso recreacional, teniendo en cuenta adición entre el 13 de agosto y 30 de octubre y contrato de vigencia futura entre el 5 de noviembre y el 31 de diciembre de 2025. Además, se cumple las meta de 113 visitas a tanques de almacenamiento de agua para consumo humano.

SL44BC	**Análisis realizados**	**Número**	**2.504**	**2.637**	**105%**

Código. Ind. SUIFP: 190300700

Descripción B/P/S: Corresponde a realizas: tomas muestras y análisis microbiológico calidad agua consumo humano; tomas muestras de agua y análisis microbiológico calidad agua uso recreativo.

Observación B/P/S: En la vigencia 2025 se logró realizar 1767 muestras de agua para consumo humano, que corresponden a 1649 en acueductos y 118 en tanques de almacenamiento, teniendo en cuenta adición a contrato entre el 13 de agosto y 30 de octubre y contrato de vigencia futura entre el 5 de noviembre y el 31 de diciembre de 2025.

SL44BD	**Productos de comunicación difundidos**	**Número**	**64**	**107**	**167%**

Código. Ind. SUIFP: 190304700

Descripción B/P/S: Corresponde a realizar: capacitaciones en normatividad sanitaria y riesgos a la salud por condiciones sanitarias y ambientales para la comunidad.

Observación B/P/S: se presenta una sobre ejecución por la alta solicitud de capacitación por parte de los comerciantes, que conllevó al aumento en la cantidad planeada inicialmente, sobre pasando las 64 capacitaciones planteadas para el año, realizando actividades no solo por oferta sino también por demanda y ajustando los temas según las necesidades de la ciudadanía, beneficiando a más personas.

Programa: 2.1.6 - Gobernanza para la salud

Proyecto: **200208 -Desarrollo de tecnologías de información e innovación en salud**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 808 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 808

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información actualizado				
SL08CB Sistemas de información actualizados	**Número**	**0,1**	**0,1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Corresponde al porcentaje faltante para finalizar la ejecución física de la plataforma CIGA Teleorientación.

Observación B/P/S: El avance corresponde a la plataforma CIGA – Teleorientación recibida y que se encuentra en el ambiente productivo del Distrito.

Proyecto: 240236 -Desarrollo de estrategias de participación social en salud y gestión social del conocimiento

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 84% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 92%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.400 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.781 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.503

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
SL36AA Estrategias de promoción de la participación social en salud implementadas	**Número**	**5**	**5**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 190504900

Descripción B/P/S: Corresponde al promedio ponderado del avance del plan de acción de la Política de participación social en salud en los 5 ejes, donde cada eje tiene un peso porcentual del 20%.

Observación B/P/S: Se garantiza el cumplimiento del 100% de las acciones de la política integral de participación social en salud en los 5 ejes.

Proyecto: 240238 -Implementación del plan de transición en salud como distrito de ciencia, tecnología e innovación

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 52% **Ejec. Financiera :** 19% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 35%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 7.131 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.131 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.342

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de información implementados				
SL38AA Sistemas de información implementados	**Número**	**1**	**0,52**	**52%**

Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Corresponde al avance de los hitos que se deben cumplir para el desarrollo e implementación de los módulos que conforman el SIISMED, a saber: Identificación y priorización necesidades, ingeniería de requisitos , vigencias futuras, contratación, seguimiento.

Observación B/P/S: El avance del semestre corresponde a las gestiones realizadas para obtener la autorización de comprometer Vigencias Futuras (Acuerdo Distrital 034 de 2025) y a los trámites necesarios para adelantar el proceso de contratación mediante licitación pública, liderado por la Secretaría de Innovación Digital (SID). Como resultado, el contrato fue adjudicado mediante la Resolución N.° SSS 202550081515 del 3 de octubre de 2025, y se suscribió el Contrato N.° 4600105966, cuyo objeto es la adquisición de servicios para el desarrollo, evolución e implementación del Sistema de Información Integrado de Salud de Medellín (SIISMED). Este contrato se firmó el 17 de octubre e inició el 24 del mismo mes. Tras su inicio, se llevaron a cabo mesas de trabajo de jornada completa entre la Secretaría de Salud, el proveedor TASS y la SID, con el fin de abordar cada uno de los módulos del SIISMED. En estas sesiones se realizó el refinamiento de las historias de usuario y el user story mapping, asegurando que cada requerimiento quedara claramente definido, estimado y comprendido. No se alcanza un avance del 100 % en la presente vigencia, dado que el desarrollo e implementación de los módulos se encuentra alineado al cronograma de entregables, el cual establece los hitos de desarrollo para cada módulo y cuya ejecución está programada para las siguientes vigencias. Al cierre de la vigencia, se espera contar con el cronograma de entregables que establecerá los hitos de desarrollo para cada uno de los módulos funcionales durante las vigencias 2026 y 2027 del proyecto.

Proyecto: 240239 -Apoyo administrativo y logístico en la gestión de estrategias en salud

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 88% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 94%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.649 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.218

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
SL39DA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Corresponde a una entidad asistida técnicamente con respuesta a requerimientos jurídicos, comunicacionales y requerimiento en transporte.

Observación B/P/S: La asistencia técnica se ha desarrollado a través de los contratos suscritos, en cumplimiento de la planeación establecida, garantizando la ejecución oportuna de las actividades programadas y el logro de los resultados esperado.

Proyecto: 240240 -Administración de los datos, información y conocimiento en salud

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 95% **Ejec. Financiera :** 90% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 92%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.875 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.574

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información actualizado				
SL40BA Sistemas de información actualizados	**Número**	**55,39**	**52,74**	**95%**

Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Corresponde a la disponibilidad que tiene el proyecto para cubrir la administración y operación de los componentes de información y conocimiento en salud durante los 12 meses del año, teniendo en cuenta que se debe realizar de forma continua.

Observación B/P/S: Corresponde a la disposición del recurso durante 95,2% del año, para la administración y operación de las herramientas de información y el conocimiento disponibles en la UGIC-SSM, y para realizar acciones de asesoría, asistencia técnica y capacitación, tendientes al mejoramiento continuo de los registros de información, que permitió dar respuesta oportuna y adecuada a los requerimientos misionales de obligatorio cumplimiento y a los relacionados con la gestión de la información y el conocimiento.

Proyecto: 240241 -Fortalecimiento de infraestructura e interoperabilidad para las tecnologías de información en salud

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 50% **Ejec. Financiera :** 74% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 62%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 585 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 435

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
SL41BA Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	**Porcentaje**	**20**	**10**	**50%**

Código. Ind. SUIFP: 230210100

Descripción B/P/S: Corresponde al porcentaje ponderado de dos acciones: adquisición de componentes tecnológicos y el soporte y mantenimiento de las plataformas tecnológicas que se vienen desarrollando en la Secretaría de Salud.

Observación B/P/S: El avance del 50% corresponde al componente de soporte y mantenimiento de las plataformas, que fue realizado mediante el contrato 4600105172 de 2025 ejecutado y supervisado por la Secretaría de Innovación Digital- SID. El componente de adquisición de equipos tecnológicos, que representa el otro 50% de la meta, no presentó avances ni ejecución financiera, toda vez que, de acuerdo a la Resolución No.202550085446 del 22 de octubre de 2025 publicado en SECOP II, el proceso de selección No. 9015726 de 2025 fue declarado desierto, lo que implicó la devolución del CDP mediante oficio rad 202520204864 del 30 de octubre.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente

Componente: 2.1 - Salud para el bienestar físico y mental

Programa: 2.1.6 - Gobernanza para la salud

Proyecto: 230052 -24pp99-prevención de la enfermedad y promoción de la salud en la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.210 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.085

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales				
SL52CB **Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales implementadas**	**Número**	**1,2**	**1,2**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 190502200

Descripción B/P/S: Corresponde a implementar estrategias de Información, Educación, Comunicación y Movilización (IEC-M), autocuidado de la salud mental en Convivencia en familias y sus entornos.

SL52CC **Campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas implementadas**	**Número**	**0,49**	**0,49**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 190502000

Descripción B/P/S: Corresponde a realizar campañas de prevención en el consumo de sustancias psicoactivas.

SL52CE **Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes implementadas**	**Número**	**7,74**	**11,43**	**148%**

Código. Ind. SUIFP: 190502300

Descripción B/P/S: Corresponde a la ejecución las siguientes estrategias: Salud Visual y Salud Oral (Ortodoncia preventiva, Prótesis dental y placas de Bruxismo).

Observación B/P/S: Se ejecutó el 100% las estrategias de salud visual, ortodoncia preventiva, prótesis dental y placas de bruxismo.

SL52CG **Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas**	**Número**	**0,33**	**0,33**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 190503100

Descripción B/P/S: Corresponde a realizar la ejecución de las estrategias de Estilos de Vida Saludable y familias cuidadores de discapacidad, para dar orientaciones a las personas en EVS.

Proyecto: 250010 -25pp99-prevención de la enfermedad y promoción de la salud en la ciudad medellin, antioquia

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 76% **Ejec. Financiera :** 79% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 78%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 41.980 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 33.100

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalente				
SL10DA **Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes implementadas**	**Número**	**55**	**40**	**73%**

Código. Ind. SUIFP: 190502300

Descripción B/P/S: Corresponde a la ejecución las siguientes estrategias: Salud Visual y Salud Oral (Ortodoncia preventiva y Prótesis Dental).

Observación B/P/S: Estrategia Salud Visual: Se han realizado actividades de consultas y entrega de lentes y monturas en las comuna 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 50, 60 y 70 se reprograman actividades en las comunas 11, 12, 13, 15 y 80 para la vigencia 2026. Estrategia Ortodoncia: se han realizado 5987 impresiones, 5974 instalación de aparatos ortodónticos y 9723 controles. Estrategia Prótesis Dentales: se han realizado 12182 evaluaciones de pacientes, se han realizado 10237 impresiones y se ha logrado instalar 2709 prótesis.

SL10DB **Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales implementadas**	**Número**	**24**	**15**	**63%**

Código. Ind. SUIFP: 190502200

Descripción B/P/S: Corresponde a implementar estrategias de Información, Educación, Comunicación y Movilización (IEC-M), autocuidado de la salud mental en Convivencia en familias y sus entornos (Escuchaderos y Familias Fuertes y Resilientes).

Observación B/P/S: Estrategia de Familias Fuertes y Resilientes: se están desarrollando las acciones de salud mental de acompañamientos familiares e individuales con 16695 actividades realizadas. La estrategia de Escuchaderos se encuentra en ejecución de las intervenciones individuales y acciones educativas con 5567 intervenciones.

SL10DC	**Campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas implementadas**	**Número**	**6**	**4,05**	**68%**

Código. Ind. SUIFP: 190502000

Descripción B/P/S: Corresponde a realizar campañas de prevención en el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes y jóvenes.

Observación B/P/S: La estrategia de Centro de Escucha - Prevención de Adicciones se encuentra en ejecución realizando actividades de enganche, Articulaciones, conversatorios, Asesorías técnicas, Formación a promotores, Formación a colectivos, pache sano y Salud mental.

SL10DD	**Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas**	**Número**	**16**	**12**	**75%**

Código. Ind. SUIFP: 190503100

Descripción B/P/S: Corresponde a realizar la ejecución de las estrategias de Estilos de Vida Saludable y Medellín Te Quiere Saludable, donde se fortalecen las capacidades de la población en los estilos vida saludables para tener una más cuerpo sano.

Observación B/P/S: Estrategia de Estilos de Vida Saludable se encuentra desarrollando las actividades del componente de formación, curso de reflexología y diplomados, se dio inició a las salidas pedagógicas, se están realizando los encuentros de iniciativas saludables, a la fecha se han impactado a 11431 personas, se aclara que, hay un incremento en la meta de beneficiarios por actividades como activaciones, iniciativas comunitarias, navidades saludables y campaña EVS. Estrategia de Medellín Te Quiere Saludable MTQS: Se están realizando las acciones de caracterización y gestión de familias impactado a 3412 personas.

SL10DE	**Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas**	**Número**	**14**	**11**	**79%**

Código. Ind. SUIFP: 190502700

Descripción B/P/S: Corresponde a la ampliación del biológico para prevenir la enfermedad asociadas al Neumococo para personas mayores de 50 años

Observación B/P/S: Estrategia Adherencia a Tratamiento de Tuberculosis: se han realizado 5 entregas de complemento nutricional a 826 personas para fortalecer la adherencia al tratamiento. Estrategia Vacunación: terminado, ejecución 100%, se aplicaron los biológicos de neumococo superando la meta proyectada, impactando a 4015 personas.

SL10DF	**Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas**	**Número**	**8**	**8**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 190502100

Descripción B/P/S: Los Centros de Escucha favorecen la apropiación de información general en sexualidad, salud sexual y reproductiva, promoviendo la prevención de infecciones de transmisión sexual ITS/VIH-SIDA, con el uso adecuado del preservativo y orientar sobre las diferentes rutas de acceso a servicios y la prevención de violencias sexuales en adolescentes y jóvenes.

Observación B/P/S: Ejecución en 100% de las estrategias de Sexualidad sin estigmas (CE-SSR) y Prevención de Violencias Sexuales. La estrategias de Sexualidad sin estigmas (CE-SSR) mediante actividades de pruebas rápidas de VIH y SIFILIS, acciones educativas y tomas de ciudad se impactan a 3200 personas. Prevención de violencias Sexuales mediante las actividades de encuentros con estudiantes, padres y docentes se impactan a 2400 personas.

SL10DG	**Documentos de evaluación realizados**	**Número**	**14**	**11**	**79%**

Código. Ind. SUIFP: 190505300

Descripción B/P/S: El fortalecimiento de la participación social en salud, la planeación participativa en salud y el desarrollo e implementación de un sistema de gestión territorial en salud basada en comunidad, los cuales se construyen con la participación de las comunidades, los diferentes sectores y actores con enfoque diferencial, para generar conciencia sobre unas problemáticas que son de interés común y se unen para diseñar y poner en práctica las soluciones o acciones a seguir.

Observación B/P/S: Estrategia de Estilos de Vida Saludable se encuentra desarrollando las actividades del componente de formación, curso de reflexología y diplomados, se dio inició a las salidas pedagógicas, se están realizando los encuentros de iniciativas saludables, a la fecha se han impactado a 11431 personas, se aclara que, hay un incremento en la meta de beneficiarios por actividades como activaciones, iniciativas comunitarias, navidades saludables y campaña EVS. Estrategia de Medellín Te Quiere Saludable MTQS: Se están realizando las acciones de caracterización y gestión de familias impactado a 3412 personas.

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: **200176** **-Desarrollo de estrategias de promoción de la afiliación al sistema general de seguridad social**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 23 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5

Proyecto: **200212** **-Fortalecimiento de la vigilancia del acceso a los servicios de salud**

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 33	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 13

Proyecto: 200201 -Control de los riesgos en salud en establecimientos abiertos al público

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 290	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 235

Proyecto: 200197 -Fortalecimiento de la gestión territorial en salud basada en comunidad

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 21	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 17

Proyecto: 200206 -Administración de los sistemas de información en salud medellín


Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 933	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 933


Proyecto: 200213 -Asistencia técnica para la gestión de estrategias en salud


Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 158	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 155


Secretaría de Inclusión Social y Familia


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2025

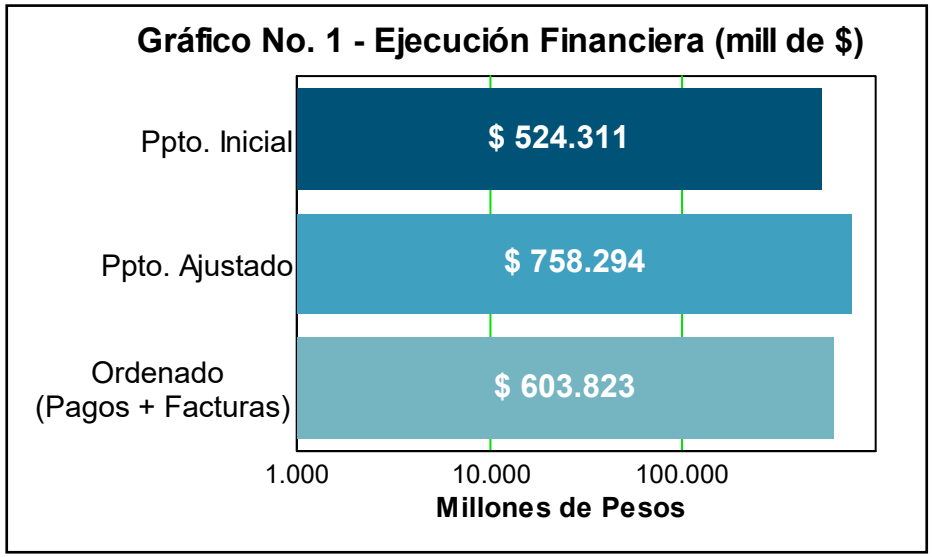

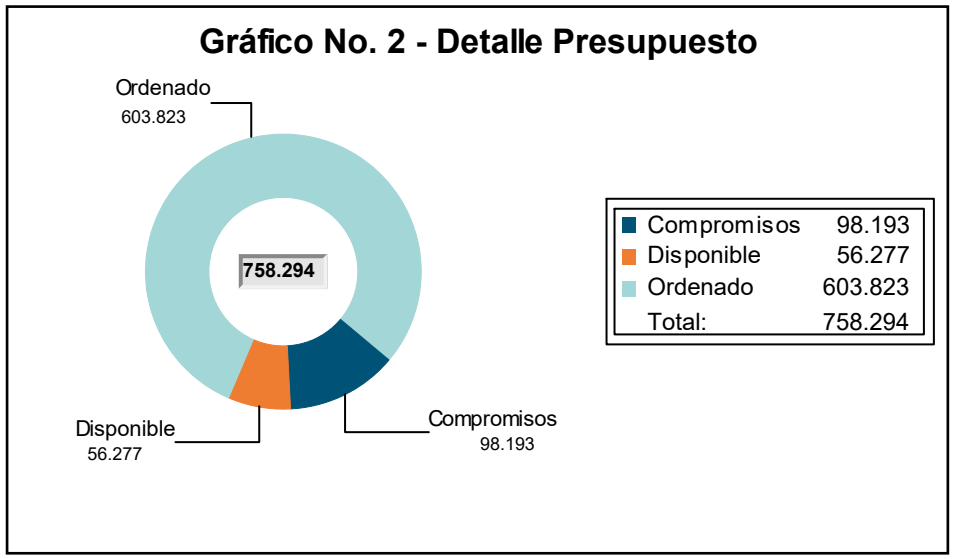

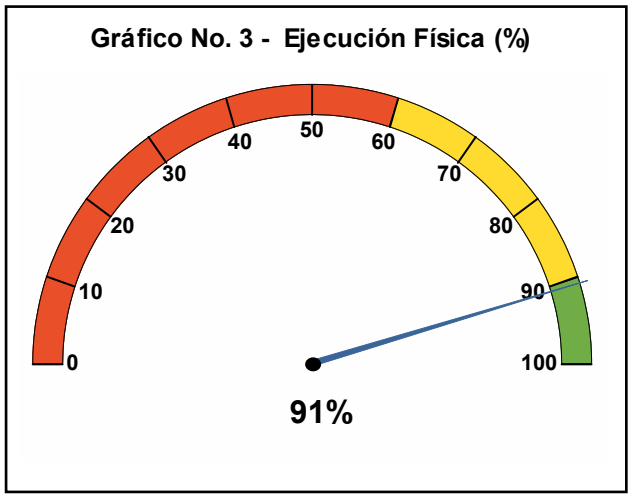

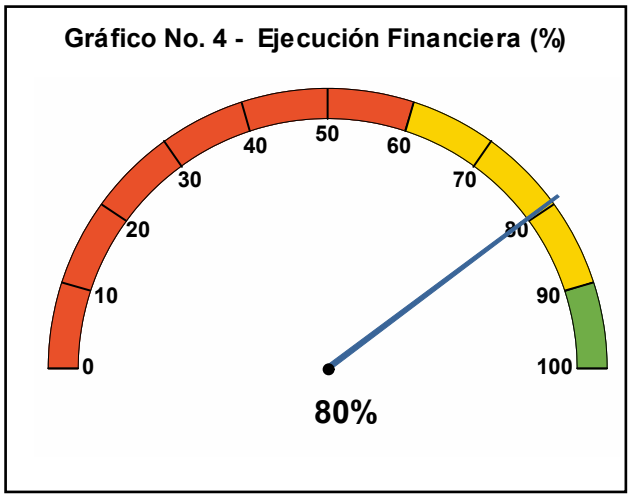

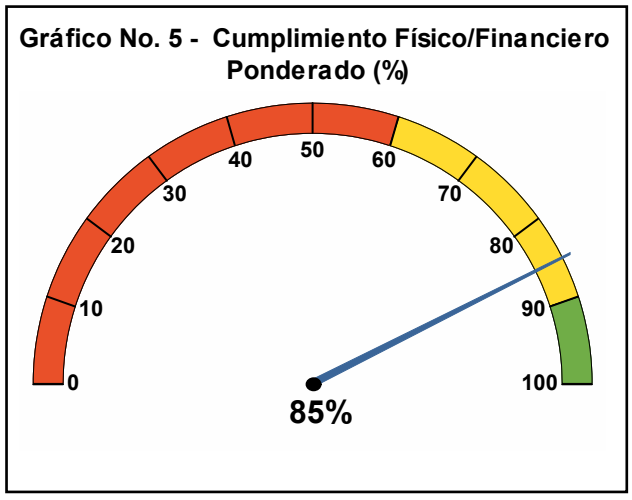

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente
Componente: 2.2 - Medellín territorio incluyente
Programa: 2.2.1 - Familias con bienestar y oportunidades

Proyecto: **200196 - Implementación de la estrategia gestores territoriales sociales**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 52% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 76%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 783 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 406

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza					
IS96AH	**Hogares con acompañamiento familiar**	**Número**	**5.066**	**5.066**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 410305000

Descripción B/P/S: Corresponde al acompañamiento familiar para el mejoramiento de condiciones de vida

Observación B/P/S: En el año 2025, se brindó acompañamiento familiar y acercamiento de oportunidades a 5.066 hogares de las comunas y corregimientos del Distrito, para el mejoramiento de sus condiciones de vida. Esta ejecución se realizó con recursos de reserva de la vigencia 2024.

IS96AI	**Personas asistidas en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas**	**Número**	**360**	**360**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 410300900

Descripción B/P/S: Acompañamiento psicosocial para el fortalecimiento familiar y el buen vivir (CIF).

Observación B/P/S: En el año 2025, 360 personas fueron beneficiadas con acompañamiento psicosocial en los Centros Integrales para la Familia, para mejorar su dinámica familiar y buen vivir. Esta ejecución se realizó con recursos de reserva de la vigencia 2024.

Observación Proyecto: El resultado de la baja ejecución financiera, se explica por las novedades en la contratación del talento humano, y la eficiencia de algunos recursos logísticos; lo que generó un mejor desempeño en la ejecución física, logrando el cumplimiento de las metas propuestas en dicho periodo.

Proyecto: **200223 - Asistencia técnica a la gestión de las estrategias sociales**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.061 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.044

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Sedes adecuadas					
IS23CG	**Sedes adecuadas**	**Número**	**15**	**15**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459901100

Descripción B/P/S: Corresponde al número de bienes inmuebles a cargo de la Secretaría de Inclusión Social y Familia con mantenimiento, renovación o adecuación a la infraestructura.

Observación B/P/S: En el año 2025, se realizaron acciones enfocadas a la ejecución de obras eléctricas, mediante el contrato de obra No. 46000102572 de 2024, en quince (15) sedes adscritas a la Secretaría de Inclusión Social y Familia: Colonia Belencito, Belén las Playas, Seguridad Alimentaria, Centro Afro - Gerencia Étnica, Sede Diversidad Sexual y de Género - Gerencia de Diversidad Sexual, Amautta, Granja San Cristóbal, Centro Integrado San Cristóbal, Parque Juanes, Centro Vida Gerontológico El Raizal, Centro Integral de Familia Finca la Mesa, sede Principal Plaza de la Libertad, Comisión Social, Por mis Derechos y CIF La Candelaria, dando cumplimiento a la meta propuesta con los recursos de reserva 2024.

Proyecto: **240033 - Apoyo institucional a las estrategias sociales**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 49% **Ejec. Financiera :** 69% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 59%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 8.955 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 12.149 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 8.415

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Sedes mantenidas					
IS33DR	**Sedes mantenidas**	**Número**	**5**	**0**	**0%**

Código. Ind. SUIFP: 459901600

Descripción B/P/S: Implementar acciones de mantenimiento, renovación y adecuación a la infraestructura de los bienes inmuebles a cargo de la Secretaría de Inclusión Social y Familia.

Observación B/P/S: En el año 2025, la Secretaría de Inclusión Social y Familia aportó recursos adicionales a la Secretaría de Suministros y Servicios, por valor de ($314.918.799), y sólo hasta el mes de noviembre se adjudicó y se dio inicio al contrato No. 4600106089 de 2025, para el mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles de propiedad del Distrito Especial de Medellín. No obstante, dicho contrato se celebró para el mantenimiento de las diferentes sedes externas de las Secretarías del Distrito, por lo que al 31 de diciembre de 2025 no fueron ejecutadas dichas obras en los inmuebles a cargo de la Secretaría de Inclusión Social y Familia. Debido a lo anterior, no fue posible dar cumplimiento a la meta programada para el año 2025.

IS33DS	**Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente**	**Número**	**46**	**45**	**98%**

Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Desarrollar acciones administrativas y logísticas para el funcionamiento de las sedes, Unidades y Equipos de trabajo de la Secretaría de Inclusión Social y Familia.

Observación B/P/S: Durante el año 2025, se realizaron acciones administrativas y logísticas para el funcionamiento y operación de las 45 sedes externas adscritas a la Secretaría de Inclusión Social y Familia. La sede pendiente por reportar es la denominada "La Salle", a la espera de la respuesta de la Dirección Administrativa Especial de Buen Comienzo sobre el traslado de este bien.

Proyecto: 240036 -Mejoramiento en las condiciones de vida de las familias del distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 93% **Ejec. Financiera :** 86% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 89%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 11.315 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 12.395 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 10.644

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza					
IS36BA	**Hogares con acompañamiento familiar**	**Número**	**35.934**	**33.315**	**93%**

Código. Ind. SUIFP: 410305000

Descripción B/P/S: Acompañamiento familiar para el mejoramiento de condiciones de vida.

Observación B/P/S: En la vigencia 2025, se brindó acompañamiento familiar y acercamiento de oportunidades a 33.315 hogares de las diferentes comunas y corregimientos del Distrito, para el mejoramiento en sus condiciones de vida.

Proyecto: 240037 -Actualización y seguimiento de la política pública para la familia

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 95% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 314 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 314 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 300

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de política					
IS37EA	**Documentos de política elaborados**	**Número**	**0,4**	**0,4**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459903200

Descripción B/P/S: Proceso de actualización de la Política Pública. Documento de exposición de motivos y proyecto de acuerdo formulado.

Observación B/P/S: En la vigencia 2025, el proceso de actualización de la política pública avanzó en la construcción del documento diagnóstico, la identificación y construcción del mapa de actores, la estructuración del problema público y la formulación de alternativas de solución. El proceso ha contado con la participación de actores de sociedad civil, institucionales y ciudadanía; entre ellos, Comités Técnico y Distrital de Familia.

IS37EB	**Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Observatorio de Familia fortalecido.

Observación B/P/S: En el año 2025, desde el observatorio se realizaron las siguientes actividades: aplicación de instrumento de recolección de información a 800 hogares de las comunas y corregimientos de Medellín, información que sirvió de insumo para la construcción del perfil de las familias de Medellín; creación de botón en la página web de la Secretaría de Inclusión Social y Familia (Unidad Familia Medellín); espacios de articulación para la gestión y apropiación social del conocimiento; elaboración de notas temáticas; y elaboración del documento "Claves para el Acompañamiento Psicosocial con Familias".

Proyecto: 240038 -Implementación de centros integrales para la familia

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 95% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.766 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.766 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.638

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas para la inclusión productiva					
IS38EA	**Personas asistidas en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas**	**Número**	**8.550**	**8.675**	**101%**

Código. Ind. SUIFP: 410300900

Descripción B/P/S: Acompañamiento psicosocial para el fortalecimiento familiar y el buen vivir (Centros Integrales de Familia, -CIF-).

Observación B/P/S: En el año 2025, se brindó acompañamiento psicosocial a 8.675 personas en los Centros Integrales para la familia de las diferentes comunas y corregimientos del Distrito. Estos acompañamientos se llevaron a cabo en las modalidades de intervención individual, familiar y grupal, proporcionando herramientas para el fortalecimiento de las relaciones familiares.

IS38EC	**Centros comunitarios adecuados**	**Número**	**21**	**21**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 410302700

Descripción B/P/S: Centros Integrales para la familia funcionando.

Observación B/P/S: En el 2025, funcionaron los 21 Centros Integrales para la Familia en las comunas y corregimientos del Distrito; se realizaron acciones como: articulación con actores privados y públicos para fortalecer la oferta institucional disponible, participación en diferentes actividades territoriales para llevar la oferta a la comunidad y descentralización de los servicios en territorios distantes.

Programa: 2.2.2 - Todos contra el hambre

Proyecto: 240025 -Desarrollo del programa de alimentación escolar – pae

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 71% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 85%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 306.948 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 310.156 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 219.389

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de entrega de raciones de alimentos					
IS25AK	**Personas beneficiadas con raciones de alimentos**	**Número**	**244.000**	**244.232**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 410301700

Descripción B/P/S: Corresponde a escolares atendidos con el Programa de Alimentación Escolar PAE-.

Observación B/P/S: El Programa de Alimentación Escolar -PAE- inició operación el 20 de enero de 2025 y finalizó el 28 de noviembre por terminación del año escolar; durante los días hábiles escolares se atendieron 244.232 niñas, niños y adolescentes con complementación alimentaria, en las diferentes modalidades del Programa.

Proyecto: 240026 -Asistencia alimentaria para población vulnerable

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 85% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 92%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 20.210 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 21.463 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 18.161

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de entrega de raciones de alimentos				
IS26AB Personas beneficiadas con raciones de alimentos	**Número**	**18.000**	**30.239**	**168%**

Código. Ind. SUIFP: 410301700

Descripción B/P/S: Corresponde a las familias beneficiarias del programa de asistencia alimentaria para población vulnerable.

Observación B/P/S: Durante el año 2025, se atendieron 30.239 familias en condiciones de alta vulnerabilidad alimentaria, quienes recibieron paquetes alimentarios y educación nutricional.

Observación Proyecto: En el proceso de subasta inversa, se presentó una propuesta con valor del 25% inferior al estimado inicialmente. El contrato se adjudicó utilizando la totalidad del presupuesto asignado, y el ahorro generado se tradujo en un incremento en la cantidad de paquetes contratados; esto permitió ampliar significativamente la cobertura, superando la meta programada inicialmente.

Proyecto: 240027 -Optimización de estrategias para un sistema agroalimentario sostenible

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 50% **Ejec. Financiera :** 36% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 43%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.345 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.305 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 475

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo para las unidades productivas para el autoconsumo de lo hogares en situación de vulnerabilidad social				
IS27DH Unidades productivas para el autoconsumo instaladas	**Número**	**600**	**0**	**0%**

Código. Ind. SUIFP: 410305500

Descripción B/P/S: Corresponde a la asistencia técnica para el establecimiento de huertas para el autoconsumo y/o comercialización.

Observación B/P/S: Finalizaron las actividades formativas de todos los ciclos educativos, con las familias seleccionadas para la implementación de unidades productivas de autoconsumo y comercialización (huertas). El proceso de contratación de insumos agrícolas fue adjudicado, pero el operador seleccionado desistió del contrato, por lo que no se pudieron entregar los insumos necesarios para culminar con el proceso de implementación.

IS27DI Centros comunitarios adecuados	**Número**	**3**	**3**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 410302700

Descripción B/P/S: Corresponde al mantenimiento y funcionamiento de los centros zonales existentes.

Observación B/P/S: Durante el año 2025, se desarrollaron las actividades en los Centros Zonales, en articulación con otros programas de Seguridad Alimentaria. Se dio el cierre del ciclo de asesorías y talleres, y culminaron las labores de mantenimiento de las zonas de cultivo y producción de plántulas, Bio insumos, abono orgánico y semillas, las cuales se retomarán el próximo año.

Proyecto: 240028 -Implementación de acciones en educación alimentaria y nutricional

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.191 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.155 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.155

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica para el mejoramiento de hábitos alimentarios					
IS28DH	Hogares asistidos técnicamente para el mejoramiento de hábitos alimenticios	Número	60.000	60.121	100%

Código. Ind. SUIFP: 410305300

Descripción B/P/S: Corresponde a los beneficiarios de capacitaciones en hábitos alimentarios y estilos de vida saludables.

Observación B/P/S: En la vigencia 2025, se beneficiaron 60.121 personas con capacitaciones en temas de alimentación, nutrición y hábitos de vida saludable. Con la terminación del Programa de Alimentación Escolar, culminaron también estas actividades educativas.

Proyecto: 240029 - Implementación del sistema de monitoreo de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 90% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 95%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.176 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.141 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.141

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de evaluación					
IS29DJ	Documentos de evaluación elaborados	Número	0,3	0,27	90%

Código. Ind. SUIFP: 459900100

Descripción B/P/S: Corresponde a la implementación del sistema de monitoreo de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Observación B/P/S: En la vigencia 2025, se revisaron y actualizaron los documentos de la Política Pública (documento técnico, proyecto de acuerdo, exposición de motivos). Se obtuvo concepto favorable del DAP y se radicaron en las Secretarías de Hacienda y General para conceptos. Se revisaron y ajustaron el Modelo de Seguimiento, la batería de indicadores y las fichas técnicas en cuanto a líneas base, metas asociadas y otros.

Programa: 2.2.3 - Medellín, entorno protector de la infancia y la adolescencia

Proyecto: 200181 - Prevención, promoción y atención de niñas, niños y adolescentes en situación de vulneración de derechos

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 91% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.391 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.932

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de protección para el restablecimiento de derechos de niños, niñas adolescentes y jóvenes					
IS81CN	Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos con servicio de protección para el restablecimiento de derechos	Número	2.298	2.298	100%

Código. Ind. SUIFP: 410203700

Descripción B/P/S: Niñas, niños y adolescentes que ingresan a procesos de prevención y restablecimiento de derechos para su desarrollo integral. Acompañamiento a familias y redes de apoyo de niñas, niños y adolescentes en riesgo o con derechos vulnerados, con el objetivo de fortalecer las condiciones de protección y cuidado.

Observación B/P/S: En el año 2025, se brindó acompañamiento integral a niñas, niños y adolescentes, para la prevención y restablecimiento de derechos a través de valoraciones iniciales, planes de caso, salidas pedagógicas y actividades artísticas. Además, se fortaleció la articulación con el programa Tejiendo Hogares para 2025 en las instituciones de protección, con el objetivo de restaurar vínculos familiares y mejorar las competencias parentales mediante sesiones mensuales. Esta ejecución se realizó con recursos de reserva de la vigencia 2024.

IS81CO	Personas capacitadas	Número	2.037	2.037	100%

Código. Ind. SUIFP: 410204500

Descripción B/P/S: Niñas, niños y adolescentes que participan en procesos de promoción de derechos y prevención de vulneraciones; y personas cualificadas para la promoción de derechos y la activación de rutas de niñas, niños y adolescentes en posible riesgo de vulneración.

Observación B/P/S: En el año 2025, se brindó acompañamiento a los adolescentes de las instituciones educativas, a través de encuentros movilizadores, en los cuales se proporcionaron herramientas para el desarrollo de habilidades para la vida, con un enfoque especial en las habilidades socioemocionales. En cuanto a la red de protección, se avanzó en su fase de planeación y en la cualificación de actores clave, permitiendo fortalecer el trabajo articulado entre la familia, la sociedad y el Estado, con el propósito de garantizar el bienestar de la niñez y la adolescencia en Medellín. Esta ejecución se realizó con recursos de reserva de la vigencia 2024.

Proyecto: **240030 - Protección integral de la infancia y adolescencia**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 84% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 92%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 48.063 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 41.538 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 34.850

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Oficina para la atención y orientación ciudadana adecuada				
IS30AD Niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiados	**Número**	**8.310**	**8.204**	**99%**

Código. Ind. SUIFP: 410205200

Descripción B/P/S: Niñas, niños y adolescentes que ingresan a procesos de prevención y restablecimiento de derechos para su desarrollo integral. Acompañamiento a familias y redes de apoyo de niñas, niños y adolescentes en riesgo o con derechos vulnerados, con el objetivo de fortalecer las condiciones de protección y cuidado.

Observación B/P/S: Durante la vigencia, se desarrollaron procesos de atención integral dirigidos a niñas, niños y adolescentes en riesgo o con vulneración de derechos, mediante intervenciones psicosociales, educativas y de protección en instituciones especializadas, orientadas al abordaje de necesidades identificadas y al fortalecimiento de habilidades socioemocionales. De manera complementaria, se adelantaron procesos de acompañamiento familiar con hogares en situación de vulnerabilidad, que permitieron acercar oportunidades, fortalecer las relaciones y dinámicas familiares y avanzar en el cierre progresivo de los procesos. En conjunto, estas acciones se articularon con entidades del Distrito y contribuyeron al fortalecimiento de entornos protectores y al acompañamiento integral de las niñas, niños y adolescentes.

IS30AE Personas capacitadas	**Número**	**8.512**	**14.973**	**176%**

Código. Ind. SUIFP: 410204500

Descripción B/P/S: Niñas, niños y adolescentes que participan en procesos de promoción de derechos y prevención de vulneraciones; y personas cualificadas para la promoción de derechos y la activación de rutas de niñas, niños y adolescentes en posible riesgo de vulneración.

Observación B/P/S: Al cierre de la vigencia 2025, se consolidaron procesos de participación de 14.973 niñas, niños y adolescentes desde los Clubes Juveniles y el proyecto Parchemos, mediante acciones formativas orientadas al fortalecimiento de habilidades socioemocionales, la expresión creativa, el trabajo colaborativo y el reconocimiento de capacidades individuales y grupales en los territorios, lo que permitió ampliar la participación, incrementando la meta establecida para la vigencia. De manera complementaria, durante el 2025, la Red de Protección desarrolló encuentros formativos dirigidos a actores corresponsables (instituciones, familias y comunidad). La implementación de la estrategia Tejiendo Hogares amplió el alcance territorial y fortaleció la participación, consolidando prácticas orientadas a la prevención de vulneraciones y a la construcción de entornos protectores para niñas, niños y adolescentes.

IS30AF Acciones ejecutadas con las comunidades	**Número**	**1.450**	**1.450**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 410107900

Descripción B/P/S: Acciones de asistencia técnica, articulación interinstitucional, movilización social y gestión territorial para la promoción, prevención y atención de la explotación sexual comercial contra niñas, niños y adolescentes (ESCNNA).

Observación B/P/S: Durante el año, se desarrollaron acciones de prevención y atención de la Explotación Sexual Comercial contra Niñas, Niños y Adolescentes - ESCNNA-, en distintos territorios del Distrito, mediante talleres pedagógicos, articulaciones interinstitucionales, movilizaciones y campañas formativas. Estas estrategias promovieron el reconocimiento de las violencias sexuales, el fortalecimiento de prácticas de autocuidado y la consolidación de entornos protectores para niñas, niños y adolescentes, en el marco del principio de corresponsabilidad.

Programa: 2.2.4 - Dignificación, cuidado y autonomía en el envejecimiento y la vejez

Proyecto: **200211 - Servicio de atención social para un envejecimiento y una vejez digna**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 97% **Ejec. Financiera :** 87% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 92%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.020 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.139

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable					
IS11DE	**Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social**	**Número**	**37.751**	**36.599**	**97%**

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas atendidas con servicios que promueven el cuidado del envejecimiento digno y activo, en este caso a la entrega de uniformes, motivando la participación de las personas mayores y favoreciendo el reconocimiento institucional.

Observación B/P/S: En la vigencia 2025, se beneficiaron 36.599 personas mayores con la entrega de uniformes (camiseta y sudadera). Se adoptaron múltiples estrategias de entrega (por comuna, zonas, sede Amautta) a lo largo de 6 jornadas, sin embargo, no se alcanzó el 100% debido a la inasistencia por parte de algunos socios de clubes de vida, quedando pendiente la entrega de 1.152 uniformes. Esta ejecución se realizó con recursos de reserva de la vigencia 2024.

Proyecto: 240013 -Asistencia y protección social para personas mayores

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 95% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 54.585 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 65.785 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 62.641

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable					
IS13CK	**Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social**	**Número**	**2.242**	**2.283**	**102%**

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas mayores atendidas con los siguientes servicios: Dormitorio social, donde reciben acompañamiento psicosocial y alimentación (desayuno y cena); familias cuidadoras de personas mayores; Colonia Belencito, con acompañamiento psicosocial y alimentación; y Red de hogares gerontológicos, con acompañamiento psicosocial, alojamiento y alimentación.

Observación B/P/S: Entre enero y diciembre, se beneficiaron 2.283 personas mayores en alto grado de vulnerabilidad social, a través de la atención integral institucionalizada, así: 1.252 desde red de hogares gerontológicos, 336 en Colonia Belencito, 408 en dormitorio social y 287 a través de familias cuidadoras, garantizando la protección, seguridad y cuidados adecuados. Se superó la meta debido al aumento de cupos en los servicios de asistencia social, nuevo componente en operación y por las rotaciones que se presentaron en cada uno de los servicios.

Proyecto: 240034 -Servicio de promoción del envejecimiento digno, activo y saludable

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 90% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 95%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 10.467 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 15.970 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 14.351

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable					
IS34DJ	**Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social**	**Número**	**34.020**	**35.832**	**105%**

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las entregas de apoyo económico a personas mayores acorde a la base de priorización del Sisbén, a las personas mayores con afiliación al servicio exequial, a las personas mayores atendidas en Centros Vida Gerontológicos y a las personas mayores beneficiarias de días de sol.

Observación B/P/S: Entre enero y diciembre, 35.832 personas mayores fueron beneficiadas con los servicios para el fortalecimiento de la dignificación, cuidado, autonomía, independencia y promoción de los derechos humanos durante el envejecimiento y la vejez, así: 13.014 con afiliación al servicio exequial, 20.646 se beneficiaron con días de sol, 1.220 atendidos en Centros Vida Gerontológicos y 952 recibieron apoyo económico. Se superó la meta porque se incrementaron los cupos en los Centros Vida Gerontológicos y por las rotaciones que se presentaron en los servicios, lo que significó una mayor cobertura para las personas mayores.

Proyecto: **240035 -Actualización y seguimiento a la política pública de envejecimiento y vejez**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 90% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 94%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 984

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de política				
IS35DE Documentos de política elaborados	**Número**	**0,35**	**0,28**	**80%**

Código. Ind. SUIFP: 459903200

Descripción B/P/S: Corresponde a la actualización de la Política Pública de Envejecimiento y Vejez, en el marco de la Política Pública Nacional de Envejecimiento 2022 - 2031.

Observación B/P/S: En la vigencia 2025, el proceso de actualización de la política pública avanzó en la construcción del diagnóstico, la identificación y mapa de actores, la identificación del problema público y alternativas de solución. El proceso ha contado con la participación de actores institucionales, sociedad civil, ciudadanía; entre ellos, Comité Distrital de Personas Mayores y Cabildos.

IS35DF Documentos de evaluación elaborados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459900100

Descripción B/P/S: Corresponde al monitoreo del Plan Gerontológico.

Observación B/P/S: Se realizó informe de seguimiento al Plan Gerontológico del Distrito de Medellín, a través de los cuatro (4) ejes de la Política Pública de Envejecimiento y Vejez. Se recolectaron, consolidaron y analizaron acciones transversales de 53 fichas adscritas a los distintos programas, proyectos o servicios reportados por las distintas dependencias corresponsables entorno a la calidad de vida de las personas mayores y partícipes en la promoción de acciones positivas para quienes están en proceso de envejecimiento. Dicho informe fue socializado y revisado en sesiones del Comité Técnico Distrital de Personas Mayores y en algunas sesiones con los delegados de las dependencias, generando un proceso de retroalimentación y validación conjunta. Posteriormente, los resultados consolidados se presentaron ante los actores del Comité Técnico Distrital de Personas Mayores y el Cabildo Mayor del Distrito, buscando garantizar la corresponsabilidad institucional.

Programa: 2.2.5 - Autonomía e inclusión de las personas con discapacidad

Proyecto: **240041 -Fortalecimiento de la autonomía, participacion e inclusión social de las personas con discapacidad, personas cuidadoras y familiares**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 79% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 89%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 8.920 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.504 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.121

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable				
IS41AD Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	**Número**	**6.509**	**7.086**	**109%**

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Personas con discapacidad, familiares y personas cuidadoras que son beneficiadas a través de servicios de atención integral y acceso a oportunidades para el fortalecimiento de capacidades, el desarrollo de competencias y la vida independiente, asimismo, la promoción de la participación ciudadana; a través de las estrategias: atención integral en casa a personas con discapacidad de media y alta complejidad; acompañamiento psicosocial a personas con discapacidad; acompañamiento psicosocial a personas cuidadoras; capacitación en temas y habilidades específicas sobre cuidado y apoyo para el respiro y relevo a las personas cuidadoras; ayudas técnicas; acciones para la promoción de la vida independiente de personas con discapacidad (campamentos de inmersión, talleres de formación y asesorías personalizadas); formación en emprendimiento para personas con discapacidad; formación en emprendimiento para personas cuidadoras; fortalecimiento a emprendimientos activos de personas con discapacidad y personas cuidadoras; capacitación en manualidades para personas con discapacidad y personas cuidadoras; atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad intelectual; estrategias para la inclusión; orientación sociolaboral, valoración de apoyos; acceso a derechos (acompañamiento jurídico, gestión institucional); promoción de la accesibilidad universal; acciones de participación, gestión e incidencia para la inclusión social de las personas cuidadoras; y por último, acciones de participación, gestión e incidencia para la inclusión social de las personas con discapacidad.

Observación B/P/S: Entre los meses de enero a diciembre, se atendieron 7.086 personas, así: 4.967 con estrategias para la inclusión de personas con discapacidad; 1.427 se beneficiaron con acciones de participación, gestión e incidencia para la inclusión social de las personas con discapacidad y personas cuidadoras; 228 personas con discapacidad fueron atendidas desde ser capaz en casa y 244 participaron del desarrollo y promoción de habilidades para la vida independiente; 121 NNA con discapacidad intelectual recibieron atención integral; 55 personas con discapacidad fueron beneficiadas con acompañamiento psicosocial y 22 recibieron valoración de apoyos; 4 personas con discapacidad y 5 personas cuidadoras de personas con discapacidad fueron capacitadas en manualidades; 3 personas con discapacidad y 10 personas cuidadoras de personas con discapacidad recibieron formación en emprendimiento. Se superó la meta debido a que el recurso de la vigencia fue ajustado, lo cual permitió fortalecer los equipos e incrementar las actividades en territorio, logrando responder a las necesidades de fortalecimiento técnico y empoderamiento de las instancias, mejorando el despliegue de asistencias técnicas, cursos formativos y acompañamientos psicosociales.

Programa: 2.2.6 - Habitantes de y en calle con atención e inclusión social

Proyecto: **200263 -Implementación de estrategias para fortalecer el sistema de atención a la población de y en calle**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 63% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 82%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.504 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.112

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de atención integral al habitante de la calle				
IS63AD Personas atendidas con servicios integrales	**Número**	**528**	**531**	**101%**

Código. Ind. SUIFP: 410402700

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas habitantes de/en o en riesgo de calle que se vinculan a procesos de resocialización. También, a la población de y en calle que recibe atención integral desde el componente de APCD (Atención a personas en situación de y en calle con altas necesidades de apoyo y/o con discapacidad leve o moderada).

Observación B/P/S: En la vigencia 2025, se atendieron 531 personas habitantes de/en o en riesgo de calle: 143 que se vincularon a procesos de resocialización y 388 que recibieron atención integral desde el componente de APCD (Atención a personas con discapacidad psicosocial de alta dependencia y/o necesidades especiales). Esta ejecución se realizó con recursos de reserva de la vigencia 2024.

IS63AF Personas atendidas con oferta institucional	**Número**	**2.487**	**2.487**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 410402600

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas habitantes de/en/ o en riesgo de calle que ingresan a las sedes de atención básica, (centro día, transitorios u otros) y reciben desde 2 servicios de los ofertados por el componente: alimentación, dormitorio, autocuidado, atención psicosocial, atención básica en salud, iniciación en proyecto de vida (pre-proceso), entre otros.

Observación B/P/S: En el año 2025, se atendieron 2.487 personas habitantes de/en o en riesgo de calle que ingresaron a las sedes de atención básica, (centro día, transitorios u otros) y recibieron desde dos (2) servicios de los ofertados por el componente: alimentación, dormitorio, autocuidado, atención psicosocial, atención básica en salud, iniciación en proyecto de vida (preproceso), entre otros. Esta ejecución se realizó con recursos de reserva de la vigencia 2024.

Proyecto: **240042 -Fortalecimiento del sistema de atención a la población de y en calle**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 92% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 35.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 77.453 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 70.933

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de articulación de oferta social para la población habitante de calle				
IS42GA Personas atendidas con oferta institucional	**Número**	**15.000**	**14.916**	**99%**

Código. Ind. SUIFP: 410402600

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas habitantes de/en o en riesgo de calle que ingresan a las sedes de atención básica (centro día, transitorios u otras) y reciben, como mínimo, dos de los servicios ofertados por el componente, tales como alimentación, dormitorio, autocuidado, atención psicosocial y atención básica en salud, entre otros.

Observación B/P/S: En el año 2025, se brindó atención básica a 14.916 personas en situación de calle o en riesgo de calle, a través de la provisión de servicios de alimentación, autocuidado, acompañamiento psicosocial y otros servicios orientados a satisfacer sus necesidades básicas.

IS42GB Personas atendidas con servicios integrales	**Número**	**1.695**	**1.746**	**103%**

Código. Ind. SUIFP: 410402700

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas habitantes de/en o en riesgo calle que se vinculan a procesos de resocialización y/o resignificación del proyecto de vida, así como a aquellas atendidas desde el componente de Reducción de Riesgos y Daños. Comprende además la atención integral a personas en situación o riesgo de calle con altas necesidades de apoyo y/o con discapacidad leve o moderada (APCD); y a quienes reciben atención integral en la modalidad de albergue temporal.

Observación B/P/S: Se atendieron 1.746 personas habitantes de/en o en riesgo de calle, de la siguiente manera: 516 con atención integral desde el componente APCD (atención personas con discapacidad), 246 recibieron atención integral en la modalidad de albergue de recuperación en salud, 636 atendidas en procesos de resocialización y 348 atendidas desde el componente de reducción de riesgos y daños.

Proyecto: **240045 -Actualización de la política pública social para los habitantes de y en calle**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 85 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 85 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 85

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de política				
IS45LR Documentos de política elaborados	**Número**	**0,4**	**0,4**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459903200

Descripción B/P/S: Corresponde al avance en el proceso de actualización de la Política Pública Social para los Habitantes de y en Calle, mediante la elaboración y entrega de los documentos y productos definidos en el procedimiento de actualización de políticas públicas, en coherencia con el plan de trabajo de la vigencia 2026, tales como el documento de objetivos, principios y enfoques, las estrategias, el plan de acción de la política, el modelo de seguimiento y evaluación, entre otros.

Observación B/P/S: En la vigencia 2025, el proceso de actualización de la Política Pública avanzó en la construcción de los productos establecidos en el plan de trabajo, que incluyeron la elaboración del diagnóstico, la identificación y mapa de actores, la estructuración del problema público, y la formulación de alternativas de solución. El proceso ha contado con la participación de actores institucionales, sociedad civil, ciudadanía, entre ellos el Comité Distrital.

Programa: 2.2.7 - Bienestar para las familias migrantes

Proyecto: **200268 -Diseño e implementación politica pública para migrantes en el municipio**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 70% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 85%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.226 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.554

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable					
IS68AJ	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	4.972	6.259	126%

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas migrantes, refugiadas y/o retornadas que reciben atención y asesoría para acceder a rutas de derechos, que les permitan mitigar o superar su situación de vulnerabilidad.

Observación B/P/S: Durante la vigencia 2025, 6.259 personas migrantes, refugiadas y/o retornadas recibieron atención y asesoría para acceder a rutas de derechos, que les permitan mitigar o superar su situación de vulnerabilidad. Esta ejecución se realizó con recursos de reserva de la vigencia 2024 y con la incorporación de recursos del balance a este proyecto de inversión. Se superó la meta programada, debido a las diversas estrategias implementadas para la atención de la población migrante y al acercamiento de la oferta institucional en las comunas con mayor presencia de esta población.

Proyecto: 240046 - **Fortalecimiento de estrategias para la acogida e integración de la población migrante**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 78% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 89%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 208 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 343 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 268

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable					
IS46DC	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	670	670	100%

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas migrantes, refugiadas y/o colombianas retornadas que reciben atención y asesoría para acceder a rutas de derechos que les permitan mitigar o superar su situación de vulnerabilidad, a través del Centro Intégrate y la Línea 123 Social - Módulo Migrante.

Observación B/P/S: Entre los meses de junio y diciembre, se brindó atención y orientación en rutas de derechos a 670 personas migrantes, para mitigar o superar su situación de vulnerabilidad.

Programa: 2.2.8 - Asistencia social a población vulnerable

Proyecto: 200264 - **Asistencia social de emergencias**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.620 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.614

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable					
IS64AA	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	4.728	4.729	100%

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a todas las personas en situación de riesgo o emergencia, ya sea natural o antrópica, que son atendidas por el componente de comisión social y reciben acompañamiento social mediante atención psicosocial y/o ayuda humanitaria, información, orientación, asesoría, intervención en crisis, y la remisión y/o coordinación para el trámite y acceso a otros servicios. Así mismo, a aquellas personas en situación de emergencia social atendidas a través de la línea 123 social que reciben acompañamiento social mediante atención psicosocial, información, orientación, asesoría, intervención en crisis y la remisión y/o trámite para el acceso a otros servicios.

Observación B/P/S: En la vigencia 2025, 4.729 personas en situación de emergencia social recibieron acompañamiento psicosocial, información, orientación, asesoría, intervención en crisis y la remisión y/o trámite para el acceso a otros servicios, 4.229 de ellas a través de la línea 123 Social y 500 atendidas por el componente de comisión social. Esta ejecución se realizó con recursos de reserva de la vigencia 2024 y con la incorporación de recursos del balance a este proyecto de inversión.

Proyecto: 200265 - Servicio de albergue a población vulnerable

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 394 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 394

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable					
IS65AQ	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	178	178	100%

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas habitantes de/en o en riesgo de calle que reciben atención integral en la modalidad de albergue de recuperación en salud. Además, las personas en situación de emergencia social, natural y/o antrópica beneficiadas con albergue temporal.

Observación B/P/S: En el 2025, se atendieron 178 personas desde el servicio de albergue: 108 personas habitantes de/en o en riesgo de calle recibieron atención integral en la modalidad de albergue de recuperación en salud; y 70 personas en situación de emergencia social, natural y/o antrópica fueron beneficiadas con albergue temporal. Esta ejecución se realizó con recursos de reserva de la vigencia 2024.

Proyecto: 240043 - Apoyo social a población vulnerable en situación de emergencia

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 90% **Ejec. Financiera :** 88% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 89%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.381 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 14.357 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 12.622

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable					
IS43DH	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	36.316	32.795	90%

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde, en primer lugar, a las personas en situación de emergencia social atendidas a través de la Línea 123 Social, quienes reciben atención psicosocial, información, orientación sobre la oferta institucional y derivación a otros servicios, etc. En segundo lugar, comprende a las personas en situación de riesgo o emergencia, de origen natural o antrópico, que reciben orientación y acompañamiento social, garantizando el acceso a servicios básicos y la activación de rutas de derechos. Finalmente, incluye a quienes acceden a un alojamiento temporal debido a condiciones de inseguridad habitacional y alta vulnerabilidad social, económica o familiar.

Observación B/P/S: De enero a diciembre, se atendieron 32.795 personas afectadas por eventos de emergencia social, natural y/o antrópica, de la siguiente manera: 32.144 personas en situación de emergencia social recibieron acompañamiento psicosocial, información, orientación, asesoría, intervención en crisis y la remisión y/o trámite para el acceso a otros servicios, 25.267 de ellas a través de la línea 123 Social y 6.877 atendidas por el componente de comisión social; adicionalmente 651 personas fueron beneficiadas con albergue temporal. No de cumplió con la meta debido a la disminución de llamadas a la Línea 123 Social, que dependen de la ocurrencia de emergencias y se generan bajo demanda.

Proyecto: 240044 - Implementación de estrategias para la intervención psicosocial y acercamiento de la oferta institucional a las personas en ejercicio de prostitución

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 78% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 89%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 602 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 468

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable					
IS44DE	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	228	394	173%

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas adultas en ejercicio de prostitución que reciben atención psicosocial y orientación en rutas para acceso a derechos.

Observación B/P/S: En el año 2025, se atendieron 394 personas en ejercicio de actividades sexuales pagas, con atención psicosocial y orientación en rutas de derechos. Se superó la meta programada, debido a la implementación de encuentros de confianza, que favorecieron la participación activa de la población en actividades para la transformación de sus proyectos de vida, el reconocimiento de sus habilidades y talentos, así como el fortalecimiento de competencias sociales.

Componente: 2.3 - Medellín diversa

Programa: 2.3.1 - Medellín distrito étnico

Proyecto: 200183 - Implementación del plan municipal afrodescendiente

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 89 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 89

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable					
IS83CC	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	157	157	100%

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las acciones de acercamiento a la oferta institucional, orientación vocacional, ocupacional, de acceso a oportunidades, acciones en el marco de la dinamización del Centro de Integración Afrodescendiente y acompañamiento a procesos organizativos.

Observación B/P/S: En el año 2025, se realizaron acciones de orientación vocacional, acercamiento a la oferta institucional, dinamización del Centro de Integración Afrodescendiente, el acompañamiento a los procesos participativos de la población y la continuidad de la reactivación de la red de prevención a casos de racismo y discriminación racial. Esta ejecución se realizó con recursos de reserva de la vigencia 2024.

Proyecto: 200184 - Formulación e implementación de la política pública para la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 21% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 60%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 105 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 22

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de política					
IS84BB	Documentos de política elaborados	Número	0,1	0,1	100%

Código. Ind. SUIFP: 459903200

Descripción B/P/S: Corresponde a la entrega y validación del documento de política pública y su estructura técnica que incluye el diagnóstico situacional, conceptos básicos de la política pública, enfoques, principios, problema público y exposición de motivos.

Observación B/P/S: En la vigencia 2025, se realizó la entrega del documento de Política Pública que incorpora el análisis situacional, la exposición de motivos, la conceptualización, objetivos y propuesta de proyecto de articulado, como también la propuesta del plan de acción y el modelo de evaluación y seguimiento. Esta ejecución se realizó con recursos de reserva de la vigencia 2024.

Observación Proyecto: Los recursos inejecutados corresponden al presupuesto de reservas destinado a la definición y validación del proceso de consulta previa por parte del Ministerio del Interior; no obstante, dicho proceso no se materializó debido a cambios en las solicitudes y en los requisitos necesarios para su realización.

Proyecto: **200185** **Implementación del plan de atención psicosocial para la población indígena**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 201 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 200

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable				
IS85CY **Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social**	**Número**	**100**	**100**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Acompañamiento, atención psicosocial, acercamiento a la oferta: institucional, laboral y de educación; activación de rutas y orientación vocacional y ocupacional.

Observación B/P/S: En el año 2025, se brindó atención a población indígena en condición de mendicidad y vulnerabilidad, con la orientación vocacional y ocupacional, el acercamiento a la oferta institucional y la activación de rutas. Esta ejecución se realizó con recursos de reserva de la vigencia 2024.

Proyecto: **200186** **Formulación del plan indígena**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 91% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 22 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 20

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación				
IS86DE **Documentos de planeación realizados**	**Número**	**0,15**	**0,15**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459901900

Descripción B/P/S: Corresponde a la revisión de diseño y corrección de estilo del documento técnico del Plan Indígena de Medellín y su plan de acción de buenos vivires.

Observación B/P/S: En el año 2025, se realizó la revisión y corrección de estilo del documento final del Plan Indígena de Medellín; y la aplicación de criterios comunicacionales para su diseño. Durante el mes de junio se hizo la entrega del documento final. Esta ejecución se realizó con recursos de reserva de la vigencia 2024.

Proyecto: **240031** **Fortalecimiento de la autonomia económica, social y cultural de la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 70% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 84%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.600 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.600 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.575

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la garantía de derechos				
IS31DS **Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas**	**Número**	**8**	**7,18**	**90%**

Código. Ind. SUIFP: 450203800

Descripción B/P/S: Contempla las estrategias en el marco del desarrollo de la agenda afrocultural, el fortalecimiento de unidades productivas para la autonomía económica, la implementación del sistema de generación de ingresos y empleabilidad, el seguimiento a la implementación del sello étnico, el sistema de estímulos a los procesos sociales, de liderazgo y capacidades propias de la población, las acciones en el marco de la prevención y atención a casos de racismo y discriminación racial, la formulación de la política pública afrodescendiente y el fortalecimiento de los procesos organizativos propios.

Observación B/P/S: Durante la vigencia 2025, se brindó orientación vocacional y ocupacional; y acompañamiento a las 16 sesiones del preuniversitario; se realizaron 5 ferias propias y 12 ferias por gestión, con la participación de las unidades productivas en proceso de fortalecimiento; se consolidó el documento técnico para la rueda de negocios y se desarrollaron 5 juntanzas para el acercamiento de la oferta institucional. También se avanzó en la articulación del sello étnico educativo y empresarial con el otorgamiento del Sello Étnico, reconociendo a 10 empresas, 13 IES y 6 entidades públicas. Se identificaron 467 familias; se realizaron 12 talleres pedagógicos, formativos y psicológicos a diferentes públicos; se realizaron 5 exposiciones en el marco de la agenda afrocultural. Además, se socializó el plan de acción de la mesa cultural, se ejecutaron 18 talleres pedagógicos para la prevención del racismo y se llevaron a cabo 6 encuentros de la mesa interinstitucional y de la red para la atención y prevención del racismo. Se consolidó el documento en la versión final del Sistema Distrital de Estímulos para la Población y se desarrolló la ceremonia de los Premios Changó con la premiación de 6 categorías.

IS31DT	**Documentos de planeación elaborados**	**Número**	**1**	**0,51**	**51%**

Código. Ind. SUIFP: 450203500

Descripción B/P/S: Documento que incorpora la estructuración técnica, el proyecto de acuerdo, los aspectos metodológicos, el diagnóstico situacional, principios y enfoques, exposición de motivos, marco conceptual y jurídico, el modelo de evaluación; seguimiento y la validación comunitaria.

Observación B/P/S: En el año 2025, se realizó la revisión del diagnóstico situacional con acompañamiento del DAP, en articulación con la Gerencia Étnica y ADAFRO, incorporando la reformulación del problema público, la actualización de instrumentos técnicos y los resultados de la Encuesta de Percepciones 2025, lo que permitirá avanzar hacia la socialización, la definición de indicadores y la radicación del proyecto de acuerdo ante el Concejo de Medellín, con recursos de reserva para la vigencia 2026. El valor estadístico no se cumple, debido a que los tiempos de revisión y ajuste por parte de la Gerencia Étnica y el DAP, en articulación con la población, se han extendido para la validación técnica y comunitaria del documento.

Observación Proyecto: En el año 2025, se realizó la revisión del diagnóstico situacional con acompañamiento del DAP, en articulación con la Gerencia Étnica y ADAFRO, incorporando la reformulación del problema público, la actualización de instrumentos técnicos y los resultados de la Encuesta de Percepciones 2025, lo que permitirá avanzar hacia la socialización, la definición de indicadores y la radicación del proyecto de acuerdo ante el Concejo de Medellín, con recursos de reserva para la vigencia 2026.

Proyecto: 240032 -Fortalecimiento de los sistemas tradicionales propios de los pueblos indígenas

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 91% **Ejec. Financiera :** 94% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 92%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.581 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.581 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.479

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la garantía de derechos					
IS32DK	**Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas**	**Número**	**9**	**8,23**	**91%**

Código. Ind. SUIFP: 450203800

Descripción B/P/S: Contempla el fortalecimiento de los procesos organizativos, la implementación del sello étnico, el fortalecimiento de la identidad étnica, expresiones artísticas, el desarrollo de acciones en el marco del calendario étnico, el fortalecimiento de las economías propias, corredor étnico, la gestión para el acceso al empleo y oportunidades educativas; la atención diferenciada con el equipo de la casa de sueños (casa Niquitao), el acercamiento a la oferta institucional y activación de rutas; y las acciones en el marco de la prevención y atención a casos de racismo y discriminación racial.

Observación B/P/S: Durante el año 2025, se logró el acompañamiento a la ejecución de los proyectos de los nueve cabildos, junto con la actualización de los listados censales y la realización de espacios de encuentro intercultural y articulación interinstitucional; también, se implementó el Sello Étnico en los ámbitos educativo y empresarial y se desarrollaron acciones de atención psicosocial, talleres de identidad étnica, activación de rutas y acercamiento de la oferta institucional a las familias indígenas como parte de la estrategia Casa Ni quitao, con la atención de 327 personas y más de 350 atenciones integrales; de igual manera, se adelantaron procesos de orientación vocacional, acceso a oportunidades laborales y fortalecimiento de unidades productivas, la realización de 5 ferias étnicas propias y 12 ferias por gestión, así como talleres pedagógicos para la prevención del racismo, 6 encuentros de la Mesa Interinstitucional y de la Red para la Atención y Prevención del Racismo y 6 sesiones de la Mesa Permanente de concertación Indígena de Medellín - MPCIM.

Observación Proyecto: Durante el año 2025, se logró el acompañamiento a la ejecución de los proyectos de los nueve cabildos, junto con la actualización de los listados censales y la realización de espacios de encuentro intercultural y articulación interinstitucional; también, se implementó el Sello Étnico en los ámbitos educativo y empresarial y se desarrollaron acciones de atención psicosocial, talleres de identidad étnica, activación de rutas y acercamiento de la oferta institucional a las familias indígenas como parte de la estrategia Casa Niquitao, con la atención de 327 personas y más de 350 atenciones integrales; de igual manera, se adelantaron procesos de orientación vocacional, acceso a oportunidades laborales y fortalecimiento de unidades productivas, la realización de 5 ferias étnicas propias y 12 ferias por gestión, así como talleres pedagógicos para la prevención del racismo, 6 encuentros de la Mesa Interinstitucional y de la Red para la Atención y Prevención del Racismo y 6 sesiones de la MPCIM.

Programa: 2.3.2 - Reconocimiento y dignificación de las orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas

Proyecto: **240039 -Desarrollo de acciones para el reconocimiento y dignificación de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 92% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.013 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.759

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable					
IS39DD	**Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social**	**Número**	**1.635**	**1.647**	**101%**

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas beneficiadas de las acciones que promueven los derechos de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no hegemónicas y sus familias, que son atendidas para el ejercicio de sus derechos, el desarrollo humano y una vida digna.

Observación B/P/S: Durante la vigencia 2025, 1.647 personas entre población con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no hegemónicas y sus familias, fueron beneficiadas de diferentes acciones afirmativas para promover el ejercicio pleno de sus derechos y el reconocimiento y dignificación de esta población, entre ellas: asesoría laboral, visitas de acompañamiento familiar, acompañamiento psicosocial, asesoría jurídica, asesoría en oferta educativa, procesos formativos de transversalización del enfoque de orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no hegemónicas, jornadas de bienestar y cuidado, acompañamiento en salud, capacitación a operadores de justicia para la promoción de los derechos de la población con OSIEG no hegemónicas, feria de empleabilidad, fortalecimiento emprendimiento; e información y orientación de servicios para acceso a derechos.

Proyecto: **240040 -Actualización, implementación y seguimiento de la política pública para la garantía de derechos de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 93% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 200 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 187

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de evaluación					
IS40DJ	**Documentos de evaluaciones realizados**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 410306400

Descripción B/P/S: Corresponde al proceso por el cual se actualiza la formulación de la Política Pública Distrital para la Garantía de los Derechos y la Dignidad de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no hegemónicas. En este proceso de actualización, se encuentra la ruta técnica y metodológica definida y aprobada por el Departamento Administrativo de Planeación.

Observación B/P/S: En la vigencia 2025 se continuó con el proceso de actualización de la Política Pública Distrital para la garantía de los derechos y la dignidad de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no hegemónicas. Se llevaron a cabo las fases de sistematización, análisis técnico y consolidación de los insumos, herramientas metodológicas y documentos producidos en el marco de la mesa técnica de trabajo de la política pública, garantizando la coherencia con la ruta técnica, metodológica y normativa definida para este proceso de actualización. Estas acciones permitieron fortalecer el enfoque de derechos, el enfoque diferencial y la articulación interinstitucional orientada al reconocimiento, acceso efectivo a derechos y la dignificación de las personas pertenecientes a esta población.

IS40DK	**Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social**	**Número**	**232**	**246**	**106%**

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde al proceso de implementación, seguimiento y evaluación de la Política Pública de diversidad sexual, en la que participan personas de la población LGBTI (Lesbianas, Gay, Bisexual, Trans e Intersexual).

Observación B/P/S: Durante el año 2025, 246 personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no hegemónicas, participaron de las diferentes acciones de implementación, seguimiento y evaluación de la Política Pública de diversidad sexual, en el marco del Plan Estratégico "Diversidad y Ciudadanía 2018 -2028", para el reconocimiento, acceso a derechos y la dignificación de esta población. Se superó la meta programada debido a la alta demanda presentada en las acciones de implementación, seguimiento y evaluación de la Política Pública de Diversidad Sexual, a través de la estrategia de territorialización implementada en las 16 comunas y los 5 corregimientos del Distrito.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente

Componente: 2.2 - Medellín territorio incluyente

Programa: 2.2.1 - Familias con bienestar y oportunidades

Proyecto: **250016 -25pp99-implementació de estrategias de acompañamiento psicosocial individual,familiar y grupal medellin**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 92% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 440 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 403

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas para la inclusión productiva					
IS16AA	**Personas asistidas en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas**	**Número**	**790**	**1.027**	**130%**

Código. Ind. SUIFP: 410300900

Descripción B/P/S: Corresponde a estrategias de acompañamiento psicosocial o grupal, a través de los Centros Integrales para la Familia -CIF- dirigido a personas con discapacidad y sus cuidadores; personas mayores y población en general.

Observación B/P/S: Entre los meses de septiembre y noviembre, se realizaron los procesos de acompañamiento psicosocial individual y grupal en las diferentes comunas, beneficiando a 1.027 personas, quienes participaron entre 1 y 5 sesiones según el servicio: acompañamiento psicosocial individual entre 1 y 5 sesiones; y acompañamiento grupal 3 sesiones. Se superó la meta programada, debido a que en las comunas 8 y 10 se contó con un mayor número de personas que participaron en las actividades grupales, principalmente en el proyecto de vida para niñas, niños y adolescentes.

Programa: 2.2.2 - Todos contra el hambre

Proyecto: **250017 -25pp99-implementació de estrategias de seguridad alimentaria medellin**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 81% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 91%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 34.938 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 28.327

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de entrega de raciones de alimentos				
IS17AR Personas beneficiadas con raciones de alimentos	**Número**	**15.484**	**16.882**	**109%**

Código. Ind. SUIFP: 410301700

Descripción B/P/S: Corresponde a las familias beneficiarias de bonos alimentarios.

Observación B/P/S: Durante los meses de septiembre a diciembre fueron beneficiadas 16.882 familias con bonos alimentarios. La meta se superó debido a los ahorros obtenidos en la licitación pública del proceso, lo que permitió atender a más familias con bonos alimentarios.

Programa: 2.2.3 - Medellín, entorno protector de la infancia y la adolescencia

Proyecto: **250020 -25pp99-prevención de las vulneraciones y fortalecimiento de capacidades de las niñas, niños y adolescentes medellin**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 84% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 92%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.099 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 923

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de educación informal a niños, niñas, adolescentes y jóvenes par el reconocimiento de sus derechos				
IS20AL Personas capacitadas	**Número**	**840**	**854**	**102%**

Código. Ind. SUIFP: 410204500

Descripción B/P/S: Niñas, niños y adolescentes beneficiados con acompañamiento psicosocial.

Observación B/P/S: Durante la vigencia se brindó acompañamiento psicosocial a niñas, niños y adolescentes en los laboratorios pedagógicos de arte, música, teatro, danza, ciencia y tecnología, deportes alternativos y astronomía. Estos espacios promovieron aprendizajes colectivos relacionados con la participación, la convivencia y la gestión emocional. El acompañamiento permitió fortalecer las dinámicas grupales y aportar al desarrollo de habilidades socioemocionales en el marco de los procesos formativos.

Programa: 2.2.4 - Dignificación, cuidado y autonomía en el envejecimiento y la vejez

Proyecto: **250018 -25pp99-asistencia social para la población adulta mayor medellín**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 57% **Ejec. Financiera :** 74% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 66%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 35.176 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 26.177

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable				
IS18CS Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	**Número**	**31.090**	**17.677**	**57%**

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas a partir de 50 años beneficiadas con servicios de promoción para un envejecimiento digno, como: formación en manualidades, días de sol, centro vida gerontológico, formación a cuidadores, apoyo económico, feria de manualidades, formación en TICS, encuentro lúdico-terapéutico, artes y oficios y rediseñar el proyecto de vida.

Observación B/P/S: Se beneficiaron 17.677 personas mayores en servicios para el fortalecimiento de la dignificación, cuidado, autonomía, independencia y promoción de los derechos humanos durante el envejecimiento y la vejez, así: 1.303 atendidas en los centros vida gerontológicos, 15.258 beneficiadas con apoyo económico, 1.041 beneficiados con día de sol y 75 que participaron en encuentro lúdico-terapéutico para socios de clubes de vida.

Observación Proyecto: El servicio de formación a cuidadores es realizado conjuntamente con el Equipo de Discapacidad, el cual solicitó aplazamiento para continuar en el mes de enero de 2026; además, la población solicitó aplazar el desarrollo de las actividades de los servicios de capacitación en manualidades, artes y oficios, rediseño de proyecto de vida y Tics, por lo que se retomará su ejecución en el mes de enero de 2026. Lo anterior afectó el cumplimiento de la meta programada.

Programa: 2.2.5 - Autonomía e inclusión de las personas con discapacidad

Proyecto: 230017 -24pp99-implementación de acciones de inclusión social para las personas con discapacidad, familiares y cuidadores

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 72% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 86%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.264 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 916

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable					
IS17CO	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	7	7	100%

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a la entrega de ayudas técnicas (sillas de rueda a la medida) para personas con discapacidad.

Observación B/P/S: En la vigencia 2025, se beneficiaron 7 personas con discapacidad con la entrega de ayudas técnicas (sillas de rueda a la medida); esta ejecución se realizó con recursos de reserva de la vigencia 2024.

Proyecto: 250013 -25pp99-implementació de acciones para la autonomía e inclusión social de las personas con discapacidad y personas cuidadoras medellin

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 78% **Ejec. Financiera :** 62% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 70%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 25.524 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 15.943

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable					
IS13AI	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	10.967	8.503	78%

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Atención integral e inclusión social de las personas con discapacidad y personas cuidadoras, a través de mecanismos que permitan promover los derechos de las personas con discapacidad y personas cuidadoras; y garantizar el acceso a servicios de atención integral y generación de oportunidades, para el fortalecimiento de capacidades, el desarrollo de competencias, la vida independiente y la promoción de la participación ciudadana.

Observación B/P/S: Hasta el mes de diciembre fueron atendidas 8.503 personas, así: 5.884 personas con discapacidad recibieron apoyo económico y 899 fueron atendidas desde ser capaz en casa; se brindó acompañamiento psicosocial a 232 personas con discapacidad y a 172 personas cuidadoras de personas con discapacidad; 158 beneficiados del fortalecimiento a la red de apoyo de cuidadores de personas con discapacidad dependientes y semidependientes de la comuna 2; 107 NNA con discapacidad intelectual recibieron atención integral; 142 personas con discapacidad beneficiadas de desarrollo y promoción de habilidades para la vida independiente; 18 beneficiarios de capacitación y fortalecimiento técnico al Comité Comunal de Inclusión de la comuna 4; 22 beneficiarios de capacitación y fortalecimiento técnico al Comité Comunal de Inclusión de la comuna 2; 424 beneficiarios de formación y apoyo a la economía del cuidado de personas cuidadoras de personas con discapacidad; se brindó formación en emprendimiento a 21 personas con discapacidad y a 172 cuidadores de personas con discapacidad; capacitación en manualidades a 30 personas con discapacidad y a 121 cuidadores de personas con discapacidad; y 101 personas con discapacidad recibieron ayudas técnicas (sillas de ruedas a la medida).

Observación Proyecto: Los servicios de emprendimiento y manualidades se suspendieron el 13 de diciembre y se reanudarán el 19 de enero de 2026, por tanto, está pendiente el reporte total de la meta asociada a dichos servicios; por otro lado, la entrega del tercer ciclo de pago de apoyo económico estuvo activa del 16 al 30 de diciembre, es decir que, el informe de beneficiarios efectivos por parte de entidades financieras, se dispondrá a partir de la segunda semana del mes de enero. Las situaciones mencionadas, afectaron el cumplimiento total de la meta al cierre de la vigencia 2025 y los servicios pendientes quedarán programados con los recursos de reserva. Es importante aclarar que una persona puede recibir más de un servicio, sin embargo, solo queda reportado el primer registro de atención del año para evitar duplicidad de datos con relación a los beneficiarios reales por comuna, siendo así, el logro de la meta en cada comuna estará determinado por el número de personas atendidas por servicio (de acuerdo a los cupos designados y el cumplimiento de requisitos).

Programa: 2.2.6 - Habitantes de y en calle con atención e inclusión social

Proyecto: **250015 -25pp10-implementaci de centro de escucha itinerante para la población de y en calle de la comuna 10 medellin**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 134 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 134

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la garantía de derechos				
IS15AP **Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450203800

Descripción B/P/S: Corresponde a la implementación del Centro de Escucha Itinerante, para la atención básica en salud y/o intervención psicosocial de los habitantes de y /en calle de la Comuna 10.

Observación B/P/S: En el año 2025, desde el Centro de Escucha Itinerante se beneficiaron 1.046 personas en situación o riesgo de calle, entre los servicios de atención básica en salud e intervención psicosocial, a través de la atención brindada por el profesional en Trabajo Social y el profesional de Atención Prehospitalaria (APH).

Componente: 2.3 - Medellín diversa

Programa: 2.3.1 - Medellín distrito étnico

Proyecto: **250019 -25pp99-fortalecimien de las prácticas culturales, saberes ancestrales e identidad étnica medellín**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 91% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 154 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 140

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la garantía de derechos				
IS19AF **Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas**	**Número**	**11**	**11**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450203800

Descripción B/P/S: Corresponde a las estrategias implementadas en las comuna 10 y 13 para el fortalecimiento de la identidad, tradición y prácticas tradicionales y artísticas; los procesos formativos en participación, el fortalecimiento de los liderazgos y el intercambio de saberes de la población étnica.

Observación B/P/S: En la vigencia 2025, se realizaron talleres en las comunas 10 La Candelaria y 13 San Javier; en la comuna 10 se realizó una feria étnica, con la participación de 16 emprendimientos, 2 grupos artísticos, espacios de intercambio intercultural y de saberes ancestrales, 4 talleres de fortalecimiento presupuestal para emprendimientos y 4 talleres de capacitación en participación ciudadana, dirigidos a población afrodescendiente e indígena. Por su parte, en la comuna 13 se realizaron 2 eventos de reconocimiento al liderazgo afrodescendiente, 14 talleres formativos (7 de corresponsabilidad y 7 de prácticas culturales del trenzado); 4 talleres dirigidos a la Mesa Afro y la entrega de insumos, como parte del proceso de fortalecimiento de su proceso organizativo.

Programa: 2.3.2 - Reconocimiento y dignificación de las orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas

Proyecto: 250014 -25pp13-desarrollo de acciones para el reconocimiento y dignificación de las personas lgbtiq+ en la comuna 13 san javier medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 92% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 628 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 580

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la garantía de derechos					
IS14AN	Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas	Número	6	6	100%

Código. Ind. SUIFP: 450203800

Descripción B/P/S: Corresponde al desarrollo de acciones para el reconocimiento y dignificación de las personas LGBTIQ+ en la comuna 13 San Javier.

Observación B/P/S: Se implementaron las siguientes acciones orientadas a la promoción, garantía y reconocimiento de los derechos de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no hegemónicas de la comuna 13 San Javier: acompañamiento integral desde los componentes jurídico y psicosocial, para la reafirmación sociopolítica de la identidad de género y el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas en el ejercicio de derechos; se realizaron recorridos artísticos y pedagógicos en el territorio, como espacios simbólicos de resignificación y promoción de la diversidad; se implementó la Escuela diversa para la transversalización del enfoque de diversidades sexuales, identidades y expresiones de género no hegemónicas; se realizó la toma conmemorativa de la comuna 13 San Javier, en reconocimiento de las muertes violentas de la población con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no hegemónicas; y se realizaron acciones para el fortalecimiento organizativo de la Mesa LGBTIQ+ "Tejiendo la Diversidad", mediante procesos de acompañamiento y cualificación de la participación orientada al reconocimiento y la dignificación de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no hegemónicas.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 230012 -24pp15-implementación de un centro de escucha itinerante para población en situación de calle comuna 15

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 230016 -24pp99-fortalecimiento de las condiciones psicosociales y formativas, individuales y familiares

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 495 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 460

Proyecto: 200075 -Implementación del programa de alimentación escolar - pae

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 36.418 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 36.418

Proyecto: 230019 -24pp99-implementación de estrategias en seguridad alimentaria

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 35 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 29

Proyecto: 230020 -24pp99-prevención de las vulneraciones y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 242 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 242


Proyecto:	**200214**	**-Consolidación de una cultura corresponsable con el envejecimiento y la vejez**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 75	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 1	
Proyecto:	**230013**	**-24pp99-asistencia social para la población adulto mayor**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 726	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 164	
Proyecto:	**200220**	**-Desarrollo de estrategias para la inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadores**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 948	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 540	
Proyecto:	**200221**	**-Implementación y seguimiento de la política pública para la inclusión de las personas con discapacidad**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 39	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 39	
Proyecto:	**200267**	**-Implementación y seguimiento de la política pública social para los habitantes de calle**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 4	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0	
Proyecto:	**200266**	**-Generación de oportunidades para la dignificación y el desarrollo de personas en prostitución**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 28	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 27	
Proyecto:	**200270**	**-Fortalecimiento y monitoreo de la política pública para el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 46	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 39	
Proyecto:	**230018**	**-24pp99-implementación de acciones de inclusión y reconocimiento a la población lgbtiq+**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 87	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 87	


5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Proyecto:	**130349**	**-Mcv-sistema de protección a la vida**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 496	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 70	


Secretaría de las Mujeres


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2025

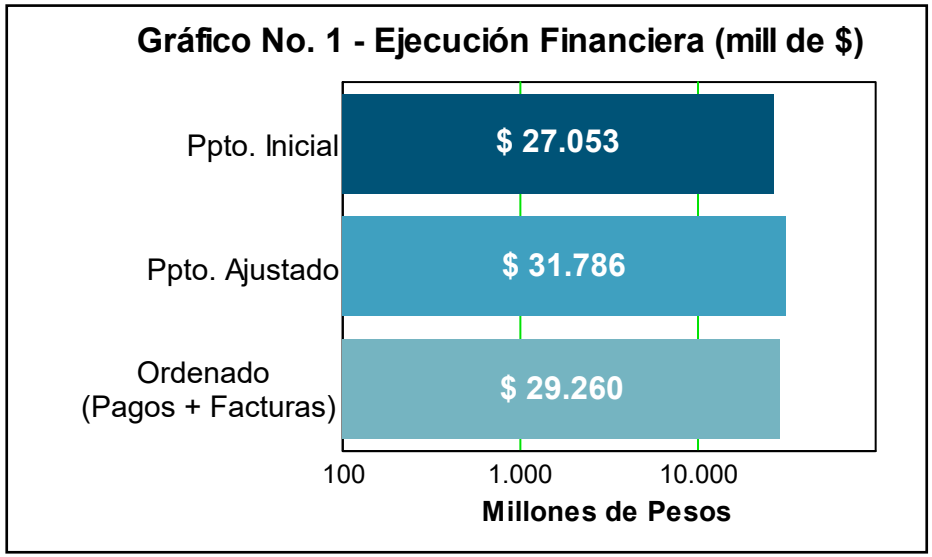


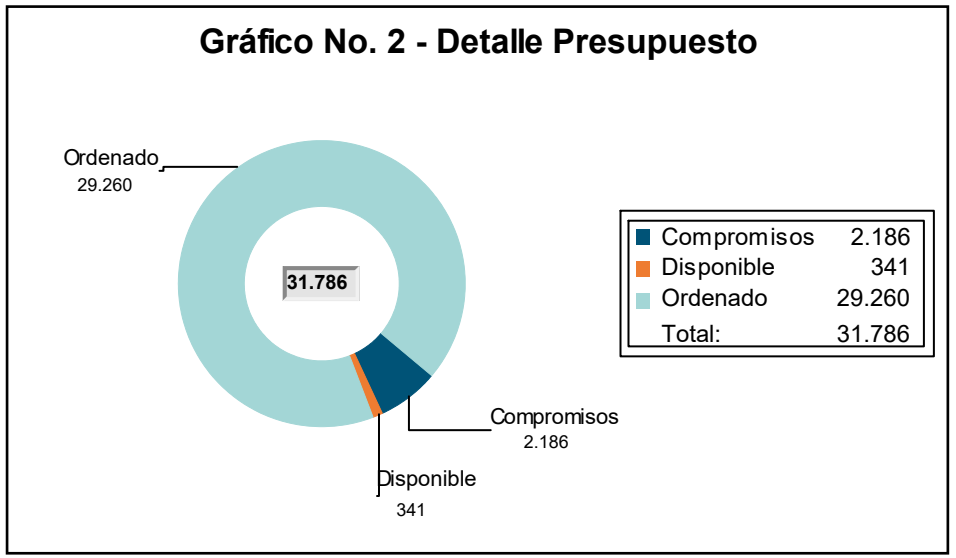

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre de 2025 comprende pagos y facturas

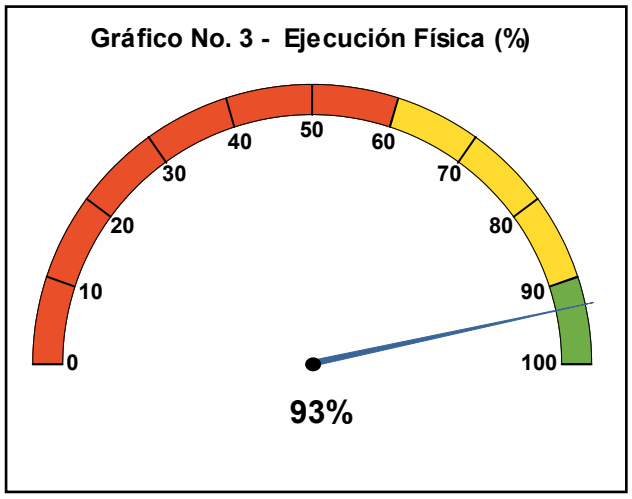

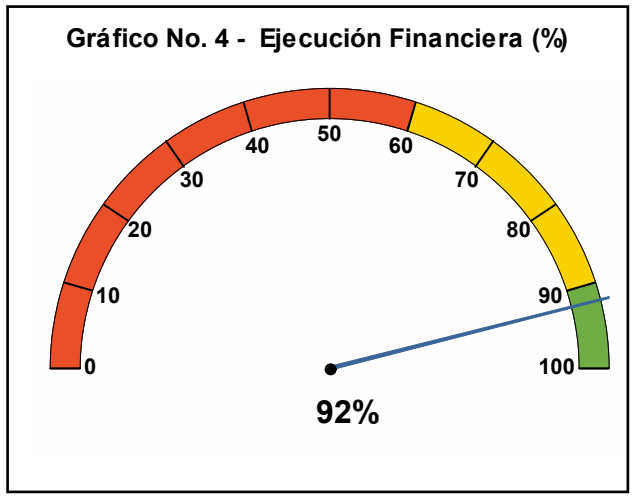

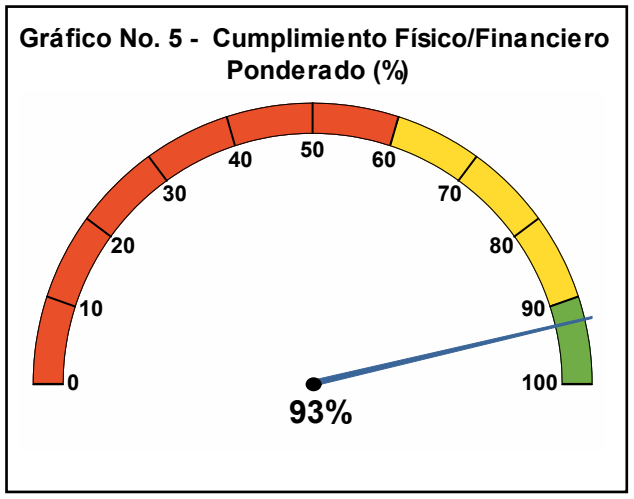

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente

Componente: 2.6 - Mujeres autónomas, mujeres libres

Programa: 2.6.1 - Promoción de la autonomía física, económica y para la toma de decisiones de las mujeres urbanas y rurales

Proyecto: **240014 -Desarrollo de estrategias para promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 95% **Ejec. Financiera :** 92% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 93%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 9.755 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 15.154 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 13.917

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de orientación a casos de violencia de género				
MU14AA Casos atendidos	**Número**	**12.752**	**10.818**	**85%**

Código. Ind. SUIFP: 450105000

Descripción B/P/S: *a. 73000 incidentes de mujeres víctimas de violencias basadas en género atendidas desde la agencia mujer --- *b. 4826 eventos de mujeres víctimas de violencias basadas en género atendidas desde la agencia mujer --- *c. 4730 mujeres víctimas de violencias basadas en género atendidos desde la agencia mujer --- *d. 4436 atención psicológica en territorio --- *e. 3886 atención jurídica en territorio --- *f. 2171 mujeres que reciben atención psicológica en territorio --- *g. 2026 mujeres que reciben atención jurídica en territorio. --- *h. 3000 mujeres víctimas de violencia basadas en género atendidas en centros especializados --- *i. 250 hombre agresor que reciben atención psicológica --- *j. 150 hombres sensibilizados en prevención de las Violencia Basada en Género --- *k. 60 personas beneficiadas con medidas de atención (en modalidades: Casa Refugio; servicio hotelero y/o subsidio monetario) --- *l. 100 mujeres víctimas de VBG que acceden a servicio de protección --- *m. 100% Casos de mujeres víctimas de VBG derivados y analizados en el comité del mecanismo Defensa técnica --- *n. 100 % Procesos de víctimas sobrevivientes de VBG que cumplen criterios para representación jurídica --- *o. 100% Asistencias técnico legales a mujeres víctimas de VBG brindadas desde el mecanismo de defensa técnica --- * p . 378 mujeres víctimas de VBG asistidas y representadas desde el mecanismo de defensa --- *q. 100% Procesos de víctimas sobrevivientes de VBG que cumplen criterios para representación jurídica (ampliación y adición 2025) --- *r. 10% mujeres víctimas de VBG asistidas y representadas desde el mecanismo de defensa (ampliación y adición 2025) --- *s. 12 estrategias implementadas para la prevención y la atención de mujeres víctimas de violencias basadas en género desde el Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres --- *t. 8367 personas atendidas --- *u. 8167 mujeres atendidas --- *v. 34 mujeres víctimas de VBG atendidas que activaron rutas

Observación B/P/S: A 31 de diciembre del 2025, los avances del producto son: *a. se han recepcionado 108226 Incidentes de mujeres víctimas de violencia a través de la Agencia Mujer --- *b. 8120 eventos de mujeres víctimas de VBG atendidas desde la agencia mujer --- *c. 7346 mujeres víctimas de VBG atendidos desde la agencia mujer --- *d. 6660 atención psicológica en territorio --- *e. 6131 atención jurídica en territorio --- *f. 3139 mujeres que reciben atención psicológica en territorio --- *g. 3025 mujeres que reciben atención jurídica en territorio --- *h. 3522 mujeres víctimas de VBG atendidas en centros especializados --- *i. 250 hombres agresores que reciben atención psicológica --- *j. 153 hombres sensibilizados en prevención de las VBG --- *k. 115 personas beneficiadas con el mecanismo de protección integral que incluye modalidad: casa refugio; servicio hotelero y/o subsidio monetario) --- *l. 169 mujeres acceden a servicio de protección por VBG --- *m. 100% (total 1297) Casos de mujeres víctimas de VBG derivados y analizados en el comité del mecanismo Defensa técnica --- *n. 100% (840) Procesos de víctimas sobrevivientes de VBG que cumplen criterios para representación jurídica --- *o. 100% (61) Asistencias técnico legales a mujeres víctimas de VBG brindadas desde el mecanismo de defensa técnica --- *p. 7 1 0 mujeres víctimas de VBG asistidas y representadas desde el mecanismo de defensa --- *q. 100% (97) Procesos de víctimas sobrevivientes de VBG que cumplen criterios para representación jurídica (ampliación y adición 2024) --- *r. 80 mujeres víctimas de VBG asistidas y representadas desde el mecanismo de defensa (ampliación y adición 2024) --- *s. 17 estrategias implementadas para la prevención y la atención de mujeres víctimas de VBG desde el Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres --- *t. 10818 personas atendidas --- *u. 10363 mujeres atendidas --- *v. 29% (2979) Mujeres víctimas de VBG atendidas que activaron rutas. Con corte al 31 de diciembre de 2025, se registra un cumplimiento del 85%, asociado a una disminución en el número de atenciones efectivas frente a lo programado. Esta situación se explica principalmente porque una proporción significativa de las mujeres que contactan la línea ya cuentan con rutas de atención previamente activadas en los sectores de salud, justicia y protección, lo cual limita la necesidad de nuevas activaciones. Adicionalmente, el cumplimiento se ve influenciado por la capacidad operativa del servicio y los tiempos de atención requeridos para cada caso, garantizando la calidad y oportunidad de la atención prestada. El avance alcanzado refleja una gestión acorde con la demanda real del servicio durante la vigencia.

MU14AB	**Instancias territoriales asistidas técnicamente**	**Número**	**36**	**36**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450100100

Descripción B/P/S: *a. 36 instancias territoriales asistidas técnicamente

Observación B/P/S: PCon corte al 31 de diciembre de 2025, la actividad se cumple al 100%, han asistido técnicamente 36 instancias territoriales

MU14AC	**Personas capacitadas**	**Número**	**4.500**	**6.025**	**134%**

Código. Ind. SUIFP: 450104900

Descripción B/P/S: *a. 3000 mujeres asesoradas con enfoque de género para la promoción de su salud mental --- *b. 3651 mujeres asesoradas con enfoque de género para para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos

Observación B/P/S: 31 de diciembre del 2025, los avances del proyecto son: *a. 3501 mujeres asesoradas en enfoque de género para la promoción de su salud mental *b. 2524 mujeres asesoradas en enfoque de género para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Se suscribió nuevo contrato para dar cumplimiento a la meta y se están diseñando estrategias para aumentar los reportes. La actividad presenta sobrecumplimiento, debido a la alta demanda comunitaria de los procesos de Salud Mental, lo que generó una participación superior a la esperada en los círculos de la palabra y en las jornadas grupales de atención.

Proyecto: 240291 -Implementación de estrategias para la participación social y política de las mujeres y la construcción de paz con enfoque de género

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 83% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 91%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 901 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 712 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 590

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
MU91AA Personas capacitadas	**Número**	**600**	**600**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: *a. 240 mujeres formadas para la participación social y/o incidencia política --- *b. 160 mujeres con habilidades para participar en instancia de participación social y/o política --- *c. 100 mujeres con herramientas para participar desde la diversidad --- *d. 100 mujeres constructoras de paz con herramientas para participar en las agendas locales

Observación B/P/S: A 31 de diciembre del 2025, los avances del proyecto son: *a. 380 mujeres culminaron el proceso de formación para la participación y el liderazgo y asistencia técnica con mujeres NARP, indígenas, jóvenes, migrantes, firmantes, víctimas, LBT y venteras informales. *b. se implementó el proceso de acompañamiento con 220 representantes en instancias de participación: Fedemedellín, JAC La Soledad, JAC Eterna Primavera, Mesa Cuidadoras C15, Comité de interlocución Política de Igualdad de Género, REDIMUJER, Consejo Distrital de Juventud y Plataforma de Juventudes, entre otros. El excedente en la meta es una respuesta a la demanda de dos Juntas de Acción Comunal para ser acompañadas.

MU91AB	**Espacios de participación promovidos**	**Número**	**4**	**4**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: a. 4 iniciativas de paz de mujeres fortalecidas con enfoque de género

Observación B/P/S: *a. con corte al 31 de diciembre de 2025 se diseñó el plan de trabajo y se implementan 4 iniciativas de paz, así: "Mural de la memoria" liderada por la Junta de Acción Comunal Nuevos Conquistadores (Comuna 13); Sanándome para la paz, Comuna 3; Tejiendo Para Sanar, Comuna 10; Mesa de trabajo de La Loma organización mixta, Corregimiento San Cristóbal.

Proyecto: 240293 -Desarrollo de estrategias de acceso y permanencia escolar de las mujeres e incorporación del enfoque de género en el sistema educativo

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 92% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.797 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.654

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación forma				
MU93EA Personas beneficiarias de estrategias de permanencia	**Número**	**1.040**	**1.367**	**131%**

Código. Ind. SUIFP: 220103300

Descripción B/P/S: *a. 1850 mujeres con acciones afirmativas para la permanencia en el sistema educativo

Observación B/P/S: *a. 1367 mujeres recibieron acciones afirmativas para la permanencia en el sistema educativo Con corte al 31 de diciembre de 2025, la suscripción del convenio de asociación permitió ampliar la cobertura de atención, beneficiando a un mayor número de mujeres frente a lo inicialmente proyectado.

MU93EB Personas beneficiadas con procesos de formación informal | **Número** | **800** | **1.000** | **125%**

Código. Ind. SUIFP: 220104900

Descripción B/P/S: *a. 900 personas que participan en las jornadas de sensibilización promoción de una educación no sexista

Observación B/P/S: *a. 1000 personas participaron en las jornadas de sensibilización promoción de una educación no sexista Con corte al 31 de diciembre de 2025, la actividad presenta sobrecumplimiento, debido a la creciente demanda de intervención por parte de las instituciones educativas vinculadas al proyecto.

MU93EC Entidades y organizaciones asistidas técnicamente | **Número** | **42** | **48** | **114%**

Código. Ind. SUIFP: 220100600

Descripción B/P/S: *a. 50 instituciones educativas asesoradas para la incorporación enfoque de género en los PEI *b. 2000 Personas que participan la cátedra de género

Observación B/P/S: *a. Se ha implementado las asesorías de acompañamiento técnico a 48 instituciones educativas. *b. 1399 personas participaron en las cátedras de género sexista *c. el documento se encuentra en construcción; se tiene planeado entregar al finalizar la vigencia Con corte al 31 de diciembre de 2025, la ejecución del convenio de asociación permitió ampliar la cobertura, beneficiando a un mayor número de mujeres.

Proyecto: 240329 -Desarrollo de estrategias para incentivar la autonomia economica de las mujeres

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 86% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 93%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.600 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.135 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.845

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado | **Unidad** | **Cantidad Planeada** | **Cantidad Ejecutada** | **Eficacia Producto**

Documentos de planeación

MU29CA Documentos de planeación elaborados | **Número** | **3** | **3** | **100%**

Código. Ind. SUIFP: 450203500

Descripción B/P/S: *a. 1 documentos orientadores para el diseño de las estrategias que incentivan la autonomía económica de las mujeres. --- *b. 1 documentos de evaluación de las estrategias que incentivan la autonomía económica de las mujeres.

Observación B/P/S: *a. A la fecha de este reporte, se han construido tres (3) documentos orientadores para las estrategias. *b. se reporta la construcción de 1 documento de evaluación de la estrategia de sensibilización

MU29CB Personas capacitadas | **Número** | **1.455** | **1.794** | **123%**

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: *a. 500 mujeres que participan de la estrategia de sensibilización para el desarrollo de su autonomía económica. --- *b. 300 mujeres que participan de la estrategia de orientación para el desarrollo de su autonomía económica. --- *c. 700 mujeres que participan de la estrategia de acompañamiento para el desarrollo de su autonomía económica.

Observación B/P/S: *a. 684 mujeres participan de la estrategia de sensibilización para el desarrollo de su autonomía económica. *b. estrategia inició con la convocatoria y los talleres en el mes de agosto y se han conformado 4 grupos, en los que han participado 380 mujeres *c. La estrategia inició con la convocatoria y los talleres, se han conformado 17 grupos con 730 mujeres participando de esta actividad. Es importante resaltar las siguientes acciones realizadas en el proyecto durante esta vigencia, lo que permitió que las mujeres recibieran más beneficios: *158 mujeres se beneficiaron de microcréditos mediante redes vecinales en el Banco Distrital. *102 mujeres recibieron dos talleres de educación financiera y 36 mujeres participaron del juego práctico de finanzas para los emprendimientos, realizada con la metodología transferida mediante una cooperación alemana formalizada por un acuerdo de voluntades. *226 mujeres recibieron capacitación de 24 horas en esmaltado semipermanente en las comunas 1, 3, 7, 8, 9, 13, 50, 60, 70 y 80, a través de la Alianza para la Igualdad de Género. Con corte al 31 de diciembre de 2025, se supera la meta por la efectividad de la convocatoria a efectuada por el asociado en las comunas y corregimientos.

Proyecto: 240330 -Implementación de procesos formativos enfocados a emprendimientos productivos para las mujeres rurales del distrito de medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 0% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Instrumentos de agregación de demanda				
MU30DA Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la educación superior	**Número**	**60**	**0**	**0%**

Código. Ind. SUIFP: 220207900

Descripción B/P/S: *a. 60 mujeres con acciones afirmativas para la permanencia en el sistema educativo

MU30DB Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior	**Número**	**60**	**0**	**0%**

Código. Ind. SUIFP: 220206200

Descripción B/P/S: *a. 60 mujeres que participan en cátedra de género y habilidades digitales

Observación Proyecto: El proyecto no presenta avance en metas, debido a que no cuenta con asignación presupuestal, por ende, este año no presentará avances en ejecución.

Programa: 2.6.2 - Transversalización y gestión del conocimiento para la igualdad de género de las mujeres urbanas y rurales de Medellín

Proyecto: **240292 -Fortalecimiento institucional para la transversalización del enfoque de género y la gestión del conocimiento**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.945 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.936 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.902

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
MU92CA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	**Número**	**50**	**50**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: *a. 70 personas capacitadas en el sector público --- *b. 150 personas capacitadas en el sector privado --- *c. 30 planes, programas, proyectos acompañados para la incorporación del enfoque de género en el sector público --- *d. 15 planes, programas, proyectos acompañados para la incorporación del enfoque de género en el sector privado y en el tercer sector --- *e. 3 sesiones del Comité Intersectorial realizadas

Observación B/P/S: El cumplimiento de metas del proyecto en el 2025 fue: *a. en el sector público se capacitó a 237 personas (reflejando el interés en los temas de género al interior del distrito. Esto se logró gracias a la participación activa de enlaces de género de las diferentes dependencias y entidades, evidenciando una creciente demanda por fortalecer la gestión pública con enfoque de género). *b. Con corte al 31 de diciembre de 2025, en el sector privado 252 personas se capacitaron para la incorporación y fortalecimiento de buenas prácticas de género en las empresas que hacen parte de la Alianza para la Igualdad de Género. La modalidad virtual facilitó la participación, evidenciando una demanda estratégica por integrar el enfoque de género en entornos empresariales. *c. desde la secretaria se acompañó 32 proyectos de inversión, en la incorporación del enfoque de género, especialmente en la identificación de actividades que contribuyen al cierre de brechas de género y a la identificación de presupuestos sensibles al género. *d. Durante la vigencia del 2025, se acompañaron y documentaron 20 proyectos empresariales para el cierre de brechas de género y la garantía de derechos de las mujeres en organizaciones priorizadas que hacen parte de la Alianza para la Igualdad de Género *e. A la fecha del reporte se han realizado 4 (cuatro) sesiones del Comité intersectorial

MU92CB Documentos de planeación realizados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459901900

Descripción B/P/S: *a. 1 documento de planeación

Observación B/P/S: *a. el documento de planeación a 31 de diciembre 2025, cumplió el avance del 100%

MU92CC Documentos de investigación elaborados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902600

Descripción B/P/S: *a. 100% Sistemas de información asistidos técnicamente (Observatorio)

Observación B/P/S: *a. el sistema de información cumplió con la meta planeada del 100%

Proyecto: 240328 - Implementación del sistema distrital de cuidados

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): $ 6.673 Ppto Ajustado (mill de $): $ 6.614 Ejec. Financiera (mill de $): $ 6.420

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de integración de la oferta pública				
MU28CA Espacios de integración de oferta pública generados	**Número**	**6**	**6**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450203300

Descripción B/P/S: *a. 9 centros de Cuidado y Equidad de Género gestionados --- *b. 10000 mujeres cuidadoras que acceden a servicios en los Centros de Cuidado y equidad de género. *c. 2 piloto de Centro de lavado comunitario puesto en marcha --- *d. 100% Madres comunitarias, fami y sustitutas que acceden al estímulo contemplado en el Acuerdo No. 18 de 2010. --- *e. 1 evento de reconocimiento a las madres comunitarias, Fami y Sustitutas.

Observación B/P/S: El avance del proyecto es: *a. Con corte al 31 de diciembre de 2025, se gestionó la apertura y puesta en marcha de seis (6) nuevos Centros de Cuidado: 1). Comuna 1- Popular (Casa de la Cultura del Popular); 2). Comuna 2- Santa Cruz (Casa de Justicia Villa del Socorro). 3). Comuna 4- Aranjuez (CISAMF). 5) Comuna 13- San Javier (Parque Biblioteca Presbítero José Luis Arroyave); y 6). Comuna 60- San Cristóbal (Parque Biblioteca Fernando Botero). Y se mantienen los tres (3) Centros de Cuidado creados en el 2024, a saber: 1). Comuna 3, Manrique (UVA La Alegría). 2). Comuna 5- Castilla (UVA Sin Fronteras). y 3). Comuna 8- Villa Hermosa (UVA La Imaginación). *b. se reporta 6803 mujeres cuidadoras que han accedido a servicios en los Centros de Cuidado. *c. Indicador de mantenimiento. En el año 2025, se dio cumplimiento al pago del estímulo al 100% (1807) de madres reportadas por el ICBF. *d. Con corte al 31 de diciembre de 2025, se llevó a cabo el evento de Reconocimiento a la labor de las Madres Comunitarias, Fami y Sustitutas (oct 15) a través de un día especial de respiro de cuidado en el Parque Comfama de Copacabana, en el cual también se llevó a cabo el evento protocolario de reconocimiento.

MU28CB Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	**Número**	**10**	**11**	**110%**

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: *a. 15 Alianzas público- privadas en favor del cuidado --- *b. 1 estrategia de gobernanza por el trabajo de cuidado, implementada --- *c. 8 4 proyectos territoriales que incorporan el enfoque de equidad de género.

Observación B/P/S: *a. Con corte al 31 de diciembre, se mantienen las 11 asistencias técnicas reportadas con corte al 31 de octubre, es decir: 1). Corporación Surgir; 2). Corporación Calor de Hogar; 3). ASOPARTES; 4). Novoplus; 6). IPS "Hola Doctor"; 7). Mesa que aglutina las redes de personas cuidadoras de Medellín. 8). Cabildo de Personas mayores, 9). Macca; 10). Hotel IBIS; 11) ASPERLA. *b. Desde el marzo de 2025, se dio inició a la implementación de la estrategia de gobernanza en torno al cuidado, entendida como el proceso de articulación y coordinación de acciones para la valoración, redistribución y reconocimiento del trabajo de cuidado. Este es un indicador de mantenimiento pues la estrategia de Gobernanza se implementa durante toda la vigencia 2025. *c. 84 proyectos territoriales recibieron asesoría, acompañamiento o asistencia técnica para la incorporación del enfoque de género y de cuidado.

MU28CC Personas capacitadas	**Número**	**10.000**	**11.088**	**111%**

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: *a. 10000 personas sensibilizadas para el reconocimiento, redistribución y valoración social del cuidado

Observación B/P/S: a. Al 31 de diciembre, 11088 personas fueron sensibilizadas para el reconocimiento, redistribución y valoración social del cuidado *b. 1032 hombres han sido sensibilizados en masculinidades cuidadoras. se supera la meta, por el aumento en la demanda de acciones de información, educación y comunicación por parte de aliados del cuidado como el INDER y Buen Comienzo, los equipos territoriales de otras Secretarías, y las redes de personas cuidadoras

Programa: 2.6.3 - Transformación de roles y relaciones culturales entre hombres y mujeres para la promoción de la igualdad de género

Proyecto: 240290 - Generación de estrategias para la transformación cultural en favor de la igualdad de género en el distrito medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): $ 1.679 Ppto Ajustado (mill de $): $ 1.679 Ejec. Financiera (mill de $): $ 1.598

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Servicio de promoción de la garantía de derechos

MU90AA	**Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas**	**Número**	**8**	**8**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450203800

Descripción B/P/S: *a. 1 conmemoración día internacional de los derechos de las mujeres --- *b. 1 implementación Estrategia Fiestas y Eventos Seguros para las mujeres --- *c. 1 promoción de la estrategia pregunta por Angela --- *d. 2 campañas comunicaciones para promoción de los derechos de las mujeres --- *e. 1 asistencias técnicas en espacios públicos seguros para mujeres y niñas --- *f. 2 acciones pedagógicas en turismo con enfoque de género --- *g. 1 conmemoración día internacional de la eliminación de las violencias contra las mujeres --- *h. 3 asistencias técnicas en turismo con enfoque de género --- *i. Acciones pedagógicas con agentes educativos para la igualdad de género

Observación B/P/S: *a. Se realizó 1 campaña comunicacional para esta conmemoración en el mes de marzo de 2025. *b. Se ejecutó 1 campaña hasta el 21 de junio y teniendo en cuenta que se ampliaron las fechas de inscripción en la convocatoria también se ampliaron las fechas de realización de la campaña hasta el 03 de agosto. *c. Se elaboraron 4 videos sobre turismo con enfoque de género dirigido a las empresas, se diseñó una propuesta de recorrido turístico con enfoque de género en el marco de la estrategia "Medellín en el corazón", se produjo un juego sobre estereotipos para fiesta segura y el cubrimiento de los espacios o eventos en los que está el equipo. A la fecha se avanza en un 50% en el cumplimiento de la meta. *d. Se el 100% de la meta mediante: piezas en redes, videos, prensa, micrositio, eventos y más alrededor de reconocimiento de las labores del cuido como trabajo y redistribución *e. La conmemoración se realizó en el mes de noviembre con diversas actividades comunicacionales, territoriales, artísticas y académicas. *f. Se realizó 3 acciones: una convocatoria pública para elegir y visibilizar a una mujer cantautora par a interpretar la canción principal de la Gran Noche de las Mujeres, y el marco del Festival "Medellín para todas" se contó con una tarima permanente donde las mujeres de la ciudad presentaron sus talentos artísticos. *g. Se avanzó en la implementación de las acciones de la Escuela Hombres como VOS: 1. Formador de formadores; 2. Asistencias técnicas a entidades; 3. Diálogo itinerante para la transformación cultural. se cumple en un 100%. *h. se avanzó en la implementación de las acciones de la Escuela Hombres como VOS: 1. Formador de formadores; 2. Asistencias técnicas a entidades; 3. Diálogo itinerante para la transformación cultural. Con corte al 31 de diciembre, este valor estadístico se cumple en un 100%. La excelente aceptación a la convocatoria permitió aplicar una estrategia mas para el cumplimiento de las metas

MU90AB	**Espacios de participación promovidos**	**Número**	**3**	**3**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: *a. 1 seminarios para la igualdad de género --- *b. 1 convocatoria anual estímulos a los talentos y liderazgos de las mujeres --- *c. 1 gran noche de las mujeres 2026

Observación B/P/S: *a. Se realizaron los dos seminarios; los cuales abordaron contenidos orientados a la promoción de los derechos de las mujeres y su empoderamiento. *b. Se realizó la convocatoria que culminó el 22 de octubre de 2025. *c. Se realizó el 22 de octubre de 2025 en el marco del Festival "Medellín para Todas"

MU90AC	**Personas capacitadas**	**Número**	**5.000**	**5.725**	**115%**

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: *a. 3250 personas capacitadas en la estrategia de espacios públicos para mujeres y niñas --- *b. 100 personas capacitadas en la estrategia de urbanismo con enfoque de género --- *c. 150 personas capacitadas en la estrategia de gestión del conocimiento para ciudades seguras para mujeres y niñas --- *d. 1000 personas capacitadas en masculinidades cuidadoras, corresponsables y no violentas

Observación B/P/S: El avance al 31 de diciembre es de: *a. 3982 personas capacitadas en la estrategia de espacios públicos para mujeres y niñas --- *b. 1388 personas capacitadas en la estrategia de turismo con enfoque de género *c. 246 personas han sido capacitadas con esta estrategia; para dar cumplimiento a esta meta se adelantó las siguientes gestiones: 1). Dos talleres programados para los días 01 y 05 de septiembre. En espera de confirmación de un grupo de profesionales de la EDU. 2). Pendiente la programación con grupos del Área Metropolitana, gestionado con Estefanía Gil (asistente al CTA). La apertura ya fue confirmada con el equipo de Seguridad y Convivencia, y a la espera de que esta dependencia confirme la fecha exacta. *d. 109 personas fueron capacitadas en la estrategia de gestión del conocimiento para ciudades seguras para mujeres y niñas Las gestiones de articulación con diferentes entidades elevaron la demanda de solicitudes, sobrepasando la meta proyectada

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente

Componente: 2.6 - Mujeres autónomas, mujeres libres

Programa: 2.6.1 - Promoción de la autonomía física, económica y para la toma de decisiones de las mujeres urbanas y rurales

Proyecto: **250035 -25pp99-implementació de estrategis a favor de la salud y calidad de vida de las mujeres medellín**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 65% **Ejec. Financiera :** 77% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 71%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 553 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 423

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de integración de la oferta pública				
MU35AA Personas atendidas con oferta institucional articulada	**Número**	**333**	**189**	**57%**

Código. Ind. SUIFP: 450203301

Descripción B/P/S: *a. 120 mujeres atendidas en arteterapia --- *b. 153 mujeres que participan en talleres de formación y multiplicación sobre VBG --- *c. 60 mujeres que participan en intercambio sobre participación social y política

Observación B/P/S: El avance al 31 de diciembre fue: *a. 128 mujeres recibieron el beneficio de arteterapia *b. La meta está prevista para las mujeres que asisten a 10 talleres, a la fecha el proceso no ha concluido para determinar el número real de mujeres que finalmente quedarán beneficiadas una vez culmine el proyecto para el 2026, para lo cual se constituirán reservas. *c. Pese a que hubo una inscripción de 68 líderes, y confirmaron asistencia 64 finalmente asistieron al evento 58. El proyecto quedó con presupuesto en reserva para el año 2026, donde se dará cumplimiento ala meta planeada

MU35AB Personas capacitadas	**Número**	**283**	**207**	**73%**

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: *a. 83 hombres que participan en formación en masculidades corresponsables --- *b. 140 mujeres que participan en formación en derechos sexuales y reproductivos --- *c. 60 mujeres que participan en formación y caminata por la salud mental

Observación B/P/S: A 31 de diciembre el avance fue: *a. el avance de la meta va en 14, el cumplimiento de la meta planeada, está prevista para con los hombres que asisten al proceso de 10 talleres, a la fecha el proceso no ha concluido para determinar el número real de hombres que finalmente quedarán beneficiados, una vez culmine el proyecto para el 2026, para lo cual se constituirán reservas. *b. 130 mujeres participan en formación en derechos sexuales y reproductivos *c. 63 mujeres que participaron en formación y caminata por la salud mental El proyecto quedó con presupuesto en reserva para el año 2026, donde se dará cumplimiento a la meta planeada

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: **200297 -Generación de estrategias para la autonomía económica de las mujeres urbanas y rurales**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 166 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 55

Proyecto: **200300 -Implementación de acciones para la promoción de la equidad de género en el territorio**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 8

Proyecto: **200301 -Implementación de estrategias para la incorporación del enfoque de género en el sistema educativo**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 184 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 141

Proyecto: **200302 -Fortalecimiento de los procesos participativos, organizativos y de movilización social de las mujeres**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 70 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 22

Proyecto: **200304 -Implementación de estrategias para prevenir y atender las violencias basadas en género**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 500 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 474


Proyecto: **230025 -24pp99-formación y empoderamiento de las mujeres para la promoción de sus derechos**


Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 83 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 63

Proyecto:	**230026**	**-24pp99-prevención de las violencias basadas en género contra las mujeres**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 88	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 76
Proyecto:	**200299**	**-Inversiones en bienes de capital a favor de mujeres con dedicación a trabajo doméstico y cuidado no remunerado**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 15,231175	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 3
Proyecto:	**200307**	**-Asistencia técnica para la integración de la perspectiva de género en sectores públicos y privados**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 6	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 6
Proyecto:	**200308**	**-Fortalecimiento de la planeación estratégica y gestión del conocimiento de la secretaría de las mujeres**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 59	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 58
Proyecto:	**200303**	**-Generación de espacios públicos seguros para las mujeres y las niñas**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 18	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0
Proyecto:	**200306**	**-Implementación de estrategias para transformar imaginarios culturales sexistas**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 7	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 3


Secretaría de la Juventud


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2025

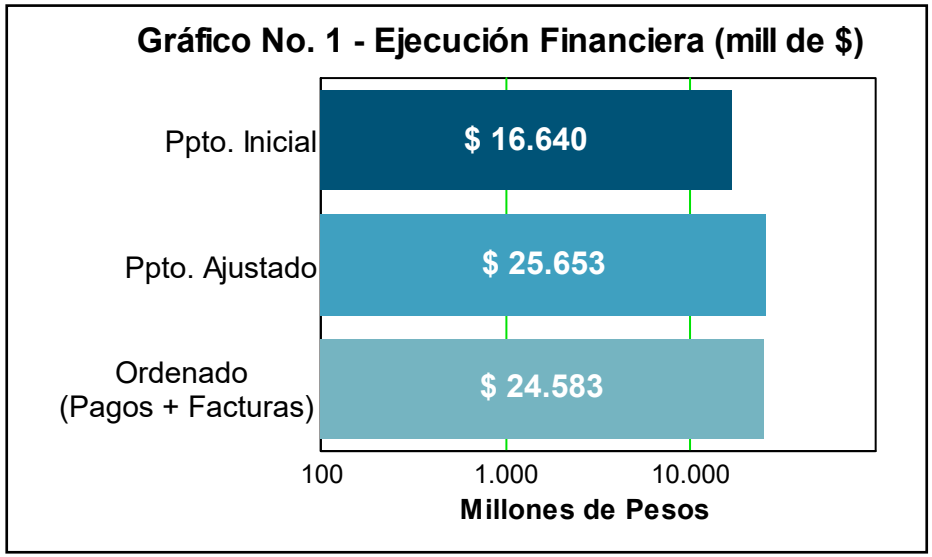


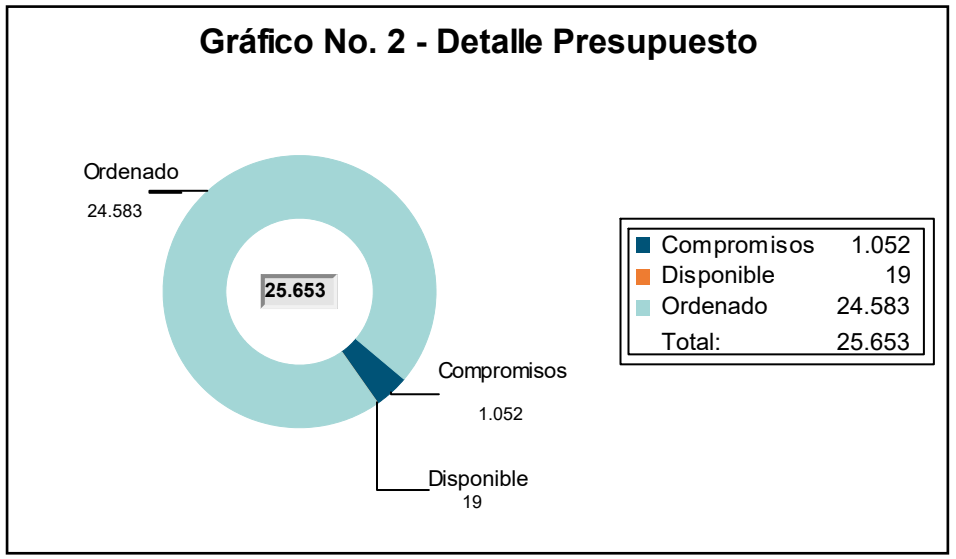

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre de 2025 comprende pagos y facturas

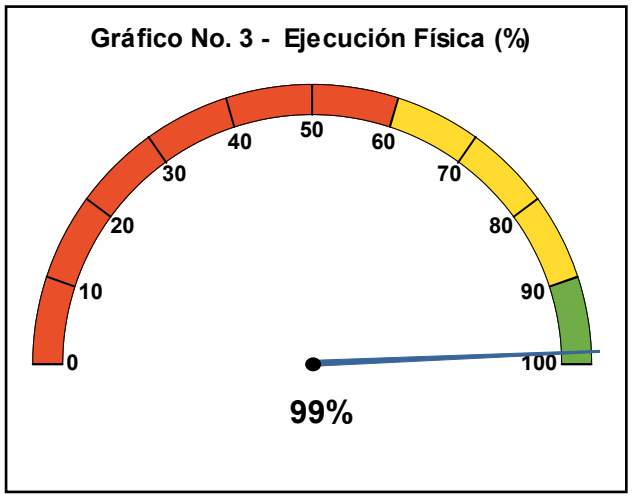

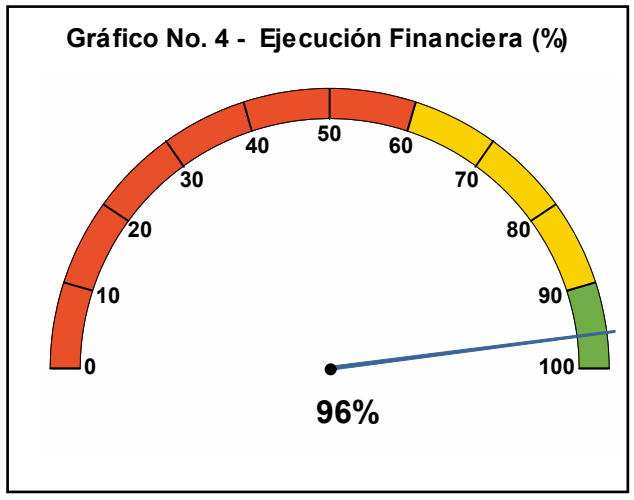

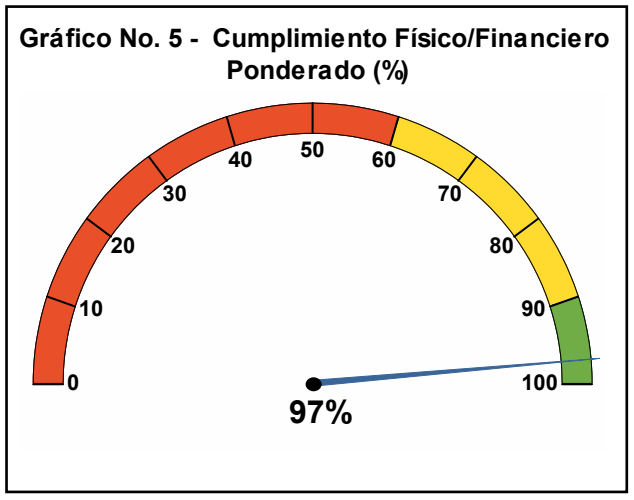

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente
Componente: 2.5 - Jóvenes: creadores y agentes de transformación social
Programa: 2.5.1 - Conexiones para el desarrollo del proyecto de vida de las juventudes

Proyecto: 240358 -Fortalecimiento de capacidades para el proyecto de vida - parceros creadores

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 93% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.733 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.989 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.596

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Oficina para la atención y orientación ciudadana adecuada				
JU58BA Niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiados	**Número**	**3.000**	**3.000**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 410205200

Descripción B/P/S: CBT: Acompañamiento cognitivo-conductual. Acompañamiento en terapia cognitivo-conductual: A través de sesiones basadas en técnicas cognitivo-conductuales, se dotará a los jóvenes de herramientas para la resolución de conflictos, afrontamiento de situaciones difíciles y técnicas de relajación, con el objetivo de mejorar su manejo del estrés y aumentar su tolerancia a la ansiedad. Moldeamiento Laboral: Entrenamiento para el empleo: A través de talleres, los jóvenes recibirán capacitación para acceder a empleos formales o instituciones educativas. Aprenderán a elaborar su hoja de vida, prepararse para entrevistas laborales y explorar opciones de financiación para su formación. Encuentros experienciales: Estos encuentros están diseñados para promover la salud mental, ayudando a los jóvenes a desarrollar habilidades para enfrentar y gestionar los riesgos a los que están expuestos. Intervenciones asistidas con animales (IAA) y desarrollo socioemocional: las IAA contribuyen significativamente al bienestar mental, reduciendo la ansiedad y creando un ambiente de confianza que facilita el aprendizaje y la rehabilitación, según Fine (2019). Este enfoque mejora la salud emocional de los participantes.

Proyecto: 240359 -Identificación y gestión de las alertas tempranas medellín - salvavidas

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 446 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 442 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 427

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
JU59BA Personas capacitadas	**Número**	**878**	**878**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: A través de las redes zonales de ciudad que se tienen en el proyecto se capacitarán estas mismas, a sus integrantes y a la población a la que impacten. También se realizarán alianzas con el equipo territorial para identificar lugares donde residan o se congregan jóvenes vulnerables para poder capacitarlos en salud mental, consumo de SPA y proyecto de vida, además se formarán 100 agentes protectores de cuidado en las problemáticas del sistema

JU59BB Documentos de lineamientos técnicos realizados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450104600

Descripción B/P/S: Informe que relaciona la atención al 100% de la alertas recibidas en la vigencia, Una persona estará encargada de estar detrás de la plataforma monitoreando el ingreso de las alertas, la derivación y el seguimiento individual de cada alerta o persona afectada reportada

Proyecto: 240364 -Desarrollo de acciones para la convivencia en el futbol - más que 90 minutos

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 817 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 809 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 781

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
JU64BA Personas capacitadas	**Número**	**452**	**452**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450104900

Descripción B/P/S: Con la Rexixtenxia Norte formaremos-capacitaremos barristas apoyándoles el programa "Aguante Musical". En este programa se forman jóvenes en instrumentos de viento y percusión; dejando un mensaje de convivencia y Fútbol y serán acompañados simultáneamente por salvavidas en una articulación que haremos entre programas, para tratar temas de prevención del consumo y salud mental. De igual manera, con la barra Los Del Sur apoyaremos su proyecto y formaremos a los jóvenes en "Liderazgos Positivos" promoviendo la convivencia en el fútbol y la cultura ciudadana en los diferentes escenarios deportivos y serán acompañados simultáneamente por salvavidas en una articulación que haremos entre programas, para tratar temas de prevención del consumo y salud mental. Por otra parte, también tenemos una formación planeada en las diferentes comunas y corregimientos con los jóvenes de estos territorios. Consiste en una formación integral para estos chicos que les servirá para afrontar las diferentes adversidades que se presenten en sus proyectos de vida. Estaremos en las instituciones educativas con la estrategia "Así Suena el Fútbol", consiste en una capacitación en el marco normativo de Cultura del Fútbol, siempre promoviendo la convivencia y la cultura ciudadana en el mundo del fútbol y en los escenarios deportivos.

JU64BB Instancias territoriales asistidas técnicamente	**Número**	**11**	**11**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450100100

Descripción B/P/S: Realizaremos toques de las instrumentales en diferentes actividades y eventos de la ciudad, serán espacios de integración donde promoveremos la convivencia en el fútbol y en los escenarios deportivos. Tendremos los "Partidos por la Convivencia", se realizaran mensualmente en diferentes canchas de las comunas y corregimientos. "Alentando por tu Comuna", serán encuentros que realizaremos para el público barrista, sus familias y comunidad en general. consiste en una feria de servicios, donde estarán vinculadas todas las entidades corresponsables de la Política Pública de Cultura del Fútbol. Segunda versión del Congreso del "Día de la Cultura del Fútbol, en esta conmemoración tenemos invitados periodistas internacionales, jugadores profesionales, exjugadores referentes, entre otras actividades relacionadas al fútbol y su historia. Foro con líderes de la ciudad, personajes que inspiren a los proyectos de vida de nuestros jóvenes barristas que sean ejemplo o hayan sido ejemplo de superación personal.

Proyecto: 240365 -Difusión de oportunidades con oferta pública y privada - medellín joven

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 276 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 956 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 935

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
JU65BA Personas capacitadas	**Número**	**3.200**	**3.200**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450104900

Descripción B/P/S: Este indicador corresponde a la Publicación de 800 oportunidades en la plataforma medellinjoven.com con el fin de conectar a los jóvenes con oferta gratuita de ciudad en educación, empleo, emprendimiento, deporte y de más. (Es de aclarar que la plataforma me permite visibilizar el numero de personas que visitan el portal mas no si se benefician de algún servicio específicamente. Acciones a realizar: •□ □Relacionamiento con dependencias del Distrito con el fin de visibilizar la oferta para la juventud. •□ □□Alianzas con entidades públicas, privadas, mixtas, comunitarias o sociales con el fin de recoger las oportunidades que tengan para los jóvenes.

JU65BB Documentos de lineamientos técnicos realizados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450104600

Descripción B/P/S: Elaborar un documento que de cuenta de las Acciones a realizar: •□ Generar estrategias de difusión o convocatoria de cada proyecto de la secretaria de acuerdo a la necesidad •□ □□Enviar información a correos electrónicos de las bases de datos de Medellín Joven. •□ □□Desarrollo y modificación de micrositios de los proyectos o eventos de la secretaria •□ □□Difusión y promoción de los espacios a través del WhatsApp de la Secretaría de la Juventud.

Proyecto: 240366 -Actualización del índice de desarrollo juvenil y de la política publica

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 89% **Ejec. Financiera :** 54% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 71%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 494 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 269

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de política				
JU66DA Documentos de política elaborados	**Porcentaje**	**45**	**40**	**89%**

Código. Ind. SUIFP: 459903200

Descripción B/P/S: Realización de la evaluación de la política pública de juventud: se finalizará la evaluación de la política pública de juventud, a través de la realización del análisis narrativo de los proyectos ejecutados por la Secretaría de la Juventud durante los últimos 10 años. Posteriormente, se realizará el análisis respectivo de la información recolectada y la redacción del informe de evaluación, un informe ejecutivo para publicación, la presentación formal de los resultados de la evaluación y una estrategia comunicacional para difundir los resultados. Con relación a la implementación del IDJ (Índice de Desarrollo Juvenil) que será el diagnóstico de la nueva política pública se realizarán las siguientes actividades: la creación del instrumento de medición; la validación de su estructura; la elaboración de estudios previos para la contratación según lineamientos públicos; el proceso de contratación y posterior ejecución por parte del contratista seleccionado, quien realizará el trabajo de campo, implementación, la captura de datos; y finalmente, la consolidación en base de datos según criterios de calidad.

Observación B/P/S: Avanzamos en el desarrollo de actividades orientadas a las etapas de elaboración del diagnóstico e identificación del problema público. En la primera, culminamos la redacción del documento de Evaluación de la Política Pública de Juventud, iniciando su ajuste editorial e incorporando de manera sistemática las observaciones de corrección de estilo en forma y fondo. Este proceso permitió mejorar la claridad, coherencia y estructura del texto, reorganizar la presentación de resultados y orientar las conclusiones y recomendaciones hacia sus implicaciones y valor agregado, con el fin de consolidar un documento más conciso y sólido. Asimismo, remitimos al DAP el plan de trabajo y el cronograma definidos para la planificación, seguimiento y control de actividades, responsabilidades, tiempos y entregables del proceso. En la etapa de identificación del problema público, avanzamos en la elaboración de una matriz de sistematización de problemáticas, relacionadas de manera preliminar con alternativas de solución surgidas de los diálogos participativos. Este ejercicio incluyó la estructuración de fichas de observación de dichos espacios y la realización del último diálogo juvenil del año, con la participación de jóvenes vinculados al Sistema de Restablecimiento de Derechos. El cumplimiento de la meta establecida (45 %) no fue posible debido a que, a la fecha del presente informe, no se cuenta con la versión final de los insumos requeridos para la determinación del diagnóstico (análisis de antecedentes, marco normativo y causalidad), ni con la definición del problema público y el mapa de actores. Para alcanzar esta meta, será necesario disponer de los resultados de la medición de bienestar juvenil, actualmente en fase de levantamiento de información en campo, los cuales aportarán elementos críticos para caracterizar la realidad de la población joven. Es importante precisar que este indicador corresponde a un proceso estructural de actualización de política pública, cuya naturaleza metodológica y participativa exige el desarrollo de fases sucesivas de diagnóstico, evaluación, concertación y formulación que trascienden una sola vigencia. El avance reportado en 2025 consolida la fase técnica más compleja del proceso —evaluación y estructuración metodológica— y sienta las bases para la formulación definitiva en 2026. En este sentido, el comportamiento del avance cuatrienal responde a la secuencia lógica del proceso y no representa un riesgo para el cumplimiento de la meta prevista para 2027.

JU66DB Documentos de lineamientos técnicos realizados	**Porcentaje**	**85**	**75**	**88%**

Código. Ind. SUIFP: 459901800

Descripción B/P/S: Medición del Índice : El Índice de Desarrollo Juvenil se desarrollaran las siguientes actividades: primero, la creación del instrumento de medición; segundo, la validación de su estructura; tercero, la elaboración de estudios previos para la contratación según lineamientos públicos; cuarto, el proceso de contratación y posterior ejecución por parte del contratista seleccionado, quien realizará el trabajo de campo, implementación, la captura de datos; y finalmente, la consolidación en base de datos según criterios de calidad

Observación B/P/S: Avanzamos en la Medición de Bienestar Juvenil de Medellín con el cumplimiento parcial de su objeto y alcance, mediante el desarrollo completo del Componente I (Diseño metodológico y alistamiento) y un avance parcial del Componente II (Captura, sistematización y procesamiento de datos). En el Componente I, consolidamos el diseño metodológico del estudio, el cual incluyó: el enfoque integral, diferencial, interseccional y territorial; la definición de las dimensiones de bienestar; el diseño y validación del cuestionario; los procedimientos de muestreo, captura y control de calidad; y el plan operativo del trabajo de campo. Cabe resaltar que se realizó una prueba piloto que permitió realizar ajustes técnicos y confirmar la viabilidad operativa y la duración adecuada del instrumento. Por su parte, en el Componente II, iniciamos el trabajo de campo y la captura de información con el apoyo de personal debidamente capacitado en Enfoque de Juventud, para la implementación de criterios éticos y protocolos técnicos adecuados. El logro total de la meta del indicador (85 %) no se alcanzó debido a contingencias externas que afectaron la ejecución del trabajo de campo, entre ellas la temporada navideña, restricciones de seguridad en algunas comunas y una baja tasa de respuesta (16 %), lo que limitó el volumen de encuestas recolectadas. Para mitigar estos efectos, la Secretaría implementó acciones correctivas inmediatas, como la ampliación del equipo de encuestadores, ajustes operativos y el fortalecimiento del seguimiento técnico al contrato. De manera paralela, se avanzó en la sistematización, validación y construcción parcial de las bases de datos, así como en el análisis de reportes de control de calidad, lo que permitió asegurar la calidad metodológica del proceso. En consecuencia, el avance reportado no compromete el cumplimiento de la meta cuatrienal, dado que el componente metodológico —el de mayor complejidad técnica— quedó completamente consolidado en 2025, dejando estructurada la base técnica necesaria para culminar la medición en la siguiente vigencia.

Proyecto: **240367 -Apoyo a la gestión de la secretaria de la juventud**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.966 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.837 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.833

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de asistencia técnica en políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud				
JU67BA Agentes de la institucionalidad de infancia, adolescencia y juventud asistidos técnicamente	**Número**	**10.883**	**10.883**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 410204700

Descripción B/P/S: El cumplimiento de este indicador obedece al acumulado de las atenciones que se realicen desde la secretaria en todos los proyectos para el cumplimiento de los 16 indicadores, incluyendo los indicadores que se relacionan a continuación : 1.Dependencias del distrito acompañadas para la implementación de sello joven. 2. Alianzas constituidas con el sector social empresarial para promover el desarrollo integral de las y los jóvenes. 3.Atenciones realizadas a jóvenes rurales de los diferentes proyectos de la secretaría de la juventud,

Proyecto: **240368 -Apoyo al desarrollo musical y creativo juvenil - medellín music lab**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 96% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.146 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.188 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.109

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
JU68AC Personas capacitadas	**Número**	**400**	**400**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: En 2026 se desarrollarán dos cohortes de Medellín Music Lab, Los participantes adquirirán tanto habilidades técnicas relacionadas con la industria musical como competencias blandas enfocadas en el desarrollo personal y el propósito de vida. Además, se ofrecerá formación continua a través de charlas abiertas al público general y un podcast especializado en el ecosistema de la industria musical de Medellín. Estas iniciativas no solo cumplen con el indicador anual, sino que lo superan ampliamente, gracias al crecimiento exponencial que ha experimentado la estrategia en términos de alcance y presupuesto.

Programa: 2.5.2 - Participación y democracia joven

Proyecto: 240360 -Divulgación de las agendas juveniles - agenda joven

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 94% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.539 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.638 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.434

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de integración de la oferta pública				
JU60BA Espacios de integración de oferta pública generados	**Número**	**14**	**14**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902900

Descripción B/P/S: semana de la juventud(se realizara en diferentes territorios del distrito a través de oferta académica cultural y de entretenimiento), Festival medayoug , reconocimientos proyector, seminarios de comunicación juvenil, festival de oportunidades 1,2,3; Toma salvavidas, Evento parceros, Evento Referentes

Proyecto: 240361 -Fortalecimiento para la incidencia de las instancias y escenarios juveniles

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 94% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 565 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 559 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 523

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
JU61BA Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	**Número**	**2**	**2**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: 1.Acompañamiento técnico, financiero y administrativo del Subsistema de participación juvenil y subsistema institucional de juventud (que son los q conforman el sistema distrital de juventud) en las diferentes acciones desarrolladas por las instancias del subsistema de participación juvenil. 2- Promover espacios de diálogo y articulación con diferentes entidades tanto del sector público, privado y la sociedad civil. 3- Velar y acompañar técnicamente el cumplimiento de las responsabilidades adquiridas por lo dictado en la ley 1885 de 2018. 4- Acompañar las agendas territoriales de las instancias del subsistema de participación juvenil.

JU61BB Personas capacitadas	**Número**	**50**	**50**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Se realizará un diplomado en liderazgo público cuyo objetivo será brindar herramientas teóricas y prácticas a 50 jóvenes con vocación de liderazgo para que puedan desarrollar habilidades en torno a la toma de mejores decisiones, la generación de pensamiento crítico, el ejercicio de un liderazgo basado en la ética, la implementación de herramientas de formulación y ejecución de proyectos y, finalmente, la creación de una red de líderes jóvenes en Medellín.

JU61BC Documentos de lineamientos técnicos realizados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450203200

Descripción B/P/S: Corresponde a un informe que detalle el acompañamiento a las instancias, donde se evidencien las diferentes acciones realizada por la secretaria de la juventud entorno a visibilizar y articular los diferentes escenarios e instancias del subsistema de participación juvenil, se llevarán a cabo acciones a través de canales digitales y presenciales. Estas acciones incluirán ferias, reuniones territoriales, Asambleas Distritales de Juventud y otros espacios que promuevan la articulación entre el sector privado, el sector público, la academia y la sociedad civil. Para lograr este objetivo, se extenderán citaciones e invitaciones a los jóvenes que forman parte del subsistema de participación juvenil.

Proyecto: 240362 -Apoyo a las organizaciones juveniles - clubes juveniles

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 96% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.054 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.043 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 999

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
JU62BA Instancias territoriales asistidas técnicamente	**Número**	**3.200**	**3.200**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450100100

Descripción B/P/S: Se atenderán 3,300 jóvenes pertenecientes a clubes juveniles mediante una estrategia integral que incluye acciones cívicas para fortalecer la participación ciudadana y el sentido comunitario; procesos de formación con talleres y capacitaciones que potencian habilidades de liderazgo y trabajo en equipo; estímulos económicos que faciliten la implementación de proyectos juveniles; intercambios de saberes y experiencias para fomentar la colaboración y el aprendizaje colectivo; ferias de emprendimiento que impulsan iniciativas económicas; asambleas de la red de clubes para garantizar la representación y liderazgo juvenil; movilizaciones digitales para amplificar causas e iniciativas; y apoyo a presentaciones de clubes juveniles que visibilicen sus talentos y proyectos en la comunidad.

JU62BB Instancias territoriales asistidas técnicamente	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450100100

Descripción B/P/S: Se implementarán estrategias para asistir instancias territoriales de clubes juveniles a través de acciones cívicas, procesos de formación, estímulos económicos, intercambios de saberes, ferias de emprendimiento, asambleas de red de clubes, movilizaciones digitales y presentaciones públicas. Para garantizar el seguimiento y la transparencia, se debe elaborar un documento que registre el número de clubes asistidos, especificando las acciones realizadas en cada territorio y su impacto en la participación y desarrollo juvenil.

Proyecto: 240363 -Apoyo para el reconocimiento del territorio - medellín en la cabeza

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 597 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 591 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 591

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
JU63BA Personas capacitadas	**Número**	**1.295**	**1.295**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450104900

Descripción B/P/S: Se realizaran acciones encaminadas a los siguientes tres componentes: 1. Componente Formación por medio de recorridos y el reconocimiento de los territorios de la ciudad. 2. Componente Gestión de Incidencia pública, articulación y comunicación. 3. Componente Sistema de Información y Evaluación. Para ello se realizaran 67 recorridos divididos en 6 líneas temáticas: - El centro, la comuna de todos - Jóvenes y empresarios - Medellín líder y creativa - Somos educación, arte y cultura. - Medellín rural. - Laboratorio urbano y memorias de ciudad. Dichos recorridos tienen como objetivo principal ofrecer recorridos locales con una duración aproximada de 4 horas utilizando herramientas pedagógicas innovadoras para resignificar los espacios urbanos y rurales de Medellín, promoviendo la reflexión, la creatividad, el pensamiento critico, la empatía y la generación de acciones que transformen e impacten positivamente los diferentes territorios de la ciudad.

JU63BB Documentos de lineamientos técnicos realizados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450104600

Descripción B/P/S: Se realizara un informe que describa los 67 recorridos temáticos encaminados a promover un pensamiento critico en los jóvenes por medio de metodologías que permitan desarrollar un reconocimiento de la ciudad, además de un pensamiento critico y empático enfocado en fortalecer una ciudadanía joven más consiente frente a los retos y oportunidades que presentan los distintos territorios de la ciudad. Se gestarán conversaciones entre diferentes para poder reconocer visiones diversas de la ciudad construidas a partir de las realidades observadas en cada uno de los territorios.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente
Componente: 2.5 - Jóvenes: creadores y agentes de transformación social
Programa: 2.5.2 - Participación y democracia joven

Proyecto: 250048 -25pp99-fortalecimiento de la incidencia y organización juvenil medellin

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 821 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 821

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
JU48BA Personas capacitadas	**Número**	**207**	**247**	**119%**

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: A través del proyecto se desarrollará un proceso formativo que beneficiará a un total de 207 jóvenes. De ellos, 120 participarán en espacios de formación sobre temáticas definidas conjuntamente con las juventudes, orientadas al fortalecimiento de su capacidad de agenciamiento y a la construcción de sus proyectos de vida. Asimismo, se llevará a cabo un proceso formativo mediante laboratorios creativos dirigido a 87 jóvenes, con el propósito de apoyar 29 iniciativas juveniles y fortalecer las organizaciones juveniles, promoviendo su empoderamiento y el desarrollo de sus potencialidades.

Observación B/P/S: El aumento de la meta de jóvenes beneficiados con el proyecto de PP, que pasa de 207 a 247, se fundamenta en la propuesta presentada por la Universidad Luis Amigó, la cual ejecutó 20 cupos adicionales para cada una de las 2 comunas. Esta ampliación se debe a la capacidad operativa y académica de la Universidad para acoger un mayor número de jóvenes sin afectar la calidad de los procesos formativos ni los recursos planeados. Además, este ajuste permitió ampliar el impacto del proyecto, garantizando el acceso de más jóvenes a las actividades programadas y fortaleciendo el cumplimiento de los objetivos planteados. La modificación de la meta no representó cambios sustanciales en la planeación del proyecto, sino una oportunidad de fortalecer los resultados y beneficios

JU48BB Espacios de participación promovidos	**Número**	**10**	**10**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Se concertarán y planearán con las juventudes un total de diez (10) acciones: siete (7) de apropiación y reconocimiento territorial, y tres (3) de visibilizarían de dinámicas y prácticas juveniles. Estas actividades permitirán a los jóvenes exponer y potenciar sus talentos a través de festivales juveniles en las comunas 8 (Villa Hermosa) y 9 (Buenos Aires)

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 200106 -Protección de las libertades juveniles - tejedores de vida

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 83 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 70

Proyecto: 200107 -Fortalecimiento del sistema de alertas tempranas - sat med

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 53 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 53

Proyecto: 200166 -Asesoría en salud para jóvenes vulnerables - emancipados

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2

Proyecto: 200167 -Prevención de consumos problemáticos en las juventudes - conscientes

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5

Proyecto: 200108 -Fortalecimiento de la movilización de agendas juveniles - agenda joven

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 89 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 86


Proyecto: 200109 -Divulgación de estéticas e identidades juveniles - indefinibles


Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6

Proyecto:	**200164**	**-Fortalecimiento de mercados juveniles en la cuarta revolución industrial - jóvenes 4.o**				
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 7	**Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7
Proyecto:	**200165**	**-Asistencia económica para jóvenes vulnerables medellín**				
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 9	**Ejec. Financiera (mill de $):** $ 9
Proyecto:	**200168**	**-Fortalecimiento del subsistema institucional del sistema municipal de juventud**				
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 11	**Ejec. Financiera (mill de $):** $ 11
Proyecto:	**200169**	**-Formación y organización para la participación ciudadana juvenil - democracia joven**				
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 17	**Ejec. Financiera (mill de $):** $ 10
Proyecto:	**200171**	**-Aportes de las juventudes para la transformación del territorio - medellín en la cabeza**				
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 4	**Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4


Secretaría de Paz y Derechos Humanos


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2025

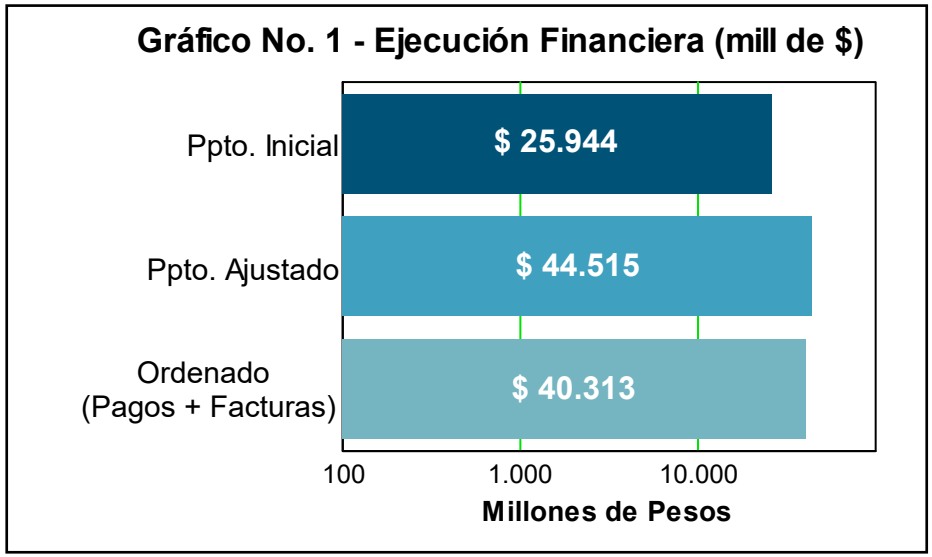


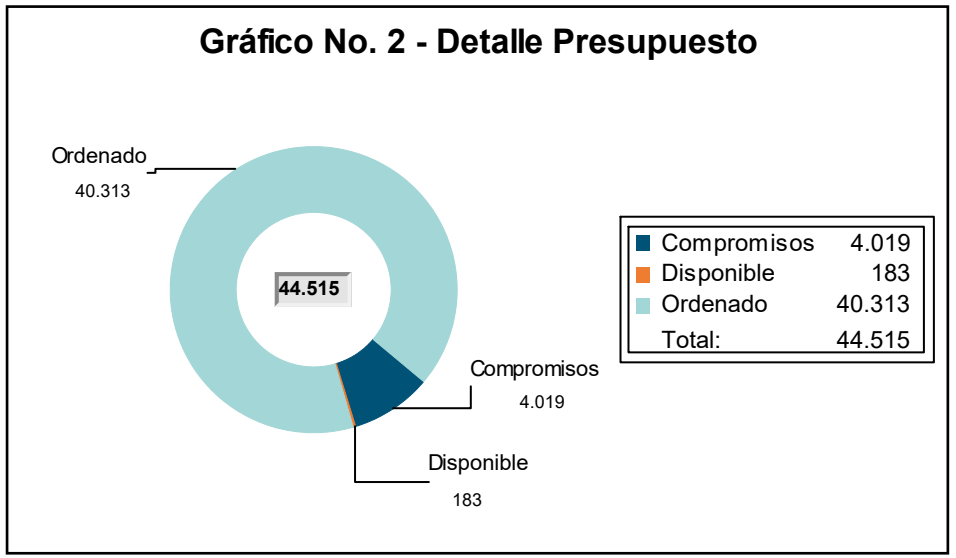

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre de 2025 comprende pagos y facturas

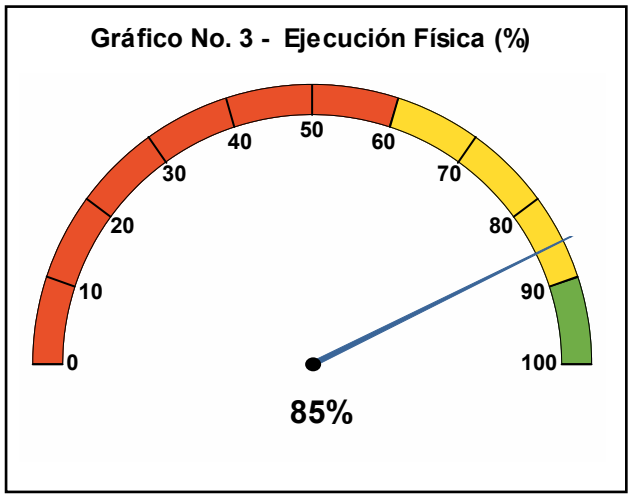

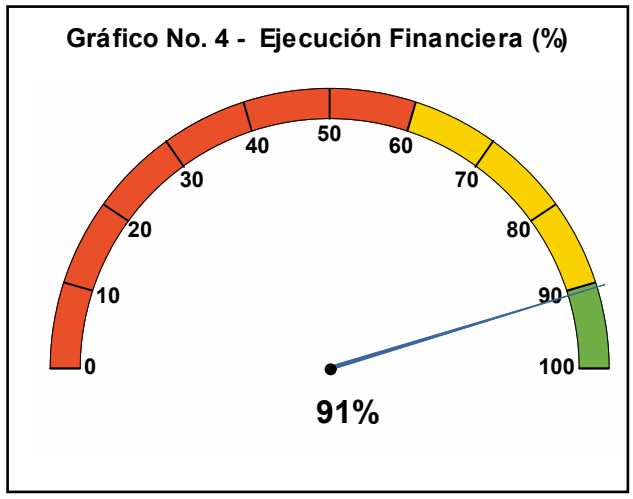

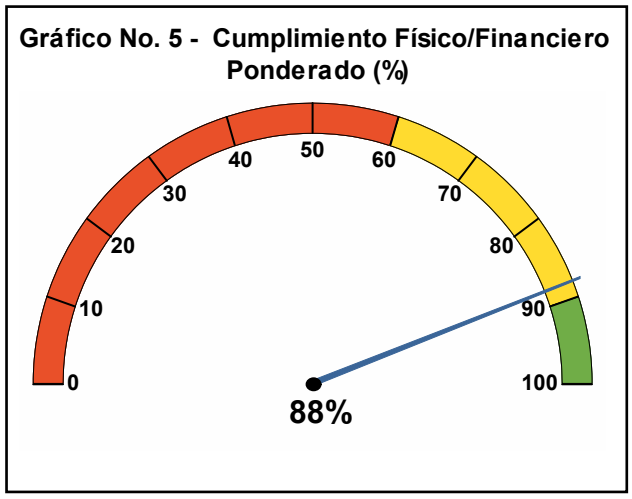

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente
Componente: 2.4 - Paz, víctimas y Derechos Humanos
Programa: 2.4.1 - Derechos Humanos y construcción de paz ciudadana

Proyecto: **240280 -Prevención de vulneraciones y promoción de los derechos humanos**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 92% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 8.298 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 11.526 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 10.623

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción a la participación ciudadana				
PD80AA Espacios de participación promovidos	**Número**	**36**	**37**	**103%**

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Corresponde al diseño e implementación de acciones y estrategias que promuevan el ejercicio de la participación ciudadana para el respeto y garantía de los derechos humanos.

Observación B/P/S: Durante el periodo se realizaron 37 espacios de participación, los cuales han permitido el desarrollo de acciones estratégicas para fortalecer la promoción de los derechos humanos, la incidencia territorial y la construcción de memoria, mediante el acompañamiento a organizaciones de derechos humanos en las comunas y corregimientos del Distrito de Medellín.

PD80AB Misiones humanitarias realizadas	**Número**	**108**	**108**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450201900

Descripción B/P/S: Mediante los cuales se activan mecanismos orientados a neutralizar o superar las causas y circunstancias que generan riesgo en el marco del conflicto armado interno, con el fin de prevenir la ocurrencia de violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Observación B/P/S: En el marco del conflicto armado interno, el Sistema Distrital de Derechos Humanos activó mecanismos de prevención, atención y acompañamiento orientados a mitigar riesgos y prevenir vulneraciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Estas acciones incluyeron la activación de rutas, la elaboración de análisis de contexto, el acompañamiento a movilizaciones sociales y la atención permanente en derechos humanos.

PD80AC Documentos metodológicos realizados	**Número**	**13**	**13**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450202900

Descripción B/P/S: Documentos técnicos que describen y sistematizan métodos, herramientas analíticas y procesos para la realización de análisis específicos EN DDHH, incorporando lineamientos metodológicos con desarrollo pedagógico, normativo, psicosocial y operativo, orientados a garantizar coherencia técnica, toma de decisiones informadas y adecuada implementación de la estrategia.

Observación B/P/S: Durante el mes de diciembre se realizaron ajustes específicos a los documentos metodológicos asociados a la aprobación de vulneraciones, incorporando actualizaciones en los componentes de líderes sociales, la caja de herramientas y el Informe Manual de Derechos Humanos, con el propósito de fortalecer la coherencia técnica, la trazabilidad del valor estadístico y la alineación con los lineamientos del Plan de Acción.

PD80AD Medidas implementadas en cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario	**Número**	**12**	**12**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450202400

Descripción B/P/S: Documentos técnicos que describen y sistematizan métodos, herramientas analíticas y procesos para la realización de análisis específicos, incorporando referentes de instancias internacionales frente a violaciones de Derechos Humanos, orientados al cumplimiento de las obligaciones del Estado colombiano.

Observación B/P/S: Fortalecimos las capacidades distritales de seguimiento, análisis en DD.HH y Derecho Internacional Humanitario, mejorando la evaluación del cumplimiento de obligaciones internacionales. Avanzamos en debida diligencia empresarial y en acciones de protección a líderes sociales y personas defensoras de DD.HH, en cumplimiento del marco normativo vigente y los compromisos internacionales del Distrito de Medellín.

Proyecto: **240281 -Desarrollo de estrategias para la paz ciudadana y la trasnformación territorial**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.080 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 878 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 865

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
PD81AA Personas capacitadas	**Número de personas**	**5.296**	**5.349**	**101%**

Código. Ind. SUIFP: 450104900

Descripción B/P/S: Corresponde a las iniciativas pedagógicas, académicas y de incidencia pública orientadas a fortalecer la cultura de paz, mediante experiencias abiertas a la ciudadanía que promueven la resignificación de las relaciones sociales, la prevención de violencias y la protección de los derechos humanos en el Distrito de Medellín.

Observación B/P/S: Promovimos en el 2025 la participación de 5.349 personas en diversas comunas, logrando mostrar cómo la pedagogía para la paz fortalece la apropiación ciudadana, fomenta la reflexión intergeneracional y genera aprendizajes colectivos que promueven convivencia y transformación cultural.

PD81AB Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas	**Número**	**12**	**12**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450100400

Descripción B/P/S: Organizaciones constructoras de paz que participan en procesos de fortalecimiento de capacidades para la construcción de paz, la autogestión y la incidencia pública, contribuyendo a procesos de reconciliación, memoria, convivencia pacífica y a mejores condiciones de vida para los habitantes de la ciudad.

Observación B/P/S: Logramos fortalecer procesos organizativos que trabajan por la paz en el Distrito, impulsando su incidencia pública y acciones para la transformación de violencias en sus territorios, a través del apoyo a once iniciativas comunitarias.

PD81AC Instancias territoriales asistidas técnicamente	**Número**	**30**	**30**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450100100

Descripción B/P/S: Corresponde al número de agendas, procesos, espacios organizativos, instancias formales y no formales de participación fortalecidos por la Secretaría, orientados a la construcción de paz con enfoque restaurativo, la gestión pacífica de los conflictos y el fortalecimiento del tejido social en el Distrito.

Observación B/P/S: Las asistencias técnicas realizadas en las comunas 6 y 7 fortalecieron la apropiación de la Política Pública de Paz, generando espacios de diálogo, reflexión y aprendizaje colectivo que promueven la resolución pacífica de conflictos y el fortalecimiento de iniciativas comunitarias de convivencia.

PD81AD Documentos de lineamientos técnicos realizados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450104600

Descripción B/P/S: Corresponde a la elaboración de documentos de lineamientos técnicos que sistematizan buenas prácticas en procesos de construcción de paz, a partir de experiencias territoriales y aprendizajes institucionales. Estos documentos analizan metodologías, enfoques y resultados, y formulan orientaciones y recomendaciones técnicas que fortalecen la planeación, implementación y replicabilidad de acciones orientadas a la transformación pacífica de los territorios.

Observación B/P/S: El documento da cuenta de los resultados y el análisis de la experiencia en el proyecto de Paz Ciudadana, evidenciando acciones de pedagogía para la paz, transformación de conflictos, reconciliación y fortalecimiento de procesos organizativos, así como su contribución a entornos más pacíficos y reconciliados en los territorios.

Proyecto: 240283 -Contribución a la justicia juvenil restaurativa y prevención del delito con la infancia y adolescencia

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.637 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.011 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.981

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encamina				
PD83AA Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidios en los servicios de restablecimiento en la administración de justicia	**Número**	**500**	**509**	**102%**

Código. Ind. SUIFP: 410203800

Descripción B/P/S: Adolescentes y jóvenes del SRPA que acceden a los servicios de atención psicosocial y formación humana con enfoque pedagógico y restaurativo en instituciones: La Acogida, Casa STAR, Asperla y Escuela de trabajo San José.

Observación B/P/S: Logramos la atención de 509 adolescentes y jóvenes a través de diversas líneas estratégicas: seguimiento a tratamiento por consumo de drogas realizado en Casa STAR, la atención psicológica y activación de rutas de protección a jóvenes del SRPA que lo requirieron. Asimismo, se realizaron acciones de sensibilización para jóvenes ofensores y actividades de formación en La Acogida, Escuela de Trabajo San José y Asperla, complementados con talleres de proyecto de vida.

PD83AB	**Personas capacitadas**	**Número de personas**	**1.000**	**1.056**	**106%**

Código. Ind. SUIFP: 410204500

Descripción B/P/S: Dirigido a la población de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, así como a sus padres, madres, cuidadores y docentes. Los servicios se centran en la socialización de temas relacionados con el reconocimiento de los derechos de la niñez, la adolescencia y la juventud, buscando generar conciencia sobre la legalidad y la prevención de conductas delictivas en este grupo poblacional.

Observación B/P/S: Durante este periodo, nuestro impacto alcanzó a 1.056 personas que participaron en dos áreas clave de formación y fortalecimiento: talleres de formación con Padres de Familia en la escuela de padres de Casa STAR y encuentros formativos en Justicia Restaurativa y prevención del delito, realizados en Instituciones Educativas del Distrito.

Programa: 2.4.2 - Atención – reparación integral a víctimas del conflicto armado y Justicia Transicional y Restaurativa

Proyecto: **240279 -Implementación y seguimiento de la política pública de atención, asistencia y reparación a vícitmas del conflicto armado**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 99% **Ejec. Financiera :** 90% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 94%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 10.919 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 17.458 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 15.635

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios					
PD79AA	**Acciones ejecutadas con las comunidades**	**Número**	**10**	**10**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 410107900

Descripción B/P/S: Corresponde a diez (10) informes que contienen la identificación, atención y seguimiento a riesgos individuales y territoriales del componente de Prevención y Protección.

Observación B/P/S: Con corte al 31 de diciembre, se logra la meta de 10 informes que dan cuenta de la identificación, atención y seguimiento de 33 casos de riesgos individuales (inminentes o materializados) que afectaron a 108 personas.

PD79AB	**Personas con asistencia humanitaria**	**Número de personas**	**7.600**	**7.011**	**92%**

Código. Ind. SUIFP: 410102500

Descripción B/P/S: Corresponde a 7.600 personas con entregas de paquete alimentario, kit de hábitat, temporalidad y albergue.

Observación B/P/S: Con corte al 31 de diciembre se logra un porcentaje de cumplimento del 92%, lo que corresponde a las dinámicas de conflictividad armada en el país y en consecuencia, a la demanda de atención inmediata de la población. Durante el 2025, se atendieron 7.011 personas en el marco de atención humanitaria en las modalidades de paquete alimentario, kit de hábitat, aseo, cocina y temporalidad.

PD79AC	**Solicitudes tramitadas**	**Número**	**80**	**100**	**125%**

Código. Ind. SUIFP: 410102300

Descripción B/P/S: Corresponde a 80 unidades productivas fortalecidas.

Observación B/P/S: Durante el mes de diciembre se realizó la entrega de 20 apoyos adicionales a las unidades productivas con la disposición de un nuevo recurso, lo cual permitió superar la meta inicialmente establecida de 80 y consolidar un cumplimiento acumulado del 125 % del indicador. En total, se logró el fortaleciendo técnico y financiero de 100 unidades productivas lideradas por víctimas del conflicto armado.

PD79AD	**Víctimas que acceden a medidas de satisfacción y de garantías de no repetición a nivel individual**	**Número**	**1.200**	**1.202**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 410109200

Descripción B/P/S: Corresponde a 1.200 víctimas (personas) que participan de acciones enmarcadas en la medida de satisfacción, lo cual incluya actos de conmemoración, fechas emblemáticas y entrega de libretas militares. También se incluyen las personas que participan de estrategias de Garantías de No Repetición (Gestores y Gestoras de Paz e iniciativas de memoria con organizaciones comunitarias y de víctimas).

Observación B/P/S: Con corte al 31 de diciembre se logra un porcentaje de cumplimento del 100% de la meta definida para la vigencia.

PD79AE	**Víctimas con rehabilitación psicosocial**	**Número**	**1.500**	**1.508**	**101%**

Código. Ind. SUIFP: 410109100

Descripción B/P/S: Corresponde a 1.200 personas atendidas en rehabilitación psicosocial individual, colectivas, familiares y comunitarias (sin duplicados). Las personas atendidas con rehabilitación psicosocial individual se reportan cuando se cierre el proceso de acompañamiento que contempla entre 2 y 6 sesiones según las necesidades identificadas.

Observación B/P/S: Con corte a diciembre se logró la atención psicosocial de 1.508 personas, superando la meta de la vigencia.

PD79AF	**Hogares apoyados con procesos de acompañamiento comunitario**	**Número**	**200**	**200**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 410107400

Descripción B/P/S: Corresponde a 200 retornos o reubicaciones efectivas por grupo familiar.

Observación B/P/S: Con corte a diciembre se logró la atención de 200 familias que accedieron al derecho al retorno y la reubicación con garantías de seguridad, voluntariedad y dignidad.

PD79AG	**Documentos de planeación elaborados**	**Número**	**5**	**5**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 410110300

Descripción B/P/S: Corresponde a un (1) informe de balance anual de la Política Pública de Víctimas (vigencia vencida), y cuatro (4) documentos reportes de seguimiento a la Política.

Observación B/P/S: Al mes de diciembre, se posee un 100% de cumplimiento de la meta. A corte de diciembre se logró la elaboración de cinco documentos de seguimiento a la implementación de la política pública de atención y reparación a víctimas, evidenciando los avances y recomendaciones para mejorar su implementación.

Proyecto: 240284 -Apoyo a personas en procesos de reintegración, reincorporación y comparecientes de fuerza pública, a la vida social y económica

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 91% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.067 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.115 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.925

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable					
PD84AA	**Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social**	**Número**	**110**	**162**	**147%**

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a 100 personas (reincorporados, reintegrados, comparecientes de fuerza pública y familiares) que acceden a ofertas culturales, sociales e institucionales.

Observación B/P/S: En la vigencia 162 personas accedieron a diferentes servicios de salud, empleabilidad, recreación, orientación socio jurídica, en el desarrollo de ferias institucionales. Se reporta un cumplimiento del 147%. Esta sobre ejecución es resultado de una mayor demanda de acceso a servicios por parte de la población de interés.

PD84AB	**Personas inscritas**	**Número de personas**	**40**	**62**	**155%**

Código. Ind. SUIFP: 410300400

Descripción B/P/S: Corresponde a 40 personas beneficiarias (en proceso de formación y culminación) en educación formal e informal con certificación.

Observación B/P/S: Con corte a diciembre se logra la certificación de 62 personas superando la meta de la vigencia, en respuesta a la alta demanda de la población y la efectividad de las gestiones adelantadas con otras entidades.

PD84AC	**Personas vinculadas a empleo formal para población vulnerable**	**Número de personas**	**30**	**36**	**120%**

Código. Ind. SUIFP: 410301000

Descripción B/P/S: Corresponde a 35 personas vinculadas a empleo formal.

Observación B/P/S: Durante la vigencia, se logra la vinculación laboral de 36 personas, 19 en proceso de reincorporación, 11 en reintegración y 6 comparecientes de la Fuerza Pública. Se reporta un cumplimiento del 120% de la meta. Esta sobre ejecución es el resultado de una efectiva articulación con diversas dependencias, entidades y actores privados, lo que ha permitido ampliar la oferta laboral para la población de interés.

PD84AD	**Proyectos productivos formulados**	**Número**	**62**	**84**	**135%**

Código. Ind. SUIFP: 410300500

Descripción B/P/S: Corresponde a 62 proyectos productivos fortalecidos técnica y/o financieramente.

Observación B/P/S: Con corte a diciembre, se logra el fortalecimiento de 84 unidades productivas, superando la meta de la vigencia, en respuesta a la demanda de la población y la disposición de recurso para garantizar el fortalecimiento financiero de los emprendimientos caracterizados.

PD84AE	**Documentos de lineamientos técnicos elaborados**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 410306000

Descripción B/P/S: Corresponde a 1 documento (informe final) que dé cuenta de la implementación de la ruta de prevención y protección.

Observación B/P/S: En esta vigencia se realizó la actualización de la ruta de prevención y protección de riesgos a la vida, la seguridad y la integridad personal de las personas en proceso de Reintegración, Reincorporación y Fuerza Pública.

Programa: 2.4.3 - Resocialización e integración social y económica de la población sindicada, privada de la libertad y pospenada

Proyecto: **240282 -Reintegración, resignificación y reincorporación a la vida social y económica de la población con realidad carcelaria y sus familias**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 86% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 93%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.941 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.043 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.747

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de resocialización de personas privadas de la libertad					
PD82AB	**Personas privadas de la libertad (ppl) que reciben servicio de resocialización**	**Número de personas**	**400**	**406**	**102%**

Código. Ind. SUIFP: 120600500

Descripción B/P/S: Este indicador se mide a partir del número de Personas Privadas de la Libertad y Preliberadas que participan de los servicio de resocialización (Atención psicosocial, brigadas institucionales, sensibilizaciones, talleres de preparación para la libertad a personas preliberadas, fortalecimiento de los vínculos familiares, atención jurídica, entre otros).

Observación B/P/S: Durante la vigencia, el componente de Cárceles realizó 406 atenciones dirigidas a Personas Privadas de la Libertad (PPL) y preliberadas. Estas atenciones se centraron en la provisión de servicios fundamentales para su proceso de resocialización (atención psicosocial, atención jurídica, brigadas institucionales, formación, talleres de preparación para la libertad a personas preliberadas y fortalecimiento de los vínculos familiares).

PD82AC	**Personas beneficiarias de procesos de formación para el trabajo y el desarrollo humano**	**Número de personas**	**720**	**743**	**103%**

Código. Ind. SUIFP: 120601400

Descripción B/P/S: Corresponde a Personas Privadas de la Libertad (PPL), pospenados y sus familiares que participan de los programas de educación para el trabajo, la resocialización y el desarrollo humano, incluyendo talleres, cursos y otras modalidades de capacitación.

Observación B/P/S: Un total de 743 personas fortalecieron sus capacidades mediante procesos de formación en desarrollo humano, artes y oficios. Esta iniciativa priorizó la inclusión de personas privadas de la libertad (PPL), pospenados y sus familias, con el fin de promover su efectiva reintegración social.

PD82AD	**Asistencias técnicas en resocialización inclusión social realizadas**	**Número**	**120**	**123**	**103%**

Código. Ind. SUIFP: 120601800

Descripción B/P/S: Esta acción combina la asesoría y atención jurídica y psicosocial directa a familiares de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) y Pospenados, con el fortalecimiento institucional. Este último se logra a través de encuentros técnicos, talleres y conversatorios dirigidos a entidades claves (INPEC, Policía Nacional, Secretarías Distritales), buscando proporcionar conocimiento especializado y facilitar la aplicación de mecanismos eficaces para la resocialización e inclusión social de las PPL.

Observación B/P/S: Logramos realizar 123 asistencias técnicas enfocadas en dos ejes esenciales: la resocialización y el afianzamiento de los vínculos familiares, y la atención jurídica y psicosocial a los familiares de PPL y pospenados, con el fin de consolidar sus redes de apoyo.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente

Componente: 2.4 - Paz, víctimas y Derechos Humanos

Programa: 2.4.1 - Derechos Humanos y construcción de paz ciudadana

Proyecto: **250051 -25pp99-implementación de estrategias para la promoción de los ddhh y la construcción de paz medellín**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 31% **Ejec. Financiera :** 90% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 60%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.730 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.136

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo para la implementación de medidas en derechos humanc y derecho internacional humanitario				
PD51AA Medidas implementadas en cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario	**Número**	**194**	**70**	**36%**

Código. Ind. SUIFP: 450202400

Descripción B/P/S: Estas medidas se definen como prioritarias en territorios donde las comunidades, mediante Presupuesto Participativo, han solicitado mayor presencia institucional, reparación simbólica, dignificación de las memorias, acompañamiento a víctimas y prevención de nuevas vulneraciones. Este valor recoge tanto medidas administrativas como acciones concretas en campo, con enfoque diferencial.

Observación B/P/S: Se realizaron 70 actividades evidenciando avance en fortalecimiento institucional, articulación interinstitucional y promoción de los derechos humanos y paz, orientados a la promoción de la reconciliación y la participación comunitaria.

PD51AB Espacios de participación promovidos	**Número**	**42**	**11**	**26%**

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Corresponde a la promoción de espacios de participación ciudadana en función del respeto y garantía de los Derechos Humanos. Este valor estadístico se enfoca en la activación de procesos comunitarios sostenibles, legitimados por la voluntad ciudadana y priorizados en Presupuesto Participativo como herramientas de transformación social.

Observación B/P/S: Se realizaron 11 talleres de memoria histórica, con enfoque artístico y pedagógico, fortaleciendo la participación comunitaria, la cultura de paz, la reconciliación y la garantía progresiva de los derechos humanos.

Observación Proyecto: Las diferentes actividades preparatorias a las festividades decembrinas desarrolladas por los distintos grupos de valor de la comunidad, junto con la decisión de los líderes comunitarios de aplazar varias actividades, impidieron el cumplimiento físico total de los proyectos en cada una de las actividades programadas. Asimismo, la limitada asimilación de la importancia de cumplir con los cronogramas establecidos obligó a reprogramar varias actividades, lo cual se refleja en el porcentaje de avance de los indicadores con corte al 31 de diciembre de 2025.

Programa: 2.4.2 - Atención – reparación integral a víctimas del conflicto armado y Justicia Transicional y Restaurativa

Proyecto: **250045 -25pp08-implementación observatorio de víctimas en la comuna 8 medellín**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 432 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 432

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo para la implementación de medidas en derechos humanc y derecho internacional humanitario				
PD45BA Medidas implementadas en cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450202400

Descripción B/P/S: Hace referencia al fortalecimiento de capacidades de las víctimas en el uso de herramientas de identificación, prevención y reporte de vulneraciones de DDHH en la comuna.

Observación B/P/S: El 22 de diciembre de 2025 finalizó el Observatorio de Víctimas en la comuna 8, sector San Antonio, con la participación de 231 personas. Como resultado, se conformó un comité de derechos humanos y se realizó un taller de huertas comunitarias que fortaleció el tejido social. A través de espacios de diálogo, la comunidad compartió sus vivencias y reconoció prácticas de solidaridad, apoyo mutuo y mediación de conflictos. Pese al contexto adverso, se destacaron liderazgos por la dignidad y la construcción del "Camino de la Vida" como una apuesta simbólica y material por la paz, la integración territorial y la convivencia.

PD45BB Personas capacitadas	**Número**	**25**	**25**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Hace referencia al proceso de formación a 25 personas bajo la estrategia de gestoras de paz, para el fortalecimiento en temas de víctimas, DDHH, incidencia y reivindicación de derechos.

Observación B/P/S: Aunque inicialmente se concertaron siete (7) encuentros, finalmente se realizaron diez (10), los cuales concluyeron el 26 de diciembre de 2025. Los temas abordados fueron los siguientes: Taller 1 Psicosocial-Las emociones Taller 2 Justicia Transicional Taller 3 Ley de Víctimas-Acceso a derechos Taller 4 Psicosocial-comprender el dolor (duelo) Taller 5 Acceso a los derechos de las víctimas Taller 6 Psicosocial-derechos fundamentales de las víctimas Taller 7 Memoria Colectiva Taller 8, 9 y 10 Muñecas de Memorias

PD45BC Espacios de participación promovidos	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Hace referencia al acompañamiento para el desarrollo de acciones de memoria que reconozcan a las víctimas del conflicto armado, promuevan la no repetición y fomenten el aprendizaje colectivo a partir del pasado, mediante estrategias como recorridos territoriales.

Observación B/P/S: El 29 de noviembre se realizó un recorrido de memoria en la Biblioteca La Ladera, Comuna 8. La actividad permitió reconocer y dignificar a las víctimas del conflicto armado y promover la no repetición. A través del recorrido territorial se facilitaron la reconstrucción de relatos, la reflexión comunitaria y la apropiación del territorio como espacio de memoria y paz.

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: **200082 -Construcción de paz a través del arte y la cultura**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 78 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 60

Proyecto: **200224 -Fortalecimiento de la cultura de derechos humanos en la ciudad**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 122 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 107

Proyecto: **200245 -Construcción democrática de paz teritorial**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 31 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6


Proyecto: **200276 -Apoyo para la gestión del sistema de responsabilidad penal para adolescentes**


Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 369 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 328

Proyecto:	**200277**	**-Prevención a la vinculación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes al conflicto armado y al crimen organizado**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 529	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 415
Proyecto:	**230002**	**-Mplementación de estrategias para la construcción de paz territorial, ddhh y convivencia**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 51	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0
Proyecto:	**200187**	**-Implementación y seguimiento de la política pública a favor de las víctimas del conflicto**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 25	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0
Proyecto:	**200188**	**-Asistencia y reparación a víctimas del conflicto armado asentadas en la ciudad**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 243	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 220
Proyecto:	**200278**	**-Implementación de estrategias para la reintegración y reincorporación a la vida social y económica**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 312	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 292
Proyecto:	**220035**	**-Implementación de medidas de atención inmediata y renta básica a víctimas del conflicto armado medellín**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 541	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 520
Proyecto:	**200275**	**-Apoyo a los procesos de resignificación de la población privada de la libertad, pospenada y en riesgo**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 20	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 20


Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2025

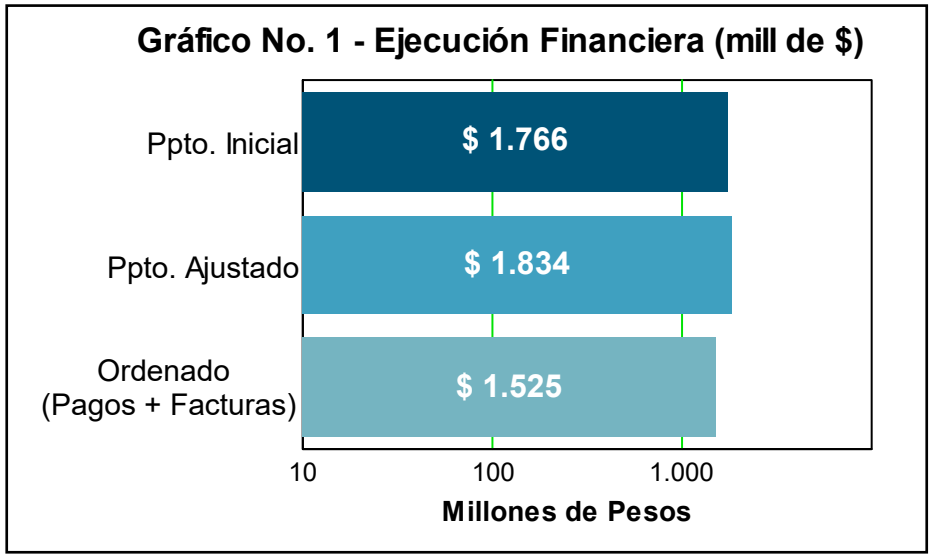


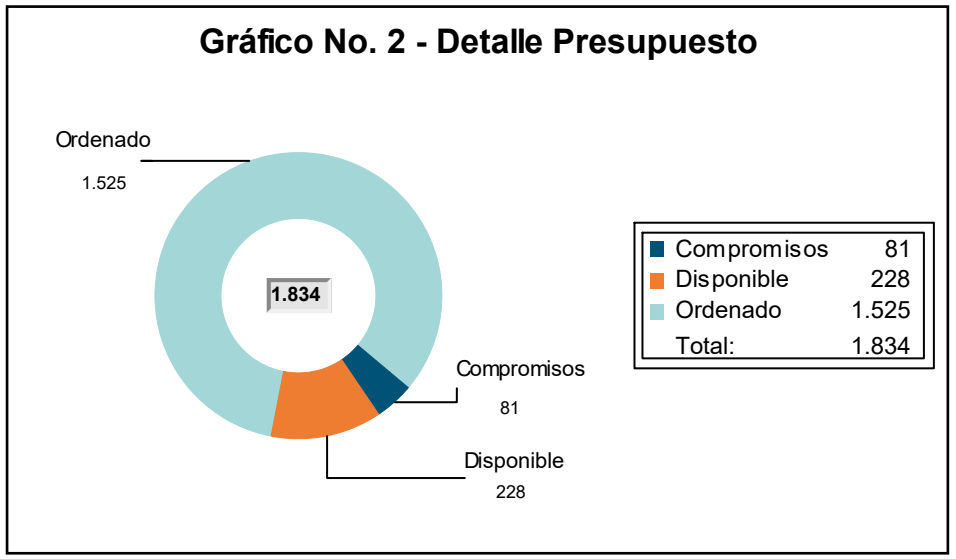

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre de 2025 comprende pagos y facturas

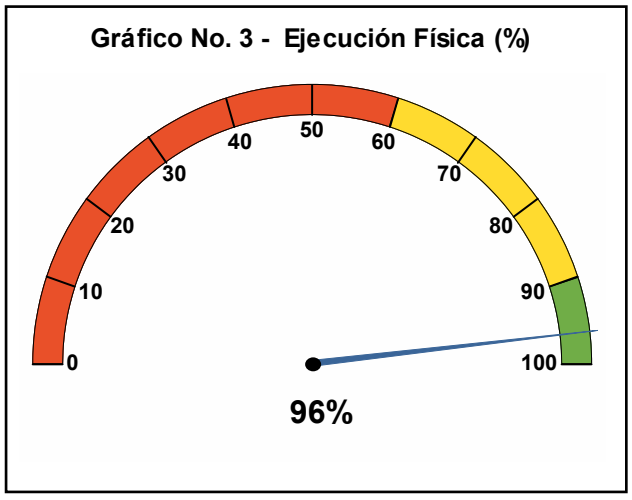

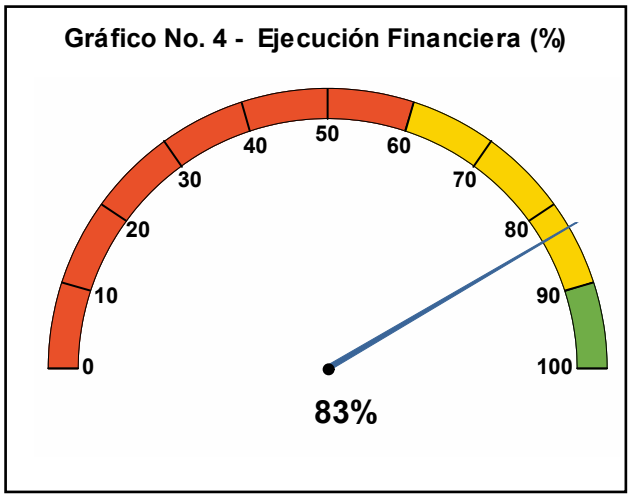

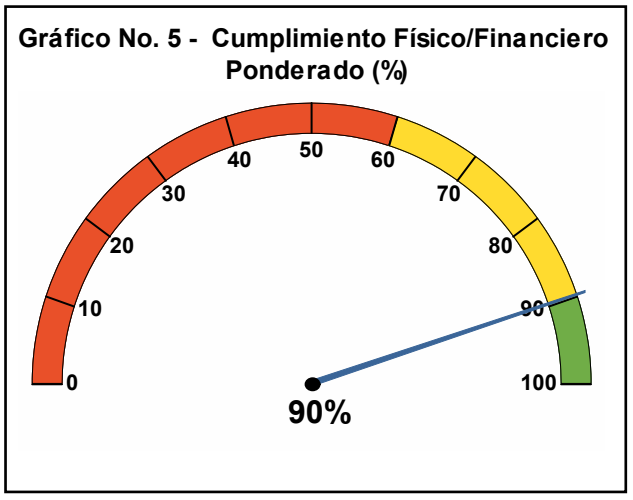

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.4 - Confianza ciudadana en la gestión pública institucional
Programa: 3.4.1 - Confianza y transparencia administrativa

Proyecto: **240315 -Apoyo en la articulación de los sectores administrativos de desarrollo**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 83% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 91%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.766 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.766 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.460

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
GO15AA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	**Número**	**36**	**36**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Corresponde al servicio de asistencia técnica a las diferentes entidades, organismos y dependencias; a través de mesas de trabajo que favorecen la articulación y gestión de los diferentes Sectores de Desarrollo Administrativo

Observación Proyecto: Durante el periodo se llevaron a cabo articulaciones con las dependencias y entidades que integran los sectores de desarrollo administrativo, lo que permitió cumplir en su totalidad la meta establecida para la vigencia 2025. Este proceso de articulación se consolidó como un espacio de diálogo y trabajo colaborativo, en el cual fue posible identificar alertas de manera oportuna y construir soluciones conjuntas que fortalecen la gestión institucional y el desarrollo administrativo.


4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)


Proyecto: **200292 -Fortalecimiento de estrategias de gobierno efectivo en el territorio**


Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 68 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 65


Secretaría de Seguridad y Convivencia


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2025

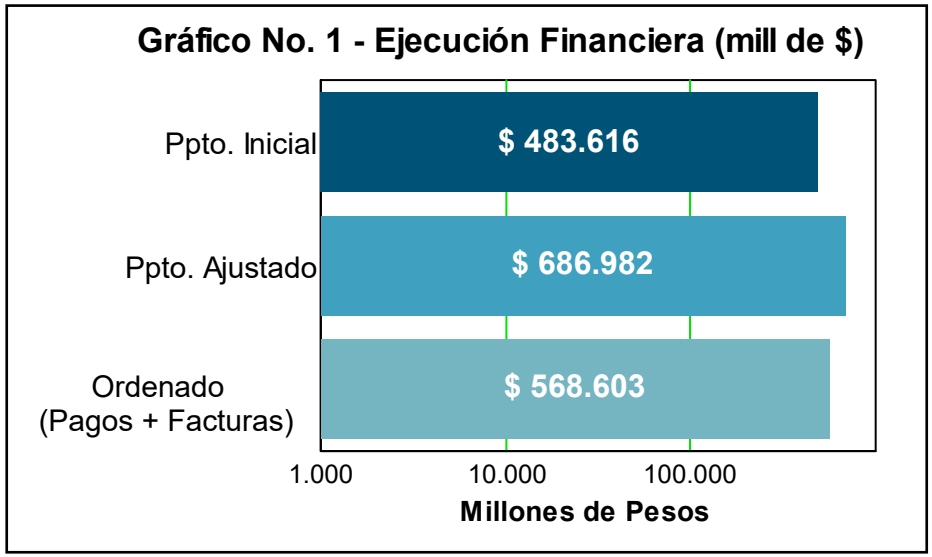

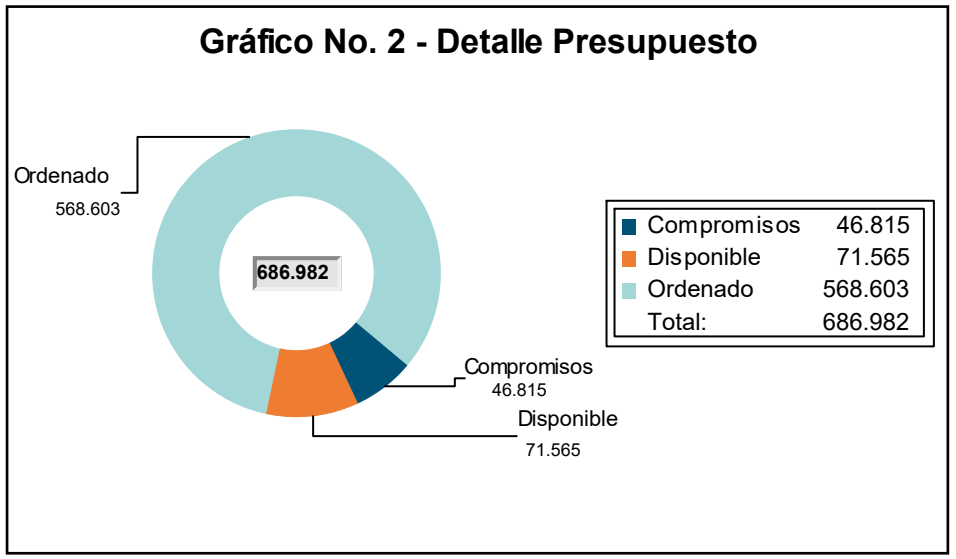

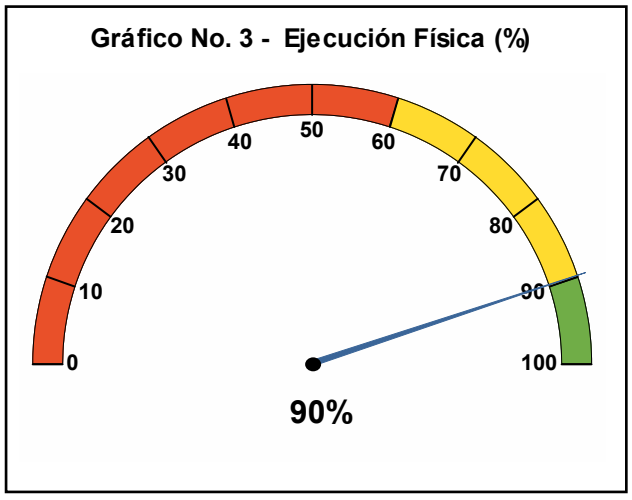

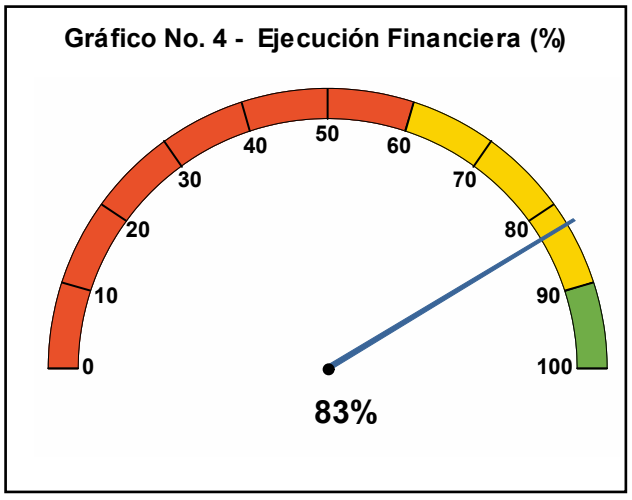

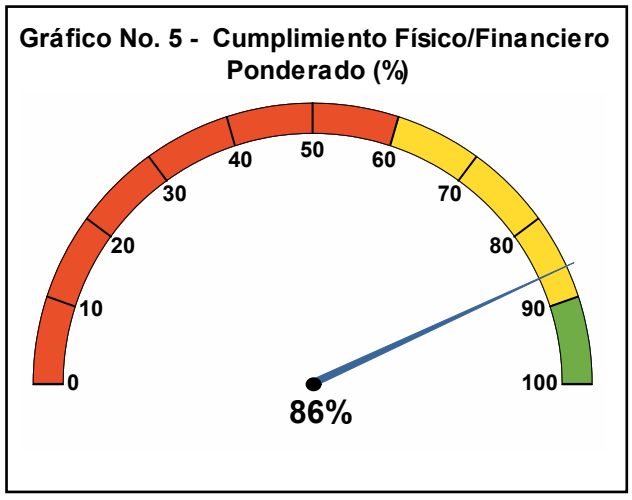

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.1 - Seguridad integral para el desarrollo social
Programa: 3.1.1 - Planeación y gestión integral de la seguridad y convivencia ciudadana

Proyecto: 240172 -Aplicación de estrategias de investigación y recopilación de información en seguridad y convivencia

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 80% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 90%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.994 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.256 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.405

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Bases de datos de la Temática de Gobierno				
SE72AD Bases de datos de la temática de gobierno generadas	**Número**	**10**	**11**	**110%**

Código. Ind. SUIFP: 040106900

Descripción B/P/S: Encuesta de Percepción de la Seguridad y Convivencia realizada.

Observación B/P/S: Bases de datos- Hasta la fecha los siguientes convenios se encuentran vigentes: Gobernación de Antioquia 123 - Mujeres, FAC, Personería, Medicina Legal, CSJ, INPEC, Migración, UNP, Policía y fiscalía Encuesta - El contratista se encuentra en la tercera y cuarta etapa del contrato correspondiente al levantamiento de la información, procesamiento de datos y entrega de resultados.

SE72AE Boletines técnicos temática de la seguridad y defensa producidos	**Número**	**2.020**	**2.606**	**129%**

Código. Ind. SUIFP: 040102300

Descripción B/P/S: Reportes geográficos, de estadística descriptiva, dateos, informes, entre otros producidos por el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia -SISC-.

Observación B/P/S: Informes diarios de homicidio: 61 Informes diarios de homicidio interno del tomador de decisión: 61 Dateos Medellín: 8 Dateos por comuna:168 Informes de vif: 8 Informes de vif NNA: 8 Informes de mujeres: 8 Informes de vif en víctimas mayores de 60 años: 8 Conductas contrarias: 8 Actualización Tableros SISC: 8 Hurtos en Medellín: 8 Dateo llamadas por ruido: 8 Informe violencias sexuales: 8 Plan de acción territorial: 2

SE72AF Documentos de estudios técnicos realizados	**Número**	**152**	**152,3**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 040110400

Descripción B/P/S: Documentos diagnósticos de seguridad y convivencia realizados por el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia -SISC- (incluye dos [2] investigaciones en temas de seguridad y convivencia).

Observación B/P/S: Realizamos los siguientes documentos/informes: *Informes semanales: 8 *Documentos de diagnóstico: 33 (El número de diagnósticos corresponde al mes de diciembre presentó un aumento considerable, toda vez que contienen información sensible utilizada para apoyar a los organismos de seguridad y justicia, lo cual impidió su conclusión en meses anteriores) * Investigaciones:2

Proyecto: 240173 -Apoyo técnico para la planeación integral de la seguridad y convivencia

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 10.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 17.562 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 16.962

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
SE73AK Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	**Número**	**9**	**9**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Organismos de Seguridad y Justicia asistidos técnicamente en el marco de la implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia.

Observación B/P/S: Corresponde a la contratación realizada a los 9 organismos de seguridad, los cuales corresponden a: POLICIA, EJERCITO, FISCALIA, INPEC, MIGRACION COLOMBIA, UNP, FAC.

SE73AL Bases de datos de la temática de gobierno generadas | **Número** | **2** | **2** | **100%**

Código. Ind. SUIFP: 040106900

Descripción B/P/S: Informe de seguimiento consolidado del Plan de Acción 2025 y formulación del Plan de Acción 2026 del Plan Integral de Seguridad y Convivencia.

Observación B/P/S: Se cuenta con el plan de acción para la vigencia 2025 (se formula anualmente al comienzo de la vigencia) y el informe de gestión e implementación del plan de acción de la vigencia 2024 (se presenta de manera anual con el consolidado de los 4 trimestres de la vigencia inmediatamente anterior.

SE73AM Documentos de política elaborados | **Número** | **0,2** | **0,2** | **100%**

Código. Ind. SUIFP: 459903200

Descripción B/P/S: Estructuración del problema público como insumo en el marco de la actualización de la Política Pública de Seguridad y Convivencia.

Observación B/P/S: Se presenta un primer borrador de documento diagnóstico del Política Pública. Se está construyendo el marco teórico del ecosistema de la seguridad y planeando los ejercicios participativos de validación con actores.

Proyecto: 240176 -Fortalecimiento de las capacidades de los organismos de seguridad y justicia que hacen presencia en el distrito de medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 81% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 90%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 95.934 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 213.521 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 171.898

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana				
SE76AG Proyectos de convivencia y seguridad ciudadana apoyados financieramente	**Número**	**9**	**9**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450102900

Descripción B/P/S: Organismos de Seguridad y Justicia que hacen presencia en el Distrito fortalecidos en sus capacidades a través del Fondo Territorial de Seguridad -FONSET-.

Observación B/P/S: Cumplimiento al 100% (9 organismos), ya que la meta se completó en periodos anteriores.

Proyecto: 240177 -Implementación de un plan maestro en tecnología y telecomunicaciones en seguridad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 91% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 20.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 28.585 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 26.141

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio información implementado				
SE77AF Sistemas de información implementados	**Número**	**2**	**2,83**	**142%**

Código. Ind. SUIFP: 450100700

Descripción B/P/S: Renovación parcial de la infraestructura tecnológica de la secretaría de seguridad y convivencia (80%) Desarrollo parcial del Sistema de Información interoperando (20%).

Observación B/P/S: Adición contrato 4600105849, cuyo objeto es "Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la transformación de soluciones tecnológicas de seguridad ciudadana"

SE77AG Sistemas de información actualizados | **Número** | **1** | **3,02** | **302%**

Código. Ind. SUIFP: 450100800

Descripción B/P/S: Plan Maestro en Tecnología de Información y Telecomunicaciones para la Seguridad y la Convivencia 2024-2027 diseñado.

Observación B/P/S: Adición contrato 4600105849, cuyo objeto es "Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la transformación de soluciones tecnológicas de seguridad ciudadana"

Programa: 3.1.2 - Modelo Integral de gestión focalizada para la seguridad ciudadana

Proyecto: 240178 -Mejoramiento de la gestión territorial en seguridad ciudadana

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 77% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 88%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 7.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.303 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.597

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva				
SE78AI Estrategias implementadas	**Número**	**149**	**149**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450104800

Descripción B/P/S: Se alacanzara a traves de los mecanismos que se implementen para la articulacion y coordinacion interinstitucional con organismos de seguridad y dependencias asociadas del Distrito.

Observación B/P/S: Se realizó e implemento 15 intervenciones territoriales para la seguridad en las comunas y corregimientos del Distrito, consistentes en: 1. Acción integral focalizada 2. Intervenciones en Cerros Tutelares 3. Control y evacuación vehicular 4. Demolición construcciones ilegales 5. Desmonte de cambuches y recolección de basuras 6. Control venta y consumo estupefacientes 7. Visitas a hoteles, moteles y hostales 8. Medición de ruido 9. Control parqueo ilegal 10. Plan Navidad 11. Plan parques 12. Plan piques 13. Plan prevención contra el hurto 14. PMU Eventos de ciudad 15. Puestos de control

Proyecto: 240179 -Optimización del sistema integrado de emergencias y seguridad de medellín sies-m

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 76% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 87%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 96.924 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 118.815 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 116.008

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio información implementado				
SE79AI Sistemas de información implementados	**Número**	**2**	**2**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450100700

Descripción B/P/S: Se van a viabilizar los contratos estratégicos orientados a brindar soporte técnico, fortalecer la conectividad, asegurar el mantenimiento y desarrollos tanto del ICAD como del sistema de videovigilancia (CCTV) del SIES-M.

Observación B/P/S: Se elaboraron 13 documentos técnicos que incluyen análisis sobre la reducción de delitos priorizados y la formulación de planes estratégicos orientados a su prevención y disminución, con base en evidencia territorial y criterios de priorización institucional.

SE79AJ Cámaras de seguridad instaladas	**Número**	**731**	**375**	**51%**

Código. Ind. SUIFP: 450102800

Descripción B/P/S: Se van a instalar un total de 1064 dispositivos tecnológicos, un total de 635 cámaras de seguridad y 300 alarmas comunitarias y 129 botones de panico.

Observación B/P/S: Se instalaron 176 dispositivos tecnológicos para la seguridad (86 noviembre y 90 diciembre, incluyendo cámaras PTZ, MS y LPR, en puntos previamente existentes y en otros que fueron modernizados), lo que ha contribuido a mejorar los indicadores del sistema CCTV; a la fecha, se han instalado un total de 372 cámaras de seguridad y 3 botones de pánico, para un total de 375 durante el año 2025.

Proyecto: 240180 -Prevención de la criminalidad y atención del delito (copad)

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 84% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 92%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 12.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 11.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 9.288

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos metodológicos				

SE80AF	**Documentos metodológicos realizados**	**Número**	**90**	**90**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450104400

Descripción B/P/S: Número total de documentos metodológicos elaborados en el marco del cumplimiento de las actividades programadas.

Observación B/P/S: Se elaboraron 13 documentos técnicos que incluyen análisis sobre la reducción de delitos priorizados y la formulación de planes estratégicos orientados a su prevención y disminución, con base en evidencia territorial y criterios de priorización institucional.

SE80AG	**Diligencias de inspección realizadas**	**Número**	**90**	**90**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450104700

Descripción B/P/S: Cantidad de diligencias de inspección realizadas por los equipos territoriales del COPAD, conformados por Dinamizadores Territoriales y Gestores Operativos, durante la vigencia correspondiente.

Observación B/P/S: Se realizaron 35 visitas de inspección y control, acompañadas de campañas de prevención y disuasión dirigidas a los delitos priorizados, con el objetivo de reducir su ocurrencia y fortalecer la seguridad en los territorios intervenidos.

Programa: 3.1.3 - Infraestructura para la seguridad y la convivencia

Proyecto: **210078 -Construcción y operación de la cárcel metropolitana para sindicados**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 69% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 84%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 16.826 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.663 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.527

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de bienestar a la población privada de libertad				
SE78FB Personas privadas de la libertad con servicio de bienestar	**Número**	**11.666**	**11.666**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 120600700

Descripción B/P/S: La entrega de los kits en las estaciones de Policía y en los Espacios de Detención Transitoria donde hayan PPL en calidad de sindicados se dará de la siguiente manera: Kits de Aseo: Se realizará entrega de manera trimestal a todas las PPL según la solicitud de los respondables de la custodia. Kits de Pernocte: Se dará cada 3 meses (trimestal) a las PPL que ingresen nuevos o a quienes lo requieran de acuerdo a la información reportada por los responsables de la custodia.

Observación B/P/S: Corresponde a la entrega de kits de aseo y de pernocte a PPL recluidas en CDT del Distrito de Medellín, ERON del INPEC, URI Fiscalía y Batallones del Ejército.

Proyecto: **240171 -Ampliación y mantenimiento de infraestructura física para la seguridad, convivencia y justicia**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 67% **Ejec. Financiera :** 78% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 72%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 85.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 55.480 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 43.103

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Estudios de preinversión				
SE71AG Estudios de preinversión elaborados	**Número**	**2**	**2**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459900600

Descripción B/P/S: Estudios y diseños de CAIVAS de la Fiscalía y de la Comisaría de Familia de San Sebastián de Palmitas.

Observación B/P/S: Se obtuvo la licencia de Construcción de la Comisaría de Familia de Moscú, el 10 de diciembre de 2025 con resolución N° C2-0653 de la Curaduría Urbana N°2, no se pone la unidad completa, ya que se había puesto un 0.10 cuando se realizó la radicación en curaduría. Se incluye una unidad completa de la licencia de construcción del C5, el cual fue obtenido en mayo de 2025, con 1,8 se obtiene la meta estimada.

SE71AH	**Sedes construidas**	**Número**	**0,1**	**0**	**0%**

Código. Ind. SUIFP: 459900900

Descripción B/P/S: Este indicador no será una sede completamente finalizada, sinó los siguientes avances: Del C5i el 0,60: Fundaciones + Estructura + Cerramientos+ 5 niveles de acabados De la estación de Policía Poblado el 0,30: Fundaciones + Estructura + Cerramientos De la comisaría de Familia Moscu el 0,10: Fundaciones + Estructura

Observación B/P/S: La construcción del C5 inició el 17 de diciembre, aun se encuentran en las excavaciones preliminares de las fundaciones lo que equivale a un 0,005% de la obra. La Estación de Policía Poblado fue adjudicada conjuntamente con la interventoría, aun no inicia la construcción.

SE71AI	**Sedes mantenidas**	**Número**	**20**	**22**	**110%**

Código. Ind. SUIFP: 459901600

Descripción B/P/S: De acuerdo a la necesidad de Mantenimiento de las sedes de seguridad y convivencia.

Observación B/P/S: Se obtuvo el mantenimiento de las siguientes sedes: 1. Sala Puma 2. Inspección de Policía de Minorista 3. Permanencia Sur. "

Programa: 3.1.4 - Convivencia y acceso al sistema de Justicia cercana al ciudadano

Proyecto: 240167 -Administración de las casas de justicia dentro del sistema de justicia cercana al ciudadano

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 76% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 88%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.431 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.347

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica para la articulación de los operadores de los Servicio de justicia					
SE67AC	**Entidades territoriales asistidas técnicamente**	**Número**	**18**	**18**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 120200400

Descripción B/P/S: Se refiere a la acondicionamiento y habilitación de un nuevo Punto de Atención de Conciliación en Equidad (PACE).

Observación B/P/S: Para este periodo se culminaron las jornadas de caracterización a los vendedores informales, se dio continuidad a la recepción y revisión de evidencias correspondientes al Plan de Acción de la Política Pública de Vendedores Informales y se realizó la rendición de cuentas con las entidades corresponsables y los vendedores informales.

SE67AD	**Casas de justicia en operación**	**Número**	**5**	**5**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 120200100

Descripción B/P/S: Se continuará garantizando la operatividad de las cinco (5) Casas de Justicia a través de la ejecución de un plan de acción implementado por los grupos coordinadores y apoyos administrativos del Equipo Casas de Justicia

Observación B/P/S: Las cinco (5) Casas de Justicia están funcionando en el Distrito, las cuales se encuentran ubicadas en las comunas 01 - Santo Domingo; 02 – El Popular; 04 - Aranjuez; 07 - Robledo y 13 - San Javier; en lose meses de septiembre y octubre se realizaron 7.881 acciones administrativas, operativas y de proyección.

SE67AE	**Ciudadanos con servicio de justicia prestado**	**Número**	**215.000**	**217.700**	**101%**

Código. Ind. SUIFP: 120200200

Descripción B/P/S: Será alimentado por los registro de atenciones ofrecidas desde el Centro de Recepción e Información (CRI) y las personas informadas en las acciones de proyección y descentralización de los servicios de justicia.

Observación B/P/S: Suministramos 23.286 atenciones desde las Casas de Justicia: 14.368 direccionamientos realizados desde el CERI – CRI y 8.918 personas informadas en las 62 acciones de proyección, difusión y descentralización de los servicios de justicia realizadas.

Proyecto: 240168 -Administración de las comisarías de familia dentro del sistema de justicia cercana al ciudadano

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 96% **Ejec. Financiera :** 35% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 65%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 40.484 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 58.949 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 20.588

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural					
SE68AI	**Casos atendidos**	**Número**	**30.000**	**30.881**	**103%**

Código. Ind. SUIFP: 450108200

Descripción B/P/S: Se proyecta mantener un promedio de atención de ciudadanos que acudan a las diferentes Comisarías de Familia de Medellín en busca de los servicios que estas ofrecen.

Observación B/P/S: Durante el periodo reportado, las Comisarías de Familia atendieron a 4.300 personas que se acercaron a solicitar los diferentes servicios ofrecidos. De este total, 2.900 fueron mujeres, 1.303 hombres, 34 personas se identificaron con otras categorías de género, y en 63 casos no se registró.

SE68AJ	**Comisarías de familia dotada**	**Número**	**25**	**23**	**92%**
	Código. Ind. SUIFP: 450101800				

Descripción B/P/S: Se proyecta ampliar la cobertura de Comisarías de Familia, pasando de veintitres (23) a veintiseis (26) en operación.

Observación B/P/S: El Distrito de Medellín cuenta con 23 Comisarías de Familia en operación: una en cada comuna y corregimiento del Distrito, una adicional ubicada en el corregimiento de San Cristóbal, específicamente en la ciudadela Nuevo Occidente (Lusitania), y una Comisaría de Familia de atención permanente, esta última conformada por tres grupos de trabajo para garantizar atención continua.

Proyecto: 240169 -Administración de las inspecciones de policía y corregidurías dentro del sistema de justicia cercana al ciudadano

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 92% **Ejec. Financiera :** 81% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 87%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 24.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 25.058 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 20.366

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de justicia a los ciudadanos					
SE69AQ	**Ciudadanos con servicio de justicia prestado**	**Número**	**8.200**	**6.870**	**84%**
	Código. Ind. SUIFP: 120200200				

Descripción B/P/S: Procesos policivos finalizados de manera efectiva en las Inspecciones de Convivencia y Paz y Corregidurías del Distrito (Radicados en un periodo de 1 año y 6 meses).

Observación B/P/S: Se finalizaron 922 procesos policivos de manera efectiva en las Inspecciones de Convivencia y Paz del Distrito. (Radicados en un periodo de 1 año y 6 meses). Radicados entre julio 2024 y diciembre 2025.

SE69AR	**Personas capacitadas**	**Número**	**65**	**67**	**103%**
	Código. Ind. SUIFP: 120203100				

Descripción B/P/S: Inspectores de Convivencia y Paz, Corregidores y/o Servidores de la Unidad de Coordinación de Inspecciones de Convivencia y Paz capacitados/formados en temáticas relacionadas con los comportamientos contrarios a la convivencia

Observación B/P/S: Se capacitaron 67 funcionarios de la Unidad de Coordinación de Inspecciones de Convivencia y Paz, de la Subsecretaría de Gobierno Local, en el marco del contrato N° 4600105678 de 2025 cuyo objeto es "Prestar el servicio de formación en Estatuto de Conciliación, Derecho Civil, Procesal y Policivo a los Servidores de la Unidad de Inspecciones de Policía".

Proyecto: 240170 -Administración del recurso destinado a pago de nómina de comisarias de familia

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 86% **Ejec. Financiera :** 57% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 71%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.854 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.854 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.875

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural					
SE70AF	**Casos atendidos**	**Número**	**21**	**18**	**86%**
	Código. Ind. SUIFP: 450108200				

Descripción B/P/S: Se refiere al total de pagos quincenales de la nómina anual de los nuevos equipos interdisciplinarios, necesarios para garantizar el funcionamiento adecuado de las siete Comisarías de Familia creadas mediante el Acuerdo 07 de 2024. Además, incluye la remuneración de diecinueve profesionales del área jurídica asignados como apoyo a las Comisarias de Familia.

Observación B/P/S: El valor reportado corresponde al pago de las cuatro nóminas quincenales de los meses de noviembre y diciembre de 2025 del personal contratado para potenciar el trabajo prestado en las comisarías de familia.

Proyecto: 240174 -Consolidación de un gobierno local cercano para la convivencia ciudadana

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 81% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 90%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 8.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9.790 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.895

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica					
SE74AI	**Instancias territoriales asistidas técnicamente**	**Número**	**500**	**588**	**118%**

Código. Ind. SUIFP: 450100100

Descripción B/P/S: Acciones / actividades en temas de convivencia ciudadana en el Distrito: se llevarán a cabo intervenciones en el territorio para atender conductas, hechos y fenómenos que afectan la convivencia ciudadana, así como acompañamientos a establecimientos de comercio a través del programa Convive la Noche. Estas acciones se desarrollarán en las 16 comunas y los 5 corregimientos del distrito.

Observación B/P/S: Se realizaron intervenciones integrales en las 16 comunas y 5 corregimientos del Distrito para atender comportamientos contrarios a la convivencia, priorizando acciones frente al ruido, el manejo inadecuado de residuos, las riñas y el consumo de sustancias psicoactivas, con el fin de fortalecer la cultura ciudadana y promover entornos más seguros y saludables.

SE74AJ	**Personas capacitadas**	**Número**	**625**	**628**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450104900

Descripción B/P/S: Personas formadas y/o sensibilizadas en el marco de la Ley 1801 de 2016, orientadas a la promoción de la sana convivencia y el respeto, mediante el fortalecimiento de herramientas para la resolución pacífica de conflictos y el abordaje de problemáticas relacionadas con el ruido, el manejo de basuras, la convivencia escolar, la tenencia de mascotas, el uso del espacio público, las riñas, entre otras.

Observación B/P/S: Durante el periodo se desarrollaron acciones de sensibilización con enfoque pedagógico, a modo de capacitación, orientadas al fortalecimiento de competencias ciudadanas, la promoción de la convivencia y la resolución pacífica de conflictos.

Programa: 3.1.5 - Atención integral a jóvenes en riesgo

Proyecto: 240181 -Prevención de la vinculación al crimen organizado, explotación sexual y comercial de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (parceros)

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 12.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 19.651 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 19.580

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal					
SE81AR	**Personas capacitadas**	**Número**	**1.656**	**4.305**	**260%**

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Es atención que se brindará en todos los subgrupos del programa Parceros, incluyendo Parceros, Parceras, Parceritos, entre otros.

Observación B/P/S: Durante el periodo reportado se realizó la vinculación de 718 participantes al programa, quienes participaron en espacios de formación inicial y alistamiento orientados a su inducción al modelo de intervención. Estas acciones permitieron su adecuada incorporación al proceso de acompañamiento psicosocial, sin que ello implicara la reapertura de la fase formativa previamente desarrollada.

SE81AS	**Personas beneficiadas de servicios de educación para el trabajo y el desarrollo humano**	**Número**	**1.052**	**2.537**	**241%**

Código. Ind. SUIFP: 450203700

Descripción B/P/S: Personas acompañadas por medio de las estrategias "Parceros" y "Parceras" que acceden a oportunidades en educación, empleo y/o, emprendimiento.

Observación B/P/S: Durante el periodo reportado se gestionaron 952 acercamientos a oportunidades, resultado de la priorización operativa durante el periodo, orientada a la vinculación y articulación de los participantes con la oferta disponible.

Programa: 3.1.6 - Cultura del Fútbol en Medellín

Proyecto: **240175 -Fortalecimiento de la cultura del fútbol desde la convivencia en el territorio**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.600 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.550 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.519

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de convivencia y no repetición				
SE75AI Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas	**Número**	**7**	**7**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450100400

Descripción B/P/S: En el marco de la Política Pública de Cultura de Fútbol, se realizará acompañamiento al inicio de la ejecución de los proyectos presentados por las barras organizadas y populares.

Observación B/P/S: En el marco de la Política Pública de Cultura de Fútbol, ya fueron implementadas las iniciativas para la promoción de la convivencia, a través del acompañamiento brindado al inicio de la ejecución de los proyectos presentados por las barras populares Los Del Sur y Rexixtenxia Norte

SE75AJ Planes estratégicos elaborados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450102600

Descripción B/P/S: El plan estratégico y sus anexos fueron estructurados en 2024, lo cual corresponde a una meta del 50%; el 50% restante, se distrubuyo en la implentación del plan estrategico año a año, (2025 al 2027) por lo tanto para 2026, se tendra una meta de 16,7% en la implementación del plan.

Observación B/P/S: El plan estratégico y sus anexos fueron estructurados en 2024, por lo que se considera un producto completado.

SE75AK Instancias territoriales asistidas técnicamente	**Número**	**200**	**211**	**106%**

Código. Ind. SUIFP: 450100100

Descripción B/P/S: Jornadas de capacitación en Derechos Humanos y Convivencia en el Fútbol, dirigidas a estudiantes de las diferentes instituciones educativas del distrito, padres de familia, clubes de fútbol y actores clave del desarrollo del fútbol.

Observación B/P/S: Se desarrollaron jornadas de capacitación en Derechos Humanos y Convivencia en el Fútbol, orientadas a la promoción de espacios de diálogo, reflexión y construcción colectiva, reconociendo el fútbol como una herramienta pedagógica para el fortalecimiento de la convivencia y la cultura ciudadana.

Programa: 3.1.7 - Espacio público para la convivencia ciudadana

Proyecto: **240166 -Apoyo en la gestión del espacio público desde la convivencia y el aprovechamiento económico**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 38.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 73.890 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 72.179

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de inspección, vigilancia y control				
SE66DH Diligencias de inspección realizadas	**Número**	**15.000**	**19.321**	**129%**

Código. Ind. SUIFP: 450104700

Descripción B/P/S: Este indicador se cumple mediante la ejecución de las siguientes actividades: -Sensibilización -Apoyo a la incautación -Desmonte de publicidad exterior visual.

Observación B/P/S: Realizamos 4069 intervenciones para la recuperación del espacio público, así: 1744 sensibilizaciones sobre el uso y ocupación indebida del espacio público. 521 apoyos a las incautaciones de elementos sin el permiso debido para estar en el espacio público. 804 desmontes de publicidad exterior visual y avisos sin la autorización correspondiente.

SE66DI Personas capacitadas	**Número**	**6**	**7**	**117%**

Código. Ind. SUIFP: 450104900

Descripción B/P/S: Campañas realizadas para la protección, recuperación y apropiación del espacio público del Distrito.

Observación B/P/S: Para estos periodos se ejecutaron las siguientes campañas: - Aula Móvil - Medellín te quiere bonita - Respeto y convivencia Se desarrollaron acciones de sensibilización lúdico-pedagógica para promover el uso adecuado del espacio público, con acompañamiento de Urbanito, recorridos territoriales, verificación pedagógica de la norma y reconocimiento de buenas prácticas en el comercio formal e informal. "

SE66DJ	**Planes estratégicos elaborados**	**Número**	**2.000**	**4.726**	**236%**

Código. Ind. SUIFP: 450102600

Descripción B/P/S: A traves de respuesta a los tramites de Regulaciòn para la ocupaciòn del espacio pùblico transitoria o temporal o el registro de la publicidad exterior visual.

Observación B/P/S: Expedimos 923 resoluciones para regular los siguientes temas: 1. Ocupación temporal y transitoria del espacio público para vendedores informales y demás interesados en el aprovechamiento económico y social del espacio público (907 resoluciones) y 2. Temas de publicidad exterior visual y avisos (16 resoluciones).

SE66DK	**Documentos de lineamientos técnicos realizados**	**Número**	**0,25**	**0,3**	**120%**

Código. Ind. SUIFP: 450104600

Descripción B/P/S: Desde el ejercicio de implementación de la política pública, y teniendo en cuenta los indicadores del Plan de Acción, se realiza seguimiento a la ejecución de estas actividades, enfocadas en los vendedores informales.

Observación B/P/S: Para este periodo se culminaron las jornadas de caracterización a los vendedores informales, se dio continuidad a la recepción y revisión de evidencias correspondientes al Plan de Acción de la Política Pública de Vendedores Informales y se realizó la rendición de cuentas con las entidades corresponsables y los vendedores informales.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana

Componente: 3.1 - Seguridad integral para el desarrollo social

Programa: 3.1.4 - Convivencia y acceso al sistema de Justicia cercana al ciudadano

Proyecto: **250047 -25pp99-fortalecimiento de la convivencia y seguridad ciudadana medellín**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 96% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.810 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.657

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
SE47AA Personas capacitadas	**Número**	**5.445**	**5.445**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Se realizarán procesos formativos dirigidos a niños, niñas, adolescentes, padres de familia, cuidadores y ciudadanía en general, en temas como prevención de violencias, cultura ciudadana, resolución pacífica de conflictos y seguridad comunitaria. Entre estas acciones se incluyen talleres, jornadas pedagógicas y ciclos de formación cívica juvenil. La población participante desarrollará capacidades en liderazgo, corresponsabilidad, derechos y deberes ciudadanos, fortaleciendo así su rol activo en la construcción de entornos más seguros y respetuosos.

Observación B/P/S: Se desarrollaron talleres en comuna 01 Popular, 03 Manrique, 04 Aranjuez, 09 Buenos Aires, 11 Laureles y 15 Guayabal, dando cumplimiento al 100% de lo planeados.

SE47AB	**Espacios de integración de oferta pública generados**	**Número**	**117**	**117**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450203300

Descripción B/P/S: Se generarán escenarios comunitarios de encuentro como jornadas de convivencia y paz, actividades lúdico-pedagógicas, encuentros familiares y eventos culturales alrededor del fútbol y el uso del espacio público. Estas actividades buscan propiciar el diálogo, la reconciliación y el fortalecimiento del tejido social en contextos urbanos complejos. Estos espacios estarán diseñados para fomentar la inclusión, la empatía y la apropiación positiva del territorio como parte del ejercicio de la ciudadanía.

Observación B/P/S: Se implementaron jornadas de sensibilización e integración en las comuna 01 Popular, 03 Manrique, 04 Aranjuez, 09 Buenos Aires, 11 Laureles y 15 Guayabal, dando cumplimiento al 100% de lo planeado.

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto:	**200271**	**-Mejoramiento de las capacidades de los organismos de seguridad y justicia**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 8.762	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 7.705	
Proyecto:	**200272**	**-Formulación e implementación del plan estratégico en tecnología de información y telecomunicaciones para la seguridad y la convivencia**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 5.598	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 5.598	
Proyecto:	**200280**	**-Apoyo para la gestión estratégica de la seguridad y la convivencia**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 193	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 189	
Proyecto:	**200273**	**-Administración del sistema integrado de emergencias y seguridad de medellín sies-m**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 2.486	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 2.156	
Proyecto:	**200279**	**-Consolidación de las estrategias de seguridad ciudadana y contra el crimen organizado en el territorio**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 840	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 789	
Proyecto:	**230043**	**-24pp99-apoyo tecnológico para la seguridad y la convivencia ciudadana**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 7	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0	
Proyecto:	**200283**	**-Fortalecimiento de la infraestructura física para la seguridad y justicia**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 235	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 146	
Proyecto:	**200284**	**-Fortalecimiento del gobierno local y la convivencia ciudadana**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 230	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 225	
Proyecto:	**200286**	**-Apoyo para la gestión de las comisarías de familia en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 905	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 905	
Proyecto:	**200287**	**-Apoyo para la gestión de las casas de justicia en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 127	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 115	
Proyecto:	**200288**	**-Apoyo para la gestión de las inspecciones de policía en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 1.682	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 1.355	
Proyecto:	**230042**	**-24pp99-fortalecimiento de la convivencia y seguridad ciudadana**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 356	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 329	
Proyecto:	**200285**	**-Implementación de la política pública para la cultura del fútbol**					

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 50	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 40

Proyecto: 200281 -Administración del espacio público para el disfrute de la ciudadanía

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 940	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 933


5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida


Proyecto: 130495 -Mcv-plan 500 fondo medellín ciudad para la vida

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 403	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 183


Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2025

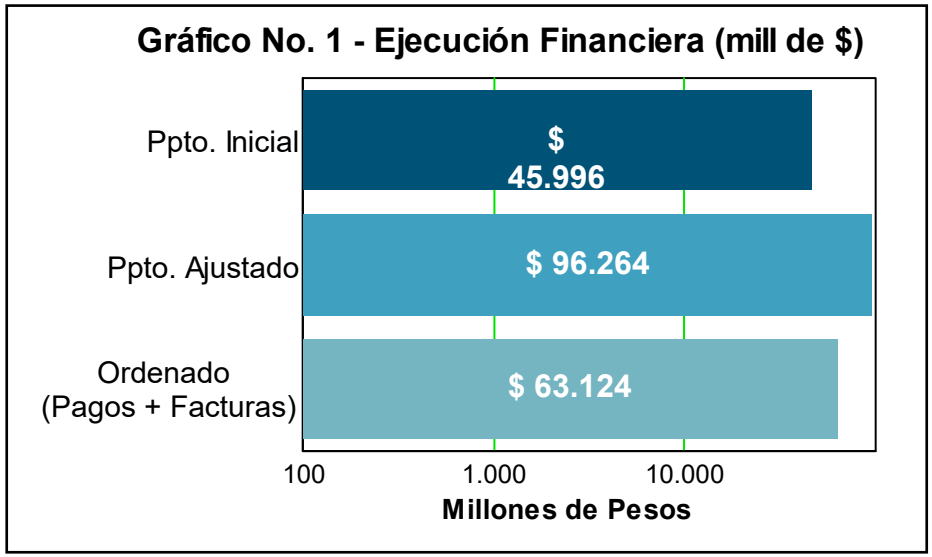


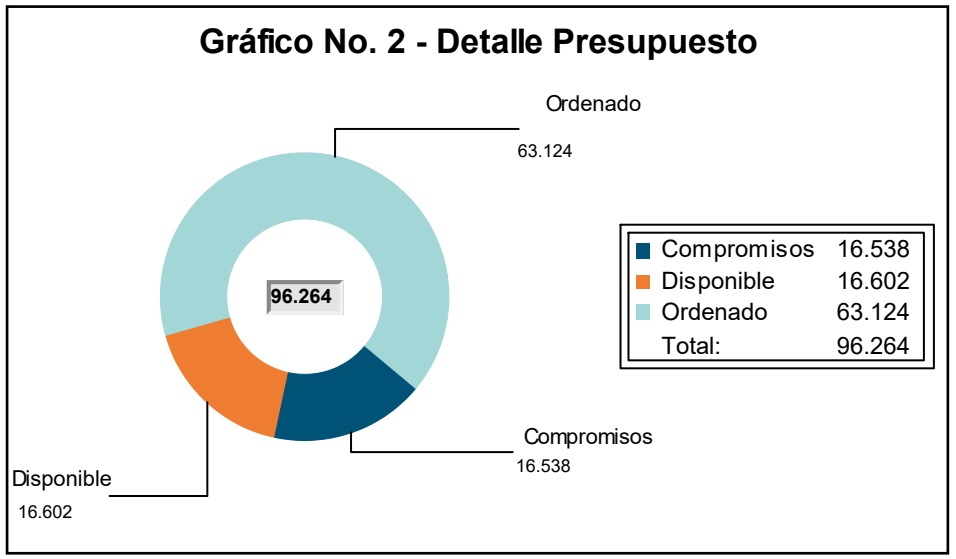

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre de 2025 comprende pagos y facturas

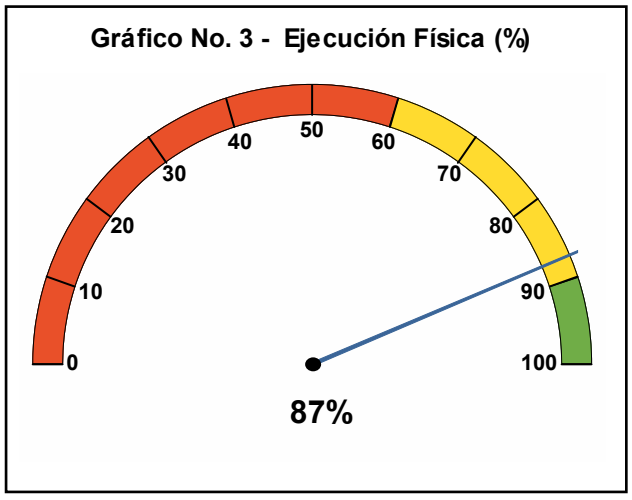

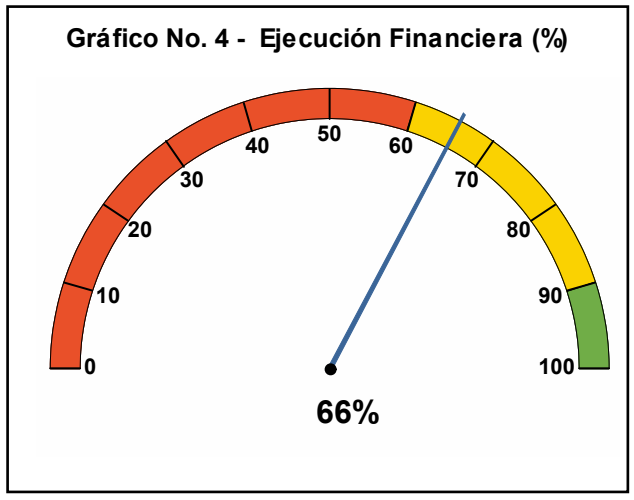

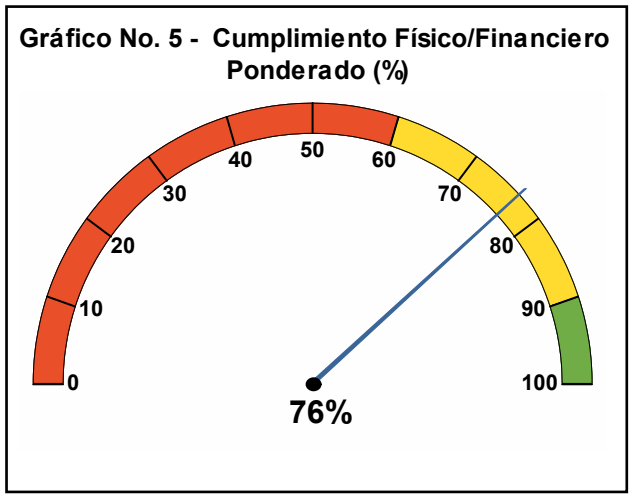

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 5 - Creemos en la sostenibilidad ambiental y en el bienestar animal
Componente: 5.2 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres
Programa: 5.2.1 - Gestión del riesgo de desastres para el desarrollo sostenible y la protección de la vida

Proyecto: 200227 -Desarrollo de estrategias de reducción del riesgo

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 95% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.069 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.915

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación				
DG27AA Documentos de planeación elaborados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450302300

Descripción B/P/S: Corresponde a la actualización de documentos concernientes a la Reducción del riesgo de desastres en la planificación y gestión del desarrollo territorial, realizando la documentación del Sistema de Alerta Temprana Comunitaria.

Observación B/P/S: Se implementaron las actividades relacionadas con la instrumentación de 10 SATs en las cuencas Santa Elena, La aguadita, Chorro hondo, La loca, La Picacha, Cantera Norte, La Castro, La Gallinaza y La Iguana y el proceso comunitario presentan un avance del 100%.

DG27AB Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres realizadas	**Número**	**3**	**3**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450302200

Descripción B/P/S: Corresponde a la realización de las intervenciones para la mitigación del riesgo de desastres en el territorio en diferentes puntos críticos identificados en la Ciudad de Medellín, así como las supervisiones de las mismas. Puntos identificados: Comuna1-Barrio Villa Guadalupe; Comuna 8: Barrio Llanaditas, y Barrio Villatina.

Observación B/P/S: Se terminan las obras que estaban en ejecución de la Comunidad del barrio Villa Guadalupe y de manera directa las 43 familias afectadas, Toda la Comuna 8 y de manera directa las 20 familias afectadas, por movimiento en masa ocurrido el año 2021 y Comunidad de los sectores de la cancha del Pacífico y Altos de la Torre, afectadas por fenómeno de caída de rocas en el año 2020.

Proyecto: 200228 -Fortalecimiento del manejo y atención de desastres

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 10.767 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 10.541

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de fortalecimiento a Cuerpos de Bomberos				
DG28BB Organismos de atención de emergencias fortalecidos	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450301300

Descripción B/P/S: Organismo fortalecido que corresponde al Cuerpo oficial de Bomberos de Medellín, mediante el fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa en el ámbito territorial y sectorial, para la respuesta de incidentes dentro del territorio, el fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos y las estrategias para la recuperación.

Observación B/P/S: Mantenimiento de la flota vehicular del DAGRD, garantizando su operatividad y disponibilidad para la atención de emergencias y mantenimiento de los Equipos y Herramientas Especializadas (HEA) utilizados en la atención de incendios, incidentes con materiales peligrosos y operaciones de rescate. Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), orientado a la protección y bienestar del personal operativo y administrativo Y fortalecimiento técnico de la capacidad de respuesta ante emergencias, en el marco del Plan Anual de Formación, mediante procesos de capacitación y entrenamiento especializado.

DG28BC	**Estaciones de bomberos adecuadas**	**Número**	**4**	**4,17**	**104%**

Código. Ind. SUIFP: 450301400

Descripción B/P/S: Corresponde a la gestión de infraestructura para el COBM, y al mantenimiento y dotación de estaciones de bomberos que permita su operación y óptimo funcionamiento.

Observación B/P/S: Ajustes finales y entrega de obras civiles y eléctricas en las sedes de bomberos Guayabal, Buenos Aires, Floresta y San Antonio de prado.

DG28BD	**Instancias territoriales asistidas**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450300300

Descripción B/P/S: Realizar la implementación de la modernización administrativa y tecnológica de la Gestión del Riesgo de Desastres, en términos de adquisición de kits humanitario, gestión administrativa, licencias de software, adquisición de dispositivos tecnológicos, soporte y mantenimiento de software.

Observación B/P/S: Se finalizó la arquitectura del módulo GRA, así como la elaboración de las historias de usuario correspondientes a cada uno de los trámites que serán gestionados en la plataforma, incluyendo su integración con la Ventanilla Única. Adicionalmente, en el módulo de establecimientos se realizaron ajustes a los flujos de autogestión, re inspección y piscinas, con el fin de optimizar los procesos y mejorar la experiencia de los usuarios en la plataforma.

Proyecto: 200229 -Investigación y gestión del conocimiento asociado al riesgo

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 755 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 754

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Estudios de riesgo de desastres					
DG29AA	**Estudios de riesgo de desastres elaborados**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450301700

Descripción B/P/S: Estudios específicos para la Gestión del conocimiento del riesgo e investigación aplicada.

Observación B/P/S: Estudio de riesgos puntos críticos Santo Domingo, Carpinelo y Barichara. La interventoría remitió Acta de Terminación y Recibo del contrato 4600102507 de 2025 con fecha del 26 de octubre de 2025.

DG29AB	**Documentos de investigación elaborados**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450303000

Descripción B/P/S: Documento de investigación asociado al conocimiento del riesgo, a través de tecnologías y sistemas de información.

Observación B/P/S: Estudio de riesgos puntos críticos Santo Domingo, Carpinelo y Barichara. La interventoría remitió Acta de Terminación y Recibo del contrato 4600102507 de 2025 con fecha del 26 de octubre de 2025.

DG29AD	**Sistemas de alerta temprana implementados**	**Número**	**5**	**5**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450301800

Descripción B/P/S: Fortalecimiento de la red existente de sensores de monitoreo in-situ y de sensores remotos. Monitoreo incendios cobertura vegetal. Sistema de información integral DAGRD FASE III implementado (Fases complementarias).

Observación B/P/S: Se implementaron las actividades relacionadas con la instrumentación de 5 SATs en las cuencas La aguadita, Chorro hondo, La loca, La Picacha, Cantera Norte y La Iguana y el proceso comunitario presentan un avance del 100%.

Proyecto: 240261 -Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 97% **Ejec. Financiera :** 62% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 79%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 15.796 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 18.916 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 11.731

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural					
DG61AA	**Cuerpos de bomberos disponibles para la prevención y control de incendios en la entidad territorial**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450303500

Descripción B/P/S: Desarrollar acciones para el fortalecimiento del cuerpo de bomberos orientadas a la atención del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, las campañas preventivas, dotación, maquinaria, equipos y otros insumos.

Observación B/P/S: Corresponde a los avances en materia de: Mantenimiento de la flota de vehículos del DAGRD; Mantenimiento de los HEA´s para la atención de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescate; Fortalecimiento del SGSST; Fortalecimiento técnico de la atención de respuesta a emergencias en el marco del plan anual de formación; Fortalecimiento del talento humano de la unidad de Seguridad Humana.

DG61AB Instancias territoriales asistidas | **Número** | **1** | **0,9** | **90%**

Código. Ind. SUIFP: 450300300

Descripción B/P/S: Corresponde al acompañamiento, apoyo, asesoría para el fortalecimiento integral del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín, a través de estrategias de formación y apoyo psicosocial

Observación B/P/S: Se realiza acompañamiento para ofrecer un espacio de meditación que contribuya con la salud física y mental del personal administrativo y bomberil. Mejorar las capacidades físicas y coordinativas de todas las compañías mediante ejercicios propioceptivos de equilibrio, desplazamientos, ritmo y fuerza. Se ofrece una amplia variedad de formaciones técnicas, actividades de bienestar psicológico, entrenamiento físico funcional, terapias de rehabilitación, así como capacitaciones en seguridad y emergencias. También se incluyen actividades institucionales y apoyo jurídico.

DG61AC Estaciones de bomberos construidas | **Número** | **1** | **1** | **100%**

Código. Ind. SUIFP: 450301500

Descripción B/P/S: Incluye la construcción de Estaciones de bomberos en terrenos no construidos o cuya área esté libre por autorización de demolición total. A su vez, contiene la dotación a la infraestructura construida.

Observación B/P/S: Desde el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) se gestionó la creación de una nueva estación de bomberos en el Túnel de Occidente. Actualmente, la estación que se denominará CB9 ha sido entregada y se encuentra en proceso de dotación. Así mismo, se realizó la entrega oficial del predio seleccionado en el corregimiento de Santa Elena, destinado al proyecto estratégico "Construcción de la Subestación de Bomberos Santa Elena". A la fecha, no se ha definido la modalidad de contratación para el desarrollo de los estudios, diseños y posterior construcción de la nueva estación de bomberos forestal.

Proyecto: 240262 Implementación de estrategias de conocimiento del riesgo para la protección de la vida y el hábitat

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 98% **Ejec. Financiera :** 74% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 86%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.531 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 12.064 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 8.874

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Estudios de riesgo de desastres				
DG62AA Estudios de riesgo de desastres elaborados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450301700

Descripción B/P/S: Estudios cuyo propósito es conocer las condiciones de riesgo de un territorio, analizar (valorar) la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, realizar análisis de riesgo a diferentes escalas con el propósito de definir tipos de intervención y alcance de la reducción del riesgo y el manejo post desastre.

Observación B/P/S: Se tramitó la ampliación 2, adición 1 y Otrosí 1, con el fin de estudiar dos (2) sitios críticos más Arroyuelos y Prado Campestre, contrato que estaba en ejecución desde el año 2024. La interventoría remitió Acta de Terminación y Recibo del contrato 4600102507 de 2025 con fecha del 26 de octubre de 2025.

DG62AB Instancias territoriales asistidas | **Número** | **1** | **1** | **100%**

Código. Ind. SUIFP: 450300300

Descripción B/P/S: Corresponde al acompañamiento, apoyo, asesoría y seguimiento técnico para la transferencia de herramientas de gestión y conocimiento en políticas, planes , proyectos y programas de apoyo a la dirección y gestión de la administración territorial.

Observación B/P/S: Al mes de Diciembre de 2025, se han realizado 3.148 inspecciones por riesgo en todas las comunas de la ciudad, de las cuales se emitió concepto de evacuación temporal para 1.169 viviendas y concepto de evacuación definitiva para 1.043 viviendas.

DG62AC Sistemas de alerta temprana implementados | **Número** | **3** | **6** | **200%**

Código. Ind. SUIFP: 450301800

Descripción B/P/S: Acciones para generar datos e información sobre el comportamiento de los fenómenos amenazantes, la vulnerabilidad y la dinámica de las condiciones de riesgo en el territorio que orienten la toma de decisiones.

Observación B/P/S: Se ejecutaron las actividades correspondientes a la instalación de los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) en los sectores de Picacha Aguas Frías, Cantera Sur, Buga y Mano de Dios, ubicados en el corregimiento de Altavista, así como en la comuna 6 (Doce de Octubre). Adicionalmente, se realizó la instalación de los SAT exprés en el sector La Chorrera, en el corregimiento de San Antonio de Prado y La honda caracolí en el corregimiento 60 San Cristóbal. La meta establecida fue superada debido a la declaratoria de calamidad pública y a la solicitud directa del Alcalde del Distrito para atender de manera prioritaria a las comunidades afectadas en los puntos críticos, durante la primera temporada de lluvias del año 2025.

DG62AD	**Sistemas de información implementados**	**Número**	**1**	**0,91**	**91%**

Código. Ind. SUIFP: 450303300

Descripción B/P/S: Corresponde al proceso que mejora en la disposición de la información para asegurar que sea accesible, confiable y oportuna.

Observación B/P/S: El SIRMED durante el mes de agosto finalizó su despliegue en preproducción. Se realizaron todas las mejoras propuestas durante el mes. Se desarrolló el módulo de boletines técnicos, el cual será integrado al ambiente de preproducción de la Alcaldía durante el mes de diciembre. Adicionalmente, se avanzó en la integración del desarrollo del SIMER para movimientos en masa, orientado al monitoreo de inclinómetros. Ambos componentes serán desplegados durante el mes de diciembre. Se avanzó en un 50% en el desarrollo del módulo de bibliotecas, el cual se espera culminar durante el mes de diciembre. Se tienen integraciones con UME del distrito, con la Secretaría de comunicaciones, con MAPGIS y se está trabajando en la integración con SIRE, siendo la primeras completamente funcionales en los servidores de la alcaldía, fueron probadas en preproducción. Se logró integración entre SIRE y SIRMED en ambientes de preproducción.

Proyecto: 240264 -Fortalecimiento de las capacidades para el manejo de desastres

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 79% **Ejec. Financiera :** 63% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 71%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 20.078 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 31.298 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 19.829

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal					
DG64AB	**Personas capacitadas**	**Número**	**350**	**614**	**175%**

Código. Ind. SUIFP: 450300200

Descripción B/P/S: Procesos formativos para los integrantes del Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres en temas relacionados a su misionalidad. Fortalecimiento de la Escuela de Formación de Bomberos.

Observación B/P/S: Superamos la meta inicial de 350 personas capacitadas, alcanzando un total de 614 participantes, lo que representa una ejecución del 175%. Esta sobre ejecución se debió a factores operativos y de demanda que no habíamos previsto al momento de la planificación, entre los cuales destacamos: Alta demanda de participación por parte de los beneficiarios, disponibilidad de recursos humanos y logísticos, que nos permitió ampliar la cobertura de las capacitaciones. Integración de participantes de actividades complementarias y reprogramadas dentro del mismo periodo de ejecución. La ampliación del número de personas capacitadas se realizó cumpliendo con los objetivos de nuestro programa, priorizando el impacto y alcance de las acciones formativas, sin afectar la calidad ni los plazos establecidos. En nuestras acciones implementadas destacamos: Bienestar físico y mental, Entrenamiento físico y coordinación, Formaciones técnicas y especializadas, Apoyo institucional y jurídico. Con estas acciones buscamos fortalecer las competencias técnicas y físicas, al mismo tiempo que promovemos el bienestar integral de los beneficiarios, asegurando una formación de calidad y un impacto sostenido en nuestra institución.

DG64AC	**Sistemas de información implementados**	**Número**	**2**	**1,84**	**92%**

Código. Ind. SUIFP: 450303300

Descripción B/P/S: Corresponde al proceso que asegura la disposición de la información de manera accesible, confiable y oportuna.

Observación B/P/S: Para el año 2025, nuestra meta establecida era ejecutar 6 servicios, de los cuales llevamos a cabo 3, lo que equivale al 50 % de cumplimiento. La ejecución parcial se debe a factores externos, entre los cuales destacamos: En la comuna 4, Aranjuez, nos ha resultado difícil identificar 2 sitios viables para la instalación de los SATs por las siguientes razones: Condiciones topográficas e hidrológicas del territorio. Pocas áreas categorizadas como de amenaza alta por inundación y avenida torrencial. Problemas de orden público. Baja participación comunitaria. En la comuna 8, Villa Hermosa, hemos identificado un sitio idóneo para la implementación de los SATs, ubicado tierra adentro; está pendiente el análisis de viabilidad técnica y social. Los procesos comunitarios se suspenden en el mes de diciembre hasta mediados de enero por solicitud de las comunidades, quienes requieren hacer una pausa durante las festividades decembrinas. Esta situación dificulta nuestros procesos y avances en la implementación de los SATs. En enero, tenemos programada la reunión con los líderes comunitarios para retomar el proceso. En el marco del Convenio Interadministrativo No. 4600105652 de 2025, suscrito entre el DAGRD y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), que iniciamos en septiembre, se ha visto afectado nuestro cumplimiento; adicionalmente, de manera simultánea con la declaratoria de calamidad pública, realizamos otros procesos de implementación.

DG64AD	**Emergencias y desastres atendidas**	**Número**	**8.000**	**8.027**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450300400

Descripción B/P/S: Acciones orientadas para dar respuesta a emergencias o desastres de origen natural o antrópico mediante la adquisición de equipos de atención de desastres, búsqueda y rescate, equipos de protección personal nucleares, biológicos, químicos, y radiológicos -NBQR-, equipos para el Manejo de inundaciones, control de incendios, sanidad veterinaria y equipos de alojamiento temporal.

Observación B/P/S: Durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2025, el Distrito atendió un total de 8.027 incidentes reportados a través de la línea de emergencias 123. Reflejando la capacidad de respuesta de las entidades distritales ante las situaciones reportadas por la ciudadanía, garantizando la atención oportuna y la articulación entre los diferentes organismos de seguridad y asistencia.

DG64AE Estaciones de bomberos adecuadas | **Número** | **8** | **1,95** | **24%**

Código. Ind. SUIFP: 450301400

Descripción B/P/S: Acciones orientadas a cambiar el uso de una edificación o parte de ella, garantizando la permanencia total o parcial del inmueble original de acuerdo con las necesidades focalizadas.

Observación B/P/S: La ejecución parcial del indicador se debe a que contamos con otras cuatro variables asociadas al cumplimiento total: Capacitamos a las entidades operativas responsables de los servicios de respuesta y soporte. Brindamos acompañamiento para la creación o modificación de los protocolos de los servicios de respuesta sectoriales. Dotamos de herramientas y equipos a las entidades para la respuesta a emergencias distritales. Realizamos simulacros y simulaciones para la respuesta a emergencias. A la fecha de corte del indicador, estas variables no han alcanzado la meta estipulada. Por otra parte, entregamos el diseño y la formulación de la estrategia distrital para la recuperación postdesastre, los cuales fueron recibidos conforme a los registros de seguimiento y al plan de acción del proyecto, y actualmente se encuentran en proceso de revisión por parte del DAGRD.

DG64AF Instancias territoriales asistidas | **Número** | **1** | **0,78** | **78%**

Código. Ind. SUIFP: 450300300

Descripción B/P/S: Corresponde al acompañamiento, apoyo, asesoría y seguimiento técnico para la transferencia de herramientas de gestión y conocimiento en políticas, planes , proyectos y programas de apoyo a la dirección y gestión de la administración territorial.

Observación B/P/S: El contrato inició el 3 de junio de 2025 y contó con una ampliación de plazo de 62 días, extendiendo su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025. El contratista realizó la entrega de la Estrategia Distrital de Recuperación Postdesastres, la cual se encuentra actualmente en etapa de revisión por parte del DAGRD. En el contrato de diseño de la estrategia se estipulan nueve (9) servicios de recuperación, por lo cual únicamente se contará con nueve (9) protocolos de recuperación. Así mismo, se adelantaron los respectivos simulacros con los grupos USAR: PONALSAR, Cruz Roja, Defensa Civil y el Cuerpo Oficial de Bomberos.

Proyecto: 240265 Implementación de medidas de reducción de riesgos existentes y emergentes para una ciudad resiliente

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 67% **Ejec. Financiera :** 16% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 41%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.597 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9.120 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.469

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres				
DG65AA Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres realizadas	**Número**	**2**	**0**	**0%**

Código. Ind. SUIFP: 450302200

Descripción B/P/S: Intervenciones para la mitigación del riesgo de desastres y la adaptación al Cambio Climático en el territorio, que buscan reducir el nivel de riesgo existente.

Observación B/P/S: Respecto de las obras de mitigación, se informa que a la fecha no se registran avances. El proceso correspondiente se encuentra adjudicado y en curso de gestión contractual.”

DG65AB Sistemas de alerta temprana implementados | **Número** | **3** | **6** | **200%**

Código. Ind. SUIFP: 450301800

Descripción B/P/S: Acciones para generar datos e información sobre el comportamiento de los fenómenos amenazantes, la vulnerabilidad y la dinámica de las condiciones de riesgo en el territorio que orienten la toma de decisiones.

Observación B/P/S: Se llevó a cabo la instalación de cinco (6) Sistemas de Alerta Temprana (SAT) exprés en los sectores de Guayabala, Manzanares, La Unión, El Guamo y La Seca, ubicados en el corregimiento 70 Altavista y en las comunas 1 Popular y 2 Santa Cruz. La meta programada fue superada debido a la declaratoria de calamidad pública y a la solicitud directa del Alcalde del Distrito, con el fin de atender oportunamente a las comunidades afectadas en los puntos críticos durante la primera temporada de lluvias del año 2025.

DG65AC Instancias territoriales asistidas | **Número** | **1** | **1** | **100%**

Código. Ind. SUIFP: 450300300

Descripción B/P/S: Corresponde al acompañamiento, apoyo, asesoría y seguimiento técnico para la transferencia de herramientas de gestión y conocimiento en políticas, planes , proyectos y programas de apoyo a la dirección y gestión de la administración territorial.

Observación B/P/S: El 100% del avance se alcanza con la integración de las observaciones finales del Ministerio de Hacienda y el Banco Mundial, la consolidación del documento definitivo y su validación interna por parte del DAGRD. Estas actividades constituyen el cumplimiento integral del indicador.

Programa: 5.2.2 - Gobernanza del riesgo de desastres para un Distrito Resiliente

Proyecto: 200231 -Fortalecimiento de la gobernanza, la comunicación y la educación del riesgo

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 84% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 92%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 469 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 394

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
DG31AB Instancias territoriales asistidas	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450300300

Descripción B/P/S: Asesoría a los actores del Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres en aplicación de la política pública territorial de gestión del riesgo de desastres, y asistencia en procesos administrativos para la GRD.

Observación B/P/S: Se realizó asesoría a los actores del sistema y se brindó asistencia en procesos administrativos para la GRD.

DG31AD Sistemas de información implementados | **Número** | **1** | **1** | **100%**

Código. Ind. SUIFP: 450303300

Descripción B/P/S: Realizar la adquisición, diseño y mejoramiento de aplicativos tecnológicos para la gestión de la información de la GRD - FASE III.

Observación B/P/S: Se realiza el diseño de base de datos de acuerdo a la estructura base del sistema con los componentes de planeación del territorio y el componente base, la estructuración e implementación de interoperabilidad mediante tecnologías de API REST y X-Road y se diseñan e implementan todos los módulos del componente base y el componente de planeación del territorio del sistema. Estos avances permiten la integración de nuevas funcionalidades de manera flexible y escalable, adaptándose a las necesidades que se vayan requiriendo en el sistema.

Proyecto: 240263 -Consolidación de la gobernanza, la comunicación y la educación del riesgo

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 97% **Ejec. Financiera :** 76% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 86%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.994 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.752 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.601

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
DG63AA Instancias territoriales asistidas	**Número**	**125**	**136**	**109%**

Código. Ind. SUIFP: 450300300

Descripción B/P/S: Aumento de la participación social en los procesos de GRD, a través de la asesoría y capacitación a 420 grupos de valor de las instancias sociales (comunidad, establecimientos educativos y empresas).

Observación B/P/S: La meta fue superada gracias a la creación de nuevas comisiones y semilleros, lo cual respondió a la necesidad de estructurar el encuentro de experiencias que promoviera la interacción intergeneracional.

DG63AB	**Personas capacitadas**	**Número**	**25.000**	**26.738**	**107%**

Código. Ind. SUIFP: 450300200

Descripción B/P/S: Oferta de capacitaciones en GRD según la instancia social (Comunidad, Educativo, Empresarial e institucional).

Observación B/P/S: Se realizaron actividades focales con Cosegrd y empresas que están bajo la figura del Plan de Ayuda Mutua (PAM), así como con otras entidades del sector comercial y de servicios, en el marco de la promoción y participación del Simulacro Nacional realizado el 22 de octubre. Se priorizó la creación de los CCGRD en el Presupuesto Participativo. Adicionalmente, se ha brindado acompañamiento y fortalecimiento a las comunidades en las cuales se ejecutan SAT, así como en las Juntas de Acción Comunal que priorizaron proyectos del GRD. Se logró atender el 100% de las actividades solicitadas por la comunidad, incorporando las actividades realizadas con los semilleros creados. Se brindó acompañamiento a instituciones educativas que realizan atención a la primera infancia —Programa Buen Comienzo—, capacitándolas y asesorándolas en temas de gestión del riesgo de desastres.

DG63AC	**Sistemas de información implementados**	**Número**	**1**	**0,91**	**91%**

Código. Ind. SUIFP: 450303300

Descripción B/P/S: Corresponde al proceso que mejora la disposición de la información para asegurar que sea accesible, confiable y oportuna.

Observación B/P/S: El SIRMED durante el mes de agosto finalizó su despliegue en preproducción. Se realizaron todas las mejoras propuestas durante el mes. Se desarrolló el módulo de boletines técnicos, el cual será integrado al ambiente de preproducción de la Alcaldía durante el mes de diciembre. Adicionalmente, se avanzó en la integración del desarrollo del SIMER para movimientos en masa, orientado al monitoreo de inclinómetros. Ambos componentes serán desplegados durante el mes de diciembre. Se avanzó en un 50% en el desarrollo del módulo de bibliotecas, el cual se espera culminar durante el mes de diciembre. Se tienen integraciones con UME del distrito, con la Secretaría de comunicaciones, con MAPGIS y se está trabajando en la integración con SIRE, siendo la primeras completamente funcionales en los servidores de la alcaldía, fueron probadas en preproducción. Se logró integración entre SIRE y SIRMED en ambientes de preproducción.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 5 - Creemos en la sostenibilidad ambiental y en el bienestar animal

Componente: 5.2 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres

Programa: 5.2.1 - Gestión del riesgo de desastres para el desarrollo sostenible y la protección de la vida

Proyecto: **250046 -25pp99-fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres medellin**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 63% **Ejec. Financiera :** 49% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 56%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.994 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.956

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal					
DG46AA	**Personas capacitadas**	**Número**	**390**	**478**	**123%**

Código. Ind. SUIFP: 450300200

Descripción B/P/S: Capacitar las comisiones de gestión del riesgo de desastres de las comunas 2,4,8 y 90 en temas como: principios básicos de la gestión del riesgo de desastres, soporte vital básico, entre otros.

Observación B/P/S: La meta ya se alcanzó y fue superada gracias a la creación de nuevas comisiones y semilleros, lo cual respondió a la necesidad de estructurar el encuentro de experiencias que promoviera la interacción intergeneracional.

DG46AB	**Instancias territoriales asistidas**	**Número**	**70**	**78**	**111%**

Código. Ind. SUIFP: 450300300

Descripción B/P/S: Fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres por medio de la transferencia de herramientas de gestión y conocimiento en políticas, planes y proyectos

Observación B/P/S: La meta ya se alcanzó y fue superada gracias a la creación de nuevas comisiones y semilleros, lo cual respondió a la necesidad de estructurar el encuentro de experiencias que promoviera la interacción intergeneracional.

DG46AC	**Sistemas de alerta temprana implementados**	**Número**	**6**	**3**	**50%**

Código. Ind. SUIFP: 450301800

Descripción B/P/S: Implementación de sistemas de alerta temprana en las comunas 4 y 8

Observación B/P/S: Se avanza en la realización de talleres, en el marco del proceso de preparación y fortalecimiento comunitario SAT la Paz y la estrechura de la comuna 8 y la implementación de las actividades con la instalación del SAT la rosa, en el barrio san isidro de la comuna 4 Aranjuez.

DG46AD	**Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres realizadas**	**Número**	**2**	**0**	**0%**

Código. Ind. SUIFP: 450302200

Descripción B/P/S: Implementación de obras de mitigación del riesgo de desastres en las comunas 8 y 90

Observación B/P/S: Respecto de las obras de mitigación, se informa que a la fecha no se registran avances. El proceso correspondiente se encuentra adjudicado y en curso de gestión contractual."

Programa: 5.2.2 - Gobernanza del riesgo de desastres para un Distrito Resiliente

Proyecto: **230033 -24pp99-fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 330 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 330

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de monitoreo y seguimiento para la gestión del riesgo				
DG33CC Sistemas de alerta temprana implementados	**Número**	**3**	**3**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 450301800

Descripción B/P/S: Implementación de 3 Sistemas de Alertas Tempranas Comunitarios, para el monitoreo de inundaciones y avenidas torrenciales, desde sus componentes técnico y social, en 3 quebradas de la comuna 8.

Observación B/P/S: Se implementaron las actividades relacionadas con la instrumentación de 3 SATs de la comuna 8, el proceso comunitario presentan un avance del 100%.


3. Proyectos con saldos no Ejecutables


Proyecto: **220106 -23pp99-fortalecimien de la gestion de riesgos de desastres medellin**


Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 730 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 730


Secretaría de Infraestructura Física


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2025

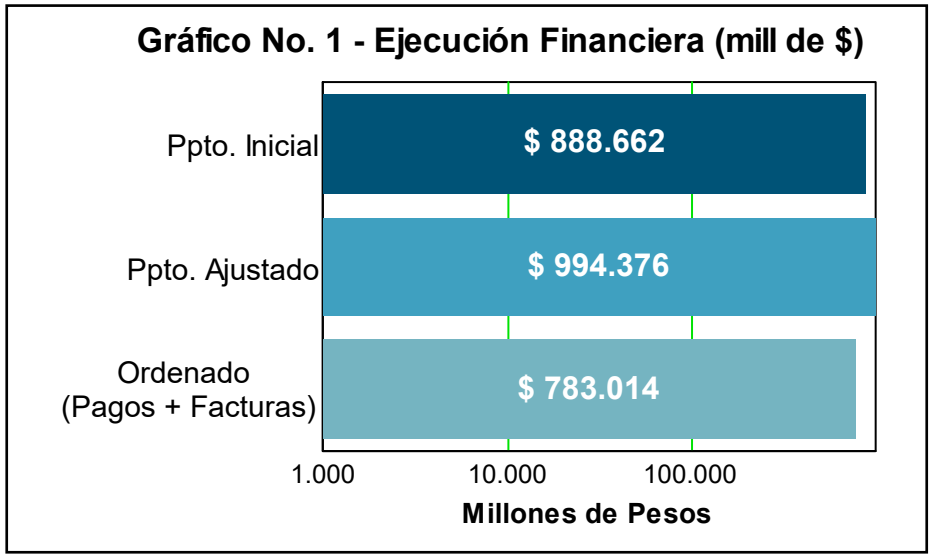

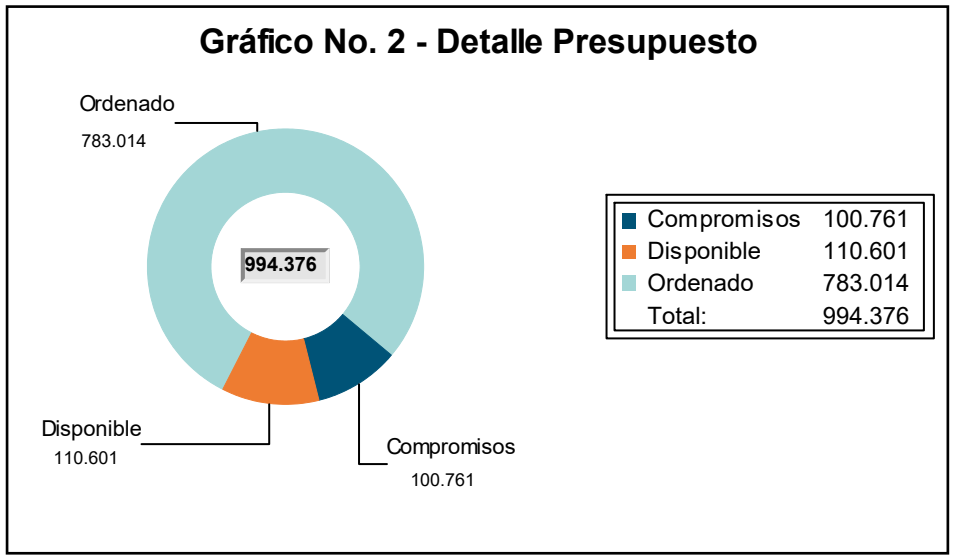

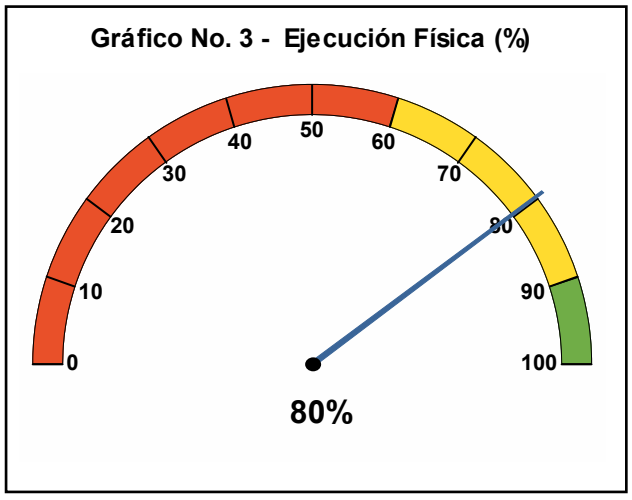

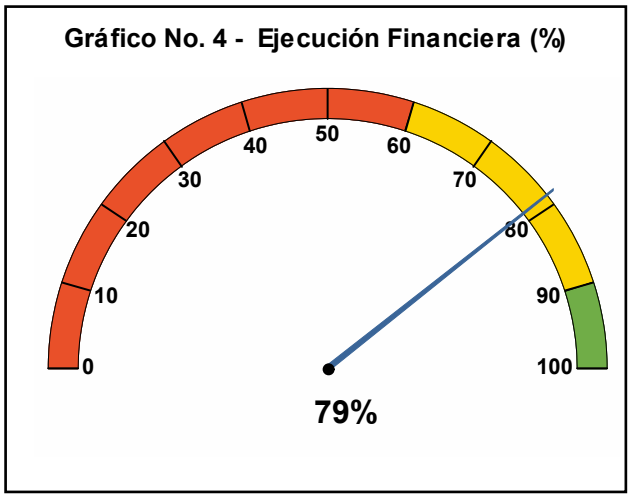

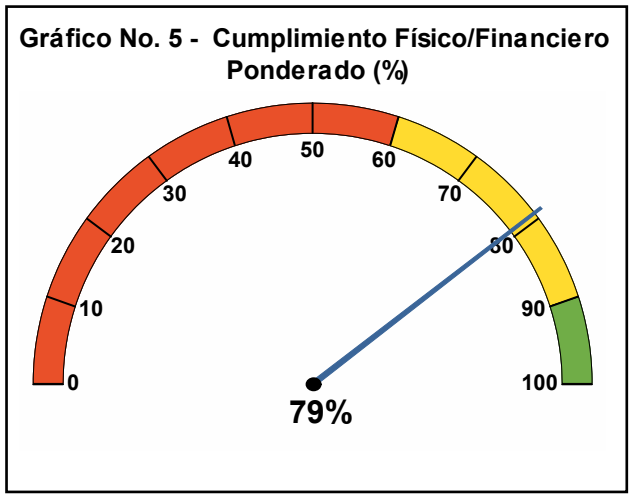

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo
Componente: 4.1 - Infraestructura para un modelo de ciudad sostenible
Programa: 4.1.1 - Conexión para el bienestar y la sostenibilidad

Proyecto: **200024 -Construcción y mejoramiento de la infraestructura vial urbana**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 32% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 16%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.733 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 874

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Estudios de preinversión para la red vial regional				
IF24GE Estudios de preinversión realizados	**Número**	**7**	**0**	**0%**

Código. Ind. SUIFP: 240211800

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la realización de siete (7) Estudios y diseños en el sector Altavista los cuales incluye: Diseño Geométrico, Urbanismo, Hidráulico, Hidrológico, Estructural, Conectividad, Aprovechamiento Forestal. Este producto se deriva de las reservas presupuestales del año 2024 y corresponde al Contrato No. 4600102759 de 2024 cuyo objeto es Actualizar los estudios y diseños del proyecto vial lateral AltaVista

Observación B/P/S: Con corte al 31 de diciembre de 2025, el proyecto registra un avance de cero (0). Actualmente, el contrato permanece suspendido, a la espera de que el contratista radique de manera formal la solicitud de ampliación y adición contractual. Este proyecto se enmarca en el Contrato No. 4600102759 de 2024 y en el Convenio Área Metropolitana No. 278 de 2023 – CI 4600098648 de 2023, suscrito con el Distrito, lo que garantiza su articulación con la planeación regional y urbana.

Proyecto: **200025 -Construcción de obras de protección y mitigación en la infraestructura vial y peatonal**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 89% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 95%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.075 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.297

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Obras para estabilización de taludes				
IF25RA Obras para estabilización de taludes realizadas	**Metro**	**810,7**	**810,7**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 320501000

Descripción B/P/S: El producto hace referencia a la construcción de 810,7 metros de estructuras de contención y de estabilización de un talud, los cuales serán ejecutados en varios puntos de la ciudad. uctural, Conectividad, Aprovechamiento Forestal. Este producto se deriva de las reservas presupuestales del año 2024 y corresponde al Contrato 4600102212 de 2024 cuyo objeto es Construcción de obras de contención, protección, mitigación y complementarias.

Observación B/P/S: La ejecución alcanzó el cien por ciento (100 %) de cumplimiento frente a lo planificado, garantizando el logro oportuno de los objetivos establecidos. Este resultado corresponde a la ejecución de las reservas presupuestales de la vigencia 2024 y se materializa a través del Contrato N.° 4600102212 de 2024, cuyo objeto es la construcción de obras de contención, protección, mitigación y obras complementarias. La ejecución de estas intervenciones contribuyó de manera significativa al fortalecimiento de la estabilidad y seguridad de las infraestructuras intervenidas, mitigando riesgos y garantizando la protección de las comunidades y del entorno"

Proyecto: **200026 -Construcción, adecuación y mantenimiento de puentes peatonales y vehiculares**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 26% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 13%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.835 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 472

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Puente de vía urbana rehabilitado				
IF26EB Puente de vía urbana rehabilitado	**Número**	**5**	**0**	**0%**

Código. Ind. SUIFP: 240207900

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mejoramiento de puentes vehiculares en varios puntos de la ciudad en aras de mejorar la conexión vial y la movilidad. Este producto se deriva de los ajustes presupuestales del año 2024 y corresponde al Contrato 4600103075 cuyo objeto es Obras para el mantenimiento de puentes, pasos viales y obras complementarias.

IF26ED Estudios de preinversión realizados	**Número**	**1**	**0**	**0%**

Código. Ind. SUIFP: 240211800

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la realización de una consultoría que abarca la realización de estudios y diseños (topográficos, hidráulicos, geotécnicos y estructurales) requeridos para la construcción y la rehabilitación de puentes peatonales y vehiculares de la infraestructura vial de la ciudad. Este producto se deriva de los ajustes presupuestales del año 2024 y corresponde al Contrato 4600103075 cuyo objeto es Obras para el mantenimiento de puentes, pasos viales y obras complementarias.

Observación Proyecto: Para el período evaluado, con corte al 31 de diciembre de 2025, el avance reportado es del cero (0), dado que el Contrato N.° 4600103075 de 2024, cuyo objeto es la ejecución de obras para el mantenimiento de puentes, pasos viales y obras complementarias, se encuentra en proceso de liquidación sin ejecución de obras.

Proyecto: 200027 -Rehabilitación y mantenimiento de la malla vial y obras complementarias

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 96% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 18.388 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 17.650

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vía urbana mejorada				
IF27DA Vía urbana con obras complementarias de seguridad vial	**Kilómetro**	**6,3**	**6,3**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 240211404

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mejoramiento de 6,3 km de vías, abarcando actividades de reconformación y recuperación de la banca, limpieza mecánica, reconstrucción de cunetas y reposición de pavimento en diversas áreas de la ciudad. Este proyecto se financia a través de los ajustes y reservas presupuestales del año 2024, y está vinculado a los contratos 4600102144, cuyo objeto es la construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada, y 4600103229, cuyo objeto es el suministro de mezcla asfáltica para el mantenimiento de la malla vial.

Observación B/P/S: Durante el período evaluado, con corte al 31 de diciembre de 2025, se alcanzó el cien por ciento (100 %) de ejecución de la meta, mediante el Contrato N.° 4600103229 de 2024, cuyo objeto corresponde al suministro de mezcla asfáltica para el mantenimiento de la malla vial del Distrito. El cumplimiento total de la meta se logró gracias a la ejecución de recursos provenientes de ajustes y reservas presupuestales de la vigencia 2024. Estas intervenciones contribuyen de manera significativa al mejoramiento de las condiciones de movilidad y seguridad vial, optimizando la infraestructura urbana y garantizando una mayor durabilidad de las vías intervenidas

Proyecto: 200028 -Construcción, mejoramiento y rehabilitación de vías rurales

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.555 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.555

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vía terciaria mejorada				
IF28AR Vía terciaria mejorada	**Kilómetro**	**1,24**	**1,24**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 240204100

Descripción B/P/S: El producto hace referencia al mantenimiento de vías de la red terciaria los andenes, bordillos, pasamanos, defensas viales, barandas, cunetas, cárcamos, obras de drenaje, limpieza y rocería. Este proyecto se financia a través de los ajustes y reservas presupuestales del año 2024 a traves del contrato 4600103243 cuyo objeto es Mantenimiento de vías y demás obras complementarias en los corregimientos, Plan Vial Rural

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 31 de diciembre de 2025, la meta se cumplió al cien por ciento (100 %). La ejecución se realizó con recursos de ajustes y reservas presupuestales de la vigencia 2024, a través de los contratos N.° 4600103243 (Plan Vial Rural – Lote 1) y N.° 4600103241 (Plan Vial Rural – Lote 2), cuyo objeto es el mantenimiento de vías y obras complementarias en los corregimientos, contribuyendo al mejoramiento de la movilidad y seguridad vial rural.

IF28AS Andén de la red terciaria en funcionamiento | **Metro Lineal** | **100** | **100** | **100%**

Código. Ind. SUIFP: 240205200

Descripción B/P/S: El producto hace referencia al mantenimiento de vías de la red terciaria los andenes, bordillos, pasamanos, defensas viales, barandas, cunetas, cárcamos, obras de drenaje, limpieza y rocería. Este proyecto se financia a través de los ajustes y reservas presupuestales del año 2024 a traves del contrato 4600103243 cuyo objeto es Mantenimiento de vías y demás obras complementarias en los corregimientos, Plan Vial Rural

Observación B/P/S: Meta cumplida al 100 %. El proyecto alcanzó la totalidad de lo planificado, con recursos de ajustes y reservas presupuestales de la vigencia 2024, ejecutados mediante el Contrato N.° 4600103243 de 2024, correspondiente al mantenimiento de vías y obras complementarias en los corregimientos, en el marco del Plan Vial Rural.

Proyecto: 240024 -Mejoramiento y construcción de conexiones viales en la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 32% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 16%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 56.155 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 63.405 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 20.485

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vía urbana construida				
IF24BA Vía urbana construida	**Kilómetro**	**0,02**	**0**	**0%**

Código. Ind. SUIFP: 240211300

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la construcción de 0,02 km de Vía urbana, en el sector conexión vial de la Cra. 43B entre Calles 1 y 1 Sur.

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 31 de diciembre, el avance físico del proyecto es del cero (0). A la fecha, los proyectos se encuentran en fase de ejecución,
sin que aún se hayan entregado productos terminados. Los contratos asociados son los siguientes: Contrato de obra N.° 4600105450 de 2025, cuyo objeto corresponde a la intervención de la carrera 43B. Contrato de interventoría N.° 4600105636 de 2025, destinado a la supervisión técnica de las obras en la carrera 43B. Contrato interadministrativo N.° 4600104738 de 2025, correspondiente a la conexión vial Lazo Descendente Palmas. Contrato interadministrativo N.° 4600104737 de 2025, correspondiente a la conexión vial Lazo Ascendente Palmas. Si bien los proyectos se encuentran en ejecución, a la fecha de corte no se registran productos finalizados, por lo cual el avance físico reportado continúa siendo del cero por ciento (0 %)."

IF24BB Vía urbana mejorada | **Kilómetro** | **1,78** | **0** | **0%**

Código. Ind. SUIFP: 240211400

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mejoramiento 1,78 km de Vía urbana en los siguientes puntos:
Cra. 40 con Calle 56 y Calle 58 con Cra. 39 (Echeverri): 0,30 km
Deprimido Feria de Ganado: 0,03 km
Puente Quebrada La Madera: 0,06 km
Tanques Aures 2: 0,46 km
Intervenciones leves en varios sitios: 1,00 km

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 31 de diciembre, el avance físico del proyecto es del cero por ciento (0 %). A la fecha, los proyectos se encuentran en fase de ejecución, sin que se hayan entregado productos terminados, por lo cual no se registra avance físico acumulado. Los contratos asociados son los siguientes: Contrato de obra N.° 4600105450 de 2025, cuyo objeto corresponde a las intervenciones en los sectores de Bolivia, Echeverri y a intervenciones leves. Contrato de interventoría N.° 4600105636 de 2025, destinado a la supervisión técnica de las obras en los sectores de Bolivia, Echeverri e intervenciones leves. Contrato de obra N.° 4600105044 de 2025, correspondiente a las intervenciones en los sectores Feria de Ganado y Aures II. Contrato de interventoría N.° 4600105636 de 2025, para la supervisión técnica de las obras en Feria de Ganado y Aures II. Contrato interadministrativo N.° 4600103299 de 2024, correspondiente al proyecto La Limona, el cual se encuentra en proceso de contratación de obra por parte del municipio de Itagüí. En consecuencia, con corte al 31 de diciembre no se registran productos finalizados, por lo cual el avance físico reportado continúa siendo del cero por ciento (0 %)."

IF24BC Andén construido — **Metro** — **15** — **0** — **0%**

Código. Ind. SUIFP: 240212100

Descripción B/P/S: El producto hace referencia a 15 metros de construccion de andenes de la ciudad los sectores de la conexión vial cra. 43B entre Calles 1 y 1Sur.

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 31 de diciembre, el avance físico del proyecto es del cero por ciento (0 %). A la fecha, los proyectos se encuentran en fase de ejecución, sin que se hayan entregado productos terminados, por lo cual no se registran obras culminadas. Los contratos asociados son los siguientes: Contrato de obra N.° 4600105450 de 2025, cuyo objeto corresponde a la intervención de la carrera 43B. Contrato de interventoría N.° 4600105636 de 2025, destinado a la supervisión técnica de la intervención en la carrera 43B. Contrato interadministrativo N.° 4600104738 de 2025, correspondiente a la conexión vial Lazo Descendente Palmas. Contrato interadministrativo N.° 4600104737 de 2025, correspondiente a la conexión vial Lazo Ascendente Palmas. En consecuencia, con corte al 31 de diciembre no se registran obras culminadas ni productos entregados, por lo cual el avance físico reportado continúa siendo del cero por ciento (0 %)."

IF24BD Andenes de la red urbana mejorados — **Metro** — **643** — **0** — **0%**

Código. Ind. SUIFP: 240212800

Descripción B/P/S: El producto hace referencia a 643 metros de mejoramiento de la red de andenes actual de la ciudad en siguientes sectores:
- Mejoramiento de andenes de la cra. 40 con calle 56 Bolivia y Calle 58 con cra. 39 - Echeverri
- Mejoramiento de andenes al deprimido de la Feria de Ganado
- Mejoramiento de andenes del Tercer carril Carlos E. - La Macarena
- Mejoramiento de andenes en intervenciones leves en varios sectores del distrito.

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 31 de diciembre, el avance físico del proyecto es del cero por ciento (0 %). A la fecha, los proyectos se encuentran en fase de ejecución, sin que se hayan entregado productos terminados, por lo cual no se registran andenes de la red urbana culminados. Los contratos asociados son los siguientes: Contrato de obra N.° 4600105450 de 2025, cuyo objeto corresponde a la intervención en los sectores de Bolivia, Echeverri y a intervenciones leves. Contrato de interventoría N.° 4600105636 de 2025, destinado a la supervisión técnica de las obras en los sectores de Bolivia, Echeverri e intervenciones leves. Contrato de obra N.° 4600105044 de 2025, correspondiente a la intervención en la Feria de Ganado y el sector Aures II. Contrato de interventoría N.° 4600105636 de 2025, para la supervisión técnica de las obras en la Feria de Ganado y el sector Aures II. Contrato interadministrativo N.° 4600103299 de 2024, correspondiente al proyecto La Limona, el cual se encuentra en proceso de contratación de obra por parte del municipio de Itagüí. En consecuencia, con corte al 31 de diciembre no se registran productos finalizados, por lo cual el avance físico reportado continúa siendo del cero por ciento (0 %)."

IF24BE Estudios de preinversión realizados — **Número** — **6** — **0** — **0%**

Código. Ind. SUIFP: 240211800

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la realización de seis (6) Estudios y diseños para el mejoramiento de la infraestructura vial urbana de la ciudad, los cuales incluye: Topografía, Diseño Geométrico, Urbanismo, Hidráulico, Hidrológico, Estructural, Conectividad, Aprovechamiento Forestal, Diseño de Redes Húmedas, Diseño de Redes Secas.

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 31 de diciembre, el avance físico del proyecto es del cero por ciento (0 %), dado que los estudios de preinversión se encuentran en ejecución y aún no han culminado, por lo cual no se registran productos entregados a la fecha. Los contratos asociados son los siguientes: Contrato de consultoría N.° 4600102317 de 2024, cuyo objeto corresponde a los estudios del proyecto Puente sobre la quebrada La Madera. Contrato de consultoría N.° 4600105294 de 2025, destinado al desarrollo de los estudios de los demás puntos priorizados. Contrato de interventoría N.° 4600105386 de 2025, encargado de la supervisión técnica de los estudios de preinversión. En consecuencia, con corte al 31 de diciembre no se registran productos finalizados, por lo cual el avance físico reportado continúa siendo del cero por ciento (0 %), pese a que los proyectos se encuentran en proceso de estructuración.

Proyecto: 240072 -Construcción obras de estabilización y mitigación en la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 57% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 78%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 14.700 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 16.596 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 9.427

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Obras para estabilización de taludes				
IF72EA Obras para estabilización de taludes realizadas	**Metro**	**516**	**516**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 320501000

Descripción B/P/S: El producto hace referencia a la construcción de 516 metros de estructuras de contención y de estabilización de un talud, los cuales serán ejecutados en varios puntos de la ciudad.

Observación B/P/S: Con corte al 31 de diciembre, se registra un avance físico de 516 metros lineales en obras de estabilización de taludes, ejecutadas mediante el Contrato N.° 4600104972 de 2025, cuyo objeto es la ejecución de intervenciones de infraestructura física para la atención de emergencias ocasionadas por la temporada invernal, en el marco de la calamidad pública y la urgencia manifiesta decretadas. El avance ponderado a la fecha se distribuye en los siguientes puntos intervenidos: Balsos – 90 – Santa Elena, con 36,43 m; Biblioteca Fernando Botero – 60 – San Cristóbal, con 4,76 m; y Santa Rita – 80 – San Antonio de Prado, con 49,62 m, contribuyendo al cumplimiento progresivo de la meta programada para la vigencia con un 100% de ejecución.

Proyecto: 240073 -Construcción y mejoramiento de puentes medellin

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 28% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 14%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 16.325 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.500

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Puente de vía urbana rehabilitado				
IF73CB Puente de vía urbana rehabilitado	**Número**	**1**	**0**	**0%**

Código. Ind. SUIFP: 240207900

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la rehabilitacion de las obras del Puente la 4 Sur en aras de mejorar la conexión vial y la movilidad de la ciudad.

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 31 de diciembre de 2025, el avance físico reportado es del cero (0), dado que el proyecto se encuentra en etapa de alistamiento para el inicio de su ejecución. El contrato interadministrativo ya se encuentra firmado; sin embargo, los contratos derivados se encuentran actualmente en proceso de selección y legalización, con una fecha estimada de inicio de obras a partir del 15 de enero de 2026. Las obras serán ejecutadas mediante un contrato interadministrativo con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), orientado a la atención de contingencias en la ciudad, de acuerdo con las necesidades prioritarias que se identifiquen durante la ejecución del proyecto.

Proyecto: 240086 -Construcción y mantenimiento de la infraestructura vial metroplus

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 12.196 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.522 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.521

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Estaciones construidas

IF86AC	**Estaciones construidas**	**Porcentaje**	**5**	**5**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 240800300

Descripción B/P/S: proyecto contempla la construcción de 3 estaciones de la fase 1 (de un total de 2 fases) de la infraestructura de las 11 estaciones, correspondientes a la U corta y la U larga en el costado de la Av. Guayabal. Estas estaciones se entregarán a la comunidad en los años 2026 y 2027, respectivamente.
Para el año 2025, se debe avanzar en un 5% en los trámites iniciales del proyecto, que abarcan estudios, diseños, aprobaciones y licenciamientos. La ejecución del proyecto estará a cargo de la empresa Metroplus, bajo el Convenio Marco 01 de 2005, con los contratos derivados No. 032 de 2023 y 034 de 2024. Las actividades serán desarrolladas de la siguiente manera:
Estudio de movilidad: 1%
Diseño de 6 estaciones iniciales: 1.5%
Diseño de 5 estaciones adicionales solicitadas por el AMVA: 1%
Aprobaciones vial DAP: 0.3%
Aprobación urbanismo DAP: 0.3%
Aprobaciones redes de servicios: 0.2%
Licenciamiento curaduría: 0.7%

Observación B/P/S: A corte del 31 de diciembre de 2025, se ha avanzado en los trámites iniciales del proyecto, que incluyen estudios, diseños, aprobaciones y licenciamientos, con un avance físico de obra del 1,7 %. Estas actividades, aunque de baja ejecución física, son fundamentales para garantizar la viabilidad del proyecto y habilitar el inicio
de la construcción de estaciones en los próximos meses, cumpliendo al 100 % la meta del 5 % del producto "Estaciones construidas" prevista para el año.

IF86AD	**Vías urbanas construidas**	**Porcentaje**	**30**	**30**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 240800500

Descripción B/P/S: El producto corresponde a la construcción de vias urbanas, con un avance del 30% en estudios y diseños técnicos, distribuidos así: estudios de suelos y geotecnia (5%), diseños de urbanismo y arquitectura (5%), diseños estructurales (5%), diseños de redes (5%) y estudios de movilidad y diseño geométrico (10%). Estos componentes garantizan la viabilidad técnica y funcional del proyecto.

Observación B/P/S: A corte del 31 de diciembre de 2025, el producto Vías urbanas construidas registra un avance del 14,8 %, correspondiente al desarrollo de actividades asociadas a estudios y diseños técnicos, que incluyen estudios de suelos y geotecnia, diseños de urbanismo y arquitectura, diseños estructurales, diseños de redes y estudios de movilidad y diseño geométrico. Si bien estas actividades no representan aún ejecución física de obra, son fundamentales para garantizar la viabilidad técnica y funcional del proyecto y habilitar el inicio de la fase constructiva en los siguientes meses, con lo cual se cumpleal 100% la meta establecida para la presente vigencia. 30 %"

Proyecto: 240092 -Conservación y rehabilitación de la malla vial e infraestructura asociada en la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 80% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 90%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 129.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 173.592 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 138.131

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario				
IF92CA Vía urbana con mantenimiento	**Kilómetro**	**24,09**	**24,09**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 240211500

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mantenimiento de 24,09 km de vía, reconformación y recuperación de la banca, limpieza mecánica y reconstrucción de cuneta reposición de pavimento en algunos sectores de la ciudad.

Observación B/P/S: Para el período evaluado con corte al 31 de diciembre, se registra un avance de 24,09 km, ejecutado a través del Contrato No. 4600105052 de 2025, cuyo objeto es la rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial y su infraestructura asociada. Durante la vigencia se realizaron intervenciones de mantenimiento y mejoramiento en diferentes vías de la ciudad, las cuales fortalecen la infraestructura vial, mejoran las condiciones de movilidad y aportan a la seguridad de los usuarios. Asimismo, estas acciones contribuyen a prolongar la vida útil de la malla vial existente y a garantizar un servicio de transporte urbano más eficiente. Con este avance, se alcanza el 100 % de la meta programada para la vigencia.

IF92CB	**Maquinaria y equipos adquiridos**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 240212500

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la adquisición de vehículos de transporte pesado de carga y especiales, y maquinaria pesada.

Observación B/P/S: Para el período evaluado con corte al 31 de diciembre, la meta se cumple en un 100 % con la adquisición de un equipo cargador frontal. El equipo fue entregado en las instalaciones de la Planta La Iguana, adscrita a la Secretaría de Infraestructura Física, en cumplimiento de las condiciones establecidas en el proceso de adquisición.

IF92CC	**Maquinaria y equipos con mantenimiento mayor, repotenciados o modernizados**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 240214100

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mantenimiento general de vehículos de transporte pesado de carga,maquinaria pesada y equipos

Observación B/P/S: Para el período evaluado con corte al 31 de diciembre de 2025, el proyecto registra un cumplimiento del 100 % de la meta, como resultado de la ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos y de la garantía en la disponibilidad del parque automotor requerido para la atención de las necesidades de la ciudad. Estas acciones se desarrollan en el marco del Contrato Interadministrativo No. 4600104845 de 2025, cuyo objeto es la gestión integral del mantenimiento y la disponibilidad de maquinaria amarilla, vehículos pesados y equipos. La ejecución adelantada ha permitido asegurar la operatividad de la flota, atender de manera oportuna los requerimientos de la administración distrital y fortalecer la capacidad técnica y operativa para la ejecución de proyectos y actividades prioritarias en el territorio.

IF92CD	**Andenes de la red urbana mantenidos**	**Metro**	**1.260**	**1.260**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 240212900

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mantenimiento de 1,260 metros de andenes que conecten espacios de ciudad y barrial, que posibiliten la continuidad de los ya existentes.

Observación B/P/S: Para el período evaluado con corte al 31 de diciembre de 2025, se reporta un avance de 1.260 metros de andenes mantenidos, ejecutados en el marco del Contrato de Obra No. 4600105052 de 2025, cuyo objeto es la rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial y su infraestructura asociada. Con la ejecución de estas intervenciones se da cumplimiento total a la meta establecida para la presente vigencia, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de movilidad peatonal, accesibilidad y seguridad para la ciudadanía.

Proyecto: **240093 -Construcción, mejoramiento y mantenimiento de vías corregimentales e infraestructura asociada**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 29% **Ejec. Financiera :** 85% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 57%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 35.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 29.537 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 25.197

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario					
IF93AA	**Vía terciaria con mantenimiento**	**Kilómetro**	**9**	**2,61**	**29%**

Código. Ind. SUIFP: 240211200

Descripción B/P/S: El producto hace referencia a 9 km de mantenimiento de vías e infraestructura asociada en corregimientos

Observación B/P/S: Para el periodo a evaluar con corte 31 de diciembre se tiene un avance de 2,61 km de Vía terciaria con mantenimiento, Ejecutados en la Comuna 90 Santa Elena a través del contrato 4600105052 de 2025 cuyo objeto es Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.

Programa: 4.1.2 - Medellín se conecta con el mundo

Proyecto: **170040 -Construcción corredor vial y de transporte avenida 80 y obras complementarias**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 80% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 90%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 402.612 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 251.556 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 202.093

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para la implementación de sistemas de transporte público de pasajeros					
IF40EA	**Convenios suscritos**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 240802200

Descripción B/P/S: Corresponde al aporte del Distrito de Medellín, al convenio de cofinanciación celebrado con la Nación para llevar a cabo la construcción del proyecto Metro de la 80.

Observación B/P/S: Con corte al 31 de diciembre de 2025, se reporta el cumplimiento del 100% de la meta anual, en el marco de los Convenios de Cofinanciación No. 4600066323 de 2016 y 4600098630 de 2023.

Proyecto: **240099 -Mejoramiento y conservación del sistema lineal teleférico de palmitas**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 93% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 25.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.496 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.333

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Sistema lineal teleférico rural mantenido				
IF99BA Sistema lineal teleférico rural mantenido	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 240804800

Descripción B/P/S: El producto consiste en realizar actividades de repotenciación del sistema teleférico, así como llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo del cable aéreo.

Observación B/P/S: Para el periodo evaluado con corte a 31 de diciembre de 2025, el contrato interadministrativo 4600104038 cuyo objeto es la operación, mantenimiento y administración del cable de San Sebastian de palmitas Durante el plazo reportado se ejecutaron las siguientes actividades: • Personal gestor de operación realiza mantenimiento de zonas verdes en la estación el Morrón • Personal gestor de operación realiza mantenimiento de canaletas y ""manhole"" de aguas lluvias de las estaciones Teresitas 1 y 2. • Personal gestor de operación realiza el lavado de estaciones de Teresitas 1 y 2, accesos de rampas. • Personal gestor de operación revisan y aceitan chapas de las puertas de la estación Aldea ya que estaban presentando dificultad para abrir. • Continúan labores de mantenimiento con el contratista Sytecsa S.A.S en el marco del contrato 109-2025 para reparar cabinas, cambiar mordazas de sujeción, cambiar ejes principales y volver a habilitar cabinas para operación con restricción interna. Durante la semana de reporte instalaron las mordazas nuevas de sujeción, al igual que las mordazas de anclaje fijo (pendientes por torques de ajuste). • Adicionalmente armaron andamios y torres soporte para realizar la retención de cables portantes en la estación La Aldea. • Se estimamos que al corte del 31 de octubre esté este tramo habilitado con las nuevas mordazas de sujeción. • El contactor que se había reportado con corto circuito, luego de una inspección por el contratista e interventoría y corregir las pistas y contactos, queda operativo nuevamente. • Se revisan la longitud de los estrobos para las nuevas mordazas de sujeción, al igual que los certificados de calidad y etiquetas de certificación. este contrato se ejecuto en un 100%

IF99BB Documentos de estudios técnicos realizados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 240805300

Descripción B/P/S: El producto hace referencia a la realización de estudios y diseños técnicos para la repotenciación del cable aéreo, aplicando la normatividad técnica actual que rigen para estos sistemas.

Observación B/P/S: La meta fue cumplida al 100% desde el mes de abril de 2025.

Programa: 4.1.3 - Renovación urbana integral

Proyecto: **200079 -Rehabilitación e intervención parque biblioteca zona nororiental**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 46% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 72%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.677 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.623

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Bibliotecas con reforzamiento estructural				
IF79BE Bibliotecas con reforzamiento estructural	**Porcentaje**	**1,4**	**0,64**	**46%**

Código. Ind. SUIFP: 330100500

Descripción B/P/S: El producto reporta un avance físico del 1,40 % hacia la culminación del 100 % de la obra, la cual contempla la ejecución de obras complementarias en las tres cajas y en el componente de urbanismo. Este avance está asociado al Contrato No. 4600092408 de 2021, cuyo objeto es la rehabilitación e intervención del Parque Biblioteca Zona Nororiental en el municipio de Medellín. Para la vigencia 2025, las actividades programadas corresponden a la finalización de las cajas 1 y 2, el atrio, el urbanismo y el 50 % de las actividades restantes de la caja 3. El 50 % restante de la caja 3 está previsto para ejecución en el año 2026.

Observación B/P/S: Durante el período evaluado, con corte a 31 de diciembre, la meta del 1,40 % programada para la vigencia 2025 se ejecutará a través del nuevo contrato interadministrativo suscrito con la EDU No. 4600105755. Este contrato interadministrativo inició el 1 de octubre de 2025 y tiene como fecha de terminación el 1 de mayo de 2026. A la fecha de corte del presente informe, la EDU se encuentra adelantando el proceso de legalización de los contratos de obra e interventoría, etapa previa al inicio de la ejecución física. Se prevé que las actividades inicien en los próximos días. En consecuencia, al cierre del período reportado no se registra avance en la ejecución física, por lo cual la cantidad ejecutada es 0,64 %. La ejecución de la meta se proyecta para los siguientes períodos, conforme al cronograma contractual.

Proyecto: 240074 -Construcción de obras de mejoramiento integral sector iguaná

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 50%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.853 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.574 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.574

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Espacio publico construido				
IF74AA Espacio publico construido	**Porcentaje**	**8**	**0**	**0%**

Código. Ind. SUIFP: 400201900

Descripción B/P/S: El proyecto contempla la construcción de 3,946 metros cuadrados de espacio público en los sectores de Conectividad Fuente Clara Fase 3 (Subfase 1) y Conectividad Calazanía-Blanquizal, con entregas programadas para los años 2026 y 2027, respectivamente. Para la vigencia 2025, se realizará la gestión predial necesaria para adquirir el 8% de los terrenos requeridos, permitiendo la construcción de las obras de espacio público en el marco del proyecto de Mejoramiento Integral del Sector Iguaná. Este proyecto será ejecutado por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).

Observación Proyecto: Con corte al 31 de diciembre de 2025, el proyecto no registra avance físico (0), debido a que se encuentra en fase precontractual, con posibilidad de adición a un contrato existente de diseños y gestión predial. A la fecha, se adelantan actividades técnicas y administrativas en ejecución, sin entrega de productos, orientadas a garantizar un proceso de contratación eficiente.

Proyecto: 240087 -Construcción de obras de mejoramiento integral comuna 13

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 50%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.178 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.138 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.138

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Estudios de pre inversión e inversión				
IF87AA Estudios o diseños realizados	**Número**	**1**	**0**	**0%**

Código. Ind. SUIFP: 400203400

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la realización de estudios y diseños del proyecto viaducto media ladera tramo 5

Observación Proyecto: Para el periodo evaluado con corte al 31 de diciembre de 2025, el avance físico reportado es cero (0). Sin embargo, con la priorización del proyecto Espacio Público Municipal San Javier se inició el proceso de gestión predial, por otra parte, los estudios y diseños se ejecutarán en el primer semestre de la vigencia 2026.

Proyecto: 240088 -Construcción de obras de mejoramiento integral sector centro oriental

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 50%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.387 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.321 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.316

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Espacio publico construido				
IF88BA Espacio publico construido	Porcentaje	8	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 400201900

Descripción B/P/S: El proyecto contempla la construcción de 1,914 metros cuadrados de espacio público, los cuales serán entregados a la comunidad en el año 2026. Para el año 2025, se requiere adquirir el 8% de los predios necesarios para la adecuación de las obras de espacio público "Camino de la Vida - Colegio La Sierra". Asimismo, se procederá a la compra de predios para el desarrollo del sendero de conexión entre la estación de cable Villa Sierra y la Ruta de Campeones. Este proyecto será ejecutado por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).

Observación Proyecto: Para el período evaluado con corte al 31 de diciembre de 2025, el proyecto no registra avance físico de obra cero (0). No obstante, durante esta vigencia, las directivas de la Secretaría de Infraestructura Física priorizaron el proyecto "Conexión Camino de la Vida – Colegio de la Sierra", cuyos estudios y diseños técnicos serán incorporados para su revisión y/o actualización en el marco del contrato interadministrativo No. 4600090649 de 2021.

Proyecto: 240089 - **Construcción de obras de mejoramiento integral sector noroccidental**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 50%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.209 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.178 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.178

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Estudios de pre inversión e inversión				
IF89BA Estudios o diseños realizados	Número	1	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 400203400

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la realización de un (1) estudio y diseño en el proyecto paseo urbano carrera 83 tramo 2

Observación Proyecto: Para el periodo evaluado con corte al 31 de diciembre de 2025, el avance físico reportado es cero (0). Sin embargo, con la priorización del proyecto Paseo Urbano Carrera 83 Tramo 2 se inició el proceso de gestión predial, por otra parte, los estudios y diseños se ejecutarán en el primer semestre de la vigencia 2026.

Programa: 4.1.4 - Espacios públicos inclusivos y accesibles

Proyecto: 190051 - **Mantenimiento del espacio público y soterrado de parques del río**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.457 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.457

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Parques mantenidos				
IF51SA Parques mantenidos	Metro cuadrado	17.950	17.950,004	100%

Código. Ind. SUIFP: 400202200

Descripción B/P/S: El producto hace referencia al mantenimiento de 17.950 m² de espacio público, incluyendo zonas verdes y peatonales, así como a los equipos electromecánicos de ingeniería especializada, abarcando además aspectos locativos, civiles y urbanísticos, con el objetivo de proporcionar un espacio de calidad para los habitantes de la ciudad. Este producto se deriva de las reservas presupuestales del año 2024, Contrato No. 4600100600 del año 2024, cuyo objeto es el "Contrato Interadministrativo de Mandato Sin Representación para la Operación, Administración y Mantenimiento de Parques del Río.

Observación B/P/S: Meta cumplida al 100%. El Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación No. 4600100600 de 2024, cuyo objeto es la operación, administración y mantenimiento de Parques del Río, alcanzó un 100% de ejecución respecto a lo planificado. La ejecución se desarrolló conforme a los objetivos, tiempos y condiciones establecidos, garantizando el cumplimiento integral de las metas del proyecto.

Proyecto: 200023 - **Construcción, mejoramiento y mantenimiento de espacios públicos de encuentro y esparcimiento**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.197 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.095

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Estudios de pre inversión e inversión					
IF23GH	**Estudios o diseños realizados**	**Número**	**2**	**2**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 400203400

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la realización de 2 estudios y diseños. Uno de estos estudios se llevará a cabo en la Avenida Las Palmas, sector La Calera, y el otro estará destinado a la atención de una acción judicial.
Este producto se deriva de las reservas presupuestales del año 2024 y corresponde al Contrato No. 4600102287, cuyo objeto es la realización de estudios y diseños para proyectos de obra pública en el barrio Las Palmas, sector La Calera, así como la atención de una acción judicial.

Observación B/P/S: Meta cumplida al 100%. La ejecución alcanzó el 100% de cumplimiento respecto a lo planificado, garantizando el logro de los objetivos establecidos en los tiempos y condiciones definidos. Contrato No. 4600102287, cuyo objeto corresponde a la realización de estudios y diseños para proyectos de obra pública en el barrio Las Palmas, sector La Calera, así como a la atención de una acción judicial.

IF23GJ	**Parques mantenidos**	**Metro cuadrado**	**14.361**	**14.361**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 400202200

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la intervención de parques mantenidos correspondientes a espacios públicos intervenidos por administración directa a través de la compra de materiales. Este producto se deriva de las reservas presupuestales del año 2024

Observación B/P/S: Meta cumplida al 100% La ejecución alcanzó el 100% de cumplimiento respecto a lo planificado, garantizando el logro de los objetivos establecidos en los tiempos y condiciones definidos. Estos espacios públicos fueron intervenidos por administración directa a través de la compra de materiales. Este producto se deriva de las reservas presupuestales del año 2024.

IF23JA	**Parques mejorados**	**Metro cuadrado**	**3.336,3**	**3.547,6**	**106%**

Código. Ind. SUIFP: 400202300

Descripción B/P/S: El producto hace referencia al mejoramiento de 3.336,60 m² de parques en el corregimiento de San Antonio de Prado, distribuidos en las siguientes zonas:
Ciudadela Prado II – Calle 40 C Sur, Carrera 62: 1.171,66 m² intervenidos.
Corregiduría – Calle 57 Sur, Carrera 63: 1.136,64 m² intervenidos.
Rosaleda – Calle 48 D Sur, Carrera 55 O: 404,60 m² intervenidos.
Limonar II – Carrera 60 D, Calle 5A: 623,40 m² intervenidos.
Este producto se deriva de las reservas presupuestales del año 2024 y corresponde al Contrato No. 4600102897, cuyo objeto es la ejecución de obras de mejoramiento y mantenimiento de espacios públicos de encuentro y esparcimiento en el corregimiento de San Antonio de Prado.

Observación B/P/S: Meta cumplida al 100% La ejecución alcanzó el 106% de cumplimiento respecto a lo planificado, garantizando el logro de los objetivos establecidos en los tiempos y condiciones definidos. Contrato No. 4600102897, cuyo objeto corresponde a la ejecución de obras de mejoramiento y mantenimiento de espacios públicos de encuentro y esparcimiento en el corregimiento de San Antonio de Prado.

Proyecto: 200080 -Construcción parques del rio norte

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 85% **Ejec. Financiera :** 92% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 88%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 50.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 102.686 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 94.295

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Espacio publico construido					
IF80FB	**Espacio publico construido**	**Porcentaje**	**9,5**	**8,09**	**85%**

Código. Ind. SUIFP: 400201900

Descripción B/P/S: El producto corresponde a la construcción del 9,5% de las etapas 1 y 2 del proyecto, distribuido según los componentes de ejecución, con una ponderación definida para cada actividad. La distribución de los porcentajes es ahora la siguiente:
-Diseño arquitectónico y aprobaciones (1.0%)
-Diseños técnicos y aprobaciones (1.5%)
-Gestión ambiental y aprobaciones (1,0%)
-Ejecución de obra (6,0%)

Observación B/P/S: Para el período evaluado con corte al 31 de diciembre, se registra un avance físico acumulado del 85,16 %, resultado de las siguientes variaciones por actividad: Diseño arquitectónico y aprobaciones: 0,01 % Diseños técnicos y aprobaciones: 0,00 % Gestión ambiental y aprobaciones: 0,02 % Ejecución de obra: 3,00 % Durante el período de reporte, en lo relacionado con las aprobaciones ante curaduría, el 14 de noviembre se recibió la viabilidad de aprobación y la liquidación de expensas para el trámite de licenciamiento de los diseños del Jardín Buen Comienzo. De manera paralela, continúa el proceso de coordinación BIM. En cuanto a la ejecución, se adelantaron movimientos de tierra, replanteos, excavaciones y el acondicionamiento de los campamentos de obra. Asimismo, se desarrollan de forma simultánea obras preliminares para la estabilización del muro del río en la margen oriental y labores de demarcación para la construcción del equipamiento cultural. Estas actividades se ejecutan en el marco de los siguientes contratos interadministrativos: No. 4600090098 de 2021 (Zona Norte), No. 4600105200 de 2025 (Urbanismo) y No. 4600105230 de 2025 (Equipamiento Cultural).

Proyecto: 240071 -Mejoramiento y construcción de espacios públicos en la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 50% **Ejec. Financiera :** 50% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 50%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 22.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 37.237 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 18.492

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Espacio publico adecuado				
IF71FA Espacio publico adecuado	**Metro cuadrado**	**10.621**	**0**	**0%**

Código. Ind. SUIFP: 400202000

Descripción B/P/S: El producto se refiere 10,621 m2, de obras de mejoramiento de espacio públicos en los siguientes sectores: Parques Lote 1: Divina Providencia y La Isla y Lote 2 García Marquez, Ying Yang y La Manga.

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 31 de diciembre, el avance físico del proyecto es del cero por ciento (0 %), dado que los proyectos se encuentran en fase inicial de ejecución y aún no se han entregado productos. Lo anterior se debe a que los contratos iniciaron su ejecución el 15 de octubre de 2025 y actualmente se encuentran desarrollando actividades preliminares. Los contratos asociados son los siguientes: Contrato de obra N.° 4600105557 de 2025, cuyo objeto es la construcción, mejoramiento y mantenimiento de espacios públicos de encuentro y esparcimiento, en el marco del programa Tejiendo Hogares – Lote 1. Contrato de obra N.° 4600105638 de 2025, cuyo objeto es la construcción, mejoramiento y mantenimiento de espacios públicos de encuentro y esparcimiento, en el marco del programa Tejiendo Hogares – Lote 2. En consecuencia, a la fecha de corte no se registran productos entregados, por lo cual el avance físico reportado continúa siendo del cero (0)"

IF71FB Estudios o diseños realizados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 400203400

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la elaboración de un (1) estudio y diseño destinados al mejoramiento y construcción de espacios público.

Observación B/P/S: La ejecución alcanzó el 100% de cumplimiento respecto a lo planificado, garantizando el logro de los objetivos establecidos en los tiempos y condiciones definidos.

Proyecto: 240075 -Mantenimiento de espacios públicos en la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 67% **Ejec. Financiera :** 62% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 64%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 20.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 28.293 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 17.422

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Parques mantenidos				
IF75AA Parques mantenidos	**Metro cuadrado**	**55.000**	**36.865**	**67%**

Código. Ind. SUIFP: 400202200

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mantenimiento de 55.000 m² de espacio publico en los diferentes parques de la ciudad

Observación B/P/S: Para el período evaluado con corte al 31 de diciembre de 2025, se reporta un avance físico de 36.865 m² de parques mantenidos, correspondientes a intervenciones realizadas en distintos barrios, comunas y corregimientos del municipio, orientadas a la conservación y mejora del espacio público recreativo y comunitario. Las intervenciones se ejecutaron en los siguientes puntos específicos: calle 77 carrera 48A, calle 104A carrera 63B, calle 101A carrera 78, calle 109 carrera 64DD, calle 53 carrera 24B, calle 63A carrera 42, calle 59 carrera 65A, calle 74 carrera 73, calle 65 diagonal 16DD, calle 52 carrera 23, calle 12 carrera 70A, sector El Uvito, calle 63B carrera 100 (Mirador del Valle) y calle 56A sur carrera 55AA."

Proyecto: 240091 -Conservación y mejoramiento del soterrado de parques del rio y el espacio publico asociado

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.990 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.763

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Parques mantenidos				
IF91CA Parques mantenidos	**Metro cuadrado**	**53.850**	**53.850**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 400202200

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mantenimiento de 53.850 m² de espacio Público, zonas verdes y peatonales, como los equipos electromecánicos de ingeniería especializada, como parte locativa, civil y urbanística, para brindar un espacio de calidad a los habitantes de la ciudad.

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 31 de diciembre de 2025, se registra un avance fisico del 100% con 53.850 m² en el marco del contrato No. 4600105021 de 2025. Este corresponde a un contrato interadministrativo de mandato sin representación, cuyo objeto es la operación, mantenimiento y administración de Parques del Río. El contrato inició formalmente el 1 de junio de 2025, con la suscripción del acta de inicio, y cuenta con un plazo de ejecución de siete (7) meses. El avance reportado evidencia el cumplimiento progresivo de las actividades programadas, en concordancia con las obligaciones contractuales y el cronograma establecido.

Proyecto: 240097 -Desarrollo de obras de mejoramiento en el centro

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 36% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 67%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 16.192 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 28.191 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 27.405

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Espacio publico adecuado				
IF97AA Espacio publico adecuado	**Metro cuadrado**	**3.015**	**2.200**	**73%**

Código. Ind. SUIFP: 400202000

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la realización de obras para el mejoramiento del espacio público

Observación B/P/S: Para el periodo a evaluar, con corte a 31 de diciembre de 2025, el avance es 2.220 m² ya que los recursos destinados a intervenciones complementarias se encuentran actualmente en estado precontractual, a la espera de culminar los trámites administrativos y contractuales correspondientes, requisito previo para dar inicio a su ejecución.

IF97AB Estudios o diseños realizados	**Número**	**1**	**0**	**0%**

Código. Ind. SUIFP: 400203400

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la elaboración de los estudios y diseños necesarios para el mejoramiento de espacios públicos en el Centro de la Ciudad.

Observación B/P/S: Para el periodo a evaluar, con corte a 31 de diciembre de 2025, el avance es cero (0) ya que los recursos destinados a intervenciones complementarias se encuentran actualmente en estado precontractual, a la espera de culminar los trámites administrativos y contractuales correspondientes, requisito previo para dar inicio a su ejecución.

Componente: 4.3 - Movilidad Sostenible e Integral

Programa: 4.3.1 - Infraestructura vial sostenible e integral

Proyecto: 200030 -Construcción, mejoramiento y rehabilitación de vías peatonales

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 8.634 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 8.541

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Andén de la red urbana mantenido				
IF30KB Andenes de la red urbana mantenidos	**Metro**	**317**	**317**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 240212900

Descripción B/P/S: El producto hace referencia a 317 metros de mantenimiento de la red de andenes actual de la ciudad.Este proyecto se financia a través de los ajustes y reservas presupuestales del año 2024, y está vinculado a los contrato 4600102792 de 2024 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS" COMUNA 10 - CANDELARIA

Observación B/P/S: Meta cumplida al 100 %. La ejecución alcanzó la totalidad de lo planificado, garantizando el logro de los objetivos establecidos dentro de los tiempos y condiciones definidos y asegurando el cumplimiento integral de las metas del proyecto. Este resultado se logró mediante el Contrato N.° 4600102792 de 2024, cuyo objeto es la construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y la ejecución de obras complementarias.

IF30KC Andenes de la red urbana mejorados	**Metro**	**9.609**	**9.609**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 240212800

Descripción B/P/S: El producto hace referencia a 9.609 metros de mejoramiento de la red de andenes actual de la ciudad. Este proyecto se financia a través de los ajustes y reservas presupuestales del año 2024, y está vinculado a los contrato 4600102792 de 2024 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS" COMUNA 10 - CANDELARIA

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 31 de diciembre, el proyecto reporta un cumplimiento de 9,609 metros lineales de andenes mantenidos, con lo cual se alcanza el cien por ciento (100 %) de ejecución, de acuerdo con lo programado. Este resultado se logró mediante el Contrato N.° 4600102792 de 2024, cuyo objeto es la construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y la ejecución de obras complementarias.

Proyecto: 240095 -Mejoramiento y construcción de andenes en la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 95% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 23.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 21.140 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 20.177

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Andén construido				
IF95BA Andén construido	**Metro**	**150**	**150**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 240212100

Descripción B/P/S: El producto hace referencia a 150 metros de construcción de andenes en la ciudad

Observación B/P/S: En el periodo evaluado con on corte al 31 de diciembre de 2025, el proyecto registra un avance físico de 150 metros de andenes construidos, ejecutados mediante el contrato No. 4600102792 de 2024, cuyo objeto es la "construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias". El resto de los recursos de la vigencia se encuentra en etapa precontractual para el mejoramiento de los andenes de los corredores Calle 10, Carrera 70, Carrera 66 y Calle 30A, los cuales serán ejecutados durante la vigencia 2026.

IF95BB Andenes de la red urbana mejorados	**Metro**	**1.497**	**1.497**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 240212800

Descripción B/P/S: El producto hace referencia a 1497 metros de mejoramiento de la red urbana de andenes de la ciudad.

Observación B/P/S: En el periodo evaluado con corte a 31 de diciembre, con corte al 31 de diciembre de 2025, el proyecto registra un cumplimieto físico del 100% con 1.497 metros de andenes construidos, ejecutados mediante el contrato No. 4600102792 de 2024, cuyo objeto es la construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias. El resto de los recursos de la vigencia se encuentra en etapa precontractual para el mejoramiento de los andenes de los corredores Calle 10, Carrera 70, Carrera 66 y Calle 30A, los cuales serán ejecutados durante la vigencia 2026.

Proyecto: **240098 - Mantenimiento de andenes en la ciudad**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 80% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 90%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 17.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 11.037 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 8.778

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Andén de la red urbana mantenido				
IF98BA Andenes de la red urbana mantenidos	**Metro**	**8.266**	**8.266**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 240212900

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la realización de 8.266 metros de mantenimiento a los andenes del Distrito de Medellín, actividades que conllevan la Localización, trazado, demolición de andén existente, Excavación, preparación y nivelación de terreno.

Observación B/P/S: Con corte al 31 de diciembre, se registra un avance de 8.266 metros ejecutados, correspondientes al Contrato Interadministrativo No. 4600104723 de 2025, cuyo objeto es la gestión integral de contingencias en la infraestructura física del Distrito. Estas intervenciones aportan al cumplimiento de las metas establecidas y al fortalecimiento del plan estratégico Medellín Tácita de Plata, en coherencia con el Plan de Desarrollo vigente. Cabe resaltar que los recursos destinados al mantenimiento de andenes fueron incorporados a este contrato, lo que permitió su inicio oportuno y la atención inmediata de las necesidades priorizadas en el territorio. Los recursos restantes se encuentran actualmente en etapa precontractual, a la espera de la culminación de los trámites administrativos y contractuales correspondientes. Una vez finalizados, se dará continuidad a la ejecución programada, garantizando el avance integral del Plan de Acción para la vigencia."

Programa: 4.3.5 - Movilidad activa, sostenible y micromovilidad

Proyecto: **200029 - Construccion, mejoramiento y mantenimiento de ciclorutas**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 8.661 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 8.600

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Ciclo infraestructura urbana con mantenimiento				
IF29HB Ciclo infraestructura urbana con mantenimiento	**Metro Lineal**	**8.000**	**8.170,1**	**102%**

Código. Ind. SUIFP: 240209400

Descripción B/P/S: El producto se refiere a 8.000 metros lineales de Ciclo infraestructura urbana mantenida para la circulación exclusiva de bicicletas en toda la ciudad. Este proyecto se financia a través de los ajustes y reservas presupuestales del año 2024, y está vinculado a los contrato 4600102703 de 2024, cuyo objeto es el mantenimiento de la red de cicloinfraestructura de la ciudad e instalación y reposición de cicloparqueaderos.

Observación B/P/S: Meta cumplida al 100 %. La ejecución alcanzó la totalidad de lo planificado, garantizando el logro de los objetivos establecidos dentro de los plazos y condiciones definidos y asegurando el cumplimiento integral de las metas del proyecto. El proyecto presenta un avance físico general del 102 %, conforme a lo reportado en informes anteriores. Se culminaron satisfactoriamente los 18 frentes de trabajo destinados al mantenimiento de la red de cicloinfraestructura. De igual manera, se finalizaron 30 frentes de trabajo para la instalación de cicloparqueaderos, logrando la implementación de 138 módulos, lo que consolida el cumplimiento total de los compromisos técnicos y operativos establecidos.

Pilar: 5 - Creemos en la sostenibilidad ambiental y en el bienestar animal

Componente: 5.1 - Sostenibilidad y patrimonio ambiental

Programa: 5.1.3 - Desarrollo de estrategias de renaturalización para la consolidación de Medellín como Distrito Verde

Proyecto: 200037 -Generación y mantenimiento de la infraestructura verde

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.013 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.997

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Zonas verdes adecuadas					
IF37IA	Zonas verdes adecuadas	Metro cuadrado	470	470	100%

Código. Ind. SUIFP: 400202500

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la ejecución de 470 m2 de labores de conservación, recuperación y establecimiento de vegetación en las zonas verdes, conservación de jardines y de árboles, siembra de árboles, siembra de jardines, siembra de grama cultivada, producción de plantas en las zonas verdes de la ciudad. Este proyecto se financia a través de los ajustes y reservas presupuestales del año 2024, y está vinculado al contrato 4600102026, cuyo objeto es el contrato de ciencia y tecnología para el desarrollo de actividades inherentes a la conservación y mejoramiento de la infraestructura verde, el cual finalizó el 31 de enero de 2025.

Observación B/P/S: Meta cumplida al 100 %. La ejecución alcanzó la totalidad de lo planificado, garantizando el logro de los objetivos establecidos dentro de los tiempos y condiciones definidos. El proyecto se financió mediante recursos provenientes de los ajustes y reservas presupuestales de la vigencia 2024 y se ejecutó a través del Contrato N.° 4600102026, correspondiente a un contrato de ciencia y tecnología para el desarrollo de actividades orientadas a la conservación y mejoramiento de la infraestructura verde, el cual finalizó el 31 de enero de 2025.

IF37IB	Zonas verdes mantenidas	Metro cuadrado	448.300	448.300	100%

Código. Ind. SUIFP: 400202600

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la ejecución 448.300 m2 de labores de conservación, recuperación y establecimiento de vegetación en las zonas verdes, conservación de jardines y de árboles, siembra de árboles, siembra de jardines, siembra de grama cultivada, producción de plantas en las zonas verdes de la ciudad. Este proyecto se financia a través de los ajustes y reservas presupuestales del año 2024, y está vinculado a los contrato 4600102026, cuyo objeto es el contrato de ciencia y tecnología para el desarrollo de actividades inherentes a la conservación y mejoramiento de la infraestructura verde, el cual finalizó el 31 de enero de 2025. Y por el contrato 4600102206 de 2024, que se amplió hasta el 15 de junio de 2025 (Recursos por ajustes y reservas).

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 31 de diciembre, se ejecutaron 448.300 m² de labores de conservación y establecimiento de vegetación en zonas verdes de la ciudad. La meta se cumplió al 100 %, conforme a los cronogramas establecidos, mediante los contratos N.° 4600102026 y 4600102206 de 2024, financiados con recursos de ajustes y reservas presupuestales de la vigencia 2024.

Proyecto: 240096 -Conservación e implementación de la infraestructura verde en el espacio publico de la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 94% **Ejec. Financiera :** 90% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 92%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 15.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 44.152 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 39.743

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Zonas verdes mantenidas					
IF96BA	Zonas verdes mantenidas	Metro cuadrado	2.450.000	2.140.900,93	87%

Código. Ind. SUIFP: 400202600

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la ejecución 2.450.000 m² de labores de conservación, recuperación y establecimiento de vegetación en las zonas verdes, conservación de jardines y de árboles, siembra de árboles, siembra de jardines, siembra de grama cultivada, producción de plantas en las zonas verdes de la ciudad

Observación B/P/S: Para el periodo evaluado con corte al 31 de diciembre de 2025, se reporta un avance del 87,38 % con 2,140900,93 m² en actividades de zonas verdes mantenidas, en el marco del Contrato No. 4600104350 de 2025, cuyo objeto es la ejecución de un contrato de ciencia y tecnología para el desarrollo de actividades orientadas a la conservación y mejoramiento de la biodiversidad y la infraestructura verde. Y el contrato 4600104824 cuyo objeto es contrato interadministrativo de mandato sin representación para el sostenimiento, recuperación y enriquecimiento ambiental de espacios públicos.

IF96BB	Zonas verdes adecuadas	Metro cuadrado	4.500	4.532,55	101%

Código. Ind. SUIFP: 400202500

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la ejecución de 4500 m² de labores de conservación, recuperación y establecimiento de vegetación en las zonas verdes, conservación de jardines y de árboles, siembra de árboles, siembra de jardines, siembra de grama cultivada, producción de plantas en las zonas verdes de la ciudad.

Observación B/P/S: Para el período evaluado con corte al 31 de diciembre, los Contratos Interadministrativos Nos. 4600104350 de 2025 y 4600104824 de 2025, cuyo objeto es el sostenimiento, recuperación y enriquecimiento ambiental de los espacios públicos, registran un cumplimiento del 100 % de la meta establecida para la vigencia.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo

Componente: 4.1 - Infraestructura para un modelo de ciudad sostenible

Programa: 4.1.1 - Conexión para el bienestar y la sostenibilidad

Proyecto: **230051 -24pp99-mejoramiento de la infraestructura para la movilidad vehicular**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.556 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.546

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vía urbana mejorada				
IF51AE Vía urbana mejorada	**Kilómetro**	**0,45**	**0,46**	**102%**

Código. Ind. SUIFP: 240211400

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mejoramiento de 0,45 km de vía urbana mejorada para el desarrollo de las actividades inherentes a la obra a ejecutarse. Este proyecto se financia mediante los ajustes presupuestales del año 2024 y está asociado al contrato 4600102864 de 2024 PP, cuyo objeto es el mejoramiento de andenes, vías, espacio público y demás obras complementarias de los proyectos priorizados por el Presupuesto Participativo PDL–PP. A la fecha se adelanta solicitud de ampliación de plazo por dos meses

Observación B/P/S: Meta cumplida al 102%, garantizando el logro de los objetivos establecidos en los tiempos y condiciones definidos.

Proyecto: **250044 -25pp99-mejoramiento de la infraestructura para la movilidad vehicular me medellin**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 40% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 70%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 12.111 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 12.109

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vía secundaria mejorada				
IF44CA Vía secundaria mejorada	**Kilómetro**	**1,26**	**0**	**0%**

Código. Ind. SUIFP: 240200600

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mejoramiento de 1,26 km de vía secundaria mejorada para el desarrollo de las actividades inherentes a la obra a ejecutarse.

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 31 de diciembre de 2025, el proyecto no registra avance en su ejecución física, presentando un avance del cero por ciento (0 %). Actualmente, el proceso se encuentra en etapa precontractual y se adelanta a través del SECOP, bajo el proceso de obra No. 70007810. De acuerdo con la programación establecida, se proyecta que el inicio de las obras se realice en el mes de febrero de 2026.

IF44CB Vía terciaria mejorada	**Kilómetro**	**2,13**	**1,71**	**80%**

Código. Ind. SUIFP: 240204100

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mejoramiento de 2,13 km de vía terciaria mejorada para el desarrollo de las actividades inherentes a la obra a ejecutarse.

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 31 de diciembre de 2025, el proyecto no registra avance en su ejecución física de 1,71 Kilometros, reportando un avance del 80;28%, dado que las actividades pendientes se encuentran en etapa precontractual. La ejecución de estas actividades se proyecta a partir del mes de febrero de 2026, conforme al cronograma establecido. El avance previamente reportado corresponde a la pavimentación ejecutada en la Comuna 50, con una longitud de 0,968 km, y en la Comuna 80, con 0,745 km, intervenciones que ya fueron culminadas en periodos anteriores. Para el resto de los recursos, correspondientes a las comunas 80 San Antonio de Prado y 90 Santa Elena, actualmente se adelanta el proceso precontractual a través del SECOP, bajo el proceso de obra No. 70007810, con una cantidad estimada de 1,29 km. El inicio de las obras se proyecta para el mes de febrero de 2026, una vez se surta la adjudicación y suscripción del contrato respectivo.

Programa: 4.1.4 - Espacios públicos inclusivos y accesibles

Proyecto: **250042 -25pp14-mejoramiento de espacios publicos en la comuna 14 el poblado medellin**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 0% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.029 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Espacio publico adecuado				
IF42EA Espacio publico adecuado	**Metro cuadrado**	**1.250**	**0**	**0%**

Código. Ind. SUIFP: 400202000

Descripción B/P/S: El producto hace referencia al mejoramiento de 1.250 M2 de espacio público adecuado en la comuna 14 el Poblado, donde se pretende generar más y mejores espacios públicos para la comunidad, para el encuentro, la recreación y el esparcimiento.

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 31 de diciembre de 2025, el proyecto no registra avance en su ejecución física, reportando un avance del cero (0). El contrato fue adjudicado bajo el No. 46000106254 de 2025 y se suscribió el acta de inicio el 11 de diciembre de 2025. No obstante, el contratista solicitó la suspensión del contrato por razones logísticas asociadas a la temporada decembrina, entre las cuales se encuentran el cierre de parques en sectores priorizados, la limitada disponibilidad de mano de obra y la necesidad de fabricar elementos con diseños especiales que requieren mayores tiempos de producción. A la fecha, se surtieron los comités correspondientes de la Secretaría de Infraestructura Física y se radicaron en su totalidad las carpetas y soportes exigidos para la evaluación y eventual aprobación de la suspensión. En consecuencia, el proyecto se encuentra a la espera del pronunciamiento administrativo que autorice formalmente la suspensión. La reanudación de la ejecución se proyecta hacia finales de enero de 2026, una vez se emita el acto administrativo respectivo. Actualmente, el contrato se encuentra en estado de suspensión.

Componente: 4.3 - Movilidad Sostenible e Integral

Programa: 4.3.1 - Infraestructura vial sostenible e integral

Proyecto: **230034 -24pp99-mejoramiento de la infraestructura para la movilidad peatonal**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.308 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.308

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Andén de la red urbana mejorado				
IF34DB Andenes de la red urbana mejorados	**Metro**	**1.740**	**1.957,84**	**113%**

Código. Ind. SUIFP: 240212800

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mejoramiento de 1740 metros de Andenes para el desarrollo de las actividades inherentes a la obra a ejecutarse. Este proyecto se financia mediante los ajustes presupuestales del año 2024 y está asociado al contrato 4600102864 de 2024 PP, cuyo objeto es el mejoramiento de andenes, vías, espacio público y demás obras complementarias de los proyectos priorizados por el Presupuesto Participativo PDL–PP. A la fecha se adelanta solicitud de ampliación de plazo por dos meses, y adición de remanente comuna 4 Aranjuez por valor de 150 millones.

Observación B/P/S: Para el periodo a evaluar con corte diciembre 31 la meta esta cumplida al 113 % garantizando el logro de los objetivos establecidos en los tiempos y condiciones definidos Este proyecto se financia mediante los ajustes presupuestales del año 2024 y está asociado al contrato 4600102864 de 2024 PP, cuyo objeto es el mejoramiento de andenes, vías, espacio público y demás obras complementarias de los proyectos priorizados por el Presupuesto Participativo PDL–PP.

Proyecto: 250040 -25pp99-mejoramiento de la infraestructura para la movilidad peatonal medellin

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 47% **Ejec. Financiera :** 94% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 70%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.256 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.980

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Andén de la red urbana mejorado				
IF40DA Andenes de la red urbana mejorados	**Metro**	**1.075**	**1.015**	**94%**

Código. Ind. SUIFP: 240212800

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mejoramiento de 1075 metros de Andenes para el desarrollo de las actividades inherentes a la obra a ejecutarse.

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 31 de diciembre de 2025, el proyecto no registra avance en su ejecución física del 94,42 %, reportando un avance 1,015 metros lineales,. Se proyecta que el inicio de las obras se realice en el mes de febrero de 2026. Los recursos correspondientes a andenes de la Comuna 1 fueron adicionados al Contrato N.° 4600102864 de 2024, el cual finalizó el 15 de agosto de 2025. El resto de los recursos, correspondientes a las comunas 60, 70 y 80, se encuentran actualmente en estado precontractual, a través del proceso SECOP obra No. 70007810, con una cantidad estimada de 1.500 metros y una proyección de inicio de obras en febrero de 2026.

IF40DB Estudios de preinversión realizados	**Número**	**1**	**0**	**0%**

Código. Ind. SUIFP: 240211800

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la realizacion de un (1) estudio para el proyecto de la comuna 3- Manrique

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 31 de diciembre de 2025, el proyecto no registra avance físico, por lo que el avance reportado es del cero (0). Los recursos se encuentran actualmente en el IDEA, desde donde se proyecta adelantar el proceso precontractual correspondiente para dar inicio a la ejecución del proyecto.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 160150 -Adquisición y gestión de bienes inmuebles para proyectos viales nuevos

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: 170062 -Construcción y obras de adecuación del corredor vial avenida regional carabobo entre las calles 77 y 123

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 623 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: 090106 -Obras corredor ayacucho

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0,000818 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 160143 -Mantenimiento y rehabilitación de la malla vial e infraestructura asociada

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3

Proyecto: 130359 -Autopistas para la prosperidad

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 31.179	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 50.000	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 50.000

Proyecto: 200031 -Diseño y construcción infraestructura física metroplus

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 60	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 60

Proyecto: 200033 -Mantenimiento del cable aereo del corregimiento de san sebastián de palmitas

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 77	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 69

5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Proyecto: 130392 -Mcv-hospital nororiental

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 824	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 783

Proyecto: 130503 -Mcv-intervención integral del centro

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 243	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 58

Proyecto: 130534 -Mcv-parque del río medellín

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 911	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 417

Proyecto: 130535 -Mcv-cinturón verde - jardín circunvalar


Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 1.988	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 125


Proyecto: 130533 -Mcv-corredores de transporte limpio, público y masivo

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 2.199	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 425


Secretaría de Medio Ambiente


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2025

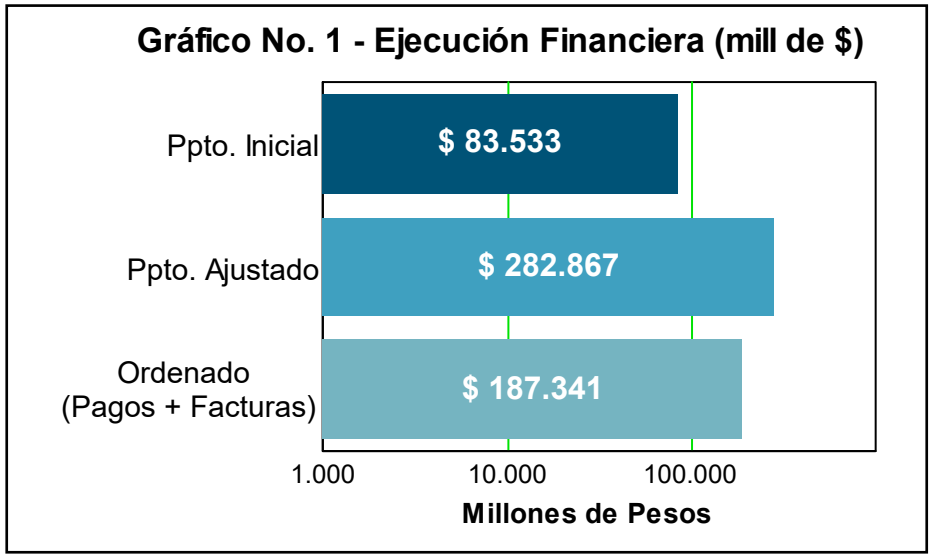


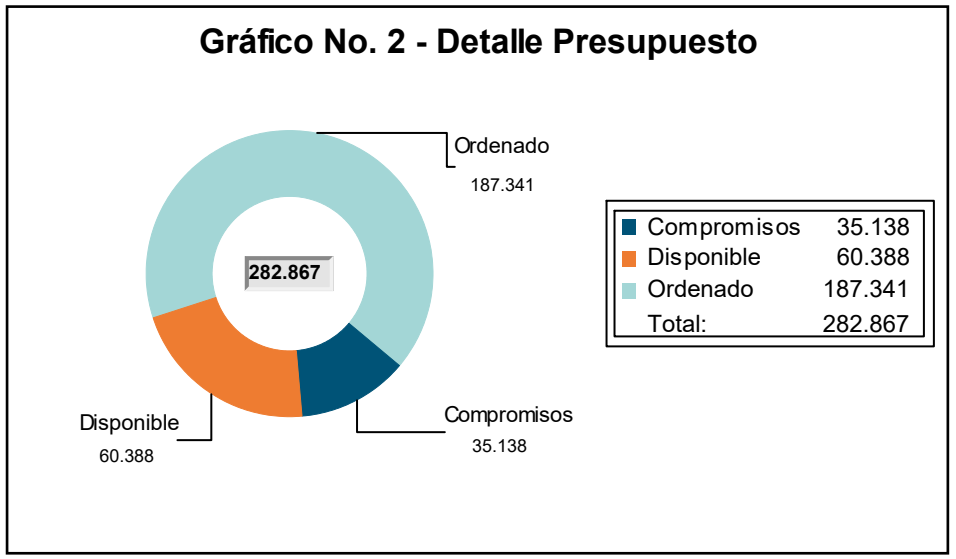

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre de 2025 comprende pagos y facturas

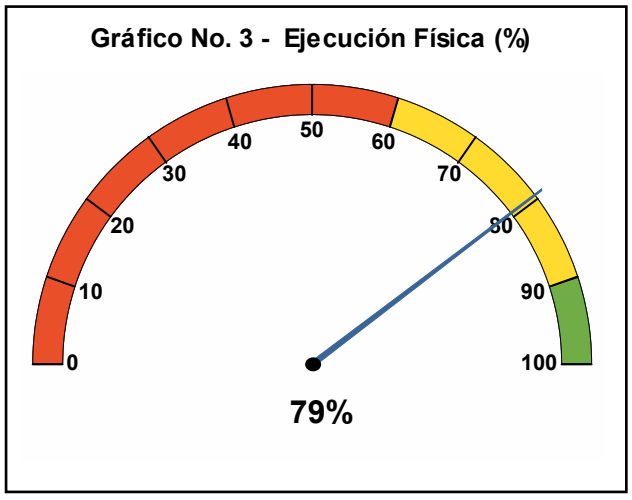

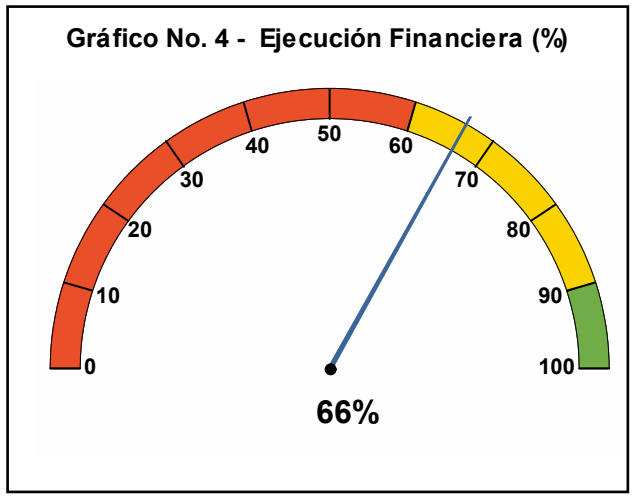

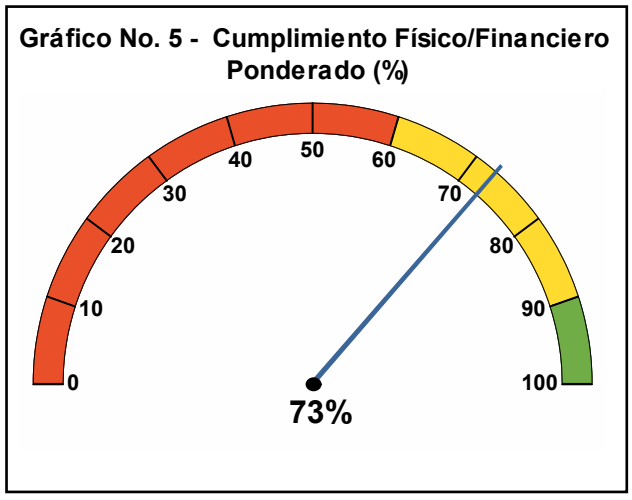

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 5 - Creemos en la sostenibilidad ambiental y en el bienestar animal
Componente: 5.1 - Sostenibilidad y patrimonio ambiental
Programa: 5.1.1 - Gestión de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos

Proyecto: 240159 -Implementación del plan de acción de la política de biodiversidad del distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 91% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 755 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 718 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 653

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de política para la conservación de la biodiversidad y sus servicio eco sistémicos				
MA59CA Documentos de política realizados	**Número**	**0,25**	**0,32**	**128%**

Código. Ind. SUIFP: 320200300

Descripción B/P/S: Incluye la implementación del 25% del plan de acción de la política de biodiversidad.

Observación B/P/S: El cumplimiento de la meta establecida para 2025 ha sido superado gracias al aporte de los proyectos de ecosistemas y PSAH y la Mesa Técnica de Biodiversidad. Se fortalecieron de manera significativa los procesos de divulgación, así como la articulación con instituciones educativas. Asimismo, se impulsaron acciones de sensibilización ambiental a través de talleres y festivales, promoviendo el compromiso y la apropiación del conocimiento en temas de biodiversidad. Finalmente, se generaron espacios de evaluación del Plan de Acción de Biodiversidad, orientados a consolidar y mejorar su implementación.

Proyecto: 240162 -Conservación y uso sostenible de los cerros tutelares y ecosistemas estratégicos

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 96% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 10.990 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 17.761 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 17.090

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de protección de ecosistemas				
MA62DA Áreas de ecosistemas protegidas	**Número**	**17.677**	**17.677,26**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 320201200

Descripción B/P/S: Incluye las acciones orientadas a la administración y manejo de áreas bajo el control de las corporaciones autónomas regionales y de las corporaciones de desarrollo sostenible

Observación B/P/S: Ecosistemas estratégicos: Loma Hermosa, Volador, Nutibara, Asomadera, Picacho, Pan de Azúcar, Tres Cruces, Alto de San Miguel, DMI, Reserva Nare, Ojo de Sal El Chiflón en Santa Elena y Humedal Jardín botánico

Proyecto: 240164 -Recuperación de la capacidad de abastecimiento y regulación hídrica de cuencas hidrográficas ley 99

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 43% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 72%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 29.033 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 49.674 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 21.587

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de restauración de ecosistemas				
MA64DA Áreas en proceso de restauración	**Hectárea**	**3.119**	**3.281,94**	**105%**

Código. Ind. SUIFP: 320200500

Descripción B/P/S: Incluye el restablecimiento del ecosistema degradado a una condición similar al ecosistema pre disturbio respecto a su composición, estructura, y funcionamiento.

Observación B/P/S: Durante el mes de Diciembre se adquirió un predio con 28,6 has en el Corregimiento de Altavista.

MA64DB	**Plantaciones forestales realizadas**	**Hectárea**	**1.003**	**1.021**	**102%**

Código. Ind. SUIFP: 320200600

Descripción B/P/S: Corresponde al área susceptible de siembra de acuerdo con los predios adquiridos en cuencas abastecedoras.

Observación B/P/S: En Octubre se firmaron 8 acuerdos, correpondientes a 8 predios, en noviembre se firmaron 8 acuerdos que se relacionan con 13 predios y finalmente en diciembre se formalizaron 8 acuerdos que vinculan a 19 predios

Observación Proyecto: Los recursos de este indicador corresponden a compra de predios para protección del recurso hídrico, recursos provenientes de ley 99, el alto avance físico corresponde a la entrega material de los inmuebles adquiridos, sin embargo la ejecución financiera se materializa solo al culminar el proceso de compra, el cual es llevado a cabo por la Secretaría de Suministros y Servicios, el cual lleva un tiempo bastante amplio para el desembolso total de los recursos.

Proyecto: 240165 -Restauración y acondicionamiento del cerro las tres cruces

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 50%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.560 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 271 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 271

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de protección de ecosistemas				
MA65BA Áreas de ecosistemas protegidas	**Hectárea**	**0,5**	**0**	**0%**

Código. Ind. SUIFP: 320201200

Descripción B/P/S: Incluye las acciones orientadas a la administración y manejo de áreas bajo el control de las corporaciones autónomas regionales y de las corporaciones de desarrollo sostenible

Observación B/P/S: A la fecha se cuenta con los diseños y el estudio de conectividad ecológica aprobados por el DAP. Se solicitaron los recursos para la ejecución de la obra al CDE y esta pendiente la asignación de los mismos.

Observación Proyecto: Durante el año 2025 se realizaron los diseños y el estudio de conectividad ecológica los cuales fueron aprobados por el DAP. Una vez aprobados los diseños, se solicitaron los recursos para lograr el acondicionamiento del sendero al CDE y esta pendiente la asignación de dichos recursos. Por lo tanto, en la ejecución de la obra es cero.

Programa: 5.1.2 - Manejo hidráulico de las corrientes hídricas del Distrito

Proyecto: 240154 -Actualización cartográfica de la red hídrica

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 0% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 50%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.011 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico				
MA54CA Documentos de planeación realizados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 320300200

Descripción B/P/S: Para 2026 se proyecta contar con el documento técnico Protocolo para la actualización cartográfica de la red hidrográfica del Distrito de Medellín

Observación B/P/S: En el mes de Diciembre se entregó a DAP la formulación del Protocolo para actualización de la red hidrográfica, para adopción mediante revisión del POT o mediante el mecanismo que se considere.

Observación Proyecto: Proyecto 240154, logró la meta propuesta en 2024, mediante modificación de alcance al contrato 4600098399 de 2023, con financiamiento de reservas presupuestales de la vigencia 2024, desde el proyecto 230342, y con recursos de personal adscrito a la administración distrital y personal de apoyo a la gestión de la Secretaría de Medio Ambiente, financiado mediante el proyecto 240160 asociado al mantenimiento y optimización hidráulica de cauces de quebradas. Por lo anterior no requirió ejecución financiera y por ende su cumplimiento físico/financiero es del 50%.

Proyecto: **240160 -Mantenimiento y optimización hidráulica de cauces de quebradas**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 62% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 81%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.902 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 32.967 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 20.452

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Obras y medidas de adecuación hidráulica.				
MA60CA Obras hidráulicas construidas.	**Metro Lineal**	**3.000**	**4.634,5**	**154%**

Código. Ind. SUIFP: 320304700

Descripción B/P/S: Consiste en la construcción de obras hidráulicas para la optimización hidráulica o mantenimiento de los cauces de quebrada del Distrito, en atención a la gestión de riesgo asociado a los mismos.

Observación B/P/S: Mediante el proyecto de inversión 240160, en el mes de Diciembre se intervinieron 176 metros lineales (5 tramos) de cauces de quebrada, para un TOTAL de 4634,5 metros lineales (118 tramos) acumulados en el año, para mitigar riesgos asociados a la hidráulica del flujo.

Programa: 5.1.3 - Desarrollo de estrategias de renaturalización para la consolidación de Medellín como Distrito Verde

Proyecto: **240163 -Recuperación de corredores ecológicos y conservación de zonas verdes**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 408 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.222 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.079

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de manejo del arbolado urbano				
MA63DA Árboles intervenidos	**Número**	**20.000**	**54.061**	**270%**

Código. Ind. SUIFP: 320204200

Descripción B/P/S: Realizar acciones de conservación del componente arbóreo de la ciudad, correspondiente a la conservación de árboles juveniles, árboles con connotación de patrimonial; y a la prevención y mitigación de riesgos derivados del componente arbóreo adulto.

Observación B/P/S: Conservamos 54.061 árboles entre adultos y juveniles, contribuyendo a la consolidación de la infraestructura Verde Urbana. La meta se supera ampliamente debido a que se integraron las ejecuciones de mantenimiento de zonas verdes de las secretarías de Medio Ambiente e Infraestructura Física de un únicoi contrato, superando por mucho los recursos económicos destinados cuando se planteó la meta del indicador la cual estaba contemplada solo para la ejecución de los arboles ubicados en las zonas de competencia de la Secretaría de Medio Ambiente.

MA63DB Áreas en proceso de restauración	**Hectárea**	**200**	**240,3**	**120%**

Código. Ind. SUIFP: 320200500

Descripción B/P/S: En el 2026 se tiene como meta Mantener zonas verdes de la ciudad y Realizar paisajismo en espacios verdes de la ciudad en 200 hectáreas.

Observación B/P/S: Conservamos, fortalecimos e intervenimos 240,3 Ha de área verde de corredores en espacios públicos, quebradas y cerros tutelares, mejorando la conectividad de dichos corredores, cumpliendo con el objetivo trazado y la promoción de la sostenibilidad urbana. La meta se supera debido a que se integraron las ejecuciones de mantenimiento de zonas verdes de las Secretarías de Medio Ambiente (SMA) e Infraestructura Física (SIF), superando por mucho los recursos económicos destinados cuando se planteó la meta del indicador, el cual además reporta logros de ejecución de otros contratos suscritos por la SIF y de la ejecución en el mes de enero del contrato 4600101032 de 2024 suscrito por SMA.

Programa: 5.1.4 - Protección y bienestar animal

Proyecto: **240161 -Mejoramiento de las condiciones de protección y bienestar de los animales en condición de vulnerabilidad**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 93% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 24.912 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 31.372 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 29.316

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de circulación artística y cultural				
MA61BA Animales atendidos	**Número**	**4.666**	**4.981**	**107%**

Código. Ind. SUIFP: 450106100

Descripción B/P/S: Corresponde a la atención médica y de urgencias médico veterinarias para el bienestar animal para prevenir, diagnosticar y curar las enfermedades de los animales domésticos, silvestres y de producción recuperados por el ente territorial, que se encuentren en condición de abandono, pérdida, desatención estatal o de tenencia irresponsable o en situación de vulnerabilidad y aprehendidos por la policía o en riesgo que ello suceda. Para tal efecto, incluye también los programas de adopción, custodia, atención del maltrato animal, comportamiento animal, registro e identificación y las demás que garanticen la atención integral a la Fauna en el cumplimiento de la normatividad vigente

Observación B/P/S: En el mes de diciembre fueron atendidos 415 animales mediante el programa de bienestar animal, para un total acumulado de 4.981 animales atendidos en la vigencia 2025.

MA61BB Infraestructura para el bienestar animal adecuada	**Número**	**2**	**3**	**150%**

Código. Ind. SUIFP: 450106000

Descripción B/P/S: Corresponde al proceso de ajuste o adaptación de un sitio, espacio o área de una edificación con las especificaciones técnicas requeridas para el desarrollo de las actividades definidas en dicho espacio, así mismo incluye acciones de remodelación o ampliación o modificación, entendidas como cambios de la infraestructura o arquitectura de una edificación.

Observación B/P/S: En el mes de diciembre fueron construidos dos pasos para fauna silvestre, para un total acumulado de tres pasos para fauna construidos en esta vigencia.

MA61BC Personas capacitadas	**Número**	**12.000**	**23.342**	**195%**

Código. Ind. SUIFP: 450104900

Descripción B/P/S: Corresponde al diseño y desarrollo de estrategias educativas que tienen como objetivo brindar oportunidades para apropiar, complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas de la prevención y la participación, como herramientas para la convivencia y la seguridad ciudadana. Este conocimiento libre y espontáneo adquirido por ciudadanos, puede provenir de personas, entidades, medios de comunicación masiva, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados y su duración es inferior a 160 horas.

Observación B/P/S: En el mes de diciembre se sensibilizaron en fauna y en cuidado responsable de animales de compañía a 5.706 personas, para un total acumulado de 23.342 personas sensibilizadas.

Programa: 5.1.5 - Economía circular y crecimiento verde

Proyecto: **240156 -Desarrollo de estrategias de aprovechamiento y manejo integral de residuos**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 60% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 80%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.842 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 49.502 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 29.917

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos PGIRS				
MA56CA Plan de gestión integral de residuos solidos implementado	**Número**	**1**	**1,11**	**111%**

Código. Ind. SUIFP: 400302200

Descripción B/P/S: Implementación de un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos con las siguientes Acciones: Gestión de RCD, Implementación de La Política de Economía Circular y Recicladores Acompañados.

Observación B/P/S: La implementación del PGIRS se logró a través de la gestión de los residuos de construcción y demolición, en especial la recolección y disposición final de los clandestinos, así mismo, se avanzó en la estimación del indicador de generación y aprovechamiento de los grandes generadores, a partir de un trabajo articulado con el sector de la construcción y la Autoridad Ambiental Área Metropolitana del Valle de Aburrá para el año 2024, la cual fue procesada y validada. así mismo, se logró vincular más organizaciones a las planeadas a través del programa de producción circular o negocios verdes, dada la importancia y vigencia de los temas de Economía Circular; en cuanto a los recicladores certificados quedó muy por debajo de la meta planteada, ya que, posterior a la aprobación del Plan de Desarrollo, la norma nacional que regula la gestión de la población recicladora, eliminó el requisito de la certificación en competencias laborales, por tanto, los recicladores no han estado interesados en continuar con el proceso de certificación.

Programa: 5.1.6 - Gestión del ruido y emisiones atmosféricas

Proyecto: **240158 -Desarrollo de estrategias para la gestión de emisiones atmosféricas y del cambio climático**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 67% **Ejec. Financiera :** 90% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 78%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 900

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
MA58BA Personas capacitadas	**Número**	**1.060**	**622**	**59%**

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Corresponde al diseño y desarrollo de estrategias educativas que tienen como objetivo brindar oportunidades para apropiar, complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas, este conocimiento libre y espontáneo adquirido, puede provenir de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados y su duración es inferior a 160 horas.

Observación B/P/S: La meta proyectada para el año 2025 fue superada, debido a la efectiva articulación con la Secretaría de Movilidad, que permitió llevar a cabo procesos de capacitación en empresas con un número significativo de personal de conducción.

MA58BB Documentos de planeación elaborados	**Número**	**2**	**1,5**	**75%**

Código. Ind. SUIFP: 450203500

Descripción B/P/S: Documento de actualización de la Evaluación de Riesgos Climáticos

Observación B/P/S: Debido a la cantidad de información geográfica y estadística generada en el marco del contrato 4600105139 DE 2025, este proceso contractual se ampliará hasta inicios de la siguiente vigencia, por lo cual no se alcanzará a entregar la actualización de la evaluación de riesgos climáticos, lo que obliga a postergar el cumplimiento de la meta prevista para 2025. Del mismo modo, la dificultad para adquirir la totalidad de los datos de actividad asociados al consumo de combustibles fósiles en el sector industrial, ha retrasado el proceso de actualización del inventario de emisiones de GEI; la dependencia espera información rezagada de parte de la Autoridad Ambiental Competente.

Programa: 5.1.7 - Educación y cultura ambiental

Proyecto: **240155 -Apoyo integral a las intervenciones ambientales del hábitat**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 84% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 92%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.880 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 21.180 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 17.777

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación				
MA55CA Estrategias educativo ambientales y de participación implementadas	**Número**	**394**	**351**	**89%**

Código. Ind. SUIFP: 320800600

Descripción B/P/S: Implementar acciones de educación ambiental y acompañamiento técnico, vinculando a la comunidad en las intervenciones integrales de espacios públicos.

Observación B/P/S: Si bien las intervenciones inicialmente planteadas era 154, se hizo necesario ejecutar a un número mayor de estrategias llegando a 351 intervenciones, las cuales comprenden intervenciones, tanto puntuales, como integrales, que según el sistema de calidad, tienen alcances diferentes; esto debido a las condiciones extraordinarias presentadas en el territorio durante la temporada de lluvias. Este periodo generó múltiples afectaciones en parques, zonas verdes, rondas de quebrada, corredores viales y otros espacios públicos, lo que incrementó de manera significativa las necesidades operativas y las solicitudes de atención por parte de la ciudadanía y de diferentes dependencias del Distrito. Las estrategias se incrementaron con la ejecución de 1.374 intervenciones puntuales, que tienen un alcance menor que las integrales y por ende requieren una menor cantidad de recursos a invertir, pero incluyen sensibilización a la comunidad. En consecuencia, fue indispensable ampliar la capacidad de respuesta y ejecutar acciones adicionales a las programadas con el fin de garantizar la adecuada prestación del servicio, mitigar riesgos, atender situaciones prioritarias y restablecer las condiciones ambientales y de seguridad en los puntos afectados.

MA55CB	**Personas capacitadas**	**Número**	**13.790**	**84.631**	**612%**

Código. Ind. SUIFP: 320801000

Descripción B/P/S: Se capacitarán personas a través de las diferentes estrategias de educación ambiental.

Observación B/P/S: Se logró capacitar a 84.631 personas en educación ambiental, superando ampliamente la meta inicial de 13.790, ya que fue necesario ejecutar 1.374 intervenciones puntuales, que no estaban planeadas dentro del proyecto, debido a las condiciones encontradas en la ciudad, como incremento de las lluvias y la indisciplina ciudadana. Tanto las intervenciones integrales, como las puntuales incluyen el componente de sensibilización a la comunidad. Además, como se ha identificado que la problemática de disposición inadecuada de residuos en las áreas públicas de la ciudad se debe a la incultura ciudadana, durante el 2025 se implementaron 2.712 jornadas que incluyen únicamente acciones de sensibilización ambiental en las zonas más críticas.

Proyecto: **240157 -Desarrollo de estrategias de formación y participación ciudadana en buenas prácticas ambientales**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 93% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.241 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 892 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 829

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación					
MA57CA	**Estrategias educativo ambientales y de participación implementadas**	**Número**	**1**	**1,16**	**116%**

Código. Ind. SUIFP: 320800600

Descripción B/P/S: Implementar acciones de educación ambiental vinculando a la comunidad en actividades relacionadas con PROCEDAS, Hogares Sostenibles, Ecohuertas, Ferias, Talleres, entre otros.

Observación B/P/S: Se tuvo una ejecución mayor a lo planeado, ya que, la comunidad priorizó una gran cantidad de PROCEDAS y Hogares Sostenibles a través del programa de Presupuesto Participativo, que se ejecutaron mediante el contrato interadministrativo 4600105177 de 2025; igualmente se cumplió con la cantidad de ecohuertas establecidas.

MA57CB	**Personas capacitadas**	**Número**	**12.159**	**20.671**	**170%**

Código. Ind. SUIFP: 320801000

Descripción B/P/S: Personas vinculadas en estrategias de educación ambiental informal foros, talleres, cursos y diplomados, con un proceso de formación de mínimo 2 horas.

Observación B/P/S: Este indicador tuvo una ejecución mayor a lo planeado, ya que, la comunidad priorizó una gran cantidad de actividades educativo ambientales, a través del programa de Presupuesto Participativo, que se ejecutaron mediante el contrato interadministrativo 4600105177 de 2025; lo cual permitió llegar a 20.671 personas con acciones de educación ambiental informal, las cuales comprenden, cursos, talleres, diplomados, foros, etc.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 5 - Creemos en la sostenibilidad ambiental y en el bienestar animal

Componente: 5.1 - Sostenibilidad y patrimonio ambiental

Programa: 5.1.2 - Manejo hidráulico de las corrientes hídricas del Distrito

Proyecto: 230040 -24pp07-mantenimiento integral de quebradas comuna 7

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 75%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): $ 0 Ppto Ajustado (mill de $): $ 367 Ejec. Financiera (mill de $): $ 367

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Obras y medidas de adecuación hidráulica				
MA40BA Obras hidráulicas construidas	**Metro Lineal**	**206,85**	**103**	**50%**

Código. Ind. SUIFP: 320304700

Descripción B/P/S: Seguimiento y control al mantenimiento y obras complementarias de quebradas comuna 7

Programa: 5.1.3 - Desarrollo de estrategias de renaturalización para la consolidación de Medellín como Distrito Verde

Proyecto: 250037 -25pp99-adecuación y conservación de zonas verdes y senderos ecológicos medellin

Síntesis Proyecto: Eficacia : 66% Ejec. Financiera : 92% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 79%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): $ 0 Ppto Ajustado (mill de $): $ 1.700 Ejec. Financiera (mill de $): $ 1.556

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de restauración de ecosistemas				
MA37EA Áreas en proceso de restauración	**Hectárea**	**1,466**	**0,46**	**31%**

Código. Ind. SUIFP: 320200500

Descripción B/P/S: Se realizará la recuperación y mantenimiento de 1,4657 hectáreas de zonas verdes asociadas a retiros de quebradas.

Observación B/P/S: La meta se quedó corta debido a que con la priorización de PP la comunidad priorizó en su mayoría acciones de mantenimiento y conservación de amueblamientos en madera como complemento paisajístico, por lo que las actividades de conservación de zonas verdes y siembra de jardín priorizadas fueron muy pocas. El contrato será ampliado hasta el 15 de febrero de 2026.

MA37EB Personas capacitadas	**Número**	**1.086**	**3.568**	**329%**

Código. Ind. SUIFP: 320201400

Descripción B/P/S: Personas informadas y sensibilizadas en el desarrollo de actividades de amoblamiento como complemento al paisajismo.

Observación B/P/S: Se refiere a personas informadas y sensibilizadas en el desarrollo de actividades de amoblamiento como complemento al paisajismo y se informa que la meta se supera porque bajo la ejecución del contrato 4600105391 de 2025 se atiende 5 comunas, con un total de 40 puntos de ejecución. El contrato será ampliado hasta el 15 de febrero de 2026.

Observación Proyecto: El proyecto reporta baja ejecución física y alta ejecución financiera toda vez que se presentaron dificultades técnicas iniciales para la ejecución, las cuales se han venido subsanando, para lo que se adelantó ampliación en tiempo y espera ejecutarse físicamente en su totalidad para el mes de febrero de 2026.

Programa: 5.1.5 - Economía circular y crecimiento verde

Proyecto: 250034 -25pp99-fortalecimiento a recuperadores y gestión integral de residuos sólidos medellin

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): $ 0 Ppto Ajustado (mill de $): $ 788 Ejec. Financiera (mill de $): $ 776

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de asistencia técnica en manejo de residuos solidos				

MA34BA	**Personas asistidas técnicamente**	**Número**	**655**	**625**	**95%**

Código. Ind. SUIFP: 400302100

Descripción B/P/S: Se pretende fortalecer la labor de 120 recicladores de las comunas 3 y 70 técnicamente, y el acompañamiento a personas para la implementación de sistemas de aprovechamiento de orgánicos y gestión de residuos sólidos.

Observación B/P/S: Avance físico con corte a 31 de diciembre fue del 95%. El % de la ejecución al 0% obedece a que a la fecha no se había reportado. El contrato se suspenderá desde el 15 de diciembre hasta el 19 de enero de 2026, nueva fecha de terminación 5 de febrero de 2026.

Observación Proyecto: Debido a las dinámicas inherentes al proceso de planeación participativa con la comunidad, propio de la gestión de los recursos de presupuesto participativo, la ejecución de los recursos debió surtir varios pasos como la concertación y validación comunitaria, antes de iniciar la ejecución, para definir las prioridades y ajustar las actividades, lo que genera tiempos adicionales frente a la programación inicial y retrasa la ejecución física, aunque los recursos estén comprometidos. El contrato se suspenderá desde el 15 de diciembre hasta el 19 de enero de 2026, nueva fecha de terminación 5 de febrero de 2026.

Programa: 5.1.7 - Educación y cultura ambiental

Proyecto: **250033 -25pp99-fortalecimiento de la cultura ambiental medellin**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 96% **Ejec. Financiera :** 95% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 95%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 13.194 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 12.493

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación					
MA33BA	**Estrategias educativo ambientales y de participación implementadas**	**Número**	**27**	**26**	**96%**

Código. Ind. SUIFP: 320800600

Descripción B/P/S: Se realizarán 27 estrategias educativo ambientales y de participación

Observación B/P/S: Avance físico con corte a 31 de diciembre fue del 95%. El % de la ejecución al 0% obedece a que a la fecha no se había reportado. El contrato se suspenderá desde el 15 de diciembre hasta el 19 de enero de 2026, nueva fecha de terminación 5 de febrero de 2026.

MA33BB	**Campañas de educación ambiental y participación implementadas**	**Número**	**25**	**24**	**96%**

Código. Ind. SUIFP: 320800800

Descripción B/P/S: Se realizarán 25 campañas de educación ambiental y participación

Observación B/P/S: Avance físico con corte a 31 de diciembre fue del 95%. El % de la ejecución al 0% obedece a que a la fecha no se había reportado. El contrato se suspenderá desde el 15 de diciembre hasta el 19 de enero de 2026, nueva fecha de terminación 5 de febrero de 2026.

MA33BC	**Personas capacitadas**	**Número**	**1.575**	**1.496**	**95%**

Código. Ind. SUIFP: 320801000

Descripción B/P/S: Se capacitarán 1575 personas a través de diferentes estrategias de educación ambiental

Observación B/P/S: Avance físico con corte a 31 de diciembre fue del 95%. El % de la ejecución al 0% obedece a que a la fecha no se había reportado. El contrato se suspenderá desde el 15 de diciembre hasta el 19 de enero de 2026, nueva fecha de terminación 5 de febrero de 2026.

Observación Proyecto: Debido a las dinámicas inherentes al proceso de planeación participativa con la comunidad, propio de la gestión de los recursos de presupuesto participativo, la ejecución de los recursos debió surtir varios pasos como la concertación y validación comunitaria, antes de iniciar la ejecución, para definir las prioridades y ajustar las actividades, lo que genera tiempos adicionales frente a la programación inicial y retrasa la ejecución física, aunque los recursos estén comprometidos. El contrato se suspenderá desde el 15 de diciembre hasta el 19 de enero de 2026, nueva fecha de terminación 5 de febrero de 2026.

Proyecto: **250041 -25pp08-actualización del plan de accion ambiental local comuna 8 medellin**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 65% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 82%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 271 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 271

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de divulgación deconocimiento generado para la Planificación sectorial y la gestión ambiental.				
MA41BA Documentos divulgados	**Número**	**1,466**	**0,95**	**65%**

Código. Ind. SUIFP: 320404900

Descripción B/P/S: Se llevará a cabo la actualización del Plan de Acción Ambiental Ambiental Local-PAAL-

Observación B/P/S: Avance físico con corte a 31 de diciembre fue del 95%. El % de la ejecución al 0% obedece a que a la fecha no se había reportado. El contrato se suspenderá desde el 15 de diciembre hasta el 19 de enero de 2026, nueva fecha de terminación 5 de febrero de 2026.

Observación Proyecto: Debido a las dinámicas inherentes al proceso de planeación participativa con la comunidad, propio de la gestión de los recursos de presupuesto participativo, la ejecución de los recursos debió surtir varios pasos como la concertación y validación comunitaria, antes de iniciar la ejecución, para definir las prioridades y ajustar las actividades, lo que genera tiempos adicionales frente a la programación inicial y retrasa la ejecución física, aunque los recursos estén comprometidos. El contrato se suspenderá desde el 15 de diciembre hasta el 19 de enero de 2026, nueva fecha de terminación 5 de febrero de 2026.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 160182 -Desarrollo de acciones socioambientales del comparendo ambiental

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 1	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 160126 -Protección del recurso hídrico - ley 99 de 1993

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 103	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 0

Proyecto: 160127 -Conservación de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambiental

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 4.339	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 0

Proyecto: 200077 -Construcción del refugio de vida silvestre

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 2	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 2

Proyecto: 200293 -Desarrollo de estrategias para la conservación de ecosistemas estratégicos

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 455	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 425

Proyecto: 200296 -Desarrollo de estrategias para la consolidación de la política de biodiversidad

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 750	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 746

Proyecto: 200319 -Protección y conservación de las cuencas abastecedoras para medellin-ley 99 de 1993

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 6.874	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 1.775


Proyecto: 200342 -Fortalecimiento de estrategias para la gestión del sistema hidrográfico


Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 916	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 863

Proyecto:	**200343**	**-Construcción y mantenimiento en la infraestructura física del sistema hidrográfico**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 15.620	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 14.673
Proyecto:	**200344**	**-Mantenimiento de corredores verdes para la conectividad ecológica**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 1.383	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 1.371
Proyecto:	**230036**	**-24pp99-adecuación y conservación de zonas verdes y senderos ecológicos**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 0	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0
Proyecto:	**200298**	**-Implementación de estrategias para el manejo y control de abejas, avispas y otros insectos polinizadores**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 30	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 30
Proyecto:	**200316**	**-Fortalecimiento de estrategias para la protección y el bienestar animal**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 3.082	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 3.017
Proyecto:	**200305**	**-Fortalecimiento del sistema de gestión ambiental de medellin-sigam**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 7	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 7
Proyecto:	**200313**	**-Fortalecimiento de la gestión integral de residuos**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 22.697	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 5.366
Proyecto:	**230037**	**-24pp99-fortalecimiento de recicladores**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 72	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 72
Proyecto:	**200312**	**-Desarrollo de estrategias para enfrentar el cambio climático**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 0	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0
Proyecto:	**200315**	**-Fortalecimiento de la cultura ambiental**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 88	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 88
Proyecto:	**230035**	**-24pp99-fortalecimiento de la cultura ambiental**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 493	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 493
Proyecto:	**230038**	**-24pp60-formulación del plan de acción ambiental corregimiento 60**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 76	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 76


Secretaría de Movilidad


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2025

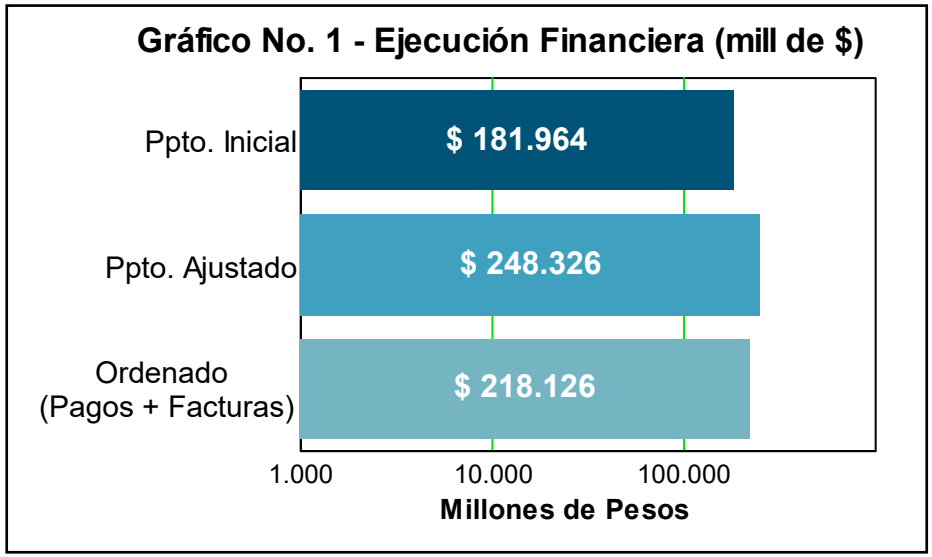


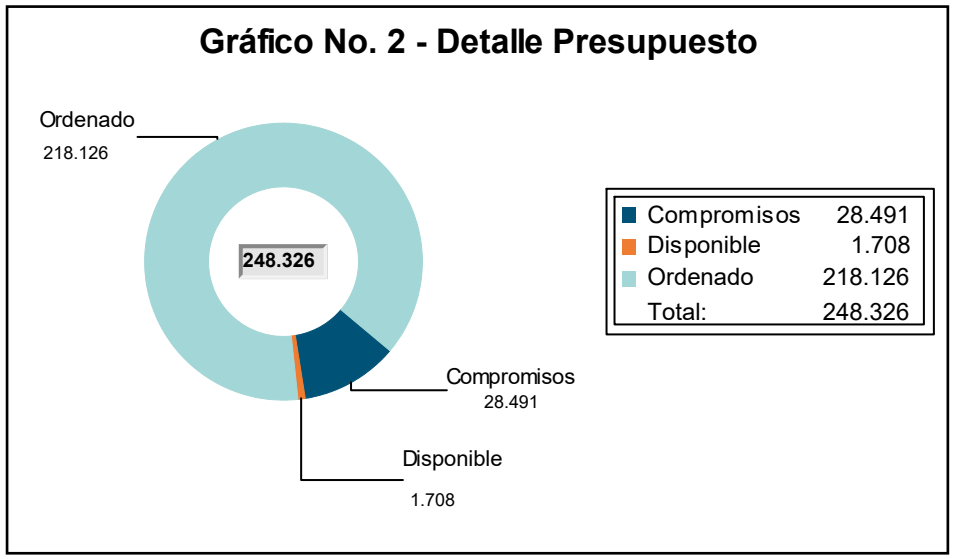

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre de 2025 comprende pagos y facturas

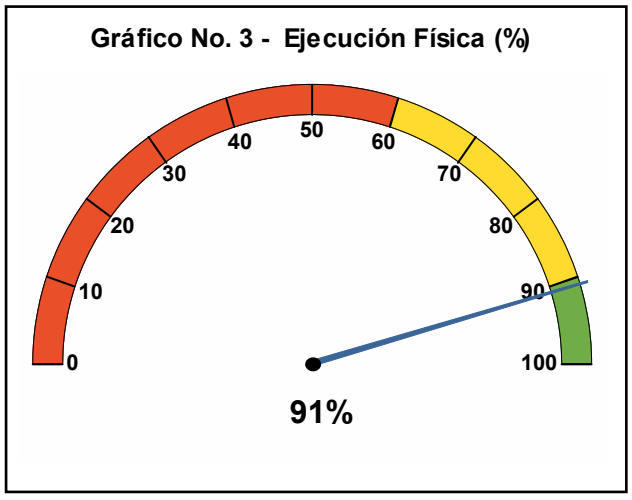

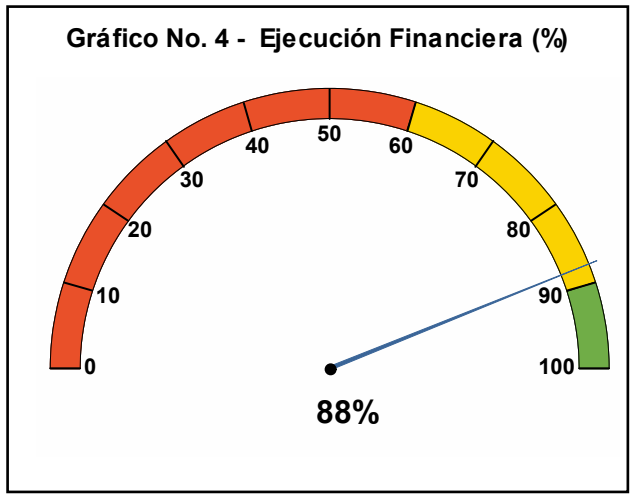

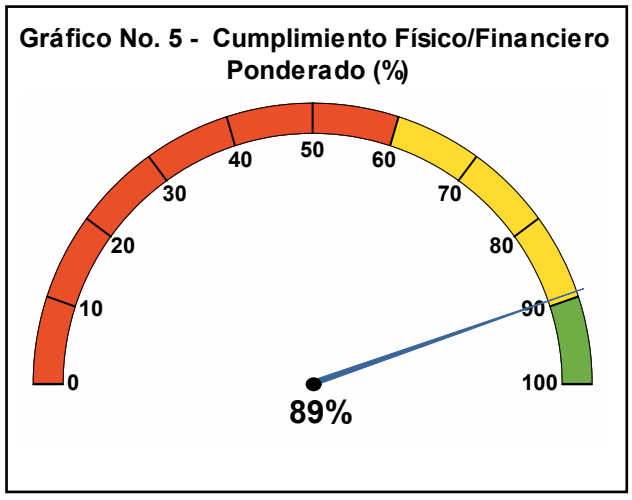

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo
Componente: 4.3 - Movilidad Sostenible e Integral
Programa: 4.3.2 - Transporte público masivo, colectivo e individual

Proyecto: **200274 -Fortalecimiento a la operación del sistema de mediana capacidad brt**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 83% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 92%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 58.080 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 84.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 69.736

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para la implementación de sistemas de transporte público de pasajeros				
MV74AA Convenios suscritos	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 240802200

Descripción B/P/S: Seguimiento y control a la operación del sistema BRT a través del Convenio 4600031108 para la operación del sistema de Buses BRT línea 1 y 2 cuencas 3 y 6.

Observación B/P/S: El Convenio No. 4600031108 de 2011, por el cual se realiza la administración y operación del Sistema BRT en el Distrito de Medellín, en el marco del sistema integrado de transporte masivo del Valle del Aburrá-SIT-VA, se encuentra en ejecución y viene garantizando la operación de Líneas 1 y 2, así como de las cuencas 3 y 6

Proyecto: **240009 -Mejoramiento al sistema de transporte público masivo tipo metro**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 15.442 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 14.268 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 14.268

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de los componentes del Sistema de Transporte Público de Pasajeros				
MV09AJ Sistema de transporte público de pasajeros cofinanciado	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 240805200

Descripción B/P/S: Consiste en aportar los recursos de cofinanciación para la compra de 13 trenes y una reperfiladora para el sistema Metro de Medellín

Observación B/P/S: En virtud del convenio tripartito entre la Gobernación de Antioquia, el Distrito de Medellín y la Empresa Metro se realizó contrato con dos empresas : Empresa Constructora Auxiliar de Ferrocarriles- CAF y la empresa fabricante Societa A Responsabilita Limitata- Srt para la compra de los 13 trenes y la reperfiladora respectivamente.

Proyecto: **240343 -Fortalecimiento del servicio de transporte público**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 83% **Ejec. Financiera :** 93% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 88%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.627

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de transporte público organizado implementados (SITM. SITP. SETP, SITR)				

MV43AA Pasajeros que se movilizan en medios de transporte sostenibles		**Número**	**900.000**	**744.874**	**83%**

Código. Ind. SUIFP: 240800100

Descripción B/P/S: Consiste en la cantidad de usuarios que se movilizan en el sistema de autobús de tránsito rápido de mediana capacidad (Metroplús) Línea 1 y 2, Cuencas 3 y 6 y en el Transporte Público Colectivo de radio de acción distrital

Observación B/P/S: La cantidad reportada corresponde a los pasajeros movilizados promedio día típico laboral durante el mes de diciembre de 2025, tanto en el transporte público colectivo (TPC) como en las líneas 1 y 2, Cuencas 3 y 6. La disminución en los pasajeros movilizados se debe a la temporada de vacaciones de fin de año.

Programa: 4.3.3 - Cultura ciudadana y fortalecimiento institucional

Proyecto: **200415 -Servicio del laboratorio de toxicología medellin**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 129 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 128

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Laboratorio de investigación con mantenimiento				
MV15AA Laboratorios con mantenimiento	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 240901800

Descripción B/P/S: Corresponde al mantenimiento de los laboratorios de investigación

Proyecto: **240016 -Mejoramiento de la señalización vial**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 56% **Ejec. Financiera :** 59% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 57%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 13.631 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 12.926 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.669

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vías con dispositivos de control y señalización				
MV16AB Vías con dispositivos de control y señalización instalados	**Kilómetro-Carril**	**500**	**278,09**	**56%**

Código. Ind. SUIFP: 240903900

Descripción B/P/S: Corresponde a la cantidad de kilómetros/carril con señalización, tanto horizontal como vertical, de las diferentes vías de las diferentes comunas y corregimientos del Distrito

Observación B/P/S: Durante la ejecución del contrato de señalización vial 4600102781 de 2024 (finalizado el 30 de agosto de 2025), se realizó el mantenimiento de la señalización de 278,093 Km/carril en los principales corredores viales del Distrito, además de 418 pasos peatonales, 153 reductores de velocidad y 49 instituciones educativas, que no solo sirve para evitar siniestros viales, sino que regula el comportamiento entre los diferentes actores viales. El nuevo proceso contractual con el mismo objeto presentó retrasos, debido a que la licitación pública 70007765, publicada el 7 de julio de 2025, fue revocada ante las múltiples observaciones de los proponentes, afectando el avance del indicador de km/carril, por lo tanto, el nuevo contrato 4600106344 de 2025 inició el 17 de diciembre de 2025.

Proyecto: **240017 -Mantenimiento y modernización de la red semafórica**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 80% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 90%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 13.923 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 13.526 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 10.757

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Infraestructura de transporte para la seguridad vial mejorada				
MV17AB Semáforos modernizados	**Número**	**15**	**21**	**140%**

Código. Ind. SUIFP: 240900303

Descripción B/P/S: Consiste en modernizar las intersecciones semafóricas del Distrito, instalando controladores con tecnología de vanguardia que permitan regular mejor el tráfico de la ciudad.

Observación B/P/S: Se realizó la modernización de 21 controladores semafóricos, a través de la actualización tecnológica, lo que permite el mejoramiento de la movilidad y la seguridad en las vías. 1. Cr 49 x Cl 78 2. Cr 65 x Cl 51 3. Cr 65 x Cl 49B 4. DG 74 A x TV 39CA - AV NUTIBARA (EC 2) 5. DG 74 A x TV 40 AV NUTIBARA 6. CR 67A x CL 51 7. CR 65 x CL 43 8. Av Bolivariana x Cr65 9. Carrera 74 x Calles 55 y 60 10. Carrera 65 x Calle 55 11. Carrera 92 x Calle 44 12. Carrera 79AA x Calle 44 13. Transversal 39B (Nutibara) x Carrera 77 14. Transversal 39B (Nutibara) x Carrera 79 15. Carrera 78 x Calle 44 16. Av Nutibara x Calle 2-4 17. Carrera 54 x Calle 45 18. Carrera 85 x Calle 76 (Ferrini) 19. Carrera 64C x Calle 60 (Unal) 20. Carrera 65 x Calle 44 21. Carrera 70 x Calle 55

MV17AC	**Infraestructura mejorada**	**Metro Lineal**	**704**	**709**	**101%**

Código. Ind. SUIFP: 240900300

Descripción B/P/S: Consiste en garantizar el mantenimiento, ampliación y modernización de las intersecciones semaforizadas del Distrito y la implementación de nuevos complementos peatonales y ciclistas, permitiendo una gestión más efectiva del tráfico, contribuyendo a una movilidad más fluida y segura para todos los ciudadanos. Se aclara que la unidad de medida del catálogo del DNP se presenta en ML y las intersecciones se miden en unidad Número.

Observación B/P/S: Se garantizó el mantenimiento de 709 intersecciones semaforizadas que regulan el flujo de vehículos, peatones y bicicletas en intersecciones o puntos críticos de las vías del Distrito. Este mantenimiento preventivo y correctivo se enfoca en la limpieza de lámparas, ménsulas, postes y controladores, reparaciones y actualizaciones de los equipos. De manera complementaria se avanzó en la renovación de intercesiones y componentes del sistema semafórico mediante la instalación de gabinetes, herrajes de seguridad, contadores regresivos y semáforos de piso. Estas acciones no solo optimizan la circulación, sino que también contribuyen a la seguridad vial, reduciendo el riesgo de incidentes viales y mejorando la experiencia de desplazamiento en la ciudad.

Proyecto: 240346 -Desarrollo de estrategias de educación vial, cultura ciudadana y de atención a victimas

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.670 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.929 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.749

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de atención integral a víctimas directas e indirectas de accidentes e incidentes de transporte				
MV46AA Víctimas directas e indirectas atendidas	**Porcentaje**	**100**	**100**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 240902400

Descripción B/P/S: Consisten en acompañar, informar y orientar a las víctimas por siniestros viales y sus familias, acerca de los procesos que pueden seguir en materia social, jurídica y psicológica.

Observación B/P/S: En el mes de diciembre se brindó información y acompañamiento a 114 usuarios víctimas por siniestros viales y sus familias, orientándolas sobre sus derechos y los trámites a seguir para recuperar su bienestar físico, emocional y económico tras un accidente. 20 con apoyo social, 32 en consulta psicológica y 62 orientaciones jurídicas.

MV46AB	**Estrategias implementadas**	**Número**	**6**	**6**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 240902900

Descripción B/P/S: Consiste en la implementación de estrategias de educación vial y cultura ciudadana en la movilidad, estas son: promoción de la movilidad segura en el sector educativo, sector empresarial, usuarios de motocicleta, diálogo ciudadano para la movilidad segura, en el entorno virtual o mixto y el cumplimiento de los Acuerdos Distritales.

Observación B/P/S: Se ejecutaron 6 estrategias de educación vial y cultura ciudadana en la movilidad: promoción de la movilidad segura en el sector educativo, sector empresarial, usuarios de motocicleta, diálogo ciudadano para la movilidad segura, en el entorno virtual o mixto y el cumplimiento de los Acuerdos Distritales, por medio del desarrollo de 28 acciones asociadas, las cuales promovieron la modificación de hábitos, representaciones, comportamientos y actitudes a partir de la corresponsabilidad y del diálogo, proponiendo el cuidado por la vida permanente y direccionado los recursos al fortalecimiento de las competencias ciudadanas en seguridad vial y la cultura ciudadana en la movilidad. Con corte a 31 de diciembre de 2025, fue posible sensibilizar un total de 282.777 ciudadanos sobre el cumplimiento de las normas, la convivencia ciudadana y la adopción de comportamientos, hábitos y actitudes responsables en la movilidad, a través de 1.504 intervenciones ejecutadas a lo largo del año.

Proyecto: 240347 -Mantenimiento y operación del laboratorio de toxicología

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 73% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 86%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 480 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 559 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 407

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Laboratorio de investigación con mantenimiento				
MV47AA Laboratorios con mantenimiento	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 240901800

Descripción B/P/S: Consiste en prestar el servicio del Laboratorio de Toxicología de manera permanente los 7 días de la semana durante las 24 horas, a través del mantenimiento de los equipos y el suministro de insumos y servicios que garantizan la calidad en la prueba pericial de embriaguez

Observación B/P/S: Se tiene en ejecución el contrato 46001054522 para la adquisición de los insumos, servicios, mantenimientos y demás elementos necesarios para la operación del Laboratorio de Toxicología, el cual se dedica a realizar las pruebas para determinar la embriaguez de personas involucradas en incidentes viales, así como la prevención a la actividad de conducción bajo el efecto de estas sustancias, con el propósito de reducir los siniestros viales y mejorar la seguridad vial. Se realizó el desembolso del recurso a administrar, equivalente al 91,5%, del cual se han celebrado 14 contratos y se están entregando los insumos bienes y servicios requeridos para la operación del laboratorio.

Proyecto: 240351 -Operación y modernización de los servicios de estacionamiento regulado, arrastre y custodia vehicular

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 11.279 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 34.506 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 33.583

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Celdas de estacionamiento disponibles				
MV51AD Celdas de estacionamiento regulado disponibles	**Número**	**2.393**	**3.296**	**138%**

Código. Ind. SUIFP: 240906200

Descripción B/P/S: Corresponde a las celdas de Estacionamiento Regulado disponibles para la ciudadanía, con el propósito de racionalizar la ocupación del espacio público, generando condiciones que faciliten la organización de la vía pública y la movilidad en el Distrito de Medellín. Se aclara que estas celdas pueden aumentar o disminuir en el transcurso del año de acuerdo a resultados de estudios técnicos realizados.

Observación B/P/S: Se realizó la operación de 3,296 celdas de estacionamiento, en Veintidós (22) Zonas de estacionamiento regulado, la operación ha permitido brindar un aporte a la solución de la problemática del parqueo, tanto en espacio público, como en las vías de la ciudad. El incremento se debe a la entrada en operación de la ampliación de la zona de laureles, desde el 1 de agosto de 2025, se están operando 735 cedas nuevas. En el mes de noviembre de 2025, se habilitaron 49 celdas en las zonas del Perpetuo Socorro, Plaza mayor y Parques del rio en el marco del plan navidad.

MV51AE Organismos de tránsito dotados con implementos para el control del tránsito	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 240901100

Descripción B/P/S: Corresponde a la adquisición de elementos y servicios logísticos para la correcta operación de las Zonas de Estacionamiento Regulado, el arrastre, la custodia de los vehículos inmovilizados y bloqueo de vehículos mal estacionados o abandonados en el Distrito de Medellín.

Observación B/P/S: Se realizó la operación de 5 parqueaderos con un área mínima de 139.400 m2, para custodia de vehículos inmovilizados, la operación de 13 vehículos (5 grúas y 8 Vans), para el arrastre de vehículos inmovilizados y la operación de 187 dispositivos bloqueadores CEPOS, con el objetivo de regular y controlar el estacionamiento de vehículos en zonas de la vía pública en la ciudad, permitiendo racionalizar el uso del espacio público y el estacionamiento de vehículos.

Proyecto: 240352 -Fortalecimiento de la capacidad operativa de control y regulación de la movilidad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 95% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 20.148 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 13.508 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 12.786

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de control a la seguridad vial				
MV52AE Organismos de tránsito dotados con implementos para el control del tránsito	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 240901100

Descripción B/P/S: Corresponde a la adquisición de equipos, elementos de seguridad, vehículos y servicios de tipo logístico con las que se desarrollan las labores de control y regulación de la movilidad del Distrito de Medellín las 24 horas del día los 365 días del año.

Observación B/P/S: Se garantizaron los recursos logísticos para que los agentes de tránsito tengan las herramientas que permitan cumplir con su misión institucional en regulación y control de la movilidad en el Distrito, recursos prioritarios como son el parque automotor de vehículos, motos, camiones y grúas dispuestas en el proceso de arrastre y custodia, los equipos de radio, las comparenderas electrónicas, el apoyo en actividades de mantenimiento para vehículos y motos, y se mantiene la planta de agentes de tránsito temporales.

Proyecto: 240355 -Fortalecimiento de la operación de trámites y servicios

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 94% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.970 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.682 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.410

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
MV55AK Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Corresponde a la supervisión del convenio interadministrativo 5400000003 de 2006 realizado con UNE-TELCO y el Distrito de Medellín, cuyo objeto es la modernización y optimización de la gestión de los servicios administrativos de la Secretaría de Movilidad, a través de una solución integral de tecnología, información, comunicaciones y operación.

Observación B/P/S: Se realizó la supervisión del convenio interadministrativo 54000000003 suscrito con UNE EPM Telecomunicaciones con el apoyo de profesionales en las áreas técnica, jurídica, financiera, administrativa, tecnológica y operativa, incorporados a través del convenio interadministrativo Nro. 4600104750 de 2025

Proyecto: 240356 -Desarrollo de los procesos de cobro coactivo y recaudo de cartera

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 7.930 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9.091 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 9.074

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de saneamiento fiscal y financiero				
MV56AI Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado	**Porcentaje**	**100**	**100**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459900200

Descripción B/P/S: Consiste en realizar las actividades y gestiones para la recuperación de cartera originada por el no pago de las sanciones pecuniarias impuestas por violación a las normas de tránsito a través de mandamientos de pago, medidas cautelares de embargos, sentencias y remates e investigación de Bienes.

Observación B/P/S: Se viene realizando las gestiones para la recuperación de cartera originada por el no pago de las sanciones pecuniarias impuestas por violación a las normas de tránsito, a través de mandamientos de pago, medidas cautelares de embargos, sentencias y remates e investigación de bienes. Durante el mes de diciembre se adelantaron 20.777 expedientes, para un total de 244.053 en lo corrido del año 2025.

Proyecto: 240357 -Fortalecimiento institucional de la secretaría de movilidad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 88% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 94%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 14.473 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 13.220 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 11.656

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
MV57AK Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Corresponde al apoyo de la gestión administrativa, logística, documental, material preimpreso, servicios de canales de atención para la ciudadanía y otros recursos de apoyo institucional requeridos en el proceso misional de Gestión de la Movilidad.

Observación B/P/S: Durante la vigencia 2025 se garantizaron, actividades de apoyo para procesos transversales durante 11 meses, esenciales para brindar respuestas oportunas a PQRSD, atención a usuarios en las sedes, disponibilidad de preimpresos (comparenderas), baños portátiles, transporte interno de pasajeros, atención prehospitalaria en la sede, gestión documental y archivo, servicio de impresión, elaboración de actos administrativos, respuestas a tutelas, atención de exhortos y despachos comisorios, así como respuestas a conciliaciones, demandas y acciones populares, entre otros.

MV57AL Sedes mantenidas	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459901600

Descripción B/P/S: Corresponde al mantenimiento y mejoramiento de espacios, dotación de muebles y vigilancia de la sede externa Caribe de la Secretaría de Movilidad, lo que incluye la red hidrosanitaria, la renovación espacios físicos inadecuados y desgastados, arreglo de techos, luminarias nuevas, aires acondicionados y recomendaciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) y a todas aquellas actividades necesarios para el adecuado funcionamiento de la sede externa.

Observación B/P/S: Durante la vigencia se ejecutaron actividades de mantenimiento en la sede Caribe mediante los contratos de obra civil y de instalaciones eléctricas. Se llevaron a cabo labores de modernización de espacios en la Unidad de Toxicología, Atención a Víctimas, el área y la zona de lockers de los agentes de tránsito practicantes; así como la renovación de las unidades sanitarias de las inspecciones, la Unidad de Transporte, Cobro Coactivo, asimismo, se instalaron pérgolas en la zona de descanso de vigilancia, se intervinieron los accesos a la guardia y al parqueadero del sótano, y se adelantaron trabajos de resane y pintura en general, además de la mejora de las cubiertas mediante actividades de impermeabilización y cambio de tejas. Por su parte, el contrato eléctrico permitió la renovación del alumbrado público, la instalación de nuevos aires acondicionados, el mantenimiento general de los equipos existentes, el reemplazo de luminarias en la sede y el desarrollo de mantenimientos rutinarios de la planta eléctrica y del ascensor. Adicionalmente, se contó con la disponibilidad del servicio de seguridad. Estas acciones garantizan espacios adecuados para el bienestar de los funcionarios y la adecuada prestación de los trámites y servicios propios de la Secretaría de Movilidad.

MV57AM Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	**Porcentaje**	**27**	**28,46**	**105%**

Código. Ind. SUIFP: 459900700

Descripción B/P/S: Corresponde a la renovación y mejoramiento de la infraestructura tecnológica (hardware y software), equipos eléctricos y electrónicos para el desarrollo de las tareas y actividades del proceso misional de Gestión de la Movilidad.

Observación B/P/S: Durante la vigencia se garantizó el óptimo funcionamiento de la infraestructura tecnológica y de los sistemas de información de la Secretaría de Movilidad, mediante la renovación, soporte y mantenimiento de los aplicativos, adquisición de equipos de cómputo, así como la gestión del licenciamiento correspondiente.

Programa: 4.3.4 - Modelo de gestión para la movilidad sostenible, segura e inteligente

Proyecto: **240018 -Innovación tecnológica y gobierno de los datos de la movilidad**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 88% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 94%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 7.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.078 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.217

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información implementado				
MV18BC Sistemas de información implementados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 240905900

Descripción B/P/S: Corresponde a la gestión integral de datos e información sobre movilidad y seguridad vial, a través del Observatorio de Movilidad y el Centro Integrado de Tráfico y Transporte (CITRA), para mejorar la disponibilidad de información, asegurando que sea accesible, confiable y oportuna para la toma de decisiones, así como proporcionar insumos técnicos para la formulación de planes, programas, proyectos y estrategias que contribuyan al bienestar y desarrollo del Distrito.

Observación B/P/S: Durante el año 2025 se formuló el Plan Estratégico de Control Contra la Ilegalidad en el Transporte PECCIT para la vigencia 2026 y se generaron los informes de seguimiento del PECCIT 2025. Asimismo, se continuó con la gestión de alianzas estratégicas interinstitucionales orientadas a fortalecer la misionalidad del Centro Integrado de Transporte y Tránsito y del Observatorio de Movilidad de Medellín (CITRA–OMM). Además, se realizaron envíos de diferentes insumos geográficos al grupo de Sistemas de Información Geográfica (SIG) del Distrito para su montaje y visualización en MapGIS que permiten fortalecer el análisis espacial y la toma de decisiones en materia de movilidad: capa de mortalidad vial correspondiente al período 2019–2024, capas generadas por Gerencia de Movilidad Humana que incluyen: red ciclista, urbanismo táctico, redes camineras, cicloparqueaderos. Se han implementado procesos de integración y automatización de datos orientados a responder de manera oportuna y eficiente los requerimientos provenientes de PQRS, prensa y Despacho, mediante la consolidación de información desde múltiples fuentes operativas y analíticas de la Secretaría de Movilidad. Los procesos son: Implementación de procesos ETL automatizados, desarrollo de tableros de apoyo para análisis y respuesta, implementación de modelos de IA para apoyo en la elaboración de respuestas e integración de fuentes de datos para atención de PQRS, prensa y despacho.

Proyecto: 240353 -Reestructuración del proceso de gestión de vehiculos abandonados

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 73% **Ejec. Financiera :** 0% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 37%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de saneamiento fiscal y financiero				
MV53AD Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado	**Porcentaje**	**100**	**73,3**	**73%**

Código. Ind. SUIFP: 459900200

Descripción B/P/S: Consiste en realizar el proceso de descongestión de patios con vehículos declarados en abandono que son objeto de disposición final por desintegración física, venta pública de subasta, traslado a patios de autoridades judiciales u otros, lo que permitirá sanear la cartera, disminuir los gastos de funcionamiento de la operación de patios, así como cumplir con la Ley 1730 de 2014.

Observación B/P/S: A través de los traslados presupuestales con radicado 202520106176, 202520095858 y 202520044268, le fueron contracreditados los recursos al proyecto.

Proyecto: 240354 -Elaboración de planes, estudios y diseños para la gestión de la movilidad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.539 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.524 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.524

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de estudios técnico				
MV54AA Documentos de estudios técnicos realizados	**Número**	**4**	**4**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 240906400

Descripción B/P/S: Consiste en la formulación de los Planes Integrales de Gestión de la Movilidad (PIGM) en las comunas y corregimientos del Distrito de Medellín, así como en la elaboración del Plan Distrital de Parqueaderos Públicos. Los PIGM son instrumentos estratégicos orientados a abordar de manera integral las dinámicas de movilidad en cada territorio. Su propósito no se limita a identificar y diagnosticar las principales problemáticas que afectan la movilidad local, sino que también busca definir soluciones específicas, viables y sostenibles que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes y a promover un entorno urbano más habitable y equitativo. De igual forma, el Plan Distrital de Parqueaderos Públicos constituye un componente dentro de la gestión integral de la movilidad urbana, al establecer la hoja de ruta para la organización y regulación del estacionamiento en todo el Distrito. Este plan contempla la incorporación de soluciones tecnológicas y el fomento de alianzas público-privadas, en concordancia con el marco normativo distrital vigente.

Observación B/P/S: Se realizaron los Planes integrales de la gestión de la movilidad -PIGM de las comunas 1, 9 y 11, Cada documento contiene el diagnóstico, identificación de las problemáticas y formulación de estrategias. El PIGM por Comuna se presenta como un instrumento estratégico diseñado para abordar de manera integral las dinámicas de movilidad. Este plan no solo busca identificar y diagnosticar las principales dificultades que afectan la movilidad local, sino también proponer soluciones específicas y viables que mejoren la calidad de vida de los residentes y promuevan un entorno urbano más habitable y equitativo. Además, se realizó el plan de trabajo, la metodología de trabajo y el diagnóstico del Plan Distrital de Parqueaderos, que presenta un avance del 60%. El Plan Distrital de Parqueaderos Públicos constituye un componente clave dentro de la gestión integral de la movilidad urbana, al establecer la hoja de ruta para la organización y regulación del estacionamiento en todo el Distrito. Este plan contempla la incorporación de soluciones tecnológicas y el fomento de alianzas público-privadas, en concordancia con el marco normativo distrital vigente.

Programa: 4.3.5 - Movilidad activa, sostenible y micromovilidad

Proyecto: **240344 - Implementación de estrategias para la promoción de la movilidad activa y sostenible**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.100 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.810 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.755

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de estudios técnicos				
MV44AC Documentos de estudios técnicos realizados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 240906400

Descripción B/P/S: Consiste en documentar la elaboración de planes integrales de gestión de la movilidad activa, realización de diagnósticos de ciclo infraestructura, mesas y apoyo en procesos de socialización, apoyo y/o seguimiento a la Secretaría de Infraestructura Física (SIF) en actividades de mantenimiento de ciclo infraestructura.

Observación B/P/S: Se realizó el diagnóstico, planificación y gestión del mantenimiento de la red ciclista ante la Secretaría de Infraestructura. Se adelantó la etapa de diagnóstico para los estudios de nuevas ciclorrutas y conexiones estratégicas (calles 34AA, 37, 34 Conquistadores, Calle 53 entre Carrera 79 y Av. 80, Calle 34 entre Carrera 76 y Av. 80) y la integración con la ciclorruta proyectada en el corredor del Metro de la 80. Se priorizaron posibles conexiones seguras y diagnósticos sociales para a la red ciclista de instituciones educativas (San Rafael, Rafael Uribe, Hipólito y José María Céspedes). Seguimiento de daños de las ciclorrutas con el fin de permitir una planeación y priorización del mantenimiento. Se elaboraron informes del mantenimiento de corredores intervenidos. Se elaboraron las propuestas técnicas como soporte para los actos administrativos de los cierres viales tales Provenza, Calle Primavera, Alhambra y Pichincha. Igualmente, y con el fin de fortalecer los tramos de ciclorrutas y el uso de estos por parte de estudiantes. Se ejecutaron estrategias de pedagogía y cultura ciudadana para promover el uso de la infraestructura buscando generar apropiación y comportamiento cívico. Se realizaron actividades para socializar la Zona Urbana de Aire Protegido (ZUAP), con intervenciones como "Sinfonía" en la Estación San Antonio, "Mi Deseo" en la Ciclorruta Bolívar, sensibilizando sobre no invasión del espacio y "Pregoneras del Cuidado" en el paseo peatonal Carabobo, agradeciendo y explicando los beneficios de la movilidad sostenible.

Proyecto: **240345 - Mantenimiento y operación del servicio de escaleras eléctricas públicas**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 89% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 95%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.922 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.193

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Espacios dedicados a la intermodalidad				
MV45AA Espacios dedicados a la intermodalidad.	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 240800400

Descripción B/P/S: Consiste en garantizar la operación y mantenimiento de las escaleras eléctricas de la Comuna 13, las cuales mejoran las condiciones de accesibilidad y movilidad de los habitantes del sector.

Observación B/P/S: Se continúa con el mantenimiento profundo (Overhaul) a las escaleras eléctricas, para garantizar la operación del sistema de transporte de escaleras eléctricas de la comuna 13 en óptimas condiciones de funcionamiento. Además, se continúa garantizando la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, facilitando los desplazamientos de los habitantes y visitantes del sector, lo cual beneficia a un promedio 170.000 personas mensuales, a través de la ejecución del contrato 4600104992 de 2025 para la administración y operación de este sistema de transporte de escaleras eléctricas.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo
Componente: 4.3 - Movilidad Sostenible e Integral
Programa: 4.3.3 - Cultura ciudadana y fortalecimiento institucional

Proyecto: **250023 -25pp99-mejoramiento de la señalización vial 25pp99**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 0% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.856 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vías con dispositivos de control y señalización					
MV23AF	**Vías con dispositivos de control y señalización instalados**	**Kilómetro-Carril**	**90**	**0**	**0%**

Código. Ind. SUIFP: 240903900

Descripción B/P/S: Corresponde a la cantidad de kilómetros por carril señalizados, tanto horizontal como vertical de las diferentes vías de las comunas 2, 3,4, Y 8 y corregimientos 50,60,70, 80 Y 90 del Distrito

Observación B/P/S: El proceso contractual cuyo objeto es la señalización vial del Distrito presentó retrasos, debido a que la licitación pública 70007765, publicada el 7 de julio de 2025, fue revocada ante las múltiples observaciones de los proponentes, y sólo hasta el 17 de diciembre de 2025 se inició el nuevo contrato 4600106344 de 2025, por lo tanto, la cantidad de kilómetros a señalizar en este proyecto se ejecutara en el primer trimestre de 2026, debido a que el contrato tiene vigencias futuras a 2027.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: **080428 -Construcción y adecuación de deposito de buses**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: **200128 -Mejoramiento de la calidad del servicio de transporte público colectivo e individual de la ciudad**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 533 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 516

Proyecto: **200073 -Ampliación y mejoramiento de la red de semaforización**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.922 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.891


Proyecto: **200076 -Ampliación y mantenimiento de la señalización vial**


Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.063 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.055


Proyecto:	**200414**	**-Implementación de estrategias de transformación cultural y educativa en la movilidad**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 128	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 119
Proyecto:	**200416**	**-Aprovechamiento del espacio público en las zonas de estacionamiento regulado**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 692	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 692
Proyecto:	**200418**	**-Adquisición de suministros y recursos logísticos para el control de la movilidad**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 1.645	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 1.645
Proyecto:	**200422**	**-Mejoramiento de la sede de la secretaría de movilidad**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 1.874	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 1.759
Proyecto:	**200423**	**-Servicio de atención a la ciudadanía de la secretaría de movilidad**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 543	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 543
Proyecto:	**200424**	**-Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y de la información de la secretaría de movilidad**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 761	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 761
Proyecto:	**200425**	**-Administración del debido cobrar de la secretaría de movilidad**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 184	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 164
Proyecto:	**240004**	**-24pp6-mejoramiento de la señalización vial comuna 6**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 180	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 180
Proyecto:	**200217**	**-Estudios de movilidad sostenible y gestión de la demanda para la ciudad**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 492	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 492
Proyecto:	**200419**	**-Fortalecimiento estratégico del observatorio y la operatividad en seguridad vial**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 667	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 667
Proyecto:	**200411**	**-Desarrollo de estrategias de movilidad caminable y pedaleable**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 990	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 990
Proyecto:	**200413**	**-Prestación de servicio de escaleras eléctricas públicas**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 117	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 113


Secretaría de Desarrollo Económico


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2025

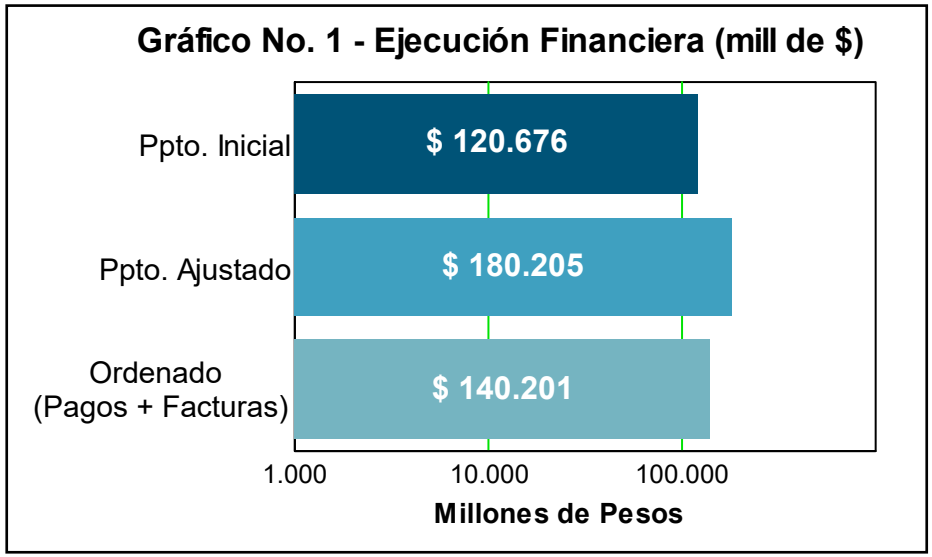

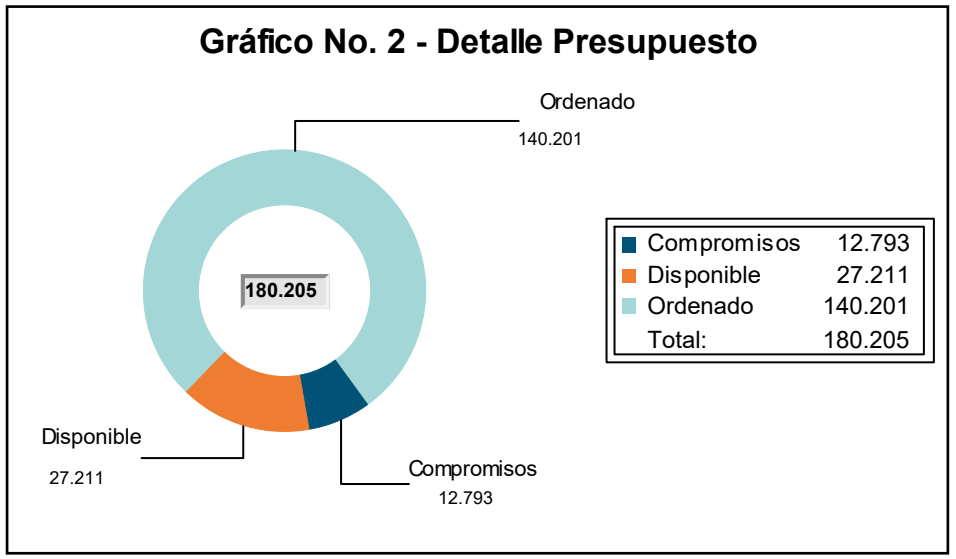

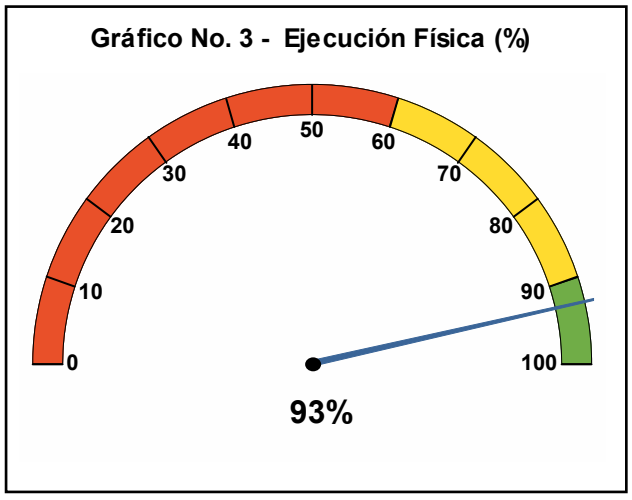

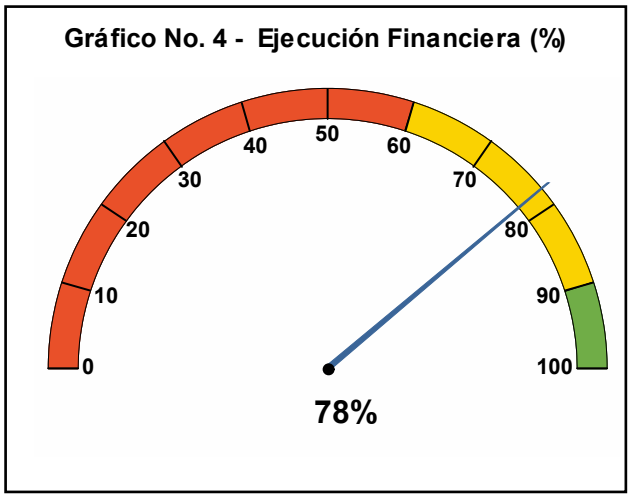

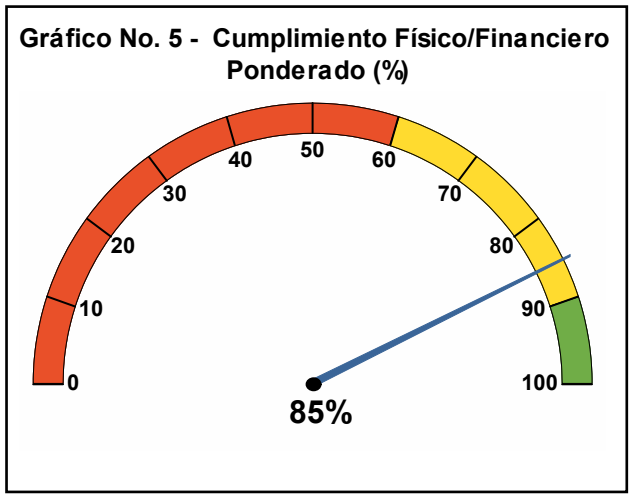

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.2 - Educación para el progreso social
Programa: 1.2.8 - Distrito bilingüe

Proyecto: 240115 -Formación en inglés como segunda lengua para la competitividad de la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 75% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 87%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 999

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral				
DE15BA Personas formadas	**Número**	**3.500**	**2.625**	**75%**

Código. Ind. SUIFP: 360300200

Descripción B/P/S: Personas certificadas en el proceso de formación en ingles como segunda lengua.

Observación B/P/S: A 30 de diciembre se cuenta con 2625 personas certificadas logrando un 75% de la meta propuesta para la vigencia. El 25% restante, requirió ampliación hasta 30 de mayo de 2026, por lo que el avance se reporta en el 2026.

Componente: 1.3 - Desarrollo económico, productividad y competitividad
Programa: 1.3.1 - Formación y empleo

Proyecto: 240104 -Formación para el trabajo en medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 69% **Ejec. Financiera :** 93% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 81%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.969 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 694 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 647

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral				
DE04AA Personas formadas	**Número**	**700**	**433**	**62%**

Código. Ind. SUIFP: 360300200

Descripción B/P/S: Personas certificadas en el proceso de formación en habilidades para el empleo.

Observación B/P/S: A 30 de diciembre se cuenta con 433 personas certificadas logrando un 62% del total de la meta, es de tener en cuenta que se tiene un proceso de formación que pasa a la vigencia de 2026 con 26 personas que se reportarán en su momento. El 28% restante se esperaba cumplir adelantando el proceso de contratación para poder ejecutar, pero dicho proceso se declaró desierto.

DE04AB Personas beneficiadas	**Número**	**700**	**530**	**76%**

Código. Ind. SUIFP: 360302600

Descripción B/P/S: Hace referencia al servicio que garantiza la gestión administrativa del proceso de formación.

Observación B/P/S: A 30 de diciembre se cuenta con 530 personas matriculadas logrando un 76% del total de la meta propuesta para la vigencia, el 24% restante se esperaba cumplir adelantando el proceso de contratación para poder ejecutar, pero dicho proceso se declaró desierto.

Proyecto: 240105 -Formación en habilidades digitales, audiovisuales y cinematograficas, laborales en medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 68% **Ejec. Financiera :** 44% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 56%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 12.935 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.636

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral				
DE05DA Personas formadas	**Número**	**6.408**	**3.976**	**62%**

Código. Ind. SUIFP: 360300200

Descripción B/P/S: Personas certificadas en el proceso de formación en habilidades digitales, audiovisual y/o cinematográfico.

Observación B/P/S: A 30 de diciembre se cuenta con 3976 personas certificadas logrando un 62% de la meta propuesta para la vigencia. El 38% restante, restante se espera cumplir con el proceso de formación ejecutado por el operador Cymetria Group SAS, el cual requirió ampliación hasta 30 de mayo de 2026, por lo que el avance se reporta en el 2026.

DE05DB Personas beneficiadas	**Número**	**6.408**	**4.693**	**73%**

Código. Ind. SUIFP: 360300600

Descripción B/P/S: Personas inscritas y matriculadas se encuentran en proceso de formación

Observación B/P/S: A 30 de diciembre se cuenta con 4693 personas matriculadas logrando un 73% del total de la meta. El 27% restante se espera cumplir con el proceso de formación ejecutado por el operador Cymetria Group SAS, el cual requirió ampliación hasta 30 de mayo de 2026, por lo que el avance se reporta en el 2026.

Programa: 1.3.11 - Medellín, capital creativa

Proyecto: **240121 -Fortalecimiento de la industria audiovisual y cinematográfica de medellín**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.607 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.232 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.196

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción para la producción de piezas audiovisuales				
DE21BA Piezas audiovisuales financiadas a partir de convocatorias públicas dirigidas a pequeños productores de contenidos audiovisuales	**Número**	**30**	**35**	**117%**

Código. Ind. SUIFP: 230207600

Descripción B/P/S: Número de permisos PUFA. Acompañamiento y dirección en la gestión de desarrollo de proyectos audiovisuales.

Observación B/P/S: Se participó en festivales y mercados internacionales (BAM, FICCI, NALIP, IBERSERIES, Ventana Sur) que permitieron recibir más de 8 FAM TRIPS en el año 2025 con mas de 20 productores internacionales. Esto consolidó a Medellín como destino fílmico , además de lograr posicionar el Distrito acompañando a las productoras en la gestión de los permisos PUFA.

DE21BB Empresas apoyadas para el desarrollo de contenidos digitales	**Número**	**50**	**178**	**356%**

Código. Ind. SUIFP: 230201100

Descripción B/P/S: Corresponde a la cantidad de productoras cinematográficas y audiovisuales beneficiadas con incentivos. Se encuentra sobrejecutada debido a que se han generado eficiencias, estrategias y alianzas que han permitido superar la meta.

Observación B/P/S: Se encuentra sobrejecutada debido a que se ha participado activamente en encuentros del sector, promoción del Distrito como escenario cinematográfico y estratégico para los rodajes. Esto permitió en el 2025 eficiencia en los recursos y alianzas que superaron la meta.

Programa: 1.3.2 - Oportunidades para crecer

Proyecto: **240123 -Incremento en la generación de ingresos en la ciudad**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 97% **Ejec. Financiera :** 95% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.874 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.024 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.930

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de colocación laboral				
DE23BA Personas colocadas laboralmente	**Número**	**6.075**	**5.743**	**95%**

Código. Ind. SUIFP: 360200400

Descripción B/P/S: Número de personas colocadas laboralmente.

Observación B/P/S: La articulación con las otras Secretarias del Distrito y Entidades Privadas permitió la aproximación de las personas colocadas, se continua aunando esfuerzos desde la estrategia.

DE23BB Planes de negocio aprobados	**Número**	**3.550**	**3.569**	**101%**

Código. Ind. SUIFP: 360201300

Descripción B/P/S: Emprendimientos apoyados.

Observación B/P/S: La articulación con las otras Secretarias del Distrito y Entidades Privadas permitió estar por encima de la meta establecida de personas colocadas, reflejando la efectividad en la estrategia durante este periodo.

Programa: 1.3.3 - Desarrollo empresarial

Proyecto: **200124 -Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento de base tecnológica**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.167 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.164

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de apoyo para la implementación de innovación en las empresas				
DE24AB Empresas apoyadas	**Número**	**97**	**97**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 390301300

Descripción B/P/S: Corresponde a emprendimientos de base tecnológica acompañados, quienes son fortalecidos en sus diferentes etapas de madurez para potenciar sus modelos de negocio.

Proyecto: **200134 -Implementación de la política pública de economía social y solidaria**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 169 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 168

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio para la formalización empresarial y de productos y/o Servicio				
DE34AD Empresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o formalización.	**Número**	**8**	**8**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 350201500

Descripción B/P/S: Asistencia técnica en temas de administración, contabilidad, comercio, jurídicos, innovación, seguridad y salud en el trabajo, cohesión grupal, coach empresarial entre otros, dirigida a la creación de empresas del sector social y solidario.

Observación B/P/S: Se crearon Ocho (8) Corporaciones de economía social y solidaria en las comunas: Manrique, Castilla, Doce de Octubre y en los corregimientos de AltaVista y Santa Elena.

Proyecto: 240101 -Incremento de las oportunidades para la inserción laboral

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 61% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 81%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.360 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.179 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.336

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de colocación laboral				
DE01AA Personas colocadas laboralmente	**Número**	**7.500**	**10.020**	**134%**

Código. Ind. SUIFP: 360200400

Descripción B/P/S: Personas que pasan por la ruta de empleabilidad desarrollada por Oficina Pública de Empleo-OPE (proceso de intermediación laboral) y acceden a la vinculación laboral.

Observación B/P/S: La articulación con las otras Secretarias del Distrito y Entidades Privadas permitió estar por encima de la meta establecida de personas colocadas, reflejando la efectividad en la estrategia durante este periodo.

DE01AB Eventos realizados	**Número**	**40**	**65**	**163%**

Código. Ind. SUIFP: 360200200

Descripción B/P/S: Hace referencia a la gestión que realiza la OPE y el Ministerio del Trabajo para la generación y formalización del empleo en diferentes grupos poblacionales mediante diferentes espacios de participación (ferias, foros, seminarios, talleres entre otros).

Observación B/P/S: La fuerte articulación con otras Secretarías del Distrito y entidades privadas con quienes participamos en 25 eventos hizo que se superara la meta establecida, ya que contamos con la participación de 3.039 personas, además de las 4,478 personas que participaron en los 40 eventos propios planeados, donde todas fueron registradas y postuladas a las vacantes.

Proyecto: 240103 -Fortalecimiento del desarrollo económico en el territorio

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 85% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 93%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.516 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.565 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.886

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad temprana				
DE03AA Empresas asistidas técnicamente	**Número**	**13.000**	**19.505**	**150%**

Código. Ind. SUIFP: 350201700

Descripción B/P/S: Emprendedores y empresas que pasan por 5 o más intervenciones de programa: Orientación, Inscripción, Diagnostico, Acompañamiento Modelo de negocio, Acompañamiento en cursos, charlas, talleres o Asesorías especializadas en temas contables, financieros, mercadeo, alimentos entre otros y apoyo a la comercialización en eventos de ciudad.

Observación B/P/S: Desde los 21 CEE se brindaron 35.031 servicios con la estrategia territorial "Oportunidades para Crecer " y la articulación con otros programas como: Parceros, Etnias, Familias Medellín, Integrate entre otros, superando la meta proyectada y alcanzando 19.505 intervenciones, con 3.901 emprendedores y/o empresarios que tuvieron 5 o más intervenciones.

DE03AC Necesidades empresariales atendidas a partir de emprendimientos	**Número**	**2.600**	**3.901**	**150%**

Código. Ind. SUIFP: 350201701

Descripción B/P/S: Emprendedores y empresas que pasan por intervenciones de programa de Acompañamiento Modelo de negocio, Acompañamiento en cursos, charlas, talleres o Asesorías especializadas en temas contables, financieros, mercadeo, alimentos entre otros y apoyo a la comercialización en eventos de ciudad.

Observación B/P/S: Desde los 21 CEE se brindaron un total de 35.031 servicios con la estrategia territorial "Oportunidades para Crecer " y la articulación con otros programas como: Parceros, Etnias, Familias Medellín, Integrate entre otros, superando la meta proyectada.

Proyecto: 240106 -Mejoramiento del emprendimiento en la ciudad de medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 95% **Ejec. Financiera :** 96% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 95%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 19.215 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 20.154 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 19.315

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
DE06BA Empresas apoyadas	**Número**	**2.000**	**1.800**	**90%**

Código. Ind. SUIFP: 390601900

Descripción B/P/S: Empresas y emprendimientos intervenidos para fortalecer capacidades competitivas y mejorar los procesos productivos.

Observación B/P/S: Se proyectó un acompañamiento de 2.000 empresas y emprendimientos; sin embargo, de acuerdo con las convocatorias realizadas se inscribieron 1.800 para su intervención. Con miras a la vigencia 2026, se fortalecerán las estrategias de difusión y divulgación de los programas en todas las comunas y corregimientos, con el fin de atraer un mayor número de empresas y emprendimientos para acompañar.

DE06BB Programas y proyectos financiados	**Número**	**2**	**2**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 390600900

Descripción B/P/S: Programas de intervención a empresas y emprendedores enfocados en base tecnológica y fortalecimiento empresarial.

Observación B/P/S: Se reporta la formulación y ejecución de los Programas de base tecnológica y fortalecimiento empresarial.

Proyecto: 240108 -Fortalecimiento de la economía social y solidaria de medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.440 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.217 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.183

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio para la formalización empresarial y de productos y/o Servicio				
DE08DA Empresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o formalización.	**Número**	**17**	**17**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 350201500

Descripción B/P/S: Empresas asistidas en asesoría especializada administrativa, financiera, seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente, innovación y/o a la medida.

Observación B/P/S: Se cumplió lo planeado y a la fecha se continua en la elaboración de planes de inversión y asesorías especializadas a la medida de estos emprendedores.

Proyecto: 240113 -Desarrollo de negocios de alto impacto

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 96% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.337 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.917 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.703

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
DE13BA Asistencias técnicas realizadas	**Número**	**70**	**79**	**113%**

Código. Ind. SUIFP: 390601400

Descripción B/P/S: Acompañamientos, fortalecimientos, financiación o conexiones proporcionados a emprendedores.

Observación B/P/S: Se supera la meta de la vigencia dado a la alta demanda y a la adherencia lograda gracias al desarrollo exitoso del programa.

Proyecto: 240122 -Fortalecimiento de artesanos medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 50% **Ejec. Financiera :** 0% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 25%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 497 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asesoría técnica para el emprendimiento				
DE22BA Emprendimientos asesorados	**Número**	**100**	**50**	**50%**

Código. Ind. SUIFP: 360203200

Descripción B/P/S: Número de artesanos formados.

Observación B/P/S: La convocatoria para la formación de los otros 50 artesanos, se declaró desierta.

Observación Proyecto: Mediante la declaración de desierta del proceso No. 9015770, se acreditó que todas las propuestas presentadas fueron rechazadas debido al incumplimiento del requisito habilitante de experiencia técnica, circunstancia que fue debidamente sustentada en los informes de evaluación y en las respuestas a las observaciones formuladas por los proponentes.

Programa: 1.3.4 - Financiación para crecer

Proyecto: **240110 -Fortalecimiento del banco distrital de medellin para la inclusión financiera**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 54% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 76%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.156 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.907 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.797

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de apoyo financiero para la creación de empresas				
DE10DA Planes de negocio financiados	**Número**	**71.000**	**38.309**	**54%**

Código. Ind. SUIFP: 360201800

Descripción B/P/S: Número de créditos otorgados línea Individual, redes y bancuadra.

Observación B/P/S: La falta de recursos presupuestales suficientes para la ejecución de las metas programadas

DE10DB Emprendimientos asesorados	**Número**	**71.000**	**38.309**	**54%**

Código. Ind. SUIFP: 360203200

Descripción B/P/S: Número De créditos otorgados línea Individual, redes y bancuadra.

Observación B/P/S: La limitada disponibilidad de recursos presupuestales que impide respaldar de manera adecuada la ejecución y el logro de las metas definidas.

Observación Proyecto: No se logra la meta debido a insuficiencia de recursos.

Programa: 1.3.5 - Acceso a Mercados

Proyecto: **240109 -Desarrollo de estrategias de acceso a mercados que promuevan espacios de comercialización para emprendedores y empresarios en medellín**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.306 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 21.228 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 21.158

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica a las Mipymes para el acceso a nuevos mercados				
DE09AA Empresas asistidas técnicamente	**Número**	**1.800**	**2.378**	**132%**

Código. Ind. SUIFP: 350202200

Descripción B/P/S: Emprendedores y empresarios vinculados a iniciativas de acceso a mercados.

Observación B/P/S: Debido al incremento actual en ferias y eventos captados para el Distrito de Medellín por promoción de ciudad, la cantidad de emprendedores que participaron se encuentra sobre ejecutado.

DE09AB Ruedas de negocios realizadas | **Número** | **111** | **178** | **160%**

Código. Ind. SUIFP: 350200500

Descripción B/P/S: Ferias -ruedas nacionales y/o locales e internacionales.

Observación B/P/S: El sector turístico y de eventos de Medellín ha tenido gran reactivación y captación en el año 2025 por la promoción de ciudad y el desarrollo del Distrito como Hub de ferias nacionales e internacionales consolidándose como capital de eventos con gran impacto económico y social destacándose un auge en encuentros de tecnología y reuniones. Es así como ya se ha cumplido más del 50% de la meta del cuatrienio en el 2025.

Programa: 1.3.6 - Innovación como motor de desarrollo económico del Distrito

Proyecto: 240102 -Fortalecimiento del ecosistema ctei del distrito de medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 74% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 87%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 38.590 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 46.763 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 34.731

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Salón comunal dotado				
DE02AA Estrategias de apropiación realizadas	**Número**	**4**	**4**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 390601100

Descripción B/P/S: Número total de estrategias implementadas para promover la apropiación del conocimiento, tecnología o iniciativas específicas por parte de los actores relevantes.

Observación B/P/S: A la fecha se han reportado las Estrategias de 1) Apropiación Social de la CTIe, 2) Ciudad Inteligente, 3) Comunidades energéticas y 4) Mitigación del ruido

DE02AB Documentos de planeación elaborados | **Número** | **4** | **4** | **100%**

Código. Ind. SUIFP: 390601500

Descripción B/P/S: Total de documentos que contienen la formulación Proyectos a desarrollar en el marco del Plan Ti.

Observación B/P/S: A la fecha se han reportado las Estrategias de 1) Apropiación Social de la CTIe, 2) Ciudad Inteligente, 3) Comunidades energéticas y 4) Mitigación del ruido

Proyecto: 240107 -Implementación del plan de transición para el desarrollo económico de distrito ctei

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 823 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 823 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 811

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
DE07CA Documentos de planeación elaborados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 390601500

Descripción B/P/S: Documentos que contienen planes detallados o guías estratégicas para la ejecución de proyectos, actividades o programas.

Observación B/P/S: Al 31 de diciembre se avanzó en las actividades del Decreto Gobernanza, Adopción de la declaratoria de la comprensión y alcance de CTI, decretos reglamentarios de la Política de CTI.

Proyecto: 240114 -Implementación del observatorio de desarrollo economico

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 96% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 596 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 596 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 573

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información implementado				
DE14BA Sistemas de información implementados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 040110200

Descripción B/P/S: Estudios técnicos realizados como informes mensuales y trimestrales coyuntura económica, informes sectoriales.

DE14BB Documentos de estudios técnicos realizados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 040110400

Descripción B/P/S: Documento con el avance en la implementación del Sistemas de información.

Observación B/P/S: Se avanzó en la estructuración y normalización de la información secundaria obtenida de diferentes fuentes oficiales como el DANE, DAP, CCMA Y DIAN

Proyecto: 240124 -Consolidación del centro para la cuarta revolución industrial

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.764 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.265 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.188

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
DE24BA Asistencias técnicas realizadas	**Número**	**4**	**7**	**175%**

Código. Ind. SUIFP: 390601400

Descripción B/P/S: Asistencias técnicas enfocadas en lograr alianzas e iniciativas gestionadas por el Centro de la Cuarta Revolución Industrial (C4IR),

Observación B/P/S: Se reportan 7 alianzas logradas, superando la meta de la vigencia, dado a la efectividad en la gestión de alianzas por parte del equipo del C4RI y la estrategia de asegurar su continuidad y activación en los próximos años.

DE24BB Documentos de política elaborados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 390601600

Descripción B/P/S: Documentos generados que contienen lineamientos, normativas o recomendaciones para la formulación o ajuste de políticas públicas.

Observación B/P/S: Se generó el documento que contiene lineamientos, normativas y recomendaciones para la formulación y ajuste de políticas públicas.

Programa: 1.3.7 - Internacionalización para el desarrollo del Distrito

Proyecto: 240111 -Fortalecimiento a la gestión de atracción y retención de inversión nacional y extranjera en la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 96% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.446 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.146 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.026

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio para la formalización empresarial y de productos y/o Servicio				
DE11BA Empresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o formalización.	**Número**	**30**	**34**	**113%**

Código. Ind. SUIFP: 350201500

Descripción B/P/S: Nuevas inversiones y reinversiones nacionales y extranjeras realizadas para el desarrollo y la competitividad.

Observación B/P/S: Conforme a la adición presupuestal realizada por parte de la secretaría de desarrollo económico se pudo supera la meta con un avance de 34 proyectos de inversión y reinversión en la ciudad, con inversionistas de Puerto Rico, Colombia, Reino Unido, Nueva Zelanda, Brasil, Estados Unidos, Francia, Perú, Panamá, Ucrania, Países Bajos, Chile, Alemania, México y Canadá.

DE11BB	**Campañas realizadas**	**Número**	**2**	**2**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 350204600

Descripción B/P/S: Encuentros comerciales realizados con empresarios nacionales o internacionales.

Observación B/P/S: Se llevaron a cabo dos Ruedas de negocio: 1) Rueda de inversión de agronegocios, energía, infraestructura, salud y tecnología y 2) Rueda de negocio del sector creativo (audiovisual) con el apoyo de la Cámara de Comercio.

Proyecto: 240112 -Fortalecimiento a la gestión de financiación internacional del distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.210 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.210 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.210

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo para la transferencia y/o implementación de metodologías de aumento de la productividad				
DE12DA **Unidades productivas beneficiadas en la implementación de estrategias para incrementar su productividad**	**Número**	**24**	**25**	**104%**

Código. Ind. SUIFP: 350200900

Descripción B/P/S: Proyectos impactados por las acciones de cooperación para la ciudad y su área de influencia.

Observación B/P/S: De acuerdo a la gestión realizada por la entidad se impactaron 25 proyectos con acciones de cooperación en temas de desarrollo económico, sostenibilidad, educación social para el progreso con cooperantes como Fundación Sparkassenstiftung, embajada de Dinamarca, BID, Universidad de Alemania, KEITI (Korea Environmental Industry and Technology Institute), Vancouver Film School, Ayuntamiento de Barcelona, BID, ICETEX - Leading House, Metrópolis, Oracle, Corporación Región, Global Latam Partner de Founderz Emprendimiento S.L. (España) y Google

DE12DB	**Documentos de lineamientos técnicos elaborados**	**Número**	**15**	**20**	**133%**

Código. Ind. SUIFP: 350200200

Descripción B/P/S: Alianzas de financiación para el desarrollo concretadas a través de la firma de instrumentos de financiación para el desarrollo.

Observación B/P/S: De acuerdo a la gestión realizada por la entidad se tiene un cumplimiento del 133% con 18 alianzas con actores estratégicos como: Comfama, Municipalidad de Córdoba, DANE, SENATEC, IMPACT HUB, ACDI-VOCA, Fundación Sparkassenstiftung, Fundación Incolmotos, ayuntamiento de valencia, GGGI, GIZ y ACDI-VOCA

DE12DC	**Personas capacitadas**	**Número**	**10**	**13**	**130%**

Código. Ind. SUIFP: 350204500

Descripción B/P/S: Acciones de cooperación sur-sur en las cuales Medellín comparte sus buenas prácticas.

Observación B/P/S: Conforme a la adición presupuestal realizada por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, el logro definitivo es de 13, lo cual ayuda a promover la generación de agendas positivas, el intercambio de conocimientos y experiencias entre países: Ciudades de Brasil, México, Turquía, Ecuador, Honduras, República Dominicana, Chile, Tailandia.

DE12DD	**Campañas realizadas**	**Número**	**17**	**19**	**112%**

Código. Ind. SUIFP: 350204600

Descripción B/P/S: Aportes de paisas en el exterior, que contribuyan al fortalecimiento de las apuestas de desarrollo local.

Observación B/P/S: De acuerdo con las gestiones realizadas por la entidad, se tiene un cumplimiento de 19 aportes de conocimiento de antioqueños en el exterior a través de nuestra red Sos Paisa: con paisas de Singapur, Estados Unidos, Países Bajos, Valencia, España, Boston, Argentina, Alemania, Bélgica, China, Canadá, Francia. Se logró contar con un aporte adicional en esta vigencia

Programa: 1.3.8 - Desarrollo Rural Agropecuario

Proyecto: 240116 -Fortalecimiento de la extension agropecuaria en la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 91% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 978 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 983 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 895

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de extensión agropecuaria				
DE16BA Productores atendidos con servicio de extensión agropecuaria	**Número**	**400**	**467**	**117%**

Código. Ind. SUIFP: 170804100

Descripción B/P/S: Productores agropecuarios de los corregimientos de Medellín que participan en la ejecución del plan de extensión agropecuaria.

Observación B/P/S: Se logra una mayor atención de la demanda de productores que requieren servicios de extensión agropecuaria con la eficiencia de recursos del proyecto.

DE16BB Capacitaciones realizadas en extensión agropecuaria	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 170804700

Descripción B/P/S: Productores agropecuarios que se benefician de la transferencia de conocimiento del servicio de extensión agropecuaria.

Proyecto: 240117 -Implementación de emprendimientos y nodos agropecuarios rurales

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 88% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 93%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 504 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 507 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 497

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal en Buenas Prácticas Agrícolas y producción sostenible				
DE17BA Personas capacitadas	**Número**	**30**	**24**	**80%**

Código. Ind. SUIFP: 170203500

Descripción B/P/S: Emprendedores agropecuarios acompañados con formación administrativa y agroempresarial para el fortalecimiento de negocios agro.

DE17BB Asociaciones fortalecidas	**Número**	**2**	**2**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 170201100

Descripción B/P/S: Nodos agropecuarios que son acompañados con formación técnica, administrativa y comercial para el desarrollo de proyectos en modelos asociativos.

DE17BC Productores con transferencia de conocimiento en el uso de información comercial atendidos	**Número**	**30**	**24**	**80%**

Código. Ind. SUIFP: 170203900

Descripción B/P/S: Emprendedores agropecuarios acompañados en el desarrollo de capacidades para la comercialización y acceso a nuevos mercados.

DE17BD Sistema de información de alianzas productivas implementado	**Número**	**5**	**5**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 170203300

Descripción B/P/S: Proyectos agro que desarrollan sus negocios en redes sociales.

DE17BE Unidades productivas beneficiadas	**Número**	**30**	**24**	**80%**

Código. Ind. SUIFP: 170202100

Descripción B/P/S: Unidades productivas que agregan valor y consolidan sus negocios agropecuarios.

Observación Proyecto: Solo 24 agroemprendedores acompañados terminaron el proceso de intervención.

Proyecto: 240125 -Fortalecimiento de los mercados campesinos

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 96% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.450 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.654 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.369

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo a la comercialización de las cadenas agrícolas, forestales pecuarias, pesqueras y acuícolas				
DE25BA Cadenas productivas apoyadas	**Número**	**565**	**580**	**103%**

Código. Ind. SUIFP: 170910600

Descripción B/P/S: Productores agropecuarios de Medellín que participan directa o indirectamente en las estrategias y canales de comercialización de Mercados Campesinos.

Observación B/P/S: Vinculación de nuevos productores agropecuarios a las estrategias de comercialización de mercados campesinos.

DE25BB Plataformas logísticas entregadas	**Número**	**3**	**4**	**133%**

Código. Ind. SUIFP: 170907100

Descripción B/P/S: Estrategias y canales de comercialización ejecutados y sostenidos.

Observación B/P/S: Se sobre ejecuta la meta, debido a que se implementa la estrategia de comercialización "mercado institucional" de mercados campesinos.

Proyecto: 240126 -Implementación del programa agropecuario distrital

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 23% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 61%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.420 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 19.252 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.332

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo a la producción de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas				
DE26BA Cadenas productivas apoyadas	**Número**	**10**	**10**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 170910500

Descripción B/P/S: Rubros agropecuarios de Medellín que son apoyados con recursos del PAD para fortalecer la productividad y competitividad del sector.

DE26BB Cadenas productivas apoyadas	**Número**	**8**	**8**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 170910600

Descripción B/P/S: Proyectos del Programa Agropecuario Distrital - PAD ejecutados para fortalecer la productividad y competitividad agropecuaria de Medellín.

DE26BC Personas capacitadas con educación informal	**Número**	**750**	**779**	**104%**

Código. Ind. SUIFP: 170911700

Descripción B/P/S: Productores agrícolas, pecuarios y transformadores de Medellín que son beneficiados con recursos del PAD para fortalecer sus proyectos productivos.

DE26BD Documentos de lineamientos técnicos elaborados	**Número**	**750**	**809**	**108%**

Código. Ind. SUIFP: 170910400

Descripción B/P/S: Registros en la plataforma "Centro de Servicios Compartidos - CSC" de los productores agropecuarios que son beneficiados con recursos del PAD.

Observación Proyecto: La ejecución de los proyectos del Programa Agropecuario Distrital - PAD que se ejecutan con los recursos del Fondo Municipal de Asistencia Técnica Directa - FMATD se optimizaron en las diferentes convocatorias realizadas para fortalecer la productividad agropecuaria, beneficiando a más de 800 productores

Programa: 1.3.9 - La nueva ruralidad para la articulación urbano-rural

Proyecto: 240118 -Recuperación de los saberes ancestrales de los corregimientos del distrito de medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 400 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 400 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 400

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Serviciode divulgación y publicación del Patrimonio cultural				
DE18AA Publicaciones realizadas	**Número**	**10**	**10**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 330207000

Descripción B/P/S: Los eventos realizados, orientados a la recuperación y divulgación de los saberes ancestrales de cada uno de los corregimientos.

Proyecto: 240119 -Innovación y transformación para la nueva ruralidad en los corregimientos del distrito de medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 49% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 74%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 803 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 336 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 163

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de fortalecimiento de capacidades locales				
DE19CA Grupos fortalecidos	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 170203700

Descripción B/P/S: Grupo de agricultores y productores fortalecidos en los corregimientos del Distrito, con el monitoreo de las parcelas agrícolas.

DE19CB Organizaciones de productores formales apoyadas	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 170203800

Descripción B/P/S: Organizaciones productoras apoyadas para la comercialización - Centro de Abastecimiento Lusitania.

Observación Proyecto: Los compromisos relacionados, 104.480.000 corresponden a procesos de contratación para el mantenimiento eléctrico y de infraestructura, del Centro de Abastecimiento Lusitania, los cuales ya fueron adjudicados pero a la fecha no se han realizado los pagos.

Proyecto: 240120 -Desarrollo de acciones de articulación institucional en los corregimientos del distrito de medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 90% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 95%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.417 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.417 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.273

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de fortalecimiento de capacidades locales				
DE20BA Grupos fortalecidos	**Número**	**10**	**10**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 170203700

Descripción B/P/S: Intervención de grupos representativos de la comunidad y comunidad en general, en cada uno de los cinco (5) corregimientos.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.3 - Desarrollo económico, productividad y competitividad
Programa: 1.3.1 - Formación y empleo

Proyecto: 250025 -25pp99-formación para el trabajo de acuerdo a la demanda laboral para la población medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 29% **Ejec. Financiera :** 42% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 35%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 424 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 176

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral					
DE25CA	Personas formadas	Número	140	41	29%

Código. Ind. SUIFP: 360300200

Descripción B/P/S: Personas formadas en las siguientes líneas: habilidades digitales, Textil artesanal y diseño grafico, de las comuna 5, 9 y 90.

Observación B/P/S: A 30 de diciembre se cuenta con 41 personas certificadas logrando un 29% de la meta propuesta para la vigencia. El 71% restante requirió ampliación hasta 30 de marzo de 2026,por lo que el avance se reporta en el 2026.

Programa: 1.3.3 - Desarrollo empresarial

Proyecto: **250039 -25pp99-desarrollo de capacidades empresariales territoriales en medellín medellin**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 36% **Ejec. Financiera :** 95% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 65%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.280 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.156

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio para la formalización empresarial y de productos y/o Servicio					
DE39DA	Empresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o formalización.	Número	140	50	36%

Código. Ind. SUIFP: 350201500

Descripción B/P/S: Corresponde a los emprendedores acompañados pertenecientes a las comunas que priorizaron los recursos.

Observación B/P/S: La ejecución se amplia hasta la vigencia 2026, en donde se llegará al 100%

Observación Proyecto: El proyecto se encuentra en compras y entrega de incentivos a las empresas, pero aún no finaliza el proceso de intervención, por ello la ejecución financiera es superior a la física.

Programa: 1.3.8 - Desarrollo Rural Agropecuario

Proyecto: **250038 -25pp50-adecuación de unidades productivas que transforman alimentos de origen agropecuario medellin**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 75% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 38%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 960 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 720

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Infraestructura para la transformación de productos agropecuarios adecuad					
DE38CA	Infraestructura para la transformación de productos agropecuarios adecuada	Número	60	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 170905900

Descripción B/P/S: Unidades productivas agropecuarias que se adecuan para mejorar las capacidades de transformación de alimentos.

Observación B/P/S: La meta se logrará en la vigencia 2026. El contrato fue ampliado hasta abril de 2026.

Observación Proyecto: El contrato N°4600105765 de 2025 terminará su ejecución el 30 de abril de 2026. La meta se reportará en la próxima vigencia.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto:	**040493**	**-Apoyo a proyectos productivos poblacion desplazada**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 72	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0
Proyecto:	**210039**	**-21pp99-desarrollo de las capacidades empresariales territoriales, medellin**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 186	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 186
Proyecto:	**210081**	**-Fortalecimiento en tics para los productores rurales**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 532	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0
Proyecto:	**220034**	**-Fortalecimiento del agroturismo en los corregimientos de medellin**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 536	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto:	**200121**	**-Formación para la inserción laboral en sectores relacionados con la cuarta revolución industrial**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 181	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 175
Proyecto:	**200153**	**-Formación en un segundo idioma para el trabajo**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 309	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 309
Proyecto:	**230021**	**-24pp99-formación para el trabajo de acuerdo a la demanda laboral para la población**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 357	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 352
Proyecto:	**200129**	**-Desarrollo de estrategias en economía creativa**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 15	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 14
Proyecto:	**200150**	**-Fortalecimiento de procesos digitales en las mipyme**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 5	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 5
Proyecto:	**230022**	**-24pp99-desarrollo de capacidades empresariales territoriales en medellín**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 281	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 247
Proyecto:	**200140**	**-Renovación del modelo de negocios del banco de los pobres**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 159	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 159
Proyecto:	**200151**	**-Implementación de un sistema digital para el banco de los pobres**					
	Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 0	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0


Proyecto:	**200135**	**-Fortalecimiento de la estrategia acceso a mercados**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 237	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 222	
Proyecto:	**200084**	**-Desarrollo de estrategias de transformación económica para la cuarta revolución industrial**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 641	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 640	
Proyecto:	**200126**	**-Fortalecimiento de la estrategia de medellín digital**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 6	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0	
Proyecto:	**200132**	**-Implementación de centros de innovación especializados**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 125	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 123	
Proyecto:	**200155**	**-Generación de circuitos cortos de comercialización para productores rurales**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 68	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 65	
Proyecto:	**210080**	**-Fortalecimiento de las cadenas productivas y de valor de los productores rurales medellín**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 6	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 5	
Proyecto:	**200157**	**-Recuperación de la memoria histórica y la identidad campesina**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 43	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 43	
Proyecto:	**200158**	**-Implementación de los centros integrales de abastecimiento corregimentales**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 0	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0	


5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Proyecto:	**130621**	**-Mcv-administración fondo tic**					
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 42	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 19	


Secretaría de Innovación Digital


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2025

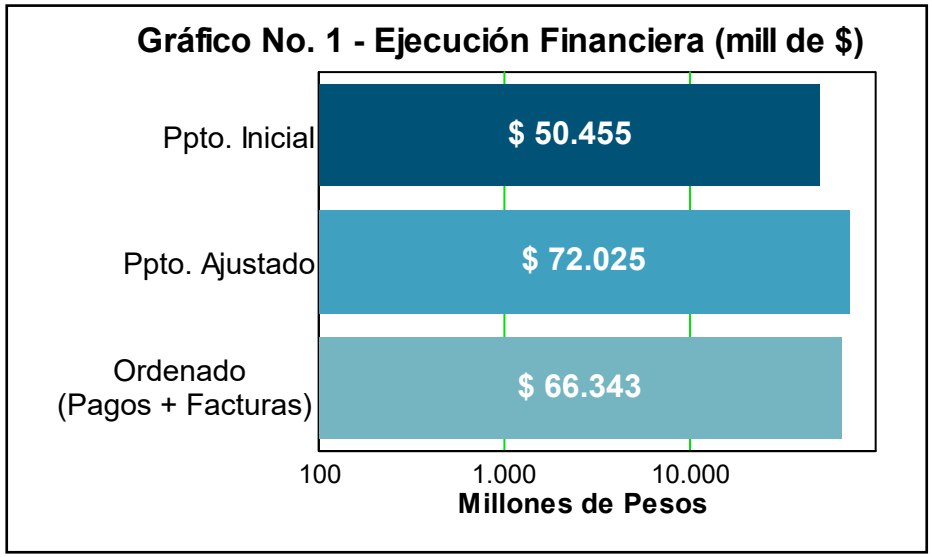


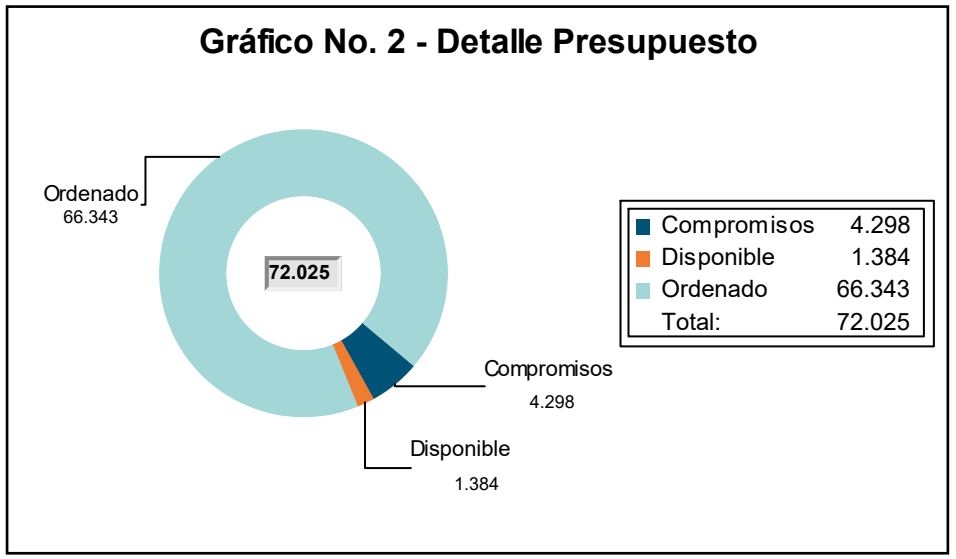

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre de 2025 comprende pagos y facturas

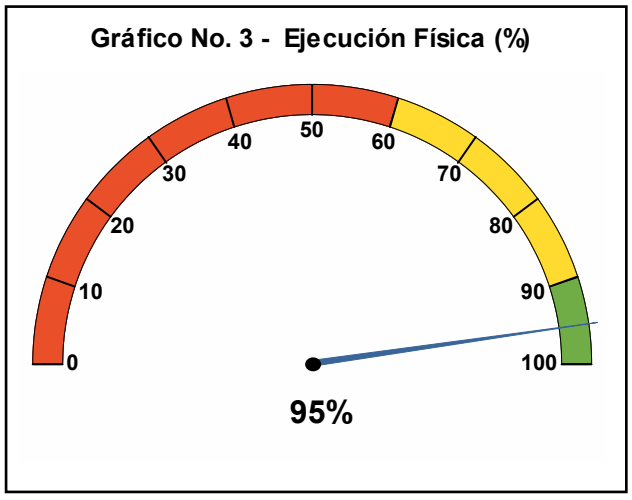

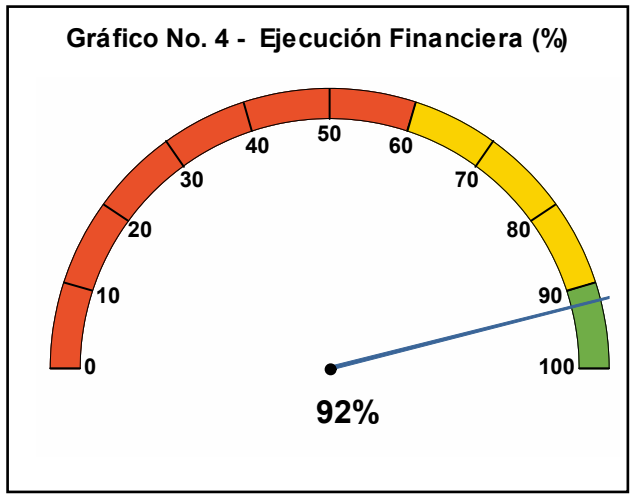

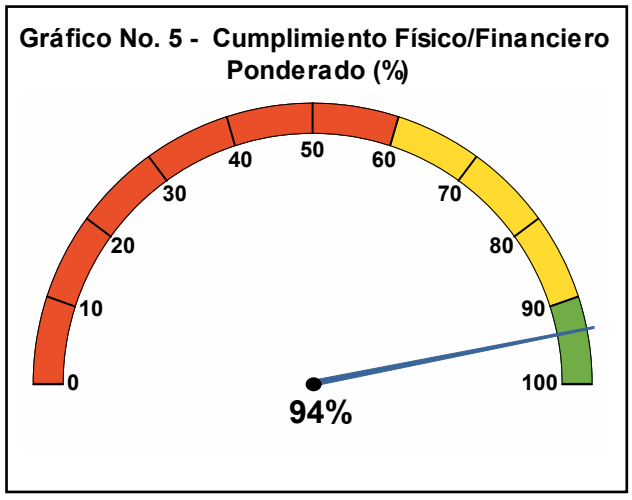

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.3 - Desarrollo económico, productividad y competitividad
Programa: 1.3.10 - Medellín Distrito inteligente

Proyecto: 240006 -Ampliación-de la infraestructura de conectividad a internet publico en la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 78% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 89%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.123 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.530

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de acceso zonas digitales				
ID06AA Zonas digitales instaladas	Número	410	410	100%

Código. Ind. SUIFP: 230107900

Descripción B/P/S: Corresponde al montaje y puesta en servicio de la zona digital (wifi).

Proyecto: 240335 -Fortalecimiento de los servicios tecnológicos del distrito de medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 93% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 29.239 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 43.189 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 40.216

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información actualizado				
ID35AA Sistemas de información actualizados	Número	2	2	100%

Código. Ind. SUIFP: 230107700

Descripción B/P/S: Sistemas de información actualizados, soportados y mantenidos de la plataforma TIC y de los aplicativos que administra la Secretaría de Innovación Digital, sobre la cual se soportan los diferentes servicios servicios tecnológicos que se prestan en el Distrito de Medellín para uso de sus servidores y la ciudadanía.

ID35AB Sistemas de información implementados	Número	2	2	100%

Código. Ind. SUIFP: 230107500

Descripción B/P/S: Sistemas de información implementados de la plataforma TIC y de los aplicativos que administra la Secretaría de Innovación Digital, sobre la cual se soportan los diferentes servicios servicios tecnológicos que se prestan en el Distrito de Medellín para uso de sus servidores y la ciudadanía.

Proyecto: 240337 -Implementación de los planes para la gestión documental y archivistica del distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 68% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 84%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.169 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.729 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.180

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información actualizado				
ID37AA Sistemas de información actualizados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 230107700

Descripción B/P/S: Corresponde al avance de las acciones ejecutadas en relación con la política de gestión documental y administración de archivos con el fin de tener la información, custodiada, preservada y disponible para la administración institucional y el servicio al ciudadano.

ID37AB	**Sistemas de información implementados**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 230107500

Descripción B/P/S: Comprende la medición porcentual de disponibilidad del servicio de gestión de las comunicaciones oficiales mediante el Sistema de Información Implementado.

Proyecto: 240338 -Implementación de las estrategias cti para un distrito inteligente

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 16.047 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 16.693 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 16.133

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de Información para la implementación de la Estrategia de Gobier digital				
ID38AA Herramientas tecnológicas de gobierno digital implemetadas	**Número**	**956**	**961**	**101%**

Código. Ind. SUIFP: 230208600

Descripción B/P/S: Nuevos conjuntos de datos que se integran en el repositorio centralizado (lago de datos) para consolidar la información relevante del Distrito de Medellín.

Observación B/P/S: Para el mes diciembre de 2025, se ha integraron el total de 5 nuevos conjuntos incorporados en el presente año a ochenta y dos (82). Con esta actualización, el acumulado general de conjuntos de datos integrados en el repositorio centralizado asciende a novecientos sesentay uno (961) para fortalecer y facilitar el acceso a la información pública del distrito. Los 5 nuevos conjuntos todos provenientes de la Secretaría de Inclusión Social y Familia no estaban planificados en la meta inicial.

ID38AB	**Productos digitales desarrollados**	**Número**	**5**	**5**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 230200300

Descripción B/P/S: Número de sistemas de información integrados utilizados en el Distrito de Medellín a partir del catálogo existente.

Observación B/P/S: Se incorporaron a la herramienta de inteligencia artificial 5 servicios del Distrito, incluyendo trámites de Hacienda (duplicado de documento de cobro, certificado de paz y salvo, informe de deuda y duplicado de industria y comercio), consultas de Inclusión Social (apoyos económicos de Presupuesto Participativo y Colombia Mayor) y servicios de Buen Comienzo y Educación como Busca tu Cupo. Con esta integración se logró ampliar significativamente el portafolio de funcionalidades disponibles en el asistente, fortaleciendo su capacidad para resolver necesidades reales de la ciudadanía. Estas soluciones permiten ofrecer atención más ágil, autónoma y accesible, facilitando la gestión de trámites públicos y mejorando la experiencia de servicio en el Distrito.

ID38AC	**Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 230210100

Descripción B/P/S: Implementación de una herramienta digital basada en inteligencia artificial (IA), diseñada para mejorar y optimizar la atención y servicios ofrecidos a los ciudadanos por parte del distrito de Medellín.

Observación B/P/S: Se implementó en un ambiente productivo controlado un asistente virtual con inteligencia artificial dentro de la plataforma Ciudadano 360, permitiendo validar su funcionamiento real con usuarios y procesos del Distrito. Con esta implementación se logró disponer de una herramienta moderna y automatizada que mejora la oportunidad y eficiencia en la atención ciudadana. Esta solución sirve para ofrecer una experiencia de servicio más cercana, accesible y personalizada para los ciudadanos de Medellín.

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 200329 -Fortalecimiento de la política de gobierno digital


Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.560 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.560


Proyecto: 200330 -Implementación de la estrategia de gobierno de datos de la ciudad

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 732 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 725


Secretaría de Turismo y Entretenimiento


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2025

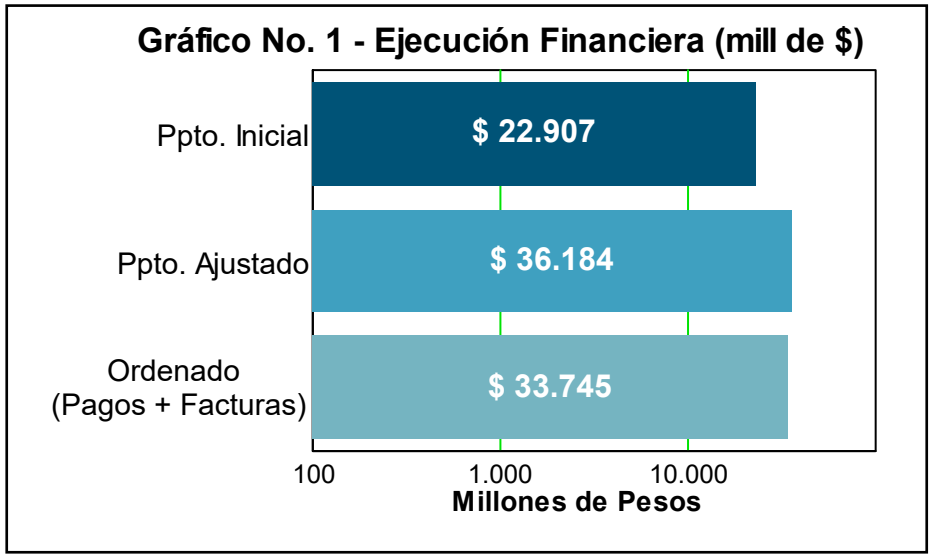


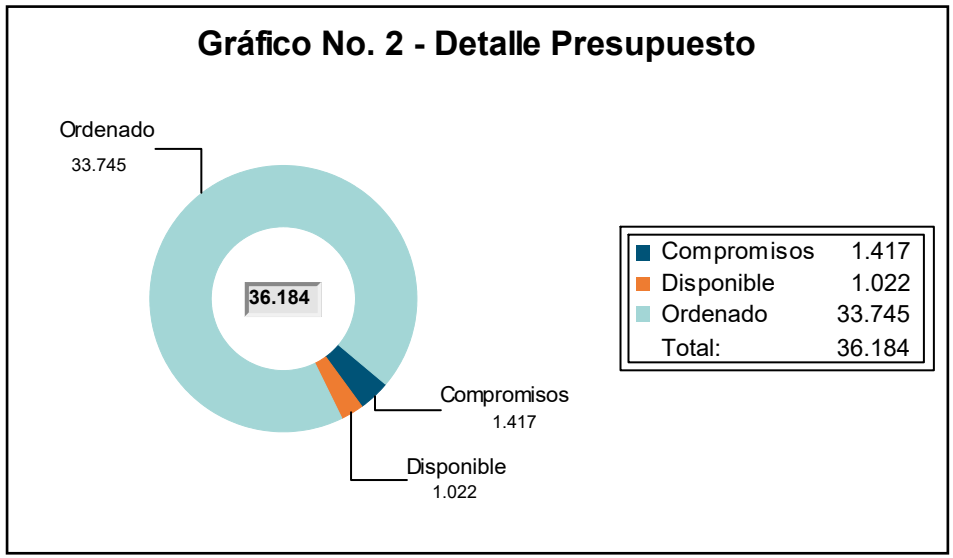

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre de 2025 comprende pagos y facturas

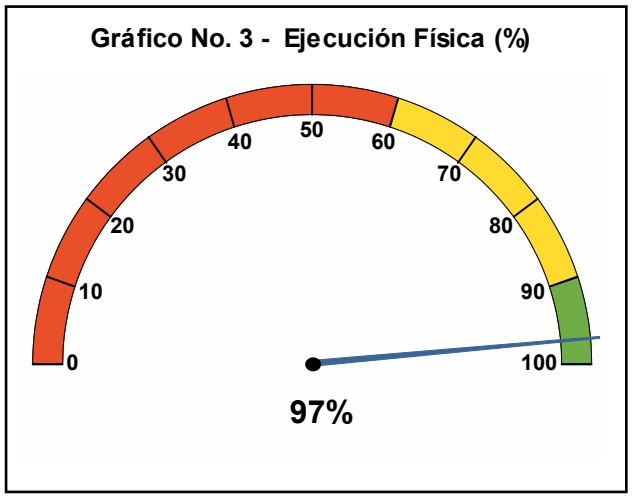

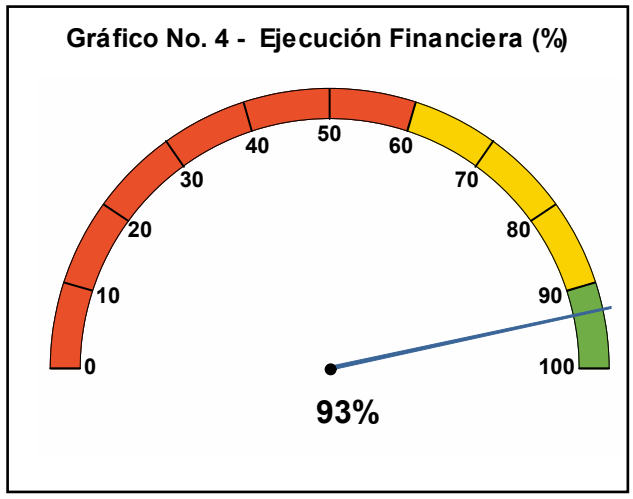

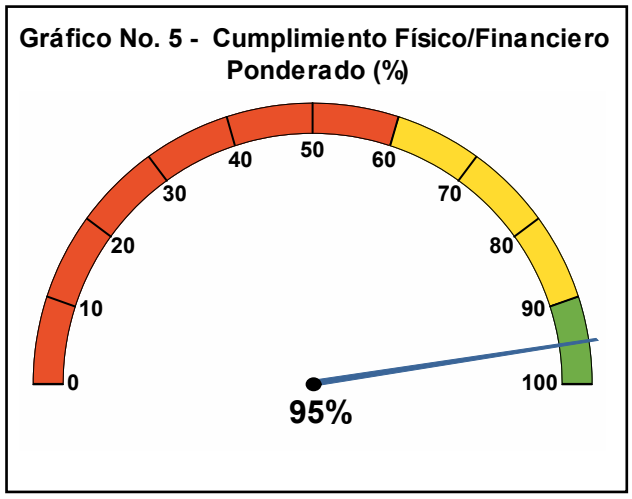

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.4 - Medellín, destino turístico y sostenible
Programa: 1.4.1 - Competitividad, control y gestión turística

Proyecto: 240285 -Fortalecimiento especializado y competitivo de las capacidades del sector turístico en medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 96% **Ejec. Financiera :** 93% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 95%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.400 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.900 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.638

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio para la formalización empresarial y de productos y/o Servicio				
TE85AA Empresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o formalización.	**Número**	**675**	**655**	**97%**

Código. Ind. SUIFP: 350201500

Descripción B/P/S: Corresponde a las empresas fortalecidas (operadores y prestadores de servicios turísticos y de la cadena de valor del Turismo) con ejercicios de formación, asistencia técnica, normativa y acompañamiento productivo y empresarial contribuyendo a incrementar sus niveles de competitividad.

Observación B/P/S: Se logró beneficiar con asistencia técnica en distintas temáticas empresariales a Operadores y Prestadores de servicios turísticos, quienes dinamizan la cadena de valor del turismo en el Distrito. Estas acciones le permiten al empresariado de la ciudad ver reflejado el pago de sus impuestos en la cualificación de su propio capital humano, trabajadores que en primera instancia nos permiten fidelizar y seguir enamorando a nuestros turistas.

TE85AB Personas capacitadas	**Número**	**553**	**1.228**	**222%**

Código. Ind. SUIFP: 350204500

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas capacitadas (empleados de empresas operadoras y prestadoras de servicios turísticos y de la cadena de valor del Turismo) con ejercicios de sensibilización e información, charlas sobre asuntos técnicos, normativos y acompañamiento productivo y empresarial contribuyendo a incrementar sus niveles de competitividad.

Observación B/P/S: Se superó la meta prevista para la vigencia con el desarrollo de procesos de capacitación al recurso humano de operadores y prestadores de servicios turísticos.

TE85AC Portales integrados	**Número**	**19**	**19**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 350209300

Descripción B/P/S: Corresponde a los portales que se integran al Sistema de Inteligencia Turística del Distrito, como fuentes de recopilación de información, fortaleciendo la data que se desarrolla en torno al Turismo y el Entretenimiento en la ciudad.

Observación B/P/S: Se avanzó con la modernización del SIT estipulada para la vigencia, logrando la integración de los diecinueve (19) portales en su operación. A la fecha se cuenta con un sistema cuya estructura de datos permite la recopilación de información estratégica, su análisis y publicación al alcance de todos. El proceso contractual con la Universidad EAFIT se ampliará garantizando operatividad y gestión durante los primeros meses del año 2026.

Observación Proyecto: El proyecto alcanzó un nivel de eficacia alto, considerando que sus tres valores estadísticos alcanzan el 96% en cumplimiento del logro, respecto a las metas establecidas para la vigencia. Se presentan algunos factores limitantes para el avance en el cumplimiento de las metas, asociados a la disponibilidad de recursos a partir del segundo semestre del año, lo cual concentró gran parte de su ejecución física en este periodo. Esto conllevo a generar acciones alternas como el uso de profesionales del contrato misional, entre tanto se iniciaban actividades con aliados estratégicos. Se mantuvo la coherencia entre los resultados y los objetivos definidos para el proyecto desde su formulación.

Proyecto: 240286 -Desarrollo de estrategias en turismo responsable y libre de delito en la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 96% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.500 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.397

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial				
TE86AA Personas beneficiadas	**Número**	**971**	**2.354**	**242%**

Código. Ind. SUIFP: 350201900

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas beneficiadas y sensibilizadas con información y procesos de mejora hacia una producción y servicio turístico sostenible, accesible, responsable y libre de delitos en el marco de la seguridad turística del Distrito, procesos organizativos, certificaciones, apertura de mercados y oportunidades tecnológicas.

TE86AB Empresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o formalización.	**Número**	**781**	**1.209**	**155%**

Código. Ind. SUIFP: 350201500

Descripción B/P/S: Corresponde a las empresas que son objeto de la promoción de la cultura de la formalidad, entendida más allá de la obligación de registro, como un medio de inclusión económica, ambiental y social de las empresas del sector turístico en los mercados, de la importancia estratégica de la sostenibilidad, accesibilidad, responsabilidad y seguridad turística del Distrito.

Observación Proyecto: El proyecto alcanzó un nivel de eficacia alto, considerando que sus dos valores estadísticos alcanzan el 100% en cumplimiento del logro, respecto a las metas establecidas para la vigencia. Se presentan algunos factores limitantes para el avance en el cumplimiento de las metas, asociados a la disponibilidad de recursos a partir del segundo semestre del año, lo cual concentró gran parte de su ejecución física en este periodo. Esto conllevo a generar acciones alternas como el uso de profesionales del contrato misional, entre tanto se iniciaban actividades con aliados estratégicos. Se mantuvo la coherencia entre los resultados y los objetivos definidos para el proyecto desde su formulación.

Proyecto: 240287 -Fortalecimiento de la infraestructura turística del distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 92% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.112 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.025

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Equipamientos turísticos dotados				
TE87AA Equipamientos dotados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 350211400

Descripción B/P/S: Corresponde a los equipamientos turísticos y/o dotación necesaria del Distrito para que la infraestructura turística o espacios de uso público en los atractivos turísticos del territorio puedan iniciar su funcionamiento y/o continuar su operación.

Observación B/P/S: Se logró avanzar en el fortalecimiento del atractivo turístico de la Comuna 3, denominado "Constelaciones El Macromural más grande de la ciudad de Medellín", a través de diversas acciones estratégicas orientadas a la implementación de un turismo social, comunitario y sostenible, basado en principios de calidad que garanticen su permanencia en el tiempo. Entre las acciones en curso se destaca la creación de un grupo primario, conformado como mesa de turismo con actores directos de la comunidad; la capacitación en temas clave como servicio al cliente, atractivos y recursos turísticos, storytelling, narrativas y contabilidad del negocio, entre otros; así como el acompañamiento, apoyo y fortalecimiento a los actores y negocios que integran la cadena de valor turística del territorio.

Observación Proyecto: El proyecto alcanzó un nivel de eficacia alto, considerando que su valor estadístico alcanzó el 100% de cumplimiento del logro, respecto a las metas establecidas para la vigencia. Se presentan algunos factores limitantes para el avance en el cumplimiento de las metas, asociados a la disponibilidad de recursos a partir del segundo semestre del año, lo cual concentró gran parte de su ejecución física en este periodo. Esto conllevo a generar acciones alternas como el uso de profesionales del contrato misional, entre tanto se iniciaban actividades con aliados estratégicos. Se mantuvo la coherencia entre los resultados y los objetivos definidos para el proyecto desde su formulación.

Programa: 1.4.2 - Promoción y mercadeo de ciudad

Proyecto: 240278 -Fortalecimiento de la promoción y mercadeo del distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 94% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 15.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 24.277 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 22.885

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción turística				
TE78AA Campañas realizadas	**Número**	**146**	**146**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 350204600

Descripción B/P/S: Corresponde a campañas de promoción y divulgación de los atributos diferenciadores del destino turístico, sus atractivos, promoción de productos, servicios y lugares turísticos, actividades para el posicionamiento del destino turístico, acciones de captación de eventos estratégicos para atracción de visitantes al destino, acciones para visibilizar la ciudad como destino turístico en espacios nacionales e internacionales incorporando estrategias tecnológicas.

Observación B/P/S: Se logró un avance importante en el cumplimiento de la meta prevista, considerando la inversión realizada con el apoyo del Aliado Bureau de Convenciones, se promocionó el Destino turístico como atractivo para la realización de congresos, ferias, convenciones, turismo vacacional, deportivo y de salud, con lo cual se contribuye a la sostenibilidad del flujo de llegada de visitantes en el mediano y largo plazo.

TE78AB Eventos de promoción realizados	**Número**	**39**	**39**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 350204602

Descripción B/P/S: Corresponde a los eventos realizados que se apoyen por su carácter estratégico para la promoción del destino turístico, sus atractivos, promoción de productos, servicios y lugares turísticos que se benefician por su realización. Son estratégicos por la posibilidad de atracción de visitantes que dinamizan la economía de la ciudad antes, durante y después de su realización.

Observación B/P/S: Se logró un avance importante en el cumplimiento de la meta prevista, considerando la inversión realizada con el apoyo del Aliado Bureau de Convenciones, se promocionó el Destino turístico como atractivo para la realización de congresos, ferias, convenciones, turismo vacacional, deportivo y de salud, con lo cual se contribuye a la sostenibilidad del flujo de llegada de visitantes en el mediano y largo plazo.

TE78AC Personas beneficiadas	**Número**	**2.912**	**5.716**	**196%**

Código. Ind. SUIFP: 350201900

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas beneficiadas y sensibilizadas con información referente al destino Turístico en el marco de la Promoción del destino, procesos de mejora hacia una producción y servicio turístico sostenible, accesible, responsable y libre de delitos en el marco de la seguridad turística del Distrito y su vinculación a las plataformas digitales como Medellín.Travel, lo cual permite el acceso a nuevos mercados y oportunidades de crecimiento en el mundo digital.

Observación B/P/S: Se supera la meta prevista para la vigencia beneficiando personas del sector turístico a través de la ejecución de recursos del contrato misional y los procesos desarrollados con aliados estratégicos como Bureau y Metroparques, se promovieron los valores asociados a nuestra marca de ciudad, el turismo responsable, sostenible, seguro y libre de delitos para propios y turistas.

Observación Proyecto: El proyecto alcanzó un nivel de eficacia alto, considerando que sus tres valores estadísticos alcanzan el 95% en cumplimiento del logro, respecto a las metas establecidas para la vigencia. No se presentaron elementos o factores limitantes para el avance en el cumplimiento de las metas. Se mantuvo la coherencia entre los resultados y los objetivos definidos para el proyecto desde su formulación.

Proyecto: 240288 -Consolidación del turismo cultural, espectáculo y entretenimiento

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 94% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.807 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.307 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.170

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción turística				
TE88AA Campañas realizadas	**Número**	**16**	**18**	**113%**

Código. Ind. SUIFP: 350204600

Descripción B/P/S: Corresponde a campañas de promoción del sector entretenimiento y divulgación de los atributos diferenciadores que tenga en la ciudad, promoción de productos en entretenimiento, servicios y lugares de interés cultural, entretenimiento y espectáculo, actividades para el posicionamiento del destino turístico como lugar privilegiado para la realización de actividades asociadas al entretenimiento, acciones de captación de eventos estratégicos para atracción de visitantes interesados en entretenimiento al destino, acciones para visibilizar la ciudad como destino eventos de entretenimiento para públicos nacionales e internacionales.

Observación B/P/S: Se superó la meta prevista en campañas realizadas para promocionar el Espectáculo y Entretenimiento de la Ciudad a través de la ejecución de recursos del contrato misional en lugares representativos del Distrito cuya orientación empresarial se articula con actividades de entretenimiento y espectáculo, promoviendo las mismas como responsables, sostenibles y libres de delito en el Distrito.

TE88AB Eventos de promoción realizados | **Número** | **5** | **21** | **420%**

Código. Ind. SUIFP: 350204602

Descripción B/P/S: Corresponde a los eventos realizados que se apoyen por su carácter estratégico para la promoción del destino como realizador de actividades asociadas al sector entretenimiento, como herramienta de divulgación de los atributos diferenciadores que tenga en la ciudad en los ámbitos del interés cultural, entretenimiento y espectáculo, la posibilidad de atracción de visitantes que dinamizan la economía de la ciudad antes, durante y después de su realización.

Observación B/P/S: Se cumple la meta prevista en términos de apoyo a eventos en Entretenimiento, el resultado es producto de la planificación oportuna de la inversión en articulación y gestión con los realizadores, se visibilizó la marca de ciudad en los espacios enfocados al entretenimiento y se promovió la realización de actividades de legado por parte de los realizadores y promotores de cada evento.

TE88AC Personas beneficiadas | **Número** | **146** | **474** | **325%**

Código. Ind. SUIFP: 350201900

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas beneficiadas y sensibilizadas con información referente al destino Turístico en el marco de la promoción de productos en entretenimiento, servicios y lugares de interés cultural, entretenimiento y espectáculo, actividades para el posicionamiento del destino turístico como lugar privilegiado para la realización de actividades asociadas al entretenimiento, así como los actores, empresarios y trabajadores del sector entretenimiento en la ciudad que sean objeto de intervención con acciones lideradas por el Distrito.

Observación B/P/S: Se supera la meta prevista de personas beneficiadas con la inversión, la estrategia desarrollada para el cumplimiento incluyó las acciones logradas a través del contrato misional, se visibilizó la marca de ciudad en los espacios enfocados al entretenimiento y se promovió la realización de actividades de legado por parte de los realizadores y promotores de cada evento y campaña de promoción.

Observación Proyecto: El proyecto alcanzó un nivel de eficacia alto, considerando que sus tres valores estadísticos alcanzan el 100% en cumplimiento del logro, respecto a las metas establecidas para la vigencia. No se presentaron elementos o factores limitantes para el avance en el cumplimiento de las metas. Se mantuvo la coherencia entre los resultados y los objetivos definidos para el proyecto desde su formulación.

Proyecto: 240289 -Fortalecimiento de la cultura turística del distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 94% **Ejec. Financiera :** 66% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 80%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 700 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 463

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción turística				
TE89AA Campañas realizadas	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 350204600

Descripción B/P/S: Corresponde a campañas de promoción de la Cultura Turística en el Distrito, tanto de los locales como de los visitantes promoviendo el respeto por la cultura, los lugares emblemáticos y las costumbres de la ciudad, campañas educativas para la difusión en medios de comunicación en plataformas digitales y puntos físicos. Sensibilización y apropiación de la Cultura Turística y la Marca de Ciudad.

Observación B/P/S: Se cumple la meta prevista con el apoyo de las actividades lideradas con los profesionales del contrato misional en la comuna 10 La Candelaria, se logró el objetivo de fortalecer la apropiación del territorio, la identidad local y el rol de la ciudadanía como anfitriona, mediante acciones de sensibilización, formación y recorridos experienciales enfocados en el reconocimiento de los atractivos turísticos del centro de la ciudad.

TE89AB Personas beneficiadas | **Número** | **1.213** | **1.057** | **87%**

Código. Ind. SUIFP: 350201900

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas que se benefician de las campañas de promoción de la Cultura Turística en el Distrito, tanto de los locales, actores del sector turístico, como de los visitantes promoviendo el respeto por la cultura, los lugares emblemáticos y las costumbres de la ciudad, de las campañas educativas para la difusión en medios de comunicación en plataformas digitales y puntos físicos. Sensibilización y apropiación de la Cultura Turística y la Marca de Ciudad.

Observación B/P/S: Se logró un avance importante en el cumplimiento de la meta prevista, con las actividades lideradas con los profesionales del contrato misional y un operador estratégico como lo fue la Biblioteca Pública Piloto cuya ejecución oriento la construcción de Vive El Poblado como estrategia de fortalecimiento, consolidación y promoción de la cultura turística de la Comuna.

Observación Proyecto: El proyecto alcanzó un nivel de eficacia alto, considerando que sus dos valores estadísticos alcanzan el 94% en promedio de cumplimiento del logro, respecto a las metas establecidas para la vigencia. No se presentaron elementos o factores limitantes para el avance en el cumplimiento de las metas. Se mantuvo la coherencia entre los resultados y los objetivos definidos para el proyecto desde su formulación.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.4 - Medellín, destino turístico y sostenible
Programa: 1.4.1 - Competitividad, control y gestión turística

Proyecto: **250052 -25pp03-desarrollo turístico del corredor de la carrera 45 de la comuna 3 25pp03 medellin**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 50% **Ejec. Financiera :** 80% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 65%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.094 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 875

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial				
TE52AA Personas beneficiadas	**Número**	**400**	**600**	**150%**

Código. Ind. SUIFP: 350201900

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas beneficiadas y sensibilizadas directa o indirectamente en el desarrollo del proyecto de inversión, en los procesos de mejora hacia un producto turístico sostenible, accesible, responsable y libre de delitos y como resultado de la vinculación a las plataformas digitales.

Observación B/P/S: Se superó la meta prevista para la vigencia con el Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial, beneficiando a personas que conforman los prestadores y operadores de servicios turísticos de la comuna 3 Manrique.

TE52AB Campañas realizadas	**Número**	**20**	**0**	**0%**

Código. Ind. SUIFP: 350204600

Descripción B/P/S: Corresponde a campañas de promoción y divulgación de los atributos diferenciadores del lugar a intervenir, sus atractivos, promoción de productos turísticos, actividades para el posicionamiento y atracción de visitantes, acciones para visibilizar dicho lugar incorporando estrategias tecnológicas.

Observación B/P/S: El Servicio de promoción turística, requiere de la información que se construye con el primer valor estadístico a través de la intervención de prestadores y operadores de servicios turísticos de la comuna 3 Manrique, por lo cual se encuentra en ejecución, sus resultados se estiman en el primer trimestre de 2026.

Observación Proyecto: El proyecto alcanzó un nivel de eficacia medio, considerando que sus dos valores estadísticos alcanzan el 75% en promedio de cumplimiento del logro, respecto a las metas establecidas para la vigencia. Se presentaron factores limitantes para el avance en el cumplimiento de las metas, dadas las dificultades que tiene el territorio para la construcción de productos turísticos validados, esto se presentó de forma simultánea a la importante definición del corredor turístico (Límite comuna 3 y 4) como lugar estratégico para el Distrito. Se mantuvo la coherencia entre los resultados obtenidos y los objetivos definidos para el proyecto desde su formulación, aunque con los factores evidenciados el valor estadístico TE52AB se aplazó (contractualmente) para 2026.

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: **200149 -Recuperación económica del sector turístico**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 168 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 166

Proyecto: **200148 -Desarrollo de estrategias de ciudad para transformarse en destino turístico inteligente**


Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 31 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 31


Proyecto: **230023 -24pp60-fortalecimiento de capacidades agro-ecoturísticas corregimiento 60**

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 94	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 94


Departamento Administrativo de Planeación


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2025

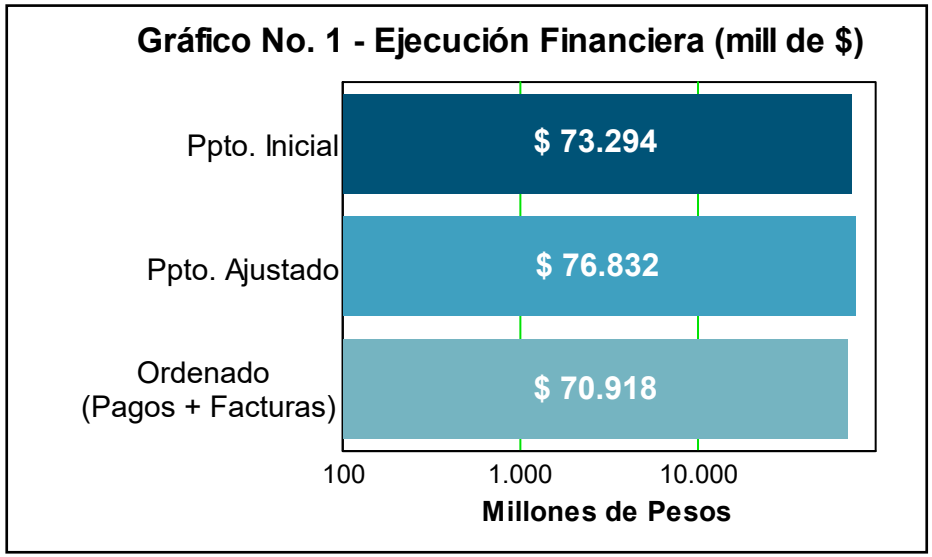


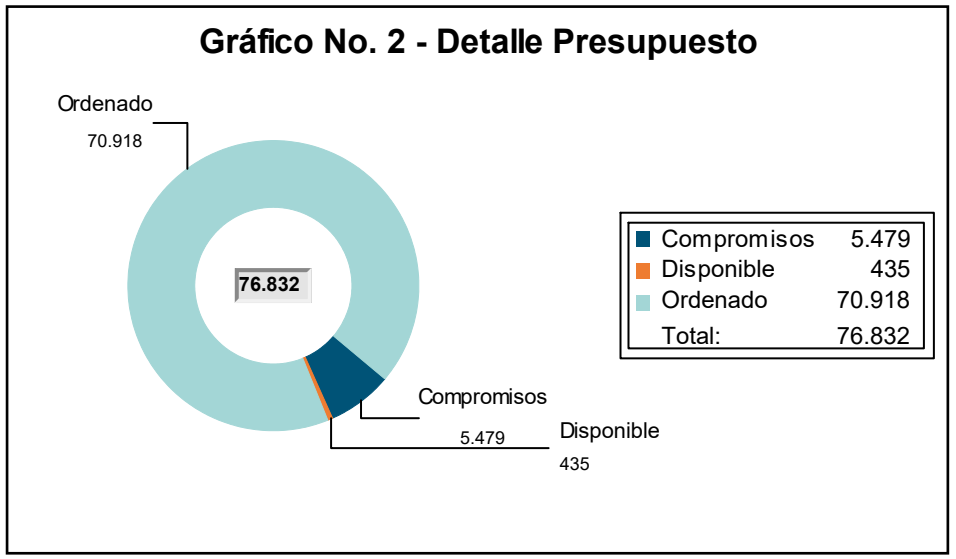

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre de 2025 comprende pagos y facturas

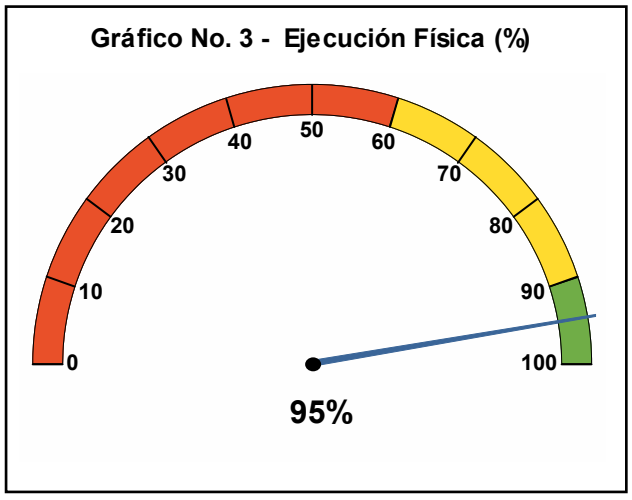

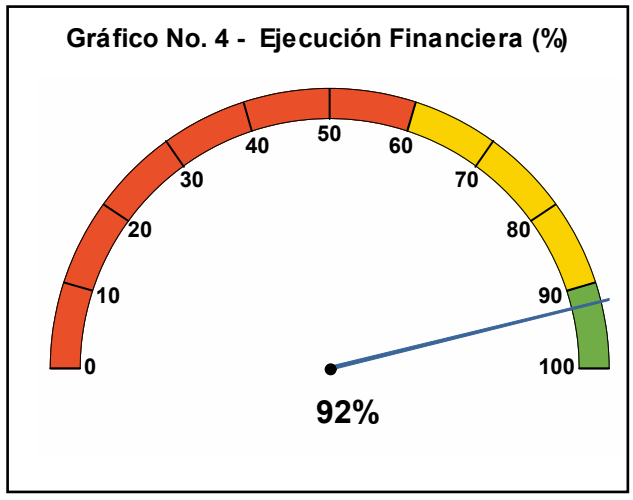

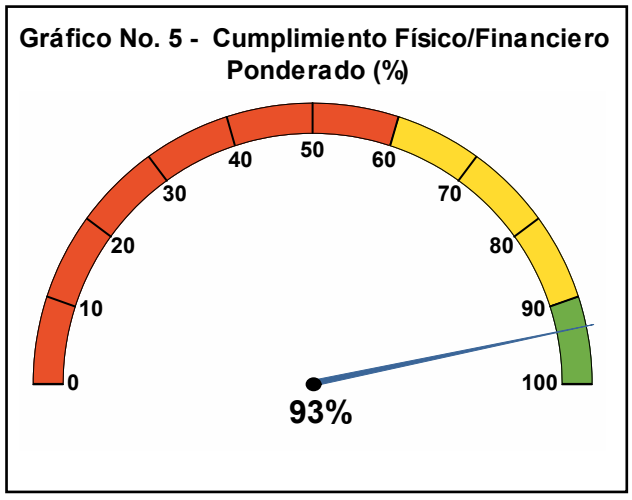

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito
Programa: 3.3.1 - Desarrollo y articulación de los instrumentos e instancias del Sistema Distrital de Planeación

Proyecto: 240313 -**Desarrollo de los instrumentos del sistema distrital de planeación social y económica**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.447 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.895 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.864

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
PL13BA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Dependencias de la alcaldía y entes descentralizados atendidos por el equipo de Inversión Publica y Banco de Proyectos. Documentos técnicos, metodológicos y de evaluación de la planeación social, económica y financiero elaborados e implementados.

Proyecto: 240314 -**Formulación de los planes de desarrollo local de las comunas y corregimientos del distrito**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 95% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.376 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.531 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.340

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación				
PL14BA Documentos de planeación realizados	**Número**	**8,8**	**8,8**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459901900

Descripción B/P/S: Planes de desarrollo local de comunas y corregimientos direccionados, técnica y metodológicamente en su formulación. Para el 2026 se realizará el desarrollo del componente estratégico de los 21 Planes de Desarrollo Local para la vigencia 2028-2040, realizando seguimiento y evaluación, equivalente al 42% de la formulación de los 21 PDL.

Programa: 3.3.2 - Gestión del Plan de Ordenamiento Territorial y sus instrumentos

Proyecto: 240012 -**Actualización y revisión del sistema de ordenamiento territorial del distrito**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 93% **Ejec. Financiera :** 95% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 94%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 20.681 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 26.285 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 25.027

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación				
PL12BC Documentos de planeación realizados	**Número**	**25**	**25**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459901900

Descripción B/P/S: Corresponde a los documentos Técnicos, estudios ambientales, urbanísticos, Informes de avance de la gestión del seguimiento y evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial.

Observación B/P/S: Corresponde al cumplimiento de la meta en documentos de estudios ambientales y urbanísticos, así como a los informes de avance de la gestión de seguimiento y evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), con corte al 31 de diciembre, de la siguiente manera: • Finalización de los 6 documentos ambientales sobre la estructura ecológica, los usos del suelo rural y las áreas de amenaza y riesgo. • Finalización de los 6 documentos sobre los sistemas público- colectivos, correspondientes a los subsistemas de espacio público de esparcimiento y encuentro, equipamientos colectivos, patrimonio cultural inmueble y movilidad. • Finalización de los 7 documentos del sistema de ocupación, relacionados con el subsistema habitacional, los usos del suelo, tratamientos urbanísticos, aprovechamientos y obligaciones urbanas y rurales, y densidades rurales, y de gestión de la calidad de la documentación producida como parte del seguimiento al POT. • Documentación de las Precisiones a la cartografía del POT, con la incorporación de los estudios detallados del AIE-Transversalidad La Iguaná, nueve polígonos del AIE-Transversalidad Santa Elena, el polígono El Pacífico y el polígono Ecoparque La Riviera II, documentados en las fichas sePOT 4227, 67AM, 5012 y 3932. • Documentación del Seguimiento y evaluación del POT en su vigencia de largo plazo, que incluye la estructuración de los contratos a desarrollarse en el marco del convenio interadministrativo con el AMVA, orientados a fortalecer dicho ejercicio. Este avance comprende la definición de la ruta metodológica, la elaboración del Plan Operativo de Inversiones y la definición y precisión de los alcances de los productos temáticos a nivel técnico en los sistemas físico-espaciales. • Elaboración de 4 documentos con los resultados de los estudios de caracterización de las dinámicas territoriales para el seguimiento y ajuste del POT, que incluyen: el análisis del territorio en sus componentes económico, social y cultural; la delimitación y caracterización de las zonas morfológicas homogéneas urbanas; el modelo multipropósito para el ordenamiento territorial del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín; y la actualización de los procesos que orientan la gestión del Sistema de Ordenamiento Territorial.

PL12BD	**Sistemas de información actualizados**	**Número**	**3**	**3**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Corresponde a informes de actualización de las herramientas tecnológicas.

Observación B/P/S: Corresponde al cumplimiento de la meta en los documentos de la siguiente manera: * Elaboración y entrega para validación del IGAC, de los productos cartográficos a partir de datos LiDAR y fotografías aéreas del Distrito Especial de Medellín. *Implementación y adaptación de la información del POT vigente al Modelo Extendido LADM_COL-POT. *Implementación tecnológica y despliegue del Modelo de capacidad de soporte "DENSURBAM"para definir la capacidad de soporte del Distrito de Medellín.

PL12BE	**Documentos normativos realizados**	**Número**	**3**	**2,4**	**80%**

Código. Ind. SUIFP: 459902100

Descripción B/P/S: Corresponde a los informes técnicos de avance sobre los documentos normativos y el acto administrativo.

Observación B/P/S: Representa el avance al 31 de diciembre en los documentos normativos, de acuerdo con el ajuste realizado al cronograma para la revisión del POT, en el que la terminación del proceso se dará en el año 2026; de la siguiente forma: 1. Publicación de la primera versión en la pagina web del documento de insumos técnicos para la revisión de mediano plazo del POT. 2. Primera versión de las fichas de Memoria justificativa para la revisión de mediano plazo del POT, las cuales serán validadas, ajustadas y publicadas en el primer semestre del año 2026. 3. Primera versión del Proyecto de Acuerdo con los ajustes al POT, ajuste al articulado, el cual será validado, ajustado y publicado en el primer semestre del año 2026 previo a la Consulta ciudadana.

Proyecto: 240308 -Desarrollo del expediente distrital del ordenamiento territorial

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 90% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 95%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 420 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 341 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 341

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de evaluación				
PL08AA Documentos de evaluación elaborados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459900100

Descripción B/P/S: Corresponde a informes de monitoreo y seguimiento a la ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial – POT de la presente vigencia.

Observación B/P/S: Se realizó el informe de monitoreo y seguimiento a la ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial – POT de la presente vigencia. Adicionalmente se presentó el informe ante el Concejo Distrital

PL08AB	**Sistemas de información implementados**	**Porcentaje**	**50**	**40**	**80%**

Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Corresponde a la herramienta tecnológica que permite la disposición de la información de manera accesible, confiable y oportuna del expediente distrital.

Observación B/P/S: Se desarrolló el documento de requisitos de la herramienta tecnológica y se tiene un borrador de los estudios previos a la contratación; no obstante, se suspendió la actividad como resultado de los avances en la revisión y ajuste del POT, que señalan la necesidad de redefinir el alcance y contenidos de la herramienta tecnológica para el Expediente Distrital; adicionalmente otros estudios contratados para esta revisión y ajuste pueden aportar elementos para la redefinición de requisitos o modificar la solución esperada

Proyecto: 240318 -Analisis y atención de solicitudes en la aplicación de la normatividad del pot

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.352 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.817 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.817

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
PL18CA Documentos de lineamientos técnicos realizados	**Número**	**3.500**	**5.823**	**166%**

Código. Ind. SUIFP: 459901800

Descripción B/P/S: Corresponde a aprobaciones de estudios de movilidad, diseño viales, diseños de espacios públicos, informativo de vías obligadas, conceptos de usos de suelo y zonas de riesgos.

Observación B/P/S: Corresponde a las respuestas emitidas en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre tal y como se relaciona a continuación: - 457 respuestas a requerimientos de información y conceptos técnicos referentes a proyectos estratégicos de obra pública. Responsable: Unidad de Proyectos Estratégicos. - 5366 respuestas a requerimientos de información y conceptos técnicos referentes a proyectos privados. Responsable: Unidad de Atención y Aplicación de la Norma Urbanística.

PL18CB Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	**Número**	**18**	**33**	**183%**

Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Corresponde a actas de reuniones técnicas llevadas a cabo con las diferentes entidades públicas o privadas y/u oficios de respuesta a requerimientos técnicos, realizados por las mismas

Observación B/P/S: En el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2025 se han asesorado 33 entidades y dependencias públicas, en el marco de la aplicación normativa y la asesoría sobre la formulación y diseño de proyectos de obra física de carácter público.

Proyecto: 240319 -Asistencia tecnica para la apropiación de la política pública de protección a moradores y actividades económicas y productivas en el distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 250 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 225 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 225

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos normativos				
PL19BA Documentos normativos elaborados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 400300500

Descripción B/P/S: Documento proyecto de decreto adoptado que modifica la reglamentación de la PPPMAEP.

Observación B/P/S: A 31 de octubre del 2025, se construyó el proyecto de decreto que modificará el Decreto 818 de 2021, el cual se encuentra en proceso de adopción.

PL19BB Asistencias técnicas realizadas	**Número**	**5**	**13**	**260%**

Código. Ind. SUIFP: 400305500

Descripción B/P/S: Acciones de asesoría, asistencia y acompañamiento técnico a las instituciones públicas que conforman el conglomerado y de la comunidad en general para la implementación de la PPPMAEP.

Observación B/P/S: En el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2025, se realizó asistencia a la Secretaría de infraestructura para socialización de la Política Pública y a la EDU para la implementación de la Política Pública de protección a moradores en los nuevos proyectos de desarrollo urbano del Distrito. Durante el último trimestre, se realizó asistencia técnica a medio ambiente para intervenciones en el territorio.

PL19BC	**Documentos de planeación elaborados**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 400300600

Descripción B/P/S: Documento técnico de seguimiento de implementación de la PPPMAEP.

Observación B/P/S: Se desarrolló un informe con las acciones realizadas enmarcadas en las mesas de trabajo, asesorías y asistencias técnicas a actores para la implementación y apropiación de la Política Pública.

Proyecto: 240320 -Formulación de los instrumentos de planificación complementaria del pot en el distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 7.372 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.033 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.033

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
PL20CA **Documentos de lineamientos técnicos elaborados**	**Número**	**10**	**21**	**210%**

Código. Ind. SUIFP: 400201500

Descripción B/P/S: Documento técnico de seguimiento de implementación de la PPPMAEP.

Observación B/P/S: Entre enero a diciembre de 2025, se desarrollaron los siguientes documentos: 1. Documento técnico de soporte y proyecto de decreto adoptado de la modificación (Decreto 472 de junio de 2025) de los planes parciales del Macro rio Sur: Barrio Colombia, Campo amor y Campo amor cristo Rey. (2 documentos) 2. Memoria justificativa de modificación al Plan parcial Altos del poblado y Proyecto de decreto adoptado (Decreto 0530 de 2025). (2 documentos) 3. Memoria justificativa y Decreto para la ampliación de vigencia del Plan Parcial el vergel (2 Documentos). 4. Memoria justificativa y proyecto de Decreto para la modificación para ampliación de vigencia del Plan Parcial La Asomadera (2 documentos) 5. Documento técnico de soporte y proyecto de decreto para ampliación de vigencia de los Plan Parcial Carabineros (2 documentos) 5.Memoria justificativa y proyecto de Decreto para para ajustar redelimitación de unidades actuación urbanística de los planes parciales San lorenzo y San Benito (4 documentos) 6. Se realizó el diagnóstico del Macroproyecto del Borde Noroccidental. (1 documento) 7. Se realizó el diagnóstico del Macroproyecto del Borde Nororiental. (1 documento) 8. Se avanzó en el proceso de formulación y adopción del Plan maestro El Castillo 9. Se avanzó en el documento de diagnóstico de los Planes de legalización y regularización: PLRU SC_CN3_21 Zona 1 (Balmoral- Caracolí), PLRU Centro oriental Z3_CN3_5 (Pedregal Alto) y PLRU La libertad Enciso - El pinal (3 documentos) 10. Documento de diagnóstico de los planes parciales Indural Globo 4 - San Germán y San Luis (2 Documentos)

PL20CB	**Documentos de planeación elaborados**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 400201600

Descripción B/P/S: Documentos técnicos de las acciones realizadas por el centro de atención especializada del Distrito de Medellín, a proyectos de desarrollos urbanísticos registrados para la implementación de instrumentos planificación del POT.

Observación B/P/S: Se cuenta con informe de las gestiones y orientaciones desarrolladas por el centro especializado de atención a proyectos urbanísticos públicos y privado con el fin de promover el proceso de transformación del Distrito según la planeación del territorio

Proyecto: 240322 -Implementación de instrumentos de financiación e intervención del suelo del pot en el distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 65% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 83%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.617 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.897 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.241

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
PL22CA **Documentos de lineamientos técnicos elaborados**	**Número**	**6**	**6**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 400201500

Descripción B/P/S: Corresponde a los documentos técnicos de instrumentos ya adoptados y/o documentos técnicos para la formulación y adopción de instrumentos de gestión del POT a ser ajustados - modificados.

Observación B/P/S: De enero a diciembre de 2025, se avanzó en los siguientes documentos: 1. El reporte corresponde al documento técnico de soporte para la modificación del Acuerdo 58 de 2008 - Estatuto de Valorización. 2. Documento técnico de metodológico para la priorización de polígonos para la aplicación del desarrollo prioritario. 3.Documento de Formulación para la modificación del Decreto 2229 de 2019 correspondiente al aprovechamiento económico del espacio publico 4. Elaboración de documento inicial de diagnóstico para la creación del Fondo de Gestión y Financiación del POT. 5. Documento de lineamientos técnicos de fuentes alternativas de financiación del Ordenamiento Territorial. 6. Documento metodológico con los criterios de priorización para la implementación del PSA en la modalidad del carbono y reducción de gases de efecto invernadero

PL22CB	**Documentos de planeación elaborados**	**Número**	**6**	**7**	**117%**

Código. Ind. SUIFP: 400201600

Descripción B/P/S: Documentos de seguimiento a la implementación de instrumentos de gestión del POT. Documento de seguimiento y gestión en el proceso de acompañamiento al Consejo de Direccionamiento Estratégico y su comité de POT.

Observación B/P/S: Entre enero y diciembre de 2025, se desarrollaron los siguientes documentos técnicos: 1. Informe de seguimiento del Sistema de Equidad territorial, en el cual se le hacen seguimiento a la formulación, adopción e implementación de los instrumentos de gestión complementarios al POT, implementación de la Política Pública de Protección a Moradores y decisiones de gran relevancia del CDE, vigencia 2024. 2. Informe de seguimiento del CDE, correspondiente a la vigencia 2024. 3. Informe técnico del cumplimiento en dinero de las Obligaciones urbanísticas 4. Documento Metodológico para la creación de Banco de programas POT y metodología de priorización para su financiación y gestión. 5. Fichas técnico/normativa de los instrumentos de financiación. 6. Informe técnico/urbanístico del proyecto circunvalar occidental. 7. Análisis comparativo de aplicabilidad de instrumentos en ciudades de América Latina para el desarrollo urbano

Proyecto: 240323 Implementación del patrimonio cultural inmueble en el distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.236 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.112 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.112

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos					
PL23AA	**Documentos de lineamientos técnicos realizados**	**Número**	**5**	**5**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459901800

Descripción B/P/S: Da cuenta del avance en los documentos que soportan la gestión del Subsistema de patrimonio cultural inmueble en cuanto a : 1_Asesorias, conceptos técnicos e informes básicos para la gestión del subsistema de patrimonio cultural inmueble del Distrito Especial de Medellín. 2_ Avance en la gestión de la lista de Bienes de Interés Cultural y la Lista Indicativa de Candidatos de Bienes de Interés Cultural. 3_Avanve en el análisis y gestión para la suscripción de convenios de exención de impuesto predial. 4_Avance en el seguimiento y la evaluación del POT. 5_ Avance en la identificación y estandarización de procedimientos y metodologías para la gestión del subsistema de patrimonio cultural inmueble

Observación B/P/S: Corresponde al cumplimiento de la meta asociada a los documentos de lineamientos técnicos, con el avance en el periodo entre el 31 de octubre y el 31 de diciembre de 2025, según el siguiente detalle: Documento 1: Se culminó con la atención de 35 conceptos técnicos, 34 asesorías presenciales y la elaboración de 3 informes técnicos. Documento 2: Se generaron los soportes técnicos para la gestión de la lista LICBIC, se finalizaron los expedientes técnicos del proceso de nueva declaratoria y se elaboró el documento compilatorio de las capacitaciones desarrolladas durante el año. Documento 3: Se atendieron 3 solicitudes de convenios y 5 solicitudes de autorización de proyectos de intervención. Documento 4: Se cumplieron los compromisos relacionados con la revisión de mediano plazo del POT, así como con los procesos de cartografía y sostenibilidad. Documento 5: Se finalizó el análisis y la gestión de 3 procedimientos técnicos.

PL23AB	**Documentos normativos realizados**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902100

Descripción B/P/S: Corresponde a los actos administrativos como resoluciones, decretos referidos al subsistema de patrimonio cultural inmueble.

Observación B/P/S: El cumplimiento de la meta anual se logra con los avances logrados durante el periodo comprendido entre el 31 de octubre y el 31 de diciembre, mediante la proyección de insumos para el proceso de declaratoria del Puente Colgante, en el corregimiento de San Cristóbal; la elaboración del documento de investigación de antecedentes para dicha declaratoria; y la proyección del normograma orientado a la adecuada compilación y organización de la base jurídica del subsistema de Patrimonio Cultural Inmueble del Distrito.

PL23AC	**Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Refleja el avance en el proceso de planteamiento interno para la creación del sistema distrital de patrimonio, así como la articulación con otras dependencias que tienen competencias sobre el patrimonio en la ciudad de Medellín, con el fin de asegurar su adecuada gestión.

Observación B/P/S: Se cumple la meta del año 2025, con la elaboración de un documento base que servirá para realizar socializaciones con las demás dependencias. Este insumo será fundamental para el proyecto de la Secretaría de Cultura, orientado al Plan Estratégico de Patrimonio Cultural.

Proyecto: 240333 -Fortalecimiento de la gestión documental de las licencias urbanísticas para planificación del ordenamiento territorial

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.200 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.131

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información actualizado				
PL33BA Sistemas de información actualizados	**Número**	**2**	**2**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Corresponde a 2 sistemas de información actualizados VISOR 360 y FUID, los cuales son el eje del proceso de gestión documental de licencias urbanísticas y se tienen las respectivas evidencias, a través de los diferentes reportes mensuales.

PL33BB Sistema de gestión documental implementado	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459901700

Descripción B/P/S: Corresponde al proceso de almacenaje y custodia de los expedientes de licencias urbanísticas desde 1.930 a la fecha, a través del proceso de conservación y preservación del 100% de los expedientes recepcionados en el Departamento Administrativo de Planeación y remitidos por las Curadurías del Distrito.

Programa: 3.3.5 - Direccionamiento estratégico para la transición a Distrito

Proyecto: 240307 -Desarrollo del direccionamiento metodológico para la transición a distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 596 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 596 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 576

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de evaluación				
PL07BA Documentos de evaluación elaborados	**Número**	**2**	**2**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 390500300

Descripción B/P/S: Documentos técnicos en donde se realiza el seguimiento y la evaluación del proceso de implementación del plan de transición al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación

Observación B/P/S: Hace referencia a los informes de gestión realizado para la vigencia 2024 y el informe de gestión proyectado 2025

PL07BB Documentos de lineamientos técnicos realizados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 390500600

Descripción B/P/S: Documentos técnicos cuyo objetivo es orientar el seguimiento, la implementación, o posible ajuste al plan de transición a Distrito.

Observación B/P/S: Corresponde al documento técnico del seguimiento al Plan de Transición a 2025

PL07BC Asistencias técnicas realizadas	**Número**	**4**	**4**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 390500500

Descripción B/P/S: Corresponde a la planeación y asistencia técnica especializada para la operación y funcionamiento del Organismo Asesor, durante las sesiones ordinarias de la vigencia 2025.

Observación B/P/S: El avance corresponde al ejercicio de planeación y estructuración de contenidos para las sesiones ordinarias de organismo asesor realizadas el 27 de marzo, 05 de agosto, 22 de septiembre y diciembre de 2025

Proyecto: 240334 -Administración del direccionamiento estratégico del distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.109 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.787 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.786

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación				
PL34AA Planes estratégicos elaborados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459901901

Descripción B/P/S: Implementación del direccionamiento y lineamiento de los planes estratégicos del DAP en la vocación distrito desde lo social, territorial y prospectivo.

PL34AB Documentos metodológicos realizados	**Número**	**2**	**2**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902000

Descripción B/P/S: Plan Anual de Adquisiciones implementado y en ejecución y seguimiento del direccionamiento jurídica de los procesos misionales del DAP.

Programa: 3.3.6 - Prospectiva de ciudad basada en el aprovechamiento de los datos, la analítica y la gestión del conocimiento

Proyecto: **240306 -Administración de la información para la focalización y clasificación socio económica del distrito**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 68% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 84%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 11.614 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 10.750 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.264

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información actualizado				
PL06BA Sistemas de información actualizados	**Número**	**12**	**12**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: El indicador está expresado en virtud de la entrega mensual de las bases de datos certificadas y actualizadas a los programas sociales, dado que es el fin principal de la base del Sisbén es la clasificación socioeconómica. Cada una de las doce bases de datos se actualizan a través de los trámites atendidos. Los cuales requieren en la mayoría de los casos aplicación de encuestas en las unidades de vivienda del ciudadano o la actualización de la información desde los puntos de atención a la ciudadanía a través del software dispuesto por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Observación B/P/S: En fase de demanda, con corte al 31 de diciembre se realizaron 69.151 encuestas. Con esa cantidad de encuestas finaliza de manera satisfactoria la décimo segunda base de datos actualizada por año, que a su vez se consolida en una sola anualizada; cumpliendo así las metas del indicador.

Proyecto: **240309 -Desarrollo del marco de referencia geoespacial distrital**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 92% **Ejec. Financiera :** 91% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 91%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.515 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.479 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.344

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
PL09BA Dependencias asistidas técnicamente	**Número**	**2**	**2**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459903102

Descripción B/P/S: Número de dependencias nuevas que aportan servicios geográficos dispuestos para grupos de interés.

Observación B/P/S: Se incorpora la Secretaria de Seguridad y Convivencia como nueva dependencia aportante de datos mediante el servicio de mapa privado y la aplicación correspondientes para las zonas de restricción definidas en el decreto 044 de 2024.

PL09BB Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	**Porcentaje**	**20**	**15**	**75%**

Código. Ind. SUIFP: 459900700

Descripción B/P/S: Porcentaje de avance en el fortalecimiento de los instrumentos de disposición de información geográfica (GeoMedellín, Banco de Imágenes, Mapas Medellín o Catálogo Geográfico)

Observación B/P/S: El contrato 4600104913 permanece suspendido. Se proyecta su reanudación para enero de 2026, una vez la plataforma tecnológica se encuentre estable y sea posible realizar el despliegue en ambiente de pruebas y productivo lo que implica un cronograma de trabajo de aproximadamente 40 días. Para la correspondiente vigencia se alcanza una ejecución del 75% del contrato.

PL09BC	**Sistemas de información implementados**	**Número**	**2**	**2**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Número proyectos formulados de análisis geográficos que permitan detectar patrones, tendencias y correlaciones de los datos.

Observación B/P/S: Se desarrollaron dos iniciativas: 1- Monitoreo del territorio: permite comprender la transformación del distrito, integrando en el análisis dinámicas poblacionales y cambios en la cobertura del suelo e incorporando el índice de Moran sobre mallas hexagonales, con lo cual se identifican focos reales de expansión urbana, habilitando una herramienta escalable y estratégica para anticipar tendencias y fortalecer la planeación urbana basada en datos. 2- Desarrollo urbano a partir del espacio público: desarrolla una metodología basada en análisis geográfico para priorizar la inversión en espacios públicos, integrando variables sociales, ambientales, territoriales y económicas mediante un análisis multicriterio. Para lo cual se planteó el Índice de Desarrollo Urbano a partir del Espacio Público (IDUEP), un indicador sintético que permite identificar desigualdades territoriales, con el propósito de apoyar la focalización de intervenciones y de orientar la inversión pública de forma eficiente.

Proyecto: 240310 -Fortalecimiento de los observatorios y unidades de gestión del conocimiento

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 196 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 136 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 136

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica					
PL10BA	**Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente**	**Número**	**10**	**10**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Por medio de profesionales contratistas con experiencia en diversas temáticas de desarrollo y de ciudad, se brindará acompañamiento técnico a por lo menos 11 Secretarías o dependencias, a fin de fortalecer los procesos de seguimiento y evaluación de políticas públicas; creación de observatorios o formulación de proyectos de investigación en política pública.

Observación B/P/S: El Observatorio de Políticas Públicas del Distrito realizó el acompañamiento técnico a nueve(9) dependencias del Distrito para la formulación de políticas públicas, diseño del modelo de seguimiento, creación de observatorios y prediseños de evaluación, en el marco de los procedimientos establecidos.

PL10BB	**Documentos de investigación elaborados**	**Número**	**2**	**2**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902600

Descripción B/P/S: Se desarrollarán y publicaran, en medios oficiales del Distrito o en otros medios de divulgación académica, al menos cuatro documentos de calidad técnico/académica asociados a algunos de los ejercicios de investigación, seguimiento o evaluación de políticas públicas, ejecutados dentro del Observatorio de Políticas Públicas.

Observación B/P/S: Se elaboraron dos (2) documentos relacionados con el avance de la evaluación de la agenda 2030 Medellín y la evaluación de la política pública familia.

Proyecto: 240311 -Fortalecimiento en la gestión, evaluación y aprovechamiento de datos para la planeación del distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.426 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.817 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.782

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documento para la planeación estratégica en TI					
PL11BA	**Documentos para la planeación estratégica en ti**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459900500

Descripción B/P/S: Se refiere a la creación y/o actualización de documentos asociados al gobierno de datos del DAP (Procesos de Información, Catálogo de datos, Calidad de datos, Seguridad de datos)

Observación B/P/S: Se construyó y se publicó en Isolución el Documento Especifico DE-GINF 060 que contiene los procesos de Información de la Subdirección de Prospectiva Información y Evaluación Estratégica. Se consolidó el Catálogo de datos que contiene los metadatos y los diccionarios de datos de la Subdirección de Prospectiva Información y Evaluación Estratégica dichos documentos fueron aprobados por los líderes de las unidades de trabajo. Se participó en mesas técnicas con la Secretaria de Innovación Digital donde se revisó la propuesta de política, decreto y modelo de Infraestructura de datos, desde el DAP se brindaron observaciones.

PL11BB	**Sistemas de información actualizados**	**Número**	**1**	**1**	**100%**
	Código. Ind. SUIFP: 459902800				

Descripción B/P/S: Se refiere a la estructuración de la base de datos que consolida la información de la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica y la creación de interfaces para la disposición y/o carga de información actualizada

Observación B/P/S: Se realizó el diagnostico de la base de datos en Postgres y se comenzó a integrar la información del DAP. A la fecha se ha modelado e insertado los datos de Plan de Acción, Inversión pública, Plan Indicativo, Gran Encuesta Integrada de Hogares(GEIH), Proyecciones de Población POAI. Además, se creó la interfaz de captura, integración y transformación de los datos provenientes de Puntos de Prestación de Servicios(PPS) para centralizar la información en el modelo de datos del DAP y ser utilizado para consumo en tiempo real de tablero de BI.

PL11BC	**Sistemas de información implementados**	**Número**	**1**	**1**	**100%**
	Código. Ind. SUIFP: 459902500				

Descripción B/P/S: Corresponde a la construcción de modelos y/o tableros de analítica automatizados en la arquitectura de datos del Distrito que permitan detectar patrones, tendencias y correlaciones, como apoyo a la toma de decisiones.

Observación B/P/S: Se priorizó la iniciativa de analítica de datos al interior de la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica para desarrollar en el presente año, denominada Modelo de Inversión Pública Territorial, el cual proyecta la inversión óptima por comuna considerando el crecimiento poblacional, distribución por sectores (Educación, Salud, Infraestructura, Turismo y entretenimiento, entre otros) e inversión por comuna. El modelo calcula la inversión per cápita, predice las ejecuciones del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) por programa y pilar estratégico, y estima el porcentaje de ejecución real. Utiliza datos demográficos y presupuestales históricos para recomendar la distribución geográfica y sectorial que maximice el impacto social. Además, se desarrolló el tablero de Inversión Territorial en Power BI, en el cual se visualizan los principales indicadores (KPI) de inversión por comuna, proyecto y programa, así como las proyecciones de inversión para el periodo comprendido entre 2025 y 2030.

PL11BD	**Documentos de evaluación elaborados**	**Número**	**1**	**1**	**100%**
	Código. Ind. SUIFP: 459900100				

Descripción B/P/S: Documentos técnicos asociados a la Estrategia de rendición publica de cuentas formulada, siguiendo los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública e implementada en toda la entidad.

Observación B/P/S: La Estrategia de rendición de cuentas distrital para la vigencia 2025, completó la implementación de sus tres elementos (Información, Diálogo, Responsabilidad), sus cinco etapas (Aprestamiento, Diseño, Preparación, Ejecución, Seguimiento y evaluación); y su plan de acción (30 actividades). Para este periodo, se finalizó la etapa Ejecución, apoyando la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas distrital 2025, a cargo del señor alcalde. Además, y se llevaron a cabo las actividades asociadas a la etapa: Seguimiento y evaluación, como lo fueron: la respuesta a los compromisos con la ciudadanía que surgieron - producto de la audiencia pública-, el análisis de las recomendaciones realizadas, la documentación de las buenas prácticas, el balance de las acciones de mejora formuladas y gestionadas para el año, y construyendo y difundiendo el Informe de resultados sobre la Estrategia distrital de rendición publica de cuentas para la vigencia 2025.

Proyecto: 240312 -Generación de información estadística, socioeconómica y poblacional para el distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.183 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.247 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.247

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Bases de datos de la temática de Demografía y Población				
PL12CA **Bases de datos de la temática de demografía y población anonimizadas producidas**	**Número**	**3**	**3**	**100%**
Código. Ind. SUIFP: 040100100				

Descripción B/P/S: Bases de datos con toda la información generada de la ejecución de cada uno de los siguientes proyectos: Encuesta de Calidad de Vida (ECV) y Cuentas Económicas.

Observación B/P/S: Los contratos asociados al indicador se encuentran en el siguiente estado: Gran Encuesta Integrada de Hogares cumplió al 100% con los productos del contrato al 31 de diciembre, esto es, la recolección de las encuestas, la entrega de informes trimestrales y las proyecciones de población, así mismo se obtuvo 100% en ejecución financiera. Encuesta Calidad de Vida, y el apoyo a la supervisión de la ECV presentó un avance del 100% tanto en lo físico como en lo financiera. Para Cuentas Económicas, el estado de ambas ejecuciones alcanzó el 100%

PL12CB	**Sistemas de información implementados**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 040110200

Descripción B/P/S: Modulo 2 del sistema de información implementado.

Observación B/P/S: Con corte al 31 de diciembre de 2025 se cumplieron con las acciones planteadas para la implementación del Plan Estadístico Distrital. Su meta de 25% se cumplió a cabalidad.

Proyecto: 240317 -Optimización y desarrollo de las plataformas tecnológicas para el seguimiento y aplicación normativa del pot

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 218 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 196 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 196

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de información implementados					
PL17BA	**Sistemas de información implemetados**	**Número**	**0,45**	**0,45**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 400304900

Descripción B/P/S: Corresponde a las fases establecidas en la vigencia para la implementación del sistema de información.

Programa: 3.3.7 - Articulación Distrital con visión regional

Proyecto: 240336 -Desarrollo de estrategias de coordinación y cooperación del distrito y la región

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 242 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 193 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 191

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica					
PL36BA	**Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente**	**Número**	**2**	**2**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Corresponde al acompañamiento, apoyo, asesoría y seguimiento técnico para la transferencia de herramientas de gestión y conocimiento en políticas, planes , proyectos y programas de apoyo a la dirección y gestión de la administración territorial.

Pilar: 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo

Componente: 4.3 - Movilidad Sostenible e Integral

Programa: 4.3.4 - Modelo de gestión para la movilidad sostenible, segura e inteligente

Proyecto: 240321 -Formulación y adopción del plan integral de movilidad sostenible y su infraestructura vial asociada al distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.243 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.019 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.019

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación				
PL21BA Documentos de planeación elaborados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 400201600

Descripción B/P/S: Avance en el Documento técnico de soporte del Plan Integral de Movilidad Sostenible con las revisiones producto de la socialización para cumplir con lo establecido en la resolución 1585 de 2028.

Observación B/P/S: Al 31 de diciembre, se avanzó en la revisión jurídica para validar los requisitos de socialización del plan según la Resolución 15885 de 2020 y se definió el contenido final, integrando etapas de diagnóstico y una estrategia de socialización para validar el plan 2026. Adicionalmente, se ajustó el diseño y se inició el proyecto de decreto para adoptar el Plan Integral de Movilidad Sostenible para Medellín.

PL21BB Documentos de lineamientos técnicos elaborados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 400201500

Descripción B/P/S: Da cuenta del avance en el documento técnico de soporte de la revisión del Plan Vial, incluyendo la recolección de los Planes Viales Zonales y Corregimentales formulados, la consolidación de su diagnóstico y la metodología de actualización. Así mismo, abarca los capítulos relacionados con los nuevos corredores de transporte multimodal a nivel de prefactibilidad, la evaluación de diversas alternativas propuestas para cada sistema en el modelo de tránsito, y la recopilación de información primaria y secundaria que actualiza la red y modela la movilidad para el análisis y formulación del plan vial, mediante el software especializado AIMSUN.

Observación B/P/S: Al 31 de diciembre se completó la formulación del corredor Calle 94, incorporando 6,93 km adicionales a la meta del año y se consolidaron los corredores de Las Palmas y Carabobo, logrando un total de 22,4 km de corredores formulados. Adicionalmente, se culminó el diagnóstico y la formulación de la Zona 1 Nororiental y se optimizó la metodología aplicada en la Zona 3 Centro. Asimismo, se calibró el modelo macroscópico para la simulación de escenarios de planificación que integran estos proyectos y permiten ampliar el abordaje de más zonas a esta escala, consolidando los avances previstos para 2025.

PL21BC Sistemas de información actualizados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 400203600

Descripción B/P/S: Corresponde al documento de actualización del plano índice de proyectos viales, con los ajustes y depuraciones correspondientes, conforme a las propuestas aprobadas en formatos .dwg y GIS. Además, incluye la documentación de cada actualización de la información cartográfica en MapGis, el diccionario de datos y las fichas de seguimiento y evaluación del POT (SePOT).

Observación B/P/S: Al 31 de diciembre de 2025, se avanzó en el Documento Técnico de Soporte para la actualización del Plano Índice de Proyectos Viales, con la inclusión del proyecto vial 1-2024-1 y la justificación técnica de 21 proyectos viales para su aval en la mesa técnica. Asimismo, se presentaron los resultados de la información primaria en el marco de la propuesta de implementación del plano interactivo. Adicionalmente, se elaboraron los informes y las presentaciones de los proyectos de ampliación en los corregimientos de San Cristóbal y San Sebastián de Palmitas, para el corregimiento de Altavista se desarrollaron los mapas de los proyectos de ampliación propuestos y el cuadro de secciones viales, y finalmente en San Antonio de Prado, una vez concluidas las visitas técnicas, se elaboró el informe diagnóstico y se construyó el cuadro de secciones viales con las propuestas de ampliación para cada corredor.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 160382 - Implementación de la metodología para el seguimiento de las transformaciones territoriales

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 0,199799	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 0

Proyecto: 160415 - Desarrollo de instrumentos para la gestión articulada del territorio

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 6	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 0

Proyecto: 180101 - Implementación de una metodología de prospectiva para el desarrollo territorial


Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 0,237723	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 0


4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto:	**200327**	**-Fortalecimiento del sistema municipal de planeación**				
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 209	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 205
Proyecto:	**200437**	**-Fortalecimiento del direccionamiento estratégico para el desarrollo integral del municipio medellín**				
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 40	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 23
Proyecto:	**200368**	**-Fortalecimiento de la gestión del patrimonio cultural inmueble**				
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 3	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 3
Proyecto:	**200373**	**-Asesoría en la aplicación normativa para proyectos públicos y privados**				
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 11	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 11
Proyecto:	**200375**	**-Revisión del sistema físico espacial definido en el pot**				
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 16	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 16
Proyecto:	**200412**	**-Administración documental de la información urbanística**				
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 99	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 99
Proyecto:	**200338**	**-Fortalecimiento de la gestión de información geográfica del municipio**				
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 47	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 47
Proyecto:	**200340**	**-Fortalecimiento del seguimiento y evaluación de la gestión y los resultados**				
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 16	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 16
Proyecto:	**200349**	**-Administración del sistema de beneficiarios de programas sociales-sisben**				
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 1.819	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 1.819
Proyecto:	**200369**	**-Desarrollo de herramientas informáticas de seguimiento a las transformaciones territoriales de medellín**				
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 3	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 3
Proyecto:	**200351**	**-Generación de alianzas e instrumentos en la gestión del desarrollo articulado con la región**				
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 3	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 1
Proyecto:	**200352**	**-Formulación plan estratégico medellín - región**				
Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 2	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0


Secretaría de Gestión y Control Territorial


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2025

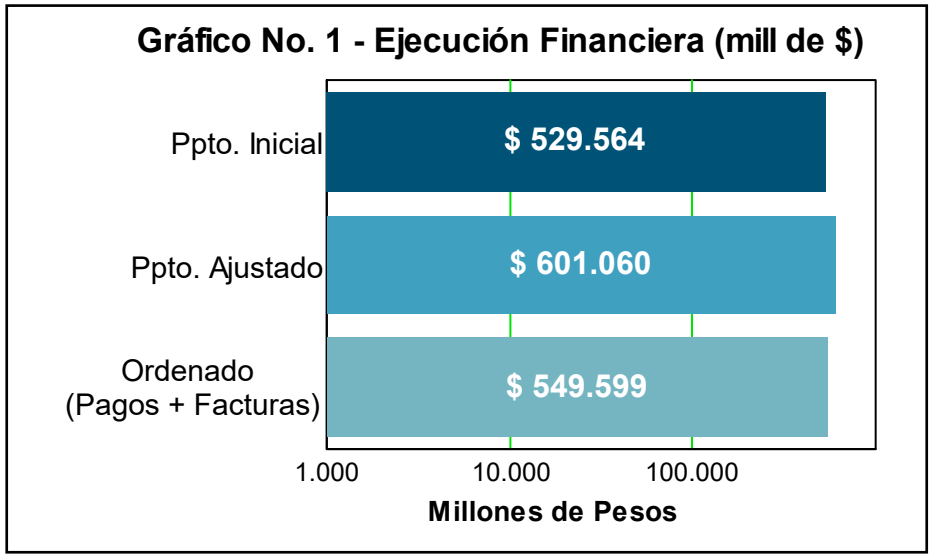


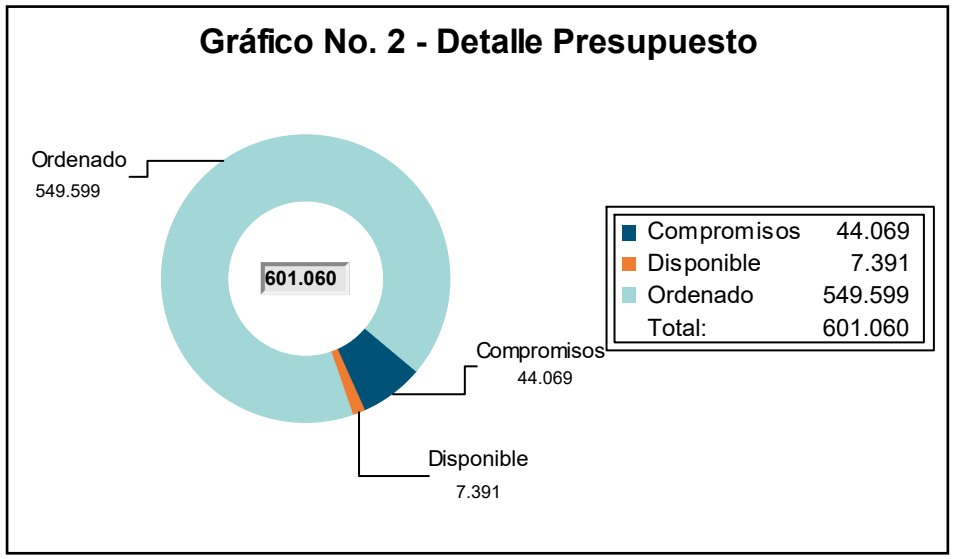

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre de 2025 comprende pagos y facturas

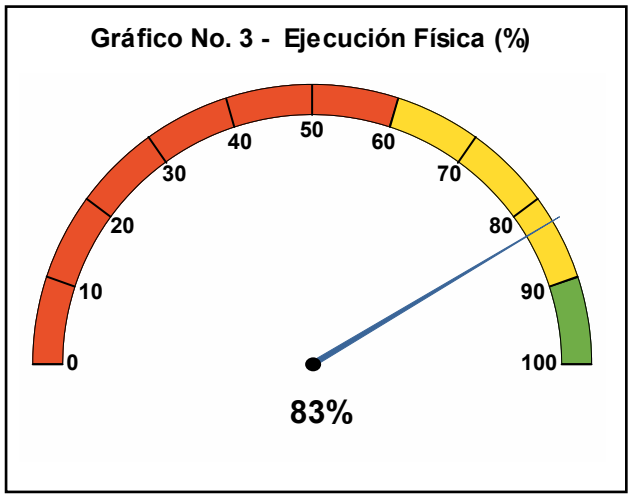

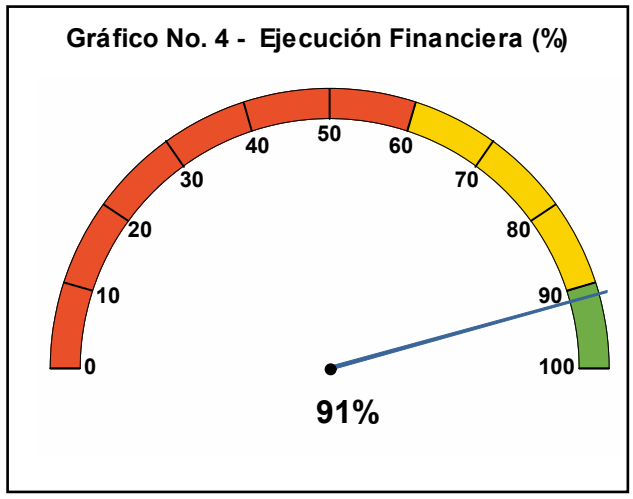

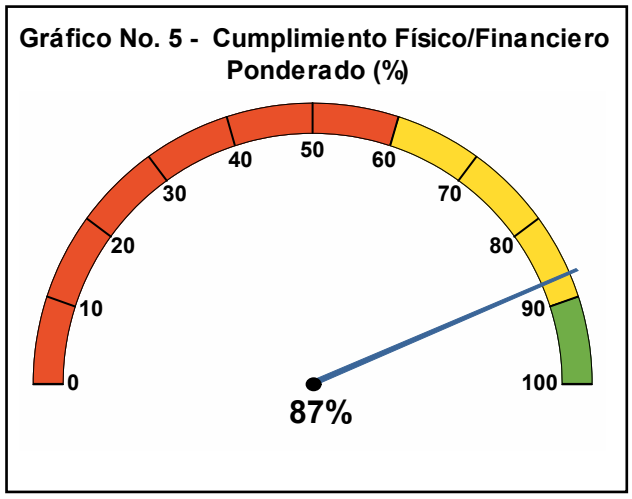

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito
Programa: 3.3.3 - Fortalecimiento del catastro distrital

Proyecto: 240212 -Aplicación de la estratificacion y homologacion catastral

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 93% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.594 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.883 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.593

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de estratificación socioeconómica				
GT12AA Predios con estratificación socioeconómica	**Número**	**24.352**	**30.052**	**123%**

Código. Ind. SUIFP: 040110500

Descripción B/P/S: Acciones orientadas a establecer la clasificación de los inmuebles residenciales de un municipio, que se hace en atención al Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios en Colombia.

Observación B/P/S: Se reporta únicamente la cantidad relacionada al proceso de homologación catastral. Debido al aumento en la ejecución de la meta presentado en los últimos cuatro (4) meses se ha cumplido con la meta estipulada.

Proyecto: 240218 -Fortalecimiento de la gestión catastral

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 96% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 26.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 23.933 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 22.998

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de investigación				
GT18CD Documentos de investigación generados	**Número**	**2**	**2**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 040600800

Descripción B/P/S: Incluye las investigaciones que se realicen sobre el territorio colombiano desde la perspectiva geográfica en sus diversos aspectos: biofísico, ambiental, económico, social, cultural, turístico y de la organización espacial.

Observación B/P/S: Logramos el 100% de la meta en materia de recolección de información de oferta inmobiliaria, el cual corresponde a la captura de datos obtenidos a través de fuentes secundarias, tales como plataformas en línea especializadas y los reportes suministrados por prediadores y avaluadores vinculados al proceso.

GT18CE Trámites de conservación catastral realizados	**Número**	**22.500**	**24.763**	**110%**

Código. Ind. SUIFP: 040600300

Descripción B/P/S: Corresponde a los tramites de conservación evacuados de la presente vigencia - Plan de Descongestión, avance sobre la meta del periodo.

Observación B/P/S: Superamos el 100% de la meta de los tramites de conservación gracias a la implementación del Plan de Descongestión propuesto.

GT18CF Mapas temáticos desarrollados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 040602100

Descripción B/P/S: Corresponde al resultado del levantamiento y análisis de información del territorio y su relación con la sociedad, representado a través de representaciones gráficas, sobre las cuales se garantiza el cumplimiento de protocolos y lineamientos para su uso y aprovechamiento.

Observación B/P/S: Cumplimos la meta, ya que en la Gaceta oficial 5540 de 2025, se publicó la Resolución N°202550008085 del 13/02/2025 "Por medio de la cual se actualizan los valores del mapa de Zonas Geoeconómicas Homogéneas – ZGH- para Suelo Urbano y para las Zonas Generadoras de derechos de construcción y desarrollo ubicadas en Suelo Rural del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, la cual fue adoptada mediante los Decretos Municipales N°1760 de 2016 y 0066 de 2018".

GT18CG	**Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en tecnologías geoespaciales realizados**	**Número**	**12.500**	**12.520**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 040601700

Descripción B/P/S: Corresponde a la realización de proyectos de investigación, desarrollo e innovación orientados a optimizar la producción, disposición y aprovechamiento de la información geográfica a través del uso de tecnologías geoespaciales y tecnologías emergentes (Percepción remota, sistemas de información geográfica, análisis espacial, infraestructuras de datos espaciales).

Observación B/P/S: Cumplimos con el indicador desarrollando las actividades que estaban a cargo de la Subsecretaría de Catastro, tales como: diseños, requerimientos y pruebas recibidas a satisfacción. Se queda a la disponibilidad de que la Secretaría de Innovación Digital, cuente con la arquitectura física para el despliegue de estos cambios realizados. Así mismo cumplimos con la aplicación de la Resolución 1040 y sus reformas.

Programa: 3.3.4 - Gestión territorial

Proyecto: **240213 -Aplicación de las normas urbanísticas en la gestión territorial**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 15.897 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 14.685 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 14.671

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		**Unidad**	**Cantidad Planeada**	**Cantidad Ejecutada**	**Eficacia Producto**
Servicios de asistencia técnica en planificación urbana y ordenamiento territorial					
GT13AB	**Entidades territoriales asistidas técnicamente**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 400200100

Descripción B/P/S: Este indicador se mide a través de: Obligaciones urbanísticas liquidadas: 600 Licencias urbanísticas revisadas: 3.100 Revisiones realizadas de actividades edificadoras en construcciones formales e informales: 4.608 Enajenadores de vivienda vigilados e inspeccionados: 800 Organizaciones populares de vivienda asistidos: 15 Intervenciones interinstitucionales realizadas a través de los protocolos ambientales y urbanísticos (PAU): 36 Recorridos realizados para la intervención de conatos de construcción en predios del Distrito: 1.749 Loteos ilegales con fines de enajenación reportados: 100%

Observación B/P/S: Se obtuvo un efectivo cumplimiento de las obligaciones urbanísticas a través de la compensación material o en dinero, con un total de 594 obligaciones urbanísticas liquidadas, en agosto se reporto 2 mas que no correspondían al indicador, siendo el total de 594. A través de este recaudo se genera nuevo espacio público y nuevos equipamientos para la ciudad en beneficio de la comunidad. Se realizó la revisión de 3.562 licencias urbanísticas y otras actuaciones expedidas por Curadores Urbanos. A través de esta revisión se garantiza que los actos administrativos que aprueban los Curadores cumplan con la normatividad del POT y de esta manera se contribuye a la adecuada ocupación del territorio. Con el objeto de contribuir al fomento de buenas prácticas constructivas, en cumplimiento de la normatividad urbana de sismorresistencia y como fin principal, a una adecuada ocupación del territorio, se realizaron un total de 5.606 revisiones a actividades edificadores formales e informales. Se realizó vigilancia e inspección a un total de 875 enajenadores de vivienda, lo que permite la prevención de estafas inmobiliarias y la verificación de cumplimiento de la normatividad vigente, protegiendo los intereses de las familias articuladas a proyectos de vivienda de cinco (5) o más unidades. Organizaciones Populares de vivienda asistidas 23. Se realizaron 42 intervenciones interinstitucionales. Esto contribuye a una adecuada localización de las actividades económicas y un menor impacto al uso residencial de las mismas, en relación con las problemáticas de ruido, ocupación del espacio público, movilidad, aforos, vibraciones y normas urbanísticas. Se realizaron 4.303 recorridos para la intervención de conatos de construcción y seguimiento en tiempo real a los desarrollos constructivos ilegales que se pretendían ejecutar en espacios públicos. Con estas acciones se contribuye a disminuir el riesgo para las personas y se genera una adecuada ocupación del territorio. Loteos ilegales con fines de enajenación reportados: 100%

GT13AC	**Personas capacitadas con educación informal**	**Número**	**4.104**	**7.704**	**188%**

Código. Ind. SUIFP: 400204100

Descripción B/P/S: Actores territoriales capacitados en procesos de legalidad, construcción y ética, en cuanto a la ocupación del territorio.

Observación B/P/S: Se capacitaron un total de 7.704 personas en procesos de legalidad, construcción y ética en el modelo de ocupación del territorio, estás acciones sensibilizan a la comunidad frente a la adecuada ocupación del territorio.

Pilar: 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo

Componente: 4.4 - Servicios públicos

Programa: 4.4.1 - Agua potable y saneamiento básico

Proyecto: 200236 - **Inversiones estratégicas en agua potable y aguas residuales**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 94% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 97%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.240 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.990

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de Alcantarillado				
GT36AC Usuarios conectados a la red de servicio de alcantarillado	**Número**	**69**	**69**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 400301400

Descripción B/P/S: Nuevos suscriptores del servicio de alcantarillado.

Observación B/P/S: Se terminó la obra de la centralidad de Palmitas y se logró conectar a 69 usuarios al servicio de alcantarillado, alcanzando la meta.

Proyecto: 240010 - **Ampliación de cobertura de servicios públicos de acueducto y alcantarillado bajo estrategia unidos por el agua distrito de medellin**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 86% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 92%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 26.130 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 27.568 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 26.980

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación				
GT10AZ Esquema de medios alternos de provisión de agua para consumo humano implementados	**Número**	**3.300**	**2.833**	**86%**

Código. Ind. SUIFP: 400306300

Descripción B/P/S: Consiste en la ampliación de redes de acueducto y alcantarillado, construcción de acometidas y domiciliarias.

Observación B/P/S: No se logró el 100% de la meta debido a que la ejecución del contrato inició a mediados del mes de junio, debido a trámites precontractuales, lo que impactó en el cumplimiento de la meta establecida para la vigencia 2025.

Proyecto: 240217 - **Desarrollo integral en agua potable y saneamiento basico**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 34% **Ejec. Financiera :** 55% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 44%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 32.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 39.899 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 21.951

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de Acueducto				
GT17DA Usuarios conectados a la red de servicio de acueducto	**Número**	**1.537**	**24**	**2%**

Código. Ind. SUIFP: 400300900

Descripción B/P/S: Numero de Usuarios conectados al servicio de Acueducto.

Observación B/P/S: La meta no se cumplió, debido a que durante el desarrollo del proceso precontractual se presentaron circunstancias que afectaron la oportunidad de la adjudicación y la posterior legalización del contrato, tales como: la revisión y ajuste de los documentos previos; la atención de observaciones formuladas por los interesados; la expedición de adendas; y las demoras en la obtención del Registro Único Tributario (RUT), así como en la expedición y aprobación de las pólizas exigidas al consorcio adjudicatario. Estas situaciones, ajenas a la voluntad de la entidad, derivaron en que el acta de inicio del contrato solo pudiera suscribirse el 23 de octubre de 2025, reduciendo el tiempo efectivo de ejecución dentro de la vigencia fiscal 2025 a setenta (70) días calendario.

GT17DB Usuarios conectados a la red de servicio de alcantarillado	**Número**	**1.391**	**0**	**0%**

Código. Ind. SUIFP: 400301400

Descripción B/P/S: Numero de Usuarios conectados al servicio de Alcantarillado.

Observación B/P/S: Es preciso indicar que el proceso precontractual estaba previsto para iniciar en el mes de mayo del 2025; sin embargo, en razón a la calamidad pública ocasionada por la temporada de lluvias que azotó al Distrito durante el primer y segundo trimestre del año 2025, los recursos inicialmente asignados fueron destinados a la estructuración de contratos bajo la figura de urgencia manifiesta, con el fin de atender los daños generados en los alcantarillados veredales como consecuencia de dicha temporada. En razón a lo anterior, el proceso se terminó publicando en el mes de agosto de 2025 cunado llegaron los nuevos recursos, y en vista de las observaciones realizadas durante el proceso de pliego de condiciones por parte de los interesados del proceso, desde la secretaria de suministros y servicios se determino revocar la resolución de apertura de la Licitación publica, teniendo presente que no se alcanzaría a adjudicar y ejecutar en la vigencia del 2025.

GT17DC	**Asistencias técnicas realizadas**	**Número**	**100**	**117**	**117%**

Código. Ind. SUIFP: 400305500

Descripción B/P/S: Número de personas que reciben acompañamiento, asesoría y seguimiento técnico para la transferencia de herramientas de gestión y conocimiento en fortalecimiento de agua potable.

Observación B/P/S: Se brindó asistencia técnica en fortalecimiento a los pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado, en temas técnicos, sociales, ambientales y administrativos.

Programa: 4.4.2 - Accesibilidad a los servicios públicos domiciliarios

Proyecto: 240011 -Ampliación-de cobertura del servicio público de gas domiciliario bajo est

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 8.155 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 10.641 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 10.392

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para subsidios a la oferta en el servicio público de gas				
GT11AA Usuarios beneficiados con subsidios a la oferta	**Número**	**16.638**	**16.599**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 210101200

Descripción B/P/S: Comprende el número de usuarios que se benefician a través de la conexión del servicio de gas domiciliario

Observación B/P/S: No se logra el 100% de la meta programada debido a que algunas solicitudes de conexión fueron declaradas por parte del contratista como no viables por razones técnicas y normativas, finalizando la vigencia 2025.

Proyecto: 240020 -Implementación de subsidios al acueducto, alcantarillado y aseo en los estratos 1,2 y 3

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 98% **Ejec. Financiera :** 99% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 276.217 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 282.200 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 278.762

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios				
GT20AA Usuarios beneficiados con subsidios al consumo	**Número**	**1.982.930**	**1.942.216**	**98%**

Código. Ind. SUIFP: 400304700

Descripción B/P/S: Número de subsidios otorgados a las viviendas de los estratos 1,2 y 3 en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

Observación B/P/S: No se logra el 100% de la meta programada debido a factores como la caída en la venta y construcción de vivienda nueva, causada principalmente por la altas tasas de interés, el aumento del valor de materiales e insumos, reducción de la confianza de los consumidores y empresarios; además del redireccionamiento y la falta de apoyo a programas como Mi Casa Ya, ha causado que la expectativa de crecimiento en la entrega de subsidios a las tarifas de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, si bien han crecido, no se hayan comportado como se esperaba.

Proyecto: 240214 -Aplicación del auspicio minimo vital de agua potable

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 72% **Ejec. Financiera :** 98% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 85%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 36.902 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 30.676 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 29.931

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para la entrega de transferencias monetarias n condicionadas				
GT14AA Familias beneficiadas con transferencias monetarias no condicionadas	**Número**	**54.343**	**39.260**	**72%**

Código. Ind. SUIFP: 410306100

Descripción B/P/S: Consiste en otorgar un subsidio a los hogares de estratos 1,2 y 3 que cumplan unas condiciones tomando como base la versión 3 del SISBEN.

Observación B/P/S: Esta cifra corresponde a los auspicios otorgados hasta el mes de diciembre de 2025, la cifra esta distribuida de la siguiente manera: 3.236 hogares auspiciados por los 15 pequeños prestadores (8 acueductos se fusionaron y se creo 1 nuevo) y 36.024 por el mayor prestador EPM, para un total de 39.260 familias auspiciadas durante el mes. Estos hogares son conformados por 156.770 personas Es importante mencionar que el programa cambio de reglamentación mediante el Decreto 0506 de 2023, y a partir del mes de Septiembre, facturación octubre de 2025, salieron los hogares que dejaron de cumplir los nuevos requisitos. Es de aclarar que se continua la cifra de 56.075 familias a quieren hasta el mes de septiembre se les entrego el beneficio.

Proyecto: 240215 -Desarrollo de estrategias pedagógicas para el uso racional de los servicios públicos

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 75% **Ejec. Financiera :** 90% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 82%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.231 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.098 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.881

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información implementado				
GT15AA Asistencias técnicas realizadas	**Número**	**2**	**1**	**50%**

Código. Ind. SUIFP: 400305200

Descripción B/P/S: Número de eventos a realizar de participación ciudadana.

Observación B/P/S: Se llevó a cabo un (1) evento de intercambio de experiencias dirigido a los vocales de control reconocidos e inscritos en el Distrito; sin embargo, la participación efectiva fue limitada, registrándose la asistencia de solo siete (7) vocales de control. Por lo anterior, no se logró el cumplimiento de la meta establecida para la vigencia.

GT15AB Sistemas de información actualizados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 400305000

Descripción B/P/S: Numero de Planes con Seguimiento.

Observación B/P/S: Se logra la meta programada para la vigencia gracias a la actualización y operación de los tableros de seguimiento.

Programa: 4.4.3 - Gestión Integral de residuos sólidos

Proyecto: 240216 -Desarrollo del plan de gestión integral de residuos sólidos y el servicio de aseo

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.438 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 13.655 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 13.300

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos PGIRS				
GT16AA Plan de gestión integral de residuos solidos implementado	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 400302200

Descripción B/P/S: Número de Plan implementado.

Observación B/P/S: Durante el período evaluado se desarrollaron acciones para fortalecer la gestión integral de residuos sólidos, la articulación institucional y la participación comunitaria. Se realizaron mesas de corresponsabilidad y actividades en territorio que permitieron identificar puntos críticos, sensibilizar a 66.331 personas y promover prácticas adecuadas de manejo y separación de residuos. Asimismo, se avanzó en el componente de aprovechamiento y economía circular mediante el fortalecimiento del trabajo con recicladores de oficio y la consolidación de instrumentos y protocolos del PGIRS, orientados a una gestión más eficiente, sostenible e inclusiva del sistema de residuos del Distrito.

GT16AB Plan de gestión integral de residuos solidos con seguimiento	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 400302300

Descripción B/P/S: Numero de Planes con Seguimiento.

Observación B/P/S: Se cumplió con la meta programada ya que se fortaleció la articulación institucional y la gobernanza del PGIRS mediante mesas de trabajo intersectoriales, la gestión de insumos para su inclusión en los instrumentos de planeación y la socialización de requerimientos presupuestales ante la Secretaría de Hacienda. Asimismo, se implementó una matriz de seguimiento contractual que permite el control y monitoreo de los procesos, garantizando el adecuado cumplimiento de las responsabilidades asociadas al PGIRS.

Programa: 4.4.4 - Alumbrado Público e Iluminación Ornamental

Proyecto: **240021 -Servicio de alumbrado público e iluminación ornamental**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 74% **Ejec. Financiera :** 79% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 76%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 100.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 119.543 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 93.974

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Redes de alumbrado público construidas				
GT21AA Redes de alumbrado público construidas	**Metro**	**74.320**	**27.080**	**36%**

Código. Ind. SUIFP: 210201200

Descripción B/P/S: Metros de redes de alumbrado público construidas en proceso de expansión del servicio.

Observación B/P/S: Se reporta un logro de 27.080 metros lineales, correspondientes a redes efectivamente construidas y puestas en servicio, las cuales cuentan con los soportes técnicos y operativos correspondientes; no se cumple la meta debido a que proyectos de gran impacto que estaban planeados para realizarse en la vigencia 2025, no fueron puesto en marcha como el corredor del metro ligero de la 80, proyecto vía al mar.

GT21AB Redes de alumbrado público mejoradas	**Metro**	**132.000**	**154.792**	**117%**

Código. Ind. SUIFP: 210201300

Descripción B/P/S: Metros de redes de alumbrado público mejoradas en la modernización del servicio.

Observación B/P/S: Se logro un total de 154.792 metros de redes de alumbrado público mejoradas, La cantidad de luminarias responde al crecimiento del parque de luminarias LED en operación,

GT21AC Redes de alumbrado público con mantenimiento	**Metro**	**58.800**	**49.878**	**85%**

Código. Ind. SUIFP: 210201100

Descripción B/P/S: Metros de redes de alumbrado público con mantenimiento preventivo y correctivo.

Observación B/P/S: Se logro un total de 49.878 metros lineales de redes mantenidas atendidas a través de la línea de atención a la ciudadanía 4444115, considerando un promedio de 2 metros de cable reemplazado por cada luminaria intervenida durante el proceso de mantenimiento.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo
Componente: 4.4 - Servicios públicos
Programa: 4.4.1 - Agua potable y saneamiento básico

Proyecto: 230030 -24pp50-suministro e instalación de sistemas sépticos corregimiento 50

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 83% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 92%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 199 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 199

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Unidades sanitarias con saneamiento básico construidas				
GT30AB Viviendas beneficiadas con la construcción de unidades sanitarias	**Número**	**18**	**15**	**83%**

Código. Ind. SUIFP: 400304400

Descripción B/P/S: Consiste en la instalación de soluciones individuales de saneamiento básico.

Observación B/P/S: La obra ya se termino, se identificó que en un predio pequeño se encontraban varias viviendas, por lo que se determinó instalar menos unidades de pozos y conectar esas viviendas a la misma unidad sanitaria; Se logró beneficiar a 112 familias en las 15 viviendas.

Proyecto: 230031 -24pp70-ampliación y mejoramiento de sistemas de acueducto corregimiento 70

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 90% **Ejec. Financiera :** 96% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 93%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 943 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 907

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Acueductos optimizados				
GT31BA Acueductos optimizados	**Número**	**5**	**4**	**80%**

Código. Ind. SUIFP: 400301700

Descripción B/P/S: Consiste en el cambio o reposición de micromedidores (incluyen capacitación personalizada para el uso eficiente del agua).

Observación B/P/S: El incumplimiento de la meta se presentó debido a que el acueducto 'Agua Pura' no formuló requerimientos para la optimización del sistema de medición.

GT31BB Acueductos ampliados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 400301600

Descripción B/P/S: Consiste en la instalación de soluciones individuales de saneamiento básico.

Observación B/P/S: Se logró realizar la ampliación del acueducto aguas frías, el cual fue entregado el 8 de diciembre; logrando la cobertura de 70 nuevos suscriptores.

Proyecto: 250050 -25pp50-construcción e instalación de sistemas sépticos en el corregimiento de san sebastián de palmitas 25pp50

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 35% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 18%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 984 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 349

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Unidades sanitarias con saneamiento básico construidas					
GT50AA	Viviendas beneficiadas con la construcción de unidades sanitarias	Número	120	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 400304400

Descripción B/P/S: Consiste en la instalación de soluciones individuales de saneamiento básico, es decir, pozos sépticos integrados en fibra de vidrio que beneficiaran a 120 familias que cumplan los requisitos establecidos durante la ruta de Presupuesto Participativo. Los cuales, se instalarán dentro del predio de la familia beneficiada a no menos de 15m de la vivienda con vertimiento de las aguas a pozo filtrante; Algunos pozos sépticos serán individuales y otros colectivos (2 o 3 familias).

Observación B/P/S: Es de aclarar que los recursos fueron trasladados de la Secretaria de participación a la Secretaria de Gestión, según decreto 0401 de Mayo 08 de 2025, dando inicio a la etapa precontractual en el mes 12 de septiembre y se adjudico el martes 5 de noviembre del 2025, teniendo presente que la duración es 4 meses no se alcanzaba a ejecutar en la vigencia 2025, se constituyo reserva presupuestal para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contrato y la meta para el 2026, por esta razón no fue posible cumplir meta en la vigencia-

Programa: 4.4.3 - Gestión Integral de residuos sólidos

Proyecto: 250049 -25pp99-fortalecimiento del manejo de residuos sólidos en la comuna 25pp99

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 680 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 680

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de asistencia técnica en manejo de residuos solidos					
GT49AA	Personas asistidas técnicamente	Número	21.200	21.282	100%

Código. Ind. SUIFP: 400302100

Descripción B/P/S: El producto esta formulado en personas asistidas técnicamente para un total 21,200, sin embargo la medición se realiza a través de la sensibilización de viviendas por comuna(6,60,80 y 90) buscando mejorar el manejo de los residuos sólidos en cada una de estas; se proyecta sensibilizar 8.000 viviendas con la entrega de un kit para propiciar la separación en la fuente, con el fin de lograr un incremento de las cantidades de residuos aprovechados y disminuir los residuos llevados el relleno sanitario o puntos críticos.

Observación B/P/S: Logramos la meta programada en 21.282 personas sensibilizadas, en las 4 comunas (6.60.80 y 90) priorizadas por el proyecto de presupuesto participativo, que tenía como objetivo incremento de las cantidades de residuos aprovechados y disminuir los residuos llevados el relleno sanitario o puntos críticos.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 980531 -Estratificación socioeconómica de las viviendas rurales urbanas del municipio

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0,166900 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 200241 -Desarrollo de infraestructura de datos del catastro multipropósito

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 8 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 8

Proyecto: 200242 -Servicio de información catastral

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 327 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 326

Proyecto: 200240 -Revisión de la aplicación de normas urbanísticas y constructivas

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 464	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 464

Proyecto: 120287 -Diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas residuales domésticas

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 179	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 0

Proyecto: 160326 -Desarrollo de estrategias para saneamiento básico y agua potable en los corregimientos de medellín,antioquia,occidente

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 8	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 0

Proyecto: 200233 -Administración del programa mínimo vital de agua potable

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 102	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 102

Proyecto: 200237 -Administración del plan de gestión integral de residuos sólidos y servicio de aseo


Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 0	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 0


Proyecto: 200234 -Prestación del servicio y modernización del alumbrado público y la iluminación ornamental

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 24.141	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 24.141


Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2025

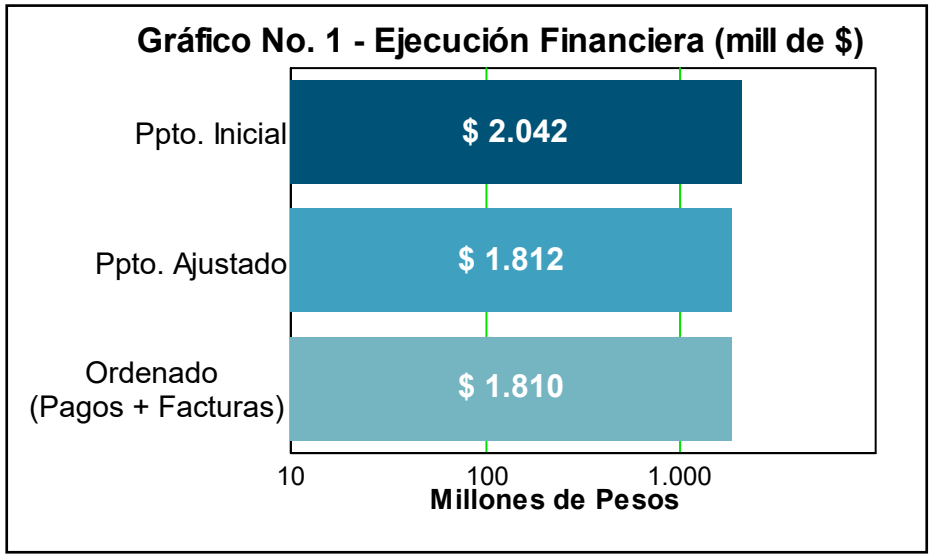


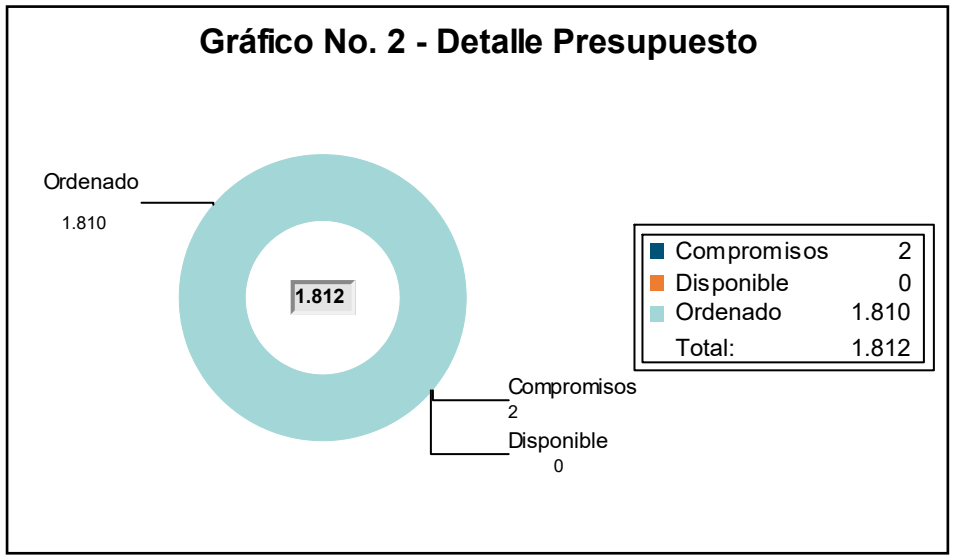

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre de 2025 comprende pagos y facturas

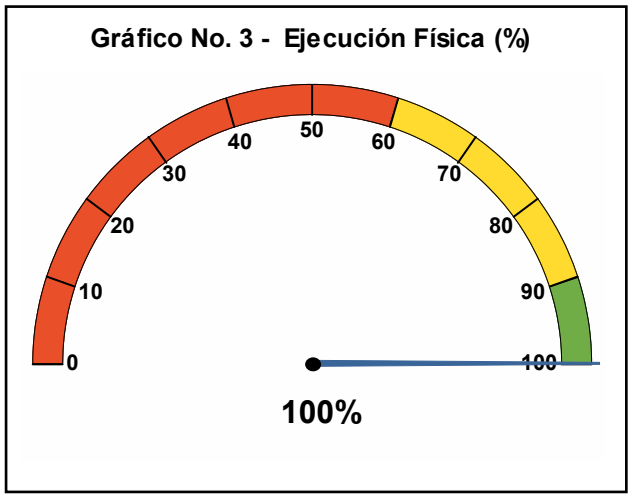

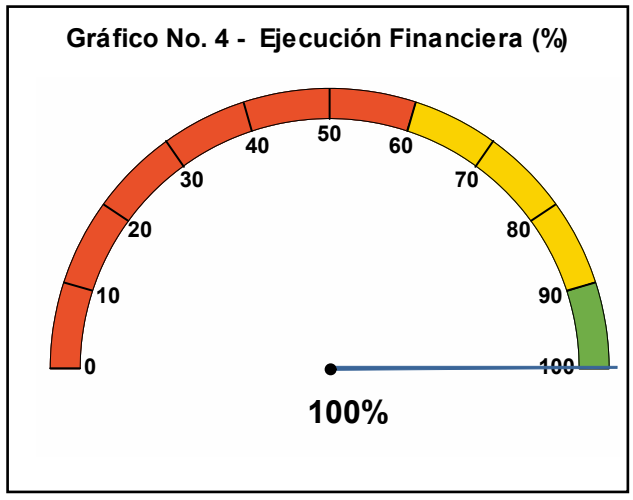

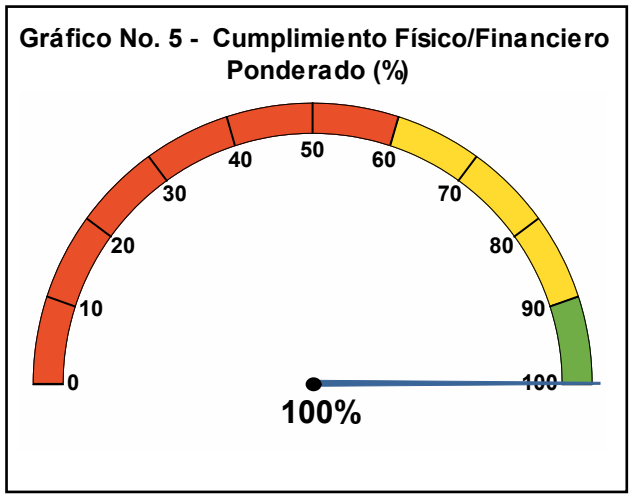

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.4 - Medellín, destino turístico y sostenible
Programa: 1.4.1 - Competitividad, control y gestión turística

Proyecto: **240331 -Desarrollo de estrategias de promoción alianzas y fomento del centro y demás territorios estratégicos**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.517 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.425 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.423

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción turística				
GC31AA Campañas realizadas	**Número**	**8**	**8**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 350204600

Descripción B/P/S: Corresponde a las Estrategias de divulgación y promoción de los atractivos turísticos de las zonas, así como las actividades para el posicionamiento de los territorios estratégicos de la ciudad.

GC31AB Asistencias técnicas realizadas	**Porcentaje**	**30**	**30**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 350211600

Descripción B/P/S: Sectores con vocación artística, cultural, patrimonial y económica para el desarrollo de sus actividades productivas.

GC31AC Clústeres asistidos en la implementación de los planes de acción	**Número**	**18**	**18**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 350200700

Descripción B/P/S: Corresponde a Alianzas estratégicas que se realizarán en el territorio.

Componente: 1.5 - Arte y cultura al alcance de todos
Programa: 1.5.1 - Estrategia Cultura Ciudadana Medellín

Proyecto: **240324 -Desarrollo de estrategias que convocan al ciudadano al centro y los territorios estratégicos**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 425 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 291 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 291

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
GC24AA Asistencias técnicas realizadas	**Número**	**50**	**50**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 330113200

Descripción B/P/S: Corresponde al acompañamiento técnico a los ciudadanos y articulación con otras dependencias.

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito
Programa: 3.3.6 - Prospectiva de ciudad basada en el aprovechamiento de los datos, la analítica y la gestión del conocimiento

Proyecto: **240332 -Implementación de sistemas de recolección de datos, análisis y gestión del centro y demás territorios estratégicos**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 100 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 96 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 96

Descripción del Avance


Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información implementado				
GC32AC Sistemas de información implementados	**Porcentaje**	**0,3**	**0,3**	**100%**


Código. Ind. SUIFP: 040110200

Descripción B/P/S: Corresponde a Diseñar e implementar un sistema para recopilar y sistematizar información que apoye decisiones y acciones para mejorar la calidad de vida, seguridad y desarrollo de la comunidad.


Biblioteca Pública Piloto


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2025

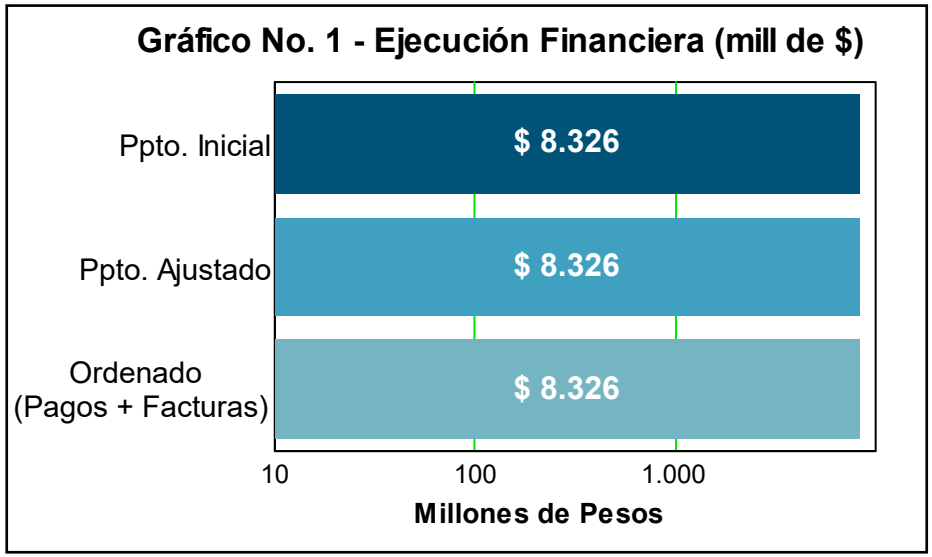


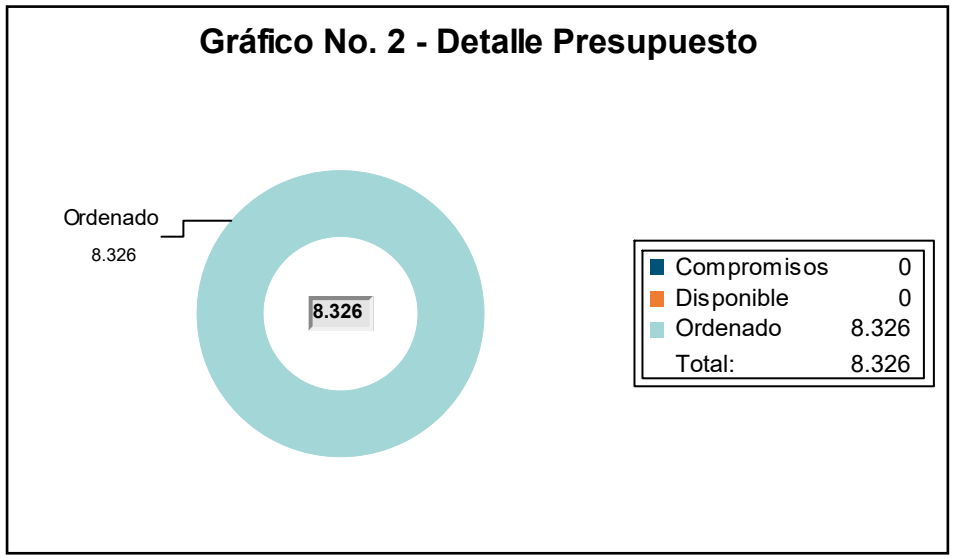

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre de 2025 comprende pagos y facturas

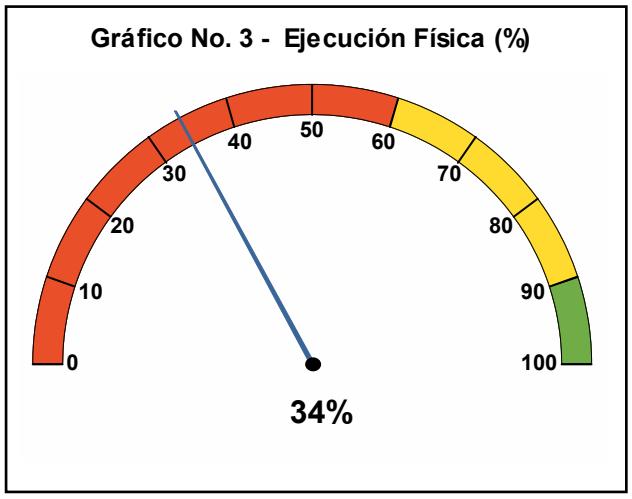

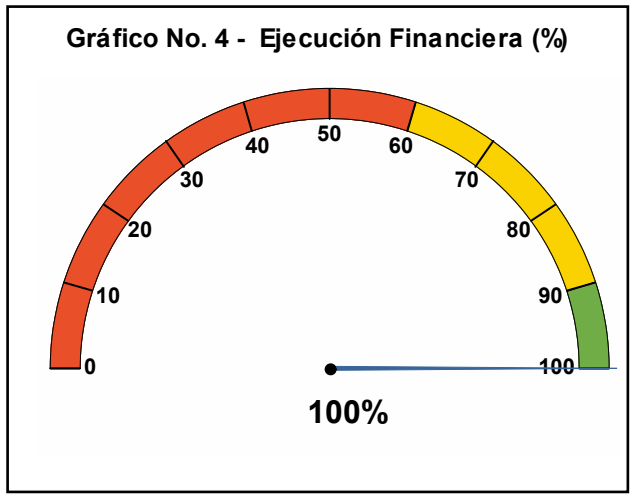

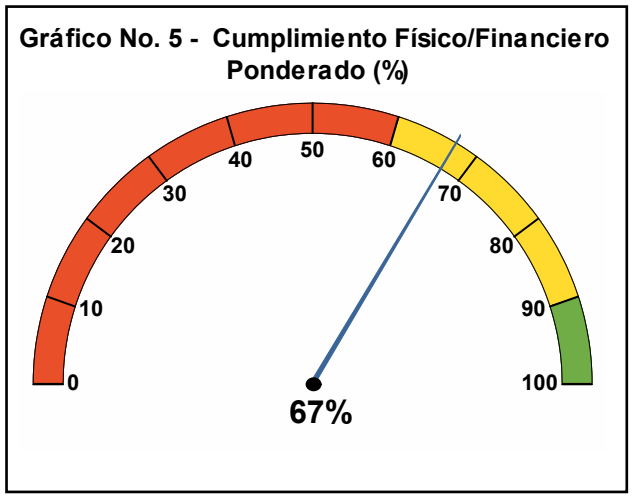

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.5 - Arte y cultura al alcance de todos
Programa: 1.5.3 - Mantenimiento y dotación de las infraestructuras culturales del Distrito

Proyecto: **240296 -Mejoramiento de sedes de la biblioteca pública piloto**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 50%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.471 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.471 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.471

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural				
BP96AA Infraestructura cultural intervenida	**Número**	**1**	**0**	**0%**

Código. Ind. SUIFP: 330106800

Descripción B/P/S: Instalación de la cubierta ligera en la terraza de la sede central, adecuación de red contra incendios y aprovechamiento de aguas lluvias. 2da etapa de adecuación de Torre de la Memoria (Sala Antioquia). 3ra etapa adecuación Torre de la Memoria (Adecuación y dotación de Auditorio).

Observación Proyecto: Aunque en 2025 se contrató al profesional responsable del apoyo técnico, fue necesario un periodo adicional para realizar el levantamiento detallado de las necesidades de la Sede Central y de la Torre de la Memoria. Este proceso resultó indispensable para estructurar adecuadamente la necesidad institucional y para formular los estudios previos requeridos para la contratación de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), entidad llamada a ejecutar las adecuaciones de la Sede Central y sus filiales. Debido a la complejidad técnica del levantamiento y a la necesidad de garantizar la calidad y precisión de la información base para los estudios y diseños, la estructuración de los estudios previos solo pudo consolidarse una vez se contó con la totalidad de la información. En consecuencia, la formalización del proceso de contratación con la EDU se materializó en el mes de octubre, y, posteriormente, durante el mes de diciembre, se llevaron a cabo reuniones con las diferentes áreas de la entidad, con el propósito de recopilar, consolidar y validar los insumos técnicos, funcionales y operativos necesarios para el levantamiento de los diseños, garantizando que estos respondan de manera integral a las necesidades identificadas en cada sede y a los lineamientos institucionales definidos lo que generó un desfase frente al cronograma inicial. En síntesis, el retraso obedeció a la necesidad de realizar un análisis técnico riguroso y a la secuencialidad obligatoria de las actividades, que exigían contar primero con información completa y validada para garantizar la adecuada ejecución de la fase inicial del proyecto.

Programa: 1.5.4 - Bibliotecas, lectura, memoria y patrimonio

Proyecto: **240294 -Fortalecimiento del museo cámara de maravillas**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 806 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 806 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 806

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de preservación del patrimonio bibliográfico y documental				
BP94AD Bienes bibliográficos y documentales preservados	**Número**	**4.940**	**5.631**	**114%**

Código. Ind. SUIFP: 330200600

Descripción B/P/S: Número de Bienes bibliográficos y documentales con procesos de preservación y conservación de la Sala Antioquia y del Archivo Fotográfico.

Observación B/P/S: Se recibió la donación del archivo fotográfico del periódico El Mundo, lo cual implicó la realización de procesos de limpieza superficial de los sobres que albergan los fotogramas, así como otras intervenciones orientadas a garantizar la preservación de las fotografías a mediano y largo plazo, tales como el retiro de ganchos, cintas y otros materiales que pudieran afectar la calidad del papel.

BP94AE Exposiciones realizadas	**Número**	**2**	**2**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 330200400

Descripción B/P/S: Número de exposiciones en sala del Museo Cámara de Maravillas.

BP94AF	**Crecimiento de usuarios**	**Número**	**6.014**	**6.749**	**112%**

Código. Ind. SUIFP: 330205600

Descripción B/P/S: Número usuarios de las salas patrimoniales y número de usuarios de contenidos del Museo Cámara de Maravillas.

Observación B/P/S: Se implementaron diversas estrategias de divulgación y apropiación de los acervos, contenidos y espacios de atención a los usuarios, como la Sala Antioquia, el Archivo Fotográfico y el MCM, mediante el boletín patrimonial de publicación mensual La vida de los archivos, orientado a difundir los contenidos y acervos que albergan estos espacios. Asimismo, se crearon dos becas de estímulo en el marco de la conmemoración de los 350 años de Medellín, denominadas "Estímulos Medellín 350: Historias en la piel de la ciudad", las cuales incentivaron a investigadores de la ciudad a formular proyectos y desarrollar dos creaciones artísticas a partir de los acervos de la Biblioteca Pública Piloto

Proyecto: 240295 Implementación de la biblioteca digital de medellín: cosmoteca la piloto

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.049 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.049 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.049

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica en asuntos de gestión de bibliotecas públicas y lectura.				
BP95AD **Personas asistidas técnicamente**	**Número**	**100**	**100**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 330106500

Descripción B/P/S: Número de personas que participan en procesos de Investigación de experiencia de usuario.

BP95AE	**Materiales de lectura disponibles en bibliotecas públicas y espacios no convencionales**	**Número**	**11.730**	**12.466**	**106%**

Código. Ind. SUIFP: 330109800

Descripción B/P/S: Libros electrónicos y audiolibros adquiridos y material patrimonial analizado y catalogado.

Observación B/P/S: El cumplimiento y superación de la meta se explica por diversos factores articulados. En primer lugar, la variación en la duración de los registros sonoros analizados, que pueden oscilar entre 10 minutos y una hora, incide directamente en el volumen y alcance del análisis realizado. Adicionalmente, la disminución del precio del dólar permitió la adquisición de un mayor número de títulos digitales en la plataforma Libby. En este sentido, el presupuesto asignado fue suficiente para ampliar la compra de contenidos digitales más allá de lo inicialmente proyectado.

BP95AF	**Usuarios atendidos**	**Número**	**110.000**	**116.526**	**106%**


Código. Ind. SUIFP: 330108500


Descripción B/P/S: Número de usuarios beneficiarios de Cosmoteca LaPiloto.

Observación B/P/S: Se implementó una estrategia de ampliación de la base de datos, acompañada de una campaña en redes sociales orientada a fortalecer la apropiación de los contenidos digitales y patrimoniales, lo que permitió incrementar el número de usuarios impactados.


Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2025

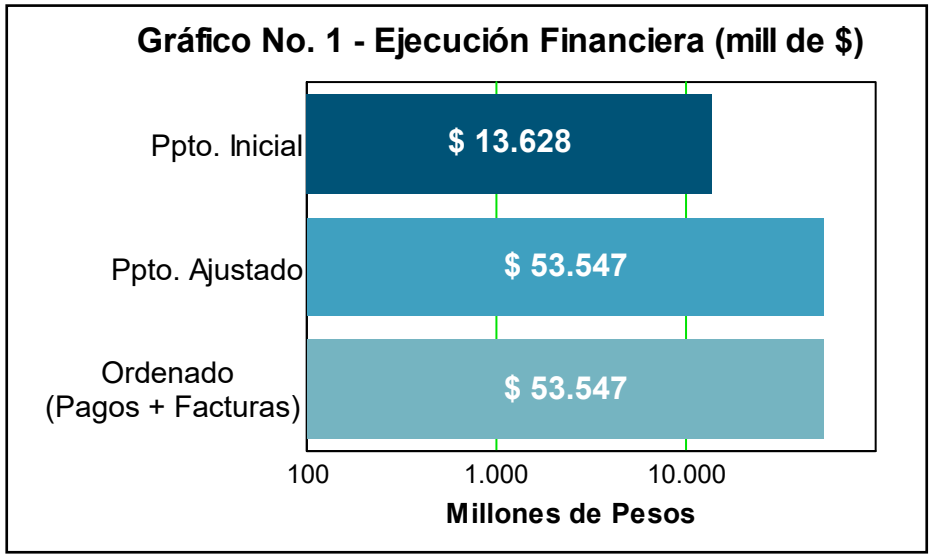


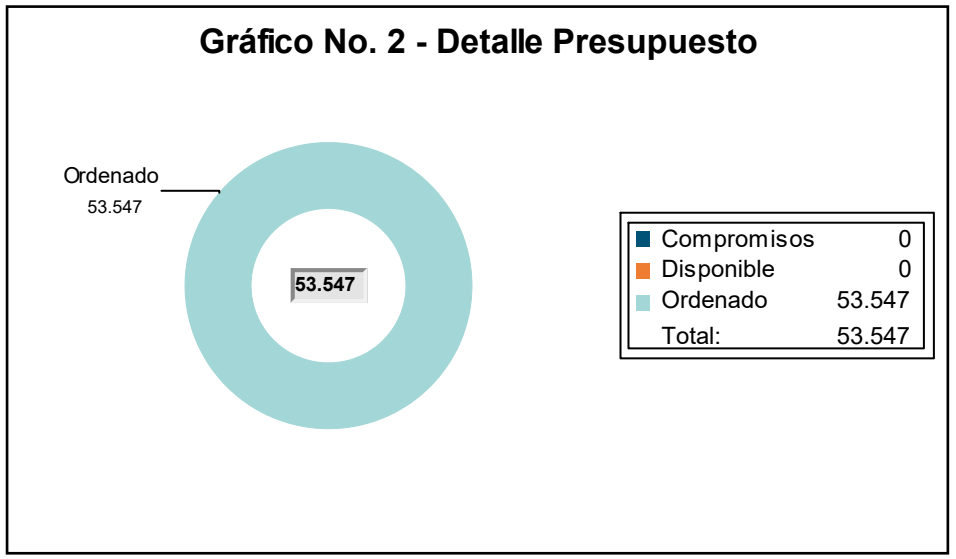

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre de 2025 comprende pagos y facturas

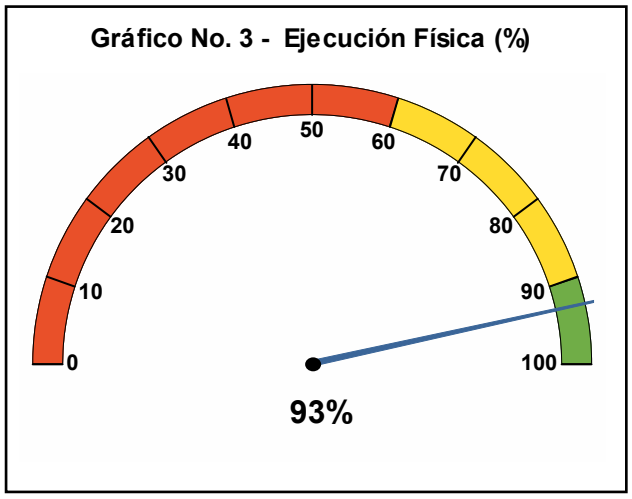

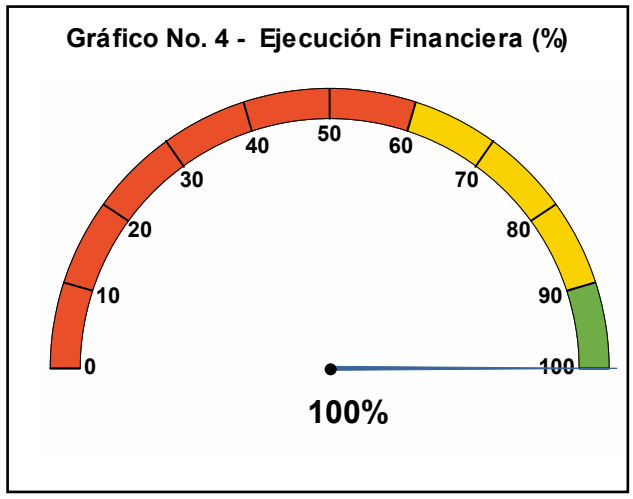

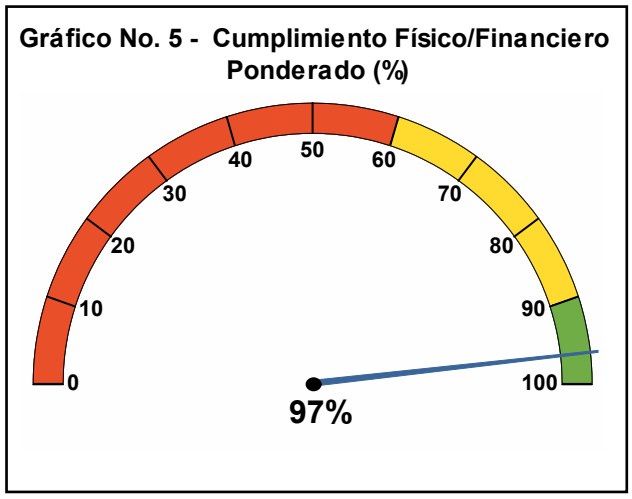

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.2 - Educación para el progreso social
Programa: 1.2.2 - Calidad y pertinencia desde preescolar hasta postsecundaria

Proyecto: **240148 -Fortalecimiento y aseguramiento de la calidad académica en la i.u. colmayor**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 98% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.833 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.833 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.833

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios tecnológicos				
CM48AA Procesos para la acreditación de la calidad de la educación superior adelantados	**Número**	**1**	**10**	**1.000%**

Código. Ind. SUIFP: 220206600

Descripción B/P/S: Número de programas acreditados.

Observación B/P/S: Programas acreditados en alta calidad: 10 1. Bacteriología y Laboratorio Clínico (reacreditado): Resolución 007454 de 30 abr 2021 2. Administración de Empresas Turísticas (reacreditado): Resolución 021401 de 11 nov 2020 3. Biotecnología (reacreditado): Resolución 013023 de 31 jul 2023 4. Tecnología en Gestión de Servicios Gastronómicos (reacreditado): Resolución 005554 de 05 abr 2023 5. Ingeniería Ambiental: Resolución 023032 de 30 nov 2021 6. Planeación y Desarrollo Social: Resolución 009415 de 27 may 2022 7. Tecnología en Delineante de Arquitectura e Ingeniería: Resolución 001015 de 03 feb 2023 8. Tecnología en Gestión Comunitaria: Resolución 006413 de 20 abr 2023 9. Construcciones Civiles: Resolución 006863 de 27 abr 2023 10. Arquitectura: Resolución 008602 de 25 may 2023. En 2025 se están desarrollando los ejercicios de autoevaluación con fines de renovación de la acreditación en alta calidad de los programas: 1. Administración de Empresas Turísticas (se radica en nov de 2025) 2. Construcciones Civiles (se radica en abril de 2026) 3. Bacteriología y Laboratorio Clínico (se radica en abril de 2026) 4. Biotecnología (se radica en julio de 2026) 5. Tecnología en Gestión Comunitaria (se radica en abril de 2026) Adicionalmente, se están desarrollando los ejercicios de autoevaluación con fines de acreditación (primera vez) de los programas: 1. Ingeniería Comercial 2. Tecnología en Gestión Ambiental

CM48AB Docentes o asistentes de educación superior beneficiarios de estrategias de mejoramiento de sus capacidades	**Número**	**242**	**230**	**95%**

Código. Ind. SUIFP: 220207400

Descripción B/P/S: Número de docentes que acceden a los procesos de formación y capacitación para el mejoramiento de las capacidades.

Observación B/P/S: Se tienen en cuenta los docentes participantes en los cursos ofertados desde la Vicerrectoría Académica, Biblioteca y Virtualidad

Programa: 1.2.5 - Escuela inteligente: Ambientes inspiradores para el aprendizaje

Proyecto: **240142 -Mejoramiento y desarrollo de la infraestructura física i.u. colmayor**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.327 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.327 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.327

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral				
CM42AA Sedes de instituciones de educación superior mejoradas	**Número**	**2**	**2**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 220207200

Descripción B/P/S: Sedes de la Institución mejoradas.

Observación B/P/S: En el año 2025 se realizaron las siguientes mejoras: En la sede central se adecuaron y optimizaron espacios académicos y administrativos, de Planeación Institucional, Tecnología, el de almacenamiento de materiales de los laboratorios de Arquitectura e Ingeniería y el Centro de Biotecnología. Adicionalmente, el distrito adecuó para la Institución la sede Nuevo Horizonte 1, ubicada en la Comuna 1 Popular.

Programa: 1.2.6 - Medellín, distrito de la educación transformadora

Proyecto: **240326 -Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la i.u. colmayor**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.159 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.159 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.159

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de saneamiento fiscal y financiero				
CM26AA Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior	**Número**	**6.300**	**6.838**	**109%**

Código. Ind. SUIFP: 220206200

Descripción B/P/S: Número de estudiantes únicos matriculados en cada vigencia teniendo en cuenta estudiantes nuevos, reingresos, reintegros, transferencias externas, internas y asistentes.

Observación B/P/S: Estudiantes únicos matriculados en los diferentes programas ofertados a 2025-2

CM26AB Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la educación superior	**Número**	**4.000**	**6.769**	**169%**

Código. Ind. SUIFP: 220207900

Descripción B/P/S: Estudiantes intervenidos con las estrategias de permanencia estudiantil.

Observación B/P/S: A corte del 31 de diciembre de 2025, un total de 2.209 estudiantes fueron intervenidos mediante las estrategias de permanencia institucional, a través de los siguientes servicios: asesorías académicas, atención individual en psicopedagogía, atención individual en neuropsicología, talleres de psicopedagogía y gestión académica. En el proceso de Bienestar Institucional, se atendieron 2.828 estudiantes, distribuidos de la siguiente manera: Asesorías médicas Asesorías psicológicas: 482 Programa de Bonos Alimentarios: 1.319 Perfil Estudiante Cívica Metro: 871 Préstamo de Chromebook: 156

Proyecto: **240341 -Fortalecimiento de la oferta de programas de educación y formación para el trabajo y desarrollo humano i.u. colmayor**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 130 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 130 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 130

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de articulación entre la educación media y el sector productivo.				
CM41AC Programas y proyectos de educación pertinente articulados con el sector productivo	**Número**	**13**	**17**	**131%**

Código. Ind. SUIFP: 220103500

Descripción B/P/S: Número de programas articulados.

Observación B/P/S: Programas de formación para el trabajo y desarrollo humano ofertados: Se pasó de contar con 13 programas a un total de 17 programas técnicos laborales, como resultado del fortalecimiento de las alianzas estratégicas y la ampliación de la oferta institucional. Este crecimiento fue posible gracias a la articulación con la Fundación Secretos para Contar, mediante la cual se dio inicio a tres grupos del programa Técnico Laboral en Organización de Viajes. Este incremento refleja el compromiso institucional con la diversificación de la oferta formativa y la pertinencia de los programas frente a las necesidades del sector productivo y del territorio. Para diciembre de 2025, la oferta de programas técnicos laborales en las diferentes comunas y municipios es la siguiente: Comuna 1 - Técnico laboral como cocinero - Técnico laboral como auxiliar en talento humano y bienestar laboral. - Técnico laboral en organización de viajes. - Técnico laboral en auxiliar en construcciones civiles. - Técnico laboral como auxiliar en publicación de contenidos digitales. San Juan Eudes - Técnico laboral como auxiliar en talento humano y bienestar laboral. - Técnico laboral como auxiliar en servicio social y comunitario. - Técnico laboral como auxiliar contable y financiero. Comuna 3 - Técnico laboral en organización de viajes. Comuna 15 - Técnico laboral como auxiliar en publicación de contenidos digitales. - Técnico laboral como auxiliar contable y financiero. Venecia - Técnico laboral como cocinero Concordia - Técnico laboral auxiliar en operador de plantas sanitarias Támesis - Técnico laboral en organización de viajes. Andes - Técnico laboral en organización de viajes. - Técnico laboral en organización de viajes. Pueblorrico - Técnico laboral en organización de viajes.

Programa: 1.2.7 - Consolidación del Sistema de Innovación e Investigación en Educación del distrito de Medellín

Proyecto: **240140 -Fortalecimiento del ecosistema tecnológico i.u. colmayor**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.807 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.807 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.807

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios tecnológicos				
CM40AA Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	**Porcentaje**	**95**	**97**	**102%**

Código. Ind. SUIFP: 459900700

Descripción B/P/S: Se mide de manera integral la calidad, fiabilidad, seguridad y eficiencia de la red inalámbrica proporcionada. Evaluar todos estos aspectos permite a las institución identificar áreas de mejora y tomar decisiones informadas sobre cómo optimizar la infraestructura tecnológica para satisfacer las crecientes necesidades de conectividad

Observación B/P/S: Se realiza una evaluación integral de la red inalámbrica institucional, considerando su desempeño, seguridad y confiabilidad, con el propósito de identificar áreas de mejora, apoyar la toma de decisiones informadas y fortalecer la infraestructura tecnológica, de manera que responda adecuadamente a las necesidades actuales y futuras de conectividad de la comunidad académica. Continuamos con el 95% de cubrimiento de Wifi, los equipos que llegaron AP en diciembre ,cuando ingresen todos los del equipo nos dispondremos a instalar para aumentar mas el porcentaje de cubrimiento.

Proyecto: **240141 -Fortalecimiento de la ciencia, la innovación la transferencia del conocimiento y el emprendimiento en la i.u. colmayor**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.372 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.372 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.372

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Estudios y diseños de infraestructura educativa				
CM41AA Personas apoyadas en su vocación científica	**Número**	**50**	**74**	**148%**

Código. Ind. SUIFP: 390600100

Descripción B/P/S: Número de personas que reciben apoyo y reconocimiento por su interés genuino y profundo por la investigación, el descubrimiento y el avance del conocimiento en diversas disciplinas y participan de proyectos de ciencia, tecnología e investigación en la Institución.

Observación B/P/S: Se registra un número mayor al proyectado debido a la favorable respuesta a las convocatorias y al incremento de postulantes que cumplieron con los requisitos aprobados.

CM41AB Programas y proyectos financiados	**Número**	**40**	**63**	**158%**

Código. Ind. SUIFP: 390600900

Descripción B/P/S: Número de Programas y proyectos financiados.

Observación B/P/S: La ejecución de los programas y proyectos financiados superó lo proyectado, como resultado de la favorable acogida, la gestión efectiva y las acciones de relacionamiento implementadas.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.2 - Educación para el progreso social
Programa: 1.2.1 - Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria

Proyecto: **250004 -25pp99-apoyo para el acceso y permanencia en educacion superior institucion universitaria colegio mayor de antioquia**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 91% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 95%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 39.918 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 39.918

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para el acceso a la educación superior				
CM04AA Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso a la educación superior	**Número**	**3.238**	**2.803**	**87%**

Código. Ind. SUIFP: 220206300

Descripción B/P/S: Corresponde a beneficiados con apoyo financiero para el acceso a la educación superior

Observación B/P/S: ACTIVIDADES IMPACTADAS POR ESTA ACCION Continuidad: 1380 Nuevos 2025-1: 338 Preicfes y preuniversitario: 312 en cursos y conducción 178 Semilleros: 326 Nuevos 2025-2: 280 TOTAL 2025-1: 2.044

CM04AB Servicio de apoyo financiero para el acceso y permanencia en programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano	**Número**	**762**	**677**	**89%**

Código. Ind. SUIFP: 220209000

Descripción B/P/S: Corresponde a beneficiados con apoyo financiero para el acceso y permanencia en programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano

Observación B/P/S: ACTIVIDADES IMPACTADAS POR ESTA ACCION servicio farmacéutico: 100 enfermería: 305 administración en salud: 25 salud oral: 37 veterinaria: 85 2025-2 técnicas comuna 1: 50 organización de viajes: 25 auxiliar contable y financiero: 25 mercadeo y marketing:25 TOTAL 2025-1: 552 TOTAL 2025-2-: 125

CM04AC Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso a programas de educación informal	**Número**	**160**	**140**	**88%**

Código. Ind. SUIFP: 220209200

Descripción B/P/S: Corresponde a beneficiados con apoyo financiero para el acceso a programas de educación informal

Observación B/P/S: ACTIVIDADES IMPACTADAS POR ESTA ACCION Manos y Pies: 30 Maquillaje social: 30 Aerografía: 30 Diplomada docencia: 30 Diplomada prospectiva: 20 - pendiente de un curso de 20 personas TOTAL 2025-1: 1.40

CM04AD Servicio de apoyo financiero para el acceso a programas de educación informal	**Número**	**3.872**	**6.714**	**173%**


Código. Ind. SUIFP: 220207900


Descripción B/P/S: Corresponde a beneficiados con apoyo financiero para la permanenecia a la educación superior

Observación B/P/S: ACTIVIDADES IMPACTADAS POR ESTA ACCION Gestores: 3.960 acompañados en las 3 IES Sostenimiento: 918 01 – POPULAR: 52 02 - SANTA CRUZ: 47 03 – MANRIQUE: 51 04 – ARANJUEZ: 70 05 – CASTILLA: 86 06 - 12 DE OCTUBRE: 151 07 – ROBLEDO: 103 8 – POPULAR: 73 13 - SAN JAVIER: 142 15 - GUAYABAL: 8 16 – BELEN: 61 60 - SAN CRISTOBAL:60 80 - SAN ANTONIO DE PRADO: 11 90 - SANTA ELENA: 3


Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - Inder


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2025

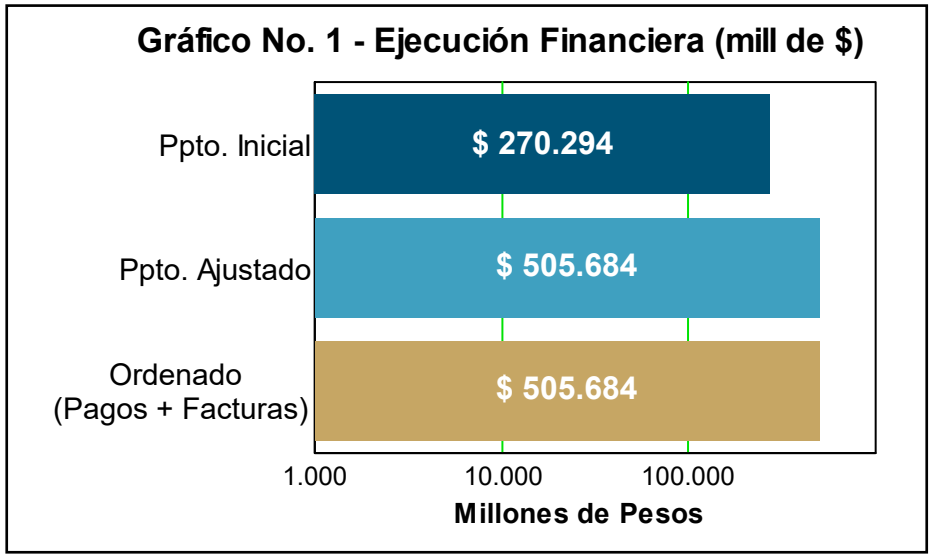


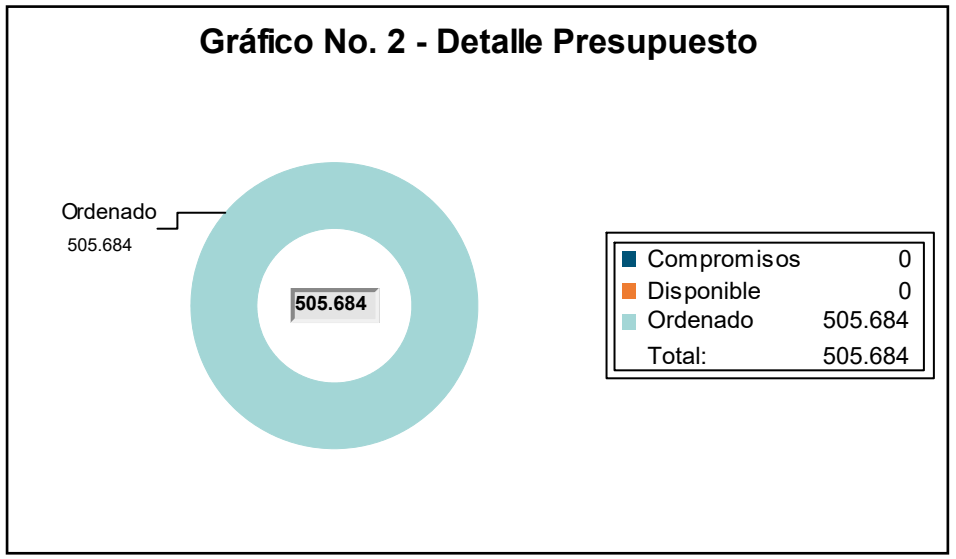

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre de 2025 comprende pagos y facturas

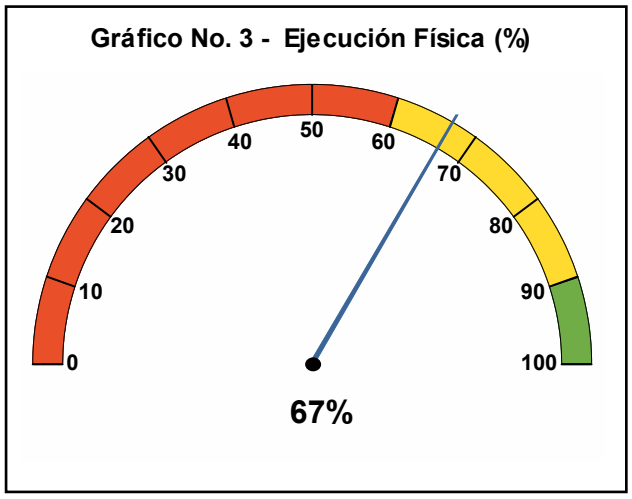

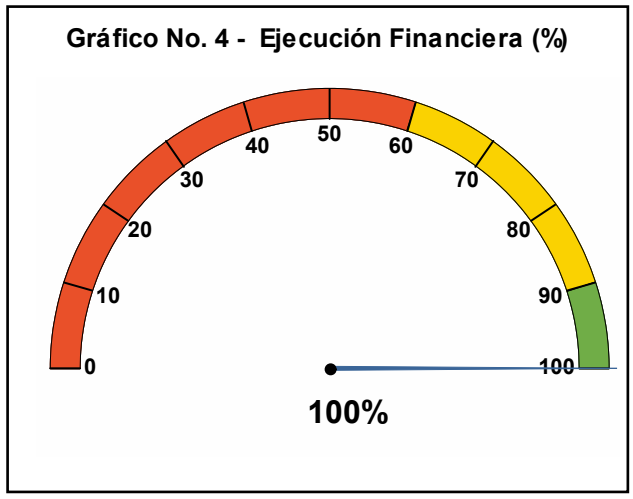

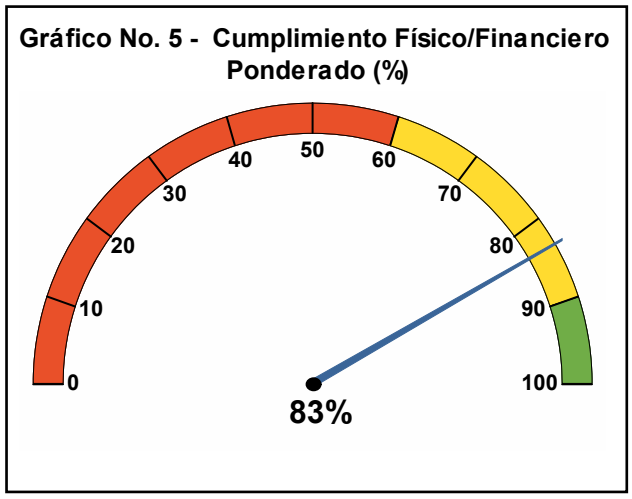

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.6 - Deporte, recreación y actividad física para el bienestar
Programa: 1.6.1 - Oportunidades para el deporte, la recreación, la actividad física y mental y el aprovechamiento del tiempo libre

Proyecto: 240082 -Servicio de escuelas deportivas

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 15.206 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 21.203 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 21.203

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte					
IN82CA	Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física	Número	47.059	56.420	120%

Código. Ind. SUIFP: 430103700

Descripción B/P/S: Cantidad de personas beneficiadas con procesos de iniciación, formación y desarrollo deportivo en diferentes disciplinas deportivas.

Observación B/P/S: Se ha logrado una ampliación de la cobertura y alta participación de la comunidad a través de las estrategias: Iniciación al Movimiento 13.289, Iniciación Deportiva 9.804, Formación Deportiva para Adolescentes y Jóvenes 20.630, Formación Deportiva para Adultos 7.036 y Desarrollo Deportivo 5.661

Proyecto: 240083 -Apoyo a las estrategias de deporte comunitario, educativo, asociado y las nuevas tendencias deportivas

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 8.229 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 12.899 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 12.899

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte					
IN83CA	Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física	Número	147.954	168.400	114%

Código. Ind. SUIFP: 430103700

Descripción B/P/S: Personas beneficiadas mediante la participación en procesos de formación en nuevas tendencias, juegos deportivos del sector educativo, juegos deporte social comunitario y apoyo a la proyección de talentos deportivos.

Observación B/P/S: Se ha logrado superar la meta a través de los servicios que se ofrecen mediante las siguientes estrategias: Adrenalina 2.543, Deporte y Convivencia 15.148, Inderescolares 32.682, Indercolegiados 46.529, Juegos Ciudad de Medellín 25.718, Universitarios 6.395, Team Medellín 1.702, Clubes Deportivos 37.683 (dep afiliados)

Proyecto: 240085 -Contribución a los estilos de vida saludables a través de la actividad física y mental

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 16.254 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 22.997 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 22.997

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte					

IN85BA	**Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física**	**Número**	**252.900**	**257.350**	**102%**

Código. Ind. SUIFP: 430103700

Descripción B/P/S: Personas que se benefician con la participación en estrategias de actividad física con fines de esparcimiento, aprovechamiento del tiempo libre y desarrollo físico procurando la integración y la promoción de espacios con la participación comunitaria.

Observación B/P/S: Se ha logrado el cumplimiento de la meta debido a la adecuada asignación de grupos y espacios, así como a la gran participación de la población en las diferentes estrategias especialmente en las ciclovías. La atención por estrategia ha sido la siguiente: Caminadas 9.516, Gimnasios 6.251, Canas al Aire 47.166, Madres Gestantes 4.755, Puntos Activos 19.945, Sin Límites 8.631 y Ciclovías 161.086

Proyecto: 240090 -Aprovechamiento del tiempo libre, espacios lúdicos y recreativos

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 10.952 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 22.806 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 22.806

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte					
IN90BA	**Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física**	**Número**	**137.988**	**156.020**	**113%**

Código. Ind. SUIFP: 430103700

Descripción B/P/S: Personas que se benefician participando en estrategias de recreación para el sano esparcimiento, el ocio y el aprovechamiento del tiempo libre garantizando la atención integral, el desarrollo de las capacidades propias en conocimientos y habilidades múltiples y que generen bienestar, seguridad y confianza.

Observación B/P/S: Se superó la meta debido a la alta participación por parte de la población. La atención de personas por estrategia ha sido la siguiente: Recreando Nuestros Barrios 20.467, Juguemos en el Parque 1.196, Ludotekas 86.818, Estimulación 14.963, Núcleos 7.418, Juegos Interactivos 17.005, MVC-Calle 1.897, MVC-Cárcel 3.068 y MVC-Víctimas 3.188

Programa: 1.6.2 - Escenarios deportivos, recreativos y de actividad física para el bienestar

Proyecto: 240079 -Administración y operación de los escenarios deportivos, recreativos y de actividad física

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 34.110 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 44.238 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 44.238

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de administración de la infraestructura deportiva					
IN79BA	**Infraestructura deportiva en operación**	**Número**	**1.052**	**1.063**	**101%**

Código. Ind. SUIFP: 430100300

Descripción B/P/S: Cantidad de escenarios e infraestructura deportiva y recreativa a los cuales se garantiza el acceso, uso y operación.

Observación B/P/S: De acuerdo con la mesa de articulación entre la Secretaría de Suministros y Servicios del Distrito y el INDER, actualmente se cuenta con 1.063 escenarios para la administración

Proyecto: 240080 -Generación y mejoramiento de escenarios deportivos

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 48% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 74%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 170.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 308.182 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 308.182

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva

IN80AA	**Infraestructura deportiva mantenida**	**Número**	**175**	**167**	**95%**

Código. Ind. SUIFP: 430100400

Descripción B/P/S: Cantidad de escenarios deportivos y recreativos intervenidos a través de mantenimientos, adecuaciones y mejoramientos garantizando las condiciones de funcionalidad de los escenarios, mejoramiento en pintura, mejoramiento de condiciones de cerramiento, funcionalidad de los servicios públicos, recuperación de mobiliario y dotación deportiva, mantenimiento de las zonas de juego entre otros

Observación B/P/S: Logramos culminar la recuperación y mejoramiento de 167 escenarios recreo deportivos entre los que se encuentran: 74 canchas de diferentes disciplinas, 35 gimnasios y street workout, 13 ludotekas y Núcleos recreativos, 14 pistas, 7 piscinas, y otros 24 escenarios como sedes administrativas, Centro gamer, fuentes y parques

IN80AB	**Parques construidos y dotados**	**Número**	**2**	**0**	**0%**

Código. Ind. SUIFP: 430101000

Descripción B/P/S: Edificios construidos y dotados para la práctica del deporte, la recreación y la actividad física.

Observación B/P/S: Se encuentra en fase de planeación contractual con la EDU para el inicio de las obras de construcción. Se tiene adelantado el proceso de estudios y diseños

Observación Proyecto: Está pendiente el reporte de obras entregadas en el mes diciembre. En cuanto a los Recreos se proyecta que para la vigencia 2026 se inicie con las obras

Programa: 1.6.3 - Fortalecimiento del Sistema Distrital del Deporte, la Recreación y la Actividad Física

Proyecto: **240081 -Fortalecimiento del sistema distrital del deporte, la recreación y la actividad física**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 13.798 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 18.705 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 18.705

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión				
IN81BA Sistema de gestión implementado	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902300

Descripción B/P/S: Diseño e implementación de sistemas de gestión y de desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y otros instrumentos de certificación de calidad a la gestión.

IN81BB	**Documentos de investigación elaborados**	**Número**	**4**	**4**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902600

Descripción B/P/S: Formulación de documentos generados a partir de la recolección, análisis y procesamiento de la información.

IN81BC	**Personas capacitadas**	**Número**	**250**	**262**	**105%**

Código. Ind. SUIFP: 459903000

Descripción B/P/S: Personas que se benefician participando en capacitaciones que permiten mejorar las competencias para integrar los organismos del sistema nacional del deporte.

Observación B/P/S: Se logró capacitar a 262 personas

IN81BD	**Sistemas de información implementados**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Diseño e implementación del sistema que asegura la disposición de la información de manera accesible, confiable y oportuna.

Programa: 1.6.4 - Posicionamiento y liderazgo deportivo y recreativo

Proyecto: **240084 -Consolidación de medellín como ciudad de gamers y grandes eventos deportivos**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.744 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.755 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.755

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios					
IN84DA	Personas beneficiadas	Número	153.941	200.368	130%

Código. Ind. SUIFP: 430103800

Descripción B/P/S: Personas beneficiadas directamente participando en eventos deportivos, recreativos y de actividad física.

Observación B/P/S: Se apoyaron 100 eventos tales como: Festival de Festivales, Revolution Games, Parceros Run, Corre mi Tierra, Corre por Amor 2025, Juegos Preparatorios Acord, Ruta Medellín, Maratón Medellín, Carrera de las Rosas, Festival de Festivales, Gamers 2025, entre otros

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico

Componente: 1.6 - Deporte, recreación y actividad física para el bienestar

Programa: 1.6.1 - Oportunidades para el deporte, la recreación, la actividad física y mental y el aprovechamiento del tiempo libre

Proyecto: **250022 -25pp99-fortalecimien del deporte la recreación y la actividad física medellín**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 42.199 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 42.199

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte					
IN22EA	Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física	Número	78.896	110.117	140%

Código. Ind. SUIFP: 430103700

Descripción B/P/S: Personas beneficiadas mediante la participación en procesos de formación en nuevas tendencias, iniciación y formación deportiva, cuadras recreativas, puntos activos, capacitaciones y eventos recreo deportivos

Observación B/P/S: Se logró atender más población de la que se tenía planeada gracias a la alta participación de la comunidad. La atención de usuarios en procesos formativos de deporte, recreación y actividad física fue de 8.998 y 101.119 eventos

Programa: 1.6.2 - Escenarios deportivos, recreativos y de actividad física para el bienestar

Proyecto: **250024 -25pp99-construcción de los escenarios deportivos, recreativos y de actividad física medellín**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 50%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.700 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.700

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Parques recreativos construidos y dotados					
IN24EA	Parques construidos y dotados	Número	3	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 430101000


Descripción B/P/S: Edificios construidos y dotados para la práctica del deporte, la recreación y la actividad física


Observación B/P/S: En cuanto al componente técnico todos las casas Recreo cuentan con el diseño arquitectónico, la idea básica aprobada y el anteproyecto en desarrollo. Se avanza en la elaboración final de los presupuestos

Observación Proyecto: El recurso se encuentra comprometido y contratado. Se proyecta que para los primeros meses de 2026 se inicien las obras


Institución Universitaria ITM


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2025

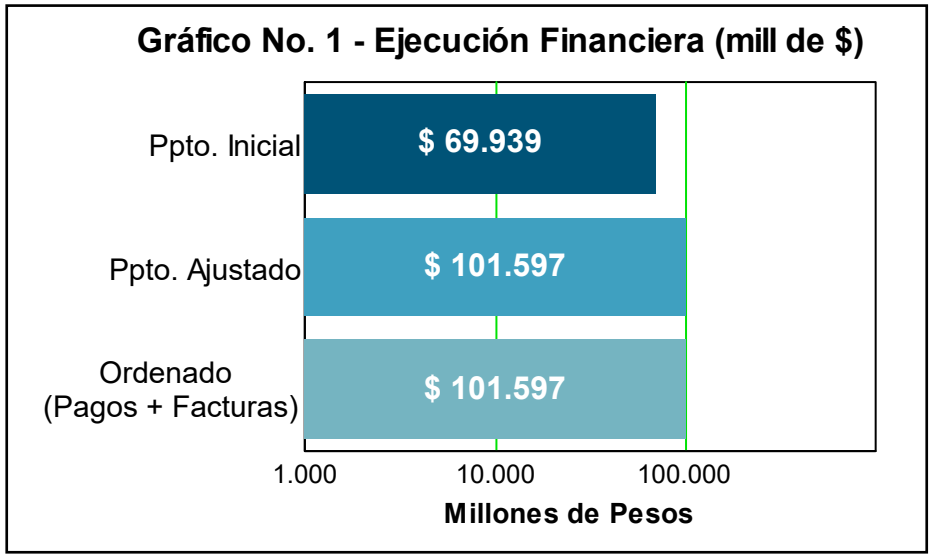


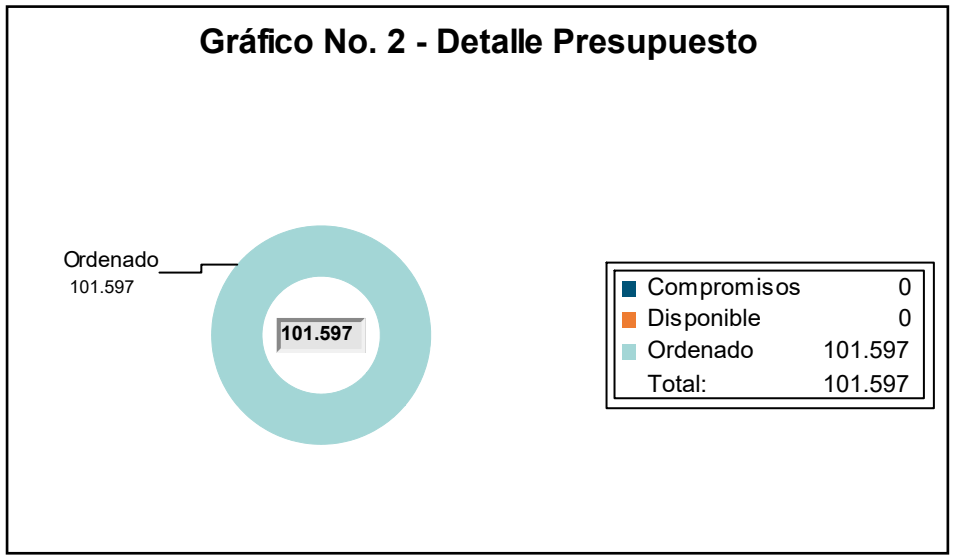

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre de 2025 comprende pagos y facturas

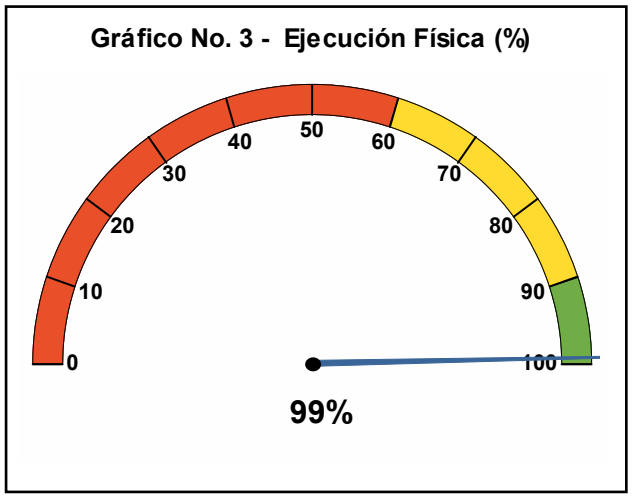

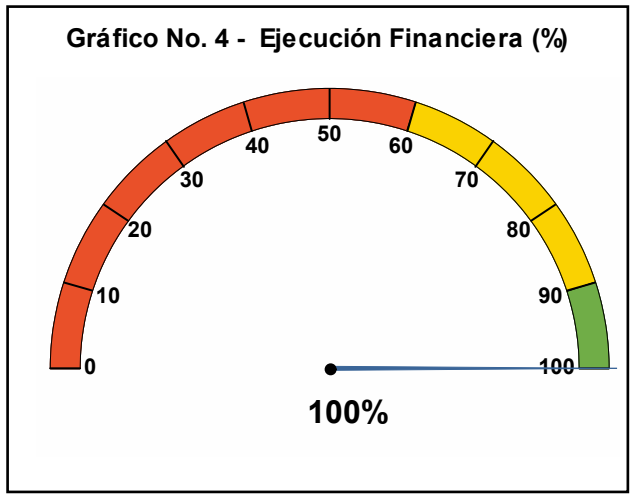

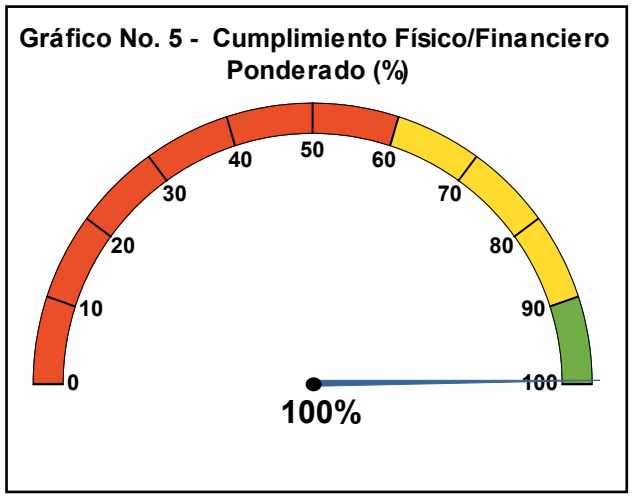

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico

Componente: 1.2 - Educación para el progreso social

Programa: 1.2.1 - Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria

Proyecto: **240130 -Desarrollo de estrategias para el acceso, la cobertura y la permanencia en la educación superior ITM**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 59.197 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 59.197 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 59.197

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de fomento para el acceso a la educación superior					
IT30AB	**Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior**	**Número**	**27.600**	**28.148**	**102%**

Código. Ind. SUIFP: 220206200

Descripción B/P/S: Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior

Observación B/P/S: Para el indicador de número de estudiantes matriculados, la demanda por matrícula en educación superior superó las expectativas inicialmente previstas, lo que permitió un mayor número de estudiantes matriculados y llevó a que la meta lograda superara lo programado para la vigencia 2025

IT30AC	**Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la educación superior**	**Número**	**15.667**	**23.695**	**151%**

Código. Ind. SUIFP: 220207900

Descripción B/P/S: 15.667 Estudiantes intervenidos mediante estrategias de permanencia estudiantil; Estudio de identificación de factores de riesgo y deserción; Restaurante Universitario; Campañas de comunicación en torno a la permanencia y Cursos transversales y específicos para el fortalecimiento de las competencias genéricas.

Observación B/P/S: La demanda de atención superó las expectativas inicialmente previstas, en coherencia con la ampliación de la cobertura de las estrategias implementadas. En este contexto, el número de estudiantes del ITM intervenidos a través de las diferentes estrategias de permanencia estudiantil fue superior a lo planificado, lo cual explica que la meta lograda superara lo programado para la vigencia 2025

Proyecto: **240134 -Extensión académica para la transformación y el progreso social ITM**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 429 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 429 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 429

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de aseguramiento de la calidad de la educación superior					
IT34AA	**Procesos para el aseguramiento de la calidad de la educación superior adelantados**	**Número**	**1**	**1,5**	**150%**

Código. Ind. SUIFP: 220208400

Descripción B/P/S: Procesos para el aseguramiento de la calidad de la educación superior adelantados

Observación B/P/S: Los resultados alcanzados superaron las expectativas inicialmente previstas, en el marco de los procesos de aseguramiento, particularmente por el fortalecimiento y ampliación de la oferta de servicios dirigida a los municipios del departamento de Antioquia y por el diseño y la puesta en marcha de programas virtuales de formación continua, los cuales tuvieron una alta demanda y aceptación, generando un nivel de ejecución superior al planeado.

Programa: 1.2.2 - Calidad y pertinencia desde preescolar hasta postsecundaria

Proyecto: 240131 -Fortalecimiento de la calidad educativa, bajo procesos innovadores de enseñanza-aprendizaje dentro de las nuevas tecnología ITM

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.548 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.548 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.548

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de aseguramiento de la calidad de la educación superior				
IT31AD Procesos para el aseguramiento de la calidad de la educación superior adelantados	**Número**	**1**	**1,02**	**102%**

Código. Ind. SUIFP: 220208400

Descripción B/P/S: Procesos para el aseguramiento de la calidad de la educación superior adelantados

Observación B/P/S: Los resultados alcanzados superaron las expectativas inicialmente previstas en el marco de los procesos de aseguramiento, particularmente en lo relacionado con las publicaciones de la línea profesoral y el desarrollo de experiencias orientadas al fomento de la cultura científica y tecnológica, las cuales registraron un nivel de ejecución y participación superior al proyectado.

Programa: 1.2.3 - Escuela incluyente y equitativa

Proyecto: 240136 -Fortalecimiento del bienestar como fuente de transformación de la educación

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.300 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.300

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Proyectos Programados en la Formulacion Plan de Acción 2026				
IT36AI Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la educación superior	**Número**	**21.084**	**24.792**	**118%**

Código. Ind. SUIFP: 220207900

Descripción B/P/S: Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la educación superior

Observación B/P/S: La prestación de los servicios de bienestar superó lo planificado, como resultado de su impacto positivo, lo cual generó un incremento en la demanda y permitió alcanzar un nivel de atención superior al previsto

Programa: 1.2.6 - Medellín, distrito de la educación transformadora

Proyecto: 240133 -Fortalecimiento de la divulgación y apropiación del conocimiento hacia la innovación y la transferencia al entorno ITM

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 500 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 500

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apropiación social del conocimiento				
IT33AF Estrategias de apropiación realizadas	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 390601100

Descripción B/P/S: Estrategias de apropiación realizadas

Proyecto: 240135 -Mejoramiento de la estrategia de internacionalización para desarrollar competencias glocales e interculturales ITM

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 167 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 167 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 167

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
IT35AG **Procesos para el aseguramiento de la calidad de la educación superior adelantados**	**Número**	**250**	**649**	**260%**

Código. Ind. SUIFP: 220208400

Descripción B/P/S: Escuelas internacionales realizadas; Eventos de internacionalización realizados y Movilidad de doble vía presencial y virtual.

Observación B/P/S: Se realizó una gestión adecuada y eficiente de los recursos, aplicando criterios de optimización, priorización y uso racional, lo que permitió maximizar los resultados alcanzados en relación con las metas establecidas.

IT35AH **Instituciones de educación superior apoyadas en el fortalecimiento de los procesos de investigación, proyección social e internacionalización**	**Número**	**1**	**1,08**	**108%**

Código. Ind. SUIFP: 220205300

Descripción B/P/S: Instituciones de educación superior apoyadas en el fortalecimiento de los procesos de investigación, proyección social e internacionalización

Observación B/P/S: Se realizó una gestión adecuada y eficiente de los recursos, aplicando criterios de optimización, priorización y uso racional, lo que permitió maximizar los resultados alcanzados en relación con las metas establecidas.

Proyecto: 240137 -Actualización tecnológica y transformación digital para una educación de excelencia ITM

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.570 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.570 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.570

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios tecnológicos				
IT37AJ **Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología**	**Porcentaje**	**33**	**33**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459900700

Descripción B/P/S: Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología

Proyecto: 240138 -Fortalecimiento de la infraestructura física para educar, fundamentada en el desarrollo sostenible

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.312 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.312 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.312

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Infraestructura educativa mantenida				
IT38AK **Sedes mantenidas**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 220106200

Descripción B/P/S: Sedes mantenidas

Programa: 1.2.7 - Consolidación del Sistema de Innovación e Investigación en Educación del distrito de Medellín

Proyecto: **240132 -Consolidación del sistema de ciencia tecnología e innovación del ITM para el posicionamiento de medellín como distrito de cti**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 916 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 916 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 916

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apropiación social del conocimiento				
IT32AE Estrategias de apropiación realizadas	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 390601100

Descripción B/P/S: Estrategias de apropiación realizadas

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico

Componente: 1.2 - Educación para el progreso social

Programa: 1.2.1 - Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria

Proyecto: **250001 -25pp99-apoyo para el acceso y permanencia de la educacion supeior - ITM medellin**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 98% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 31.658 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 31.658

Descripción del Avance


Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de saneamiento fiscal y financiero				
IT01AL Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior	**Número**	**6.156**	**6.019**	**98%**


Código. Ind. SUIFP: 220206200

Descripción B/P/S: Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior – presupuesto participativo.


Telemedellín


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2025

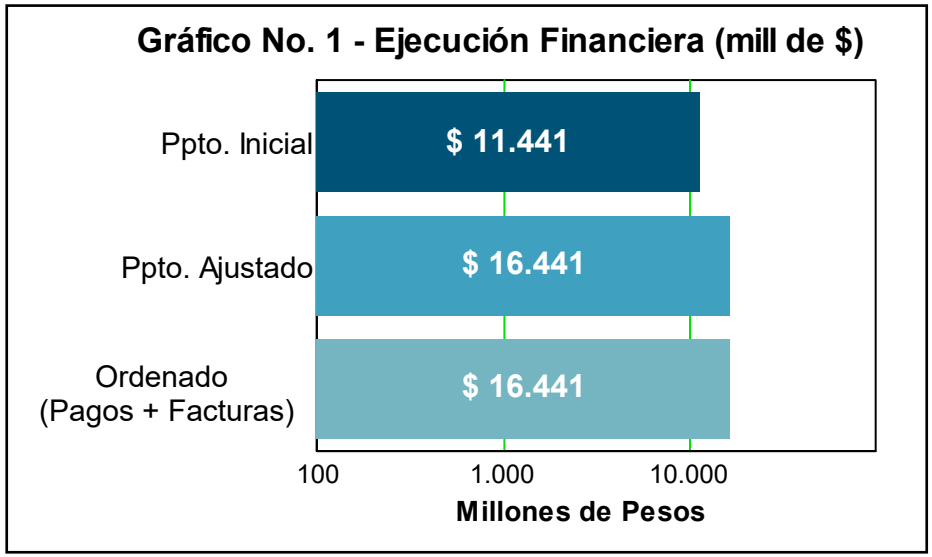


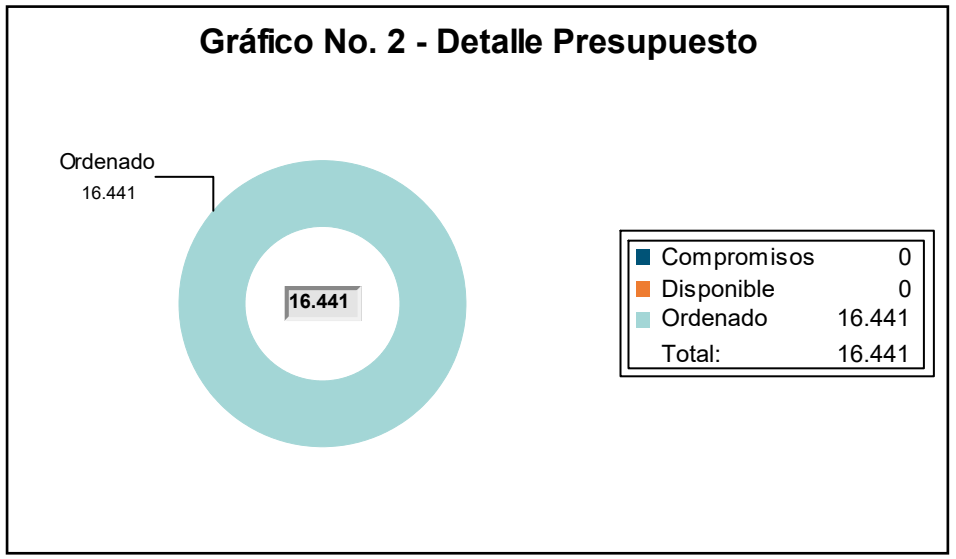

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre de 2025 comprende pagos y facturas

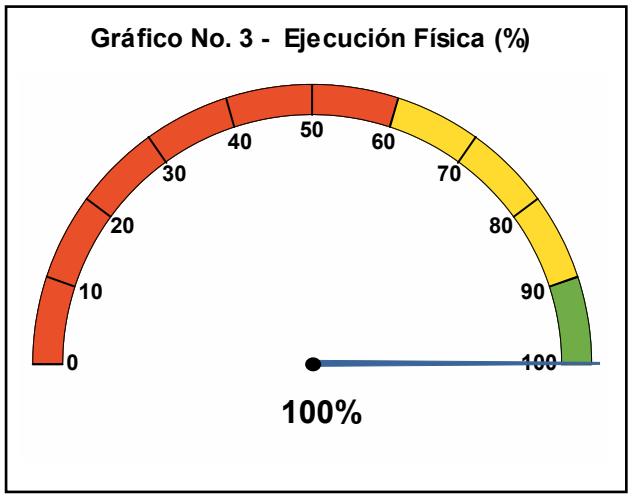

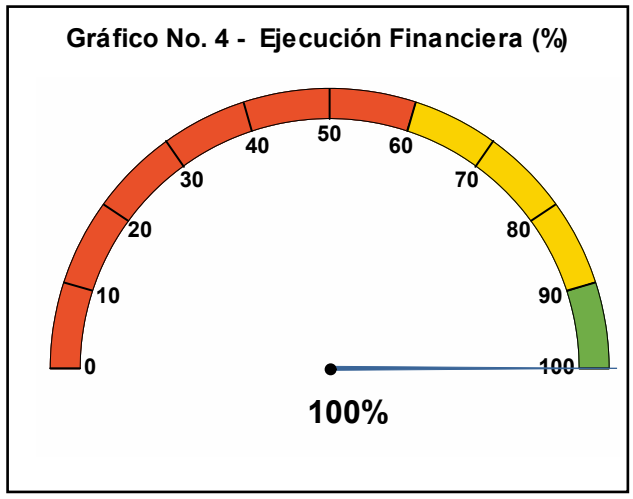

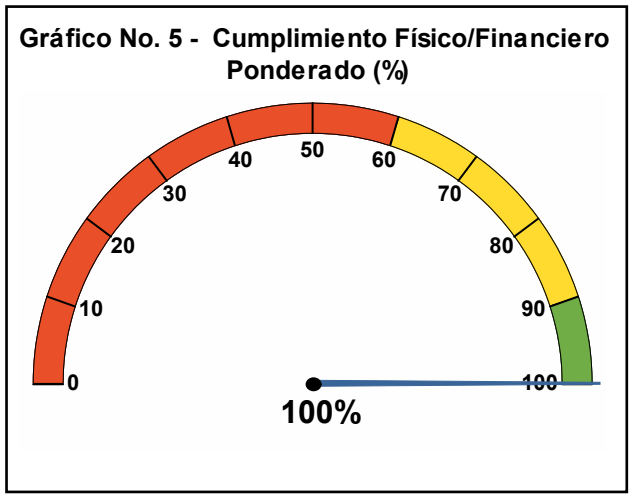

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.4 - Confianza ciudadana en la gestión pública institucional
Programa: 3.4.6 - Comunicación pública para el fortalecimiento de la institucionalidad y la confianza ciudadana

Proyecto: **240139 -Desarrollo de los servicios audiovisuales de telemedellín**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 11.441 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 16.441 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 16.441

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de contenidos audiovisuales				
TM39AA Contenidos producidos	**Horas**	**1.400**	**1.542**	**110%**


Código. Ind. SUIFP: 230208900


Descripción B/P/S: Producción y desarrollo de contenidos audiovisuales acordes con las necesidades de la ciudadanía.

Observación Proyecto: La meta definida del proyecto "Desarrollo de los servicios audiovisuales de Telemedellín" para el período 2025 era de 1.400 horas de contenidos audiovisuales producidos y emitidos. No obstante, se registró una ejecución de 1.542 horas, lo que representa un superávit de 142 horas (10,1 % superior a la meta programada). Esta sobre ejecución corresponde al cumplimiento ampliado de las funciones misionales del canal público y a una demanda creciente de contenidos de comunicación pública por parte de la ciudadanía y las entidades del Distrito. Además de la transmisión integral de la Feria de las Flores 2025, evento patrimonial y cultural de mayor visibilidad para Medellín, Telemedellín asumió la producción y emisión de múltiples coberturas especiales de ciudad, actividades institucionales de alto impacto.


Institución Universitaria Pascual Bravo


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2025

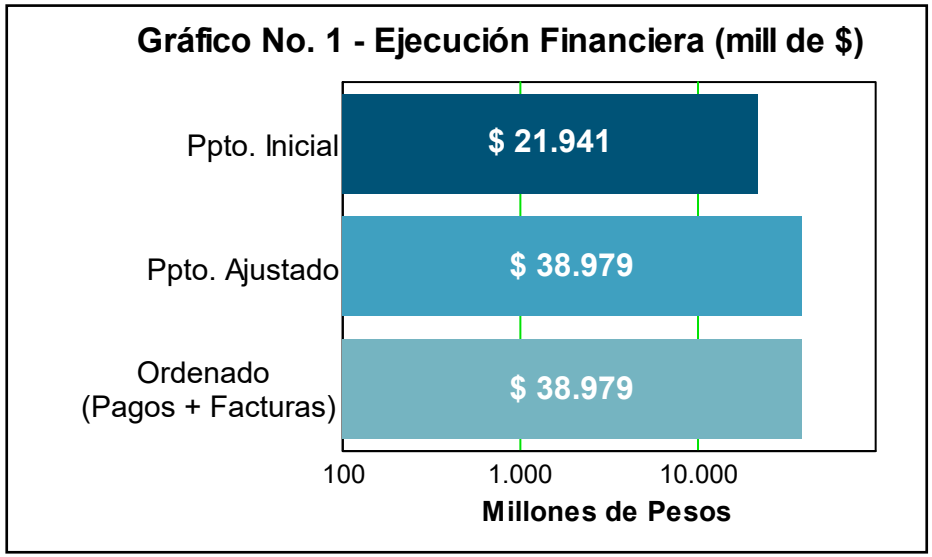


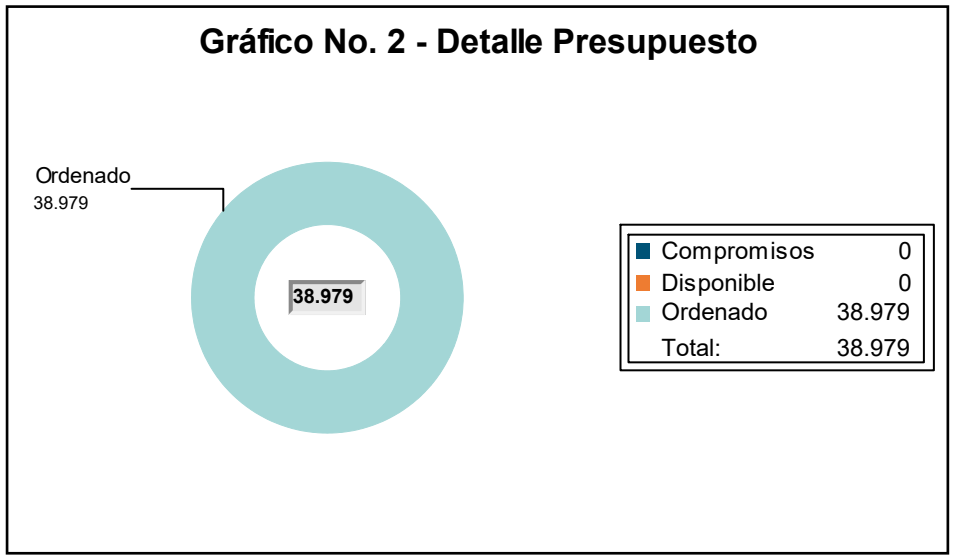

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre de 2025 comprende pagos y facturas

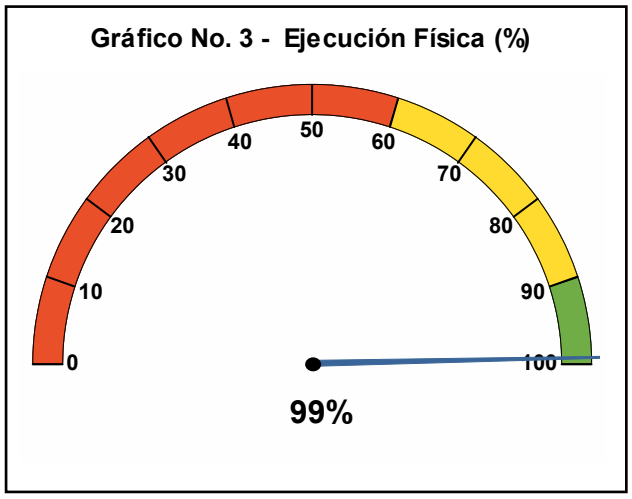

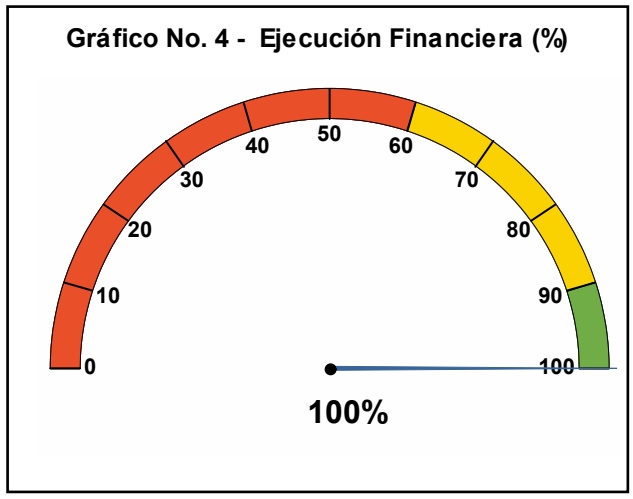

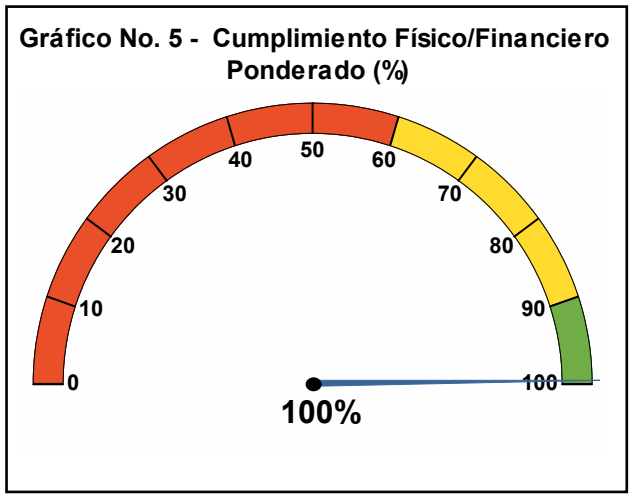

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.2 - Educación para el progreso social
Programa: 1.2.1 - Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria

Proyecto: 220122 -**Consolidación del campus verde, inteligente e inclusivo de la iu p medellin, antioquia**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.600 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.600 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.600

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos metodológicos				
PB22AA Documentos de estudios técnicos realizados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 220205600

Descripción B/P/S: Fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la Institución Universitaria Pascual Bravo.

Proyecto: 240275 -**Mejoramiento continuo de la docencia en la iu pascual bravo**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 14.930 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 14.930 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 14.930

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
PB75AB Docentes de educación de educación superior beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades	**Número**	**180**	**186**	**103%**

Código. Ind. SUIFP: 220206900

Descripción B/P/S: Fortalecer la Planta profesoral de la Institución.

Observación B/P/S: La sobreejecución en docentes contratados se justifica por el incremento significativo de la cobertura institucional, reflejado en la matrícula de 9.971 estudiantes, lo cual exigió fortalecer la planta docente para garantizar la adecuada prestación del servicio educativo. Este aumento en cobertura obedeció a estrategias de gratuidad como Matrícula Cero, Presupuesto Participativo y los Planes Integrales de Cobertura del MEN.

Proyecto: 240276 -**Fortalecimiento curricular en la iu pascual bravo**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.600 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.600 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.600

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación				
PB76AB Documentos de planeación elaborados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 220208600

Descripción B/P/S: Fortalecer el modelo de gestión curricular.

Programa: 1.2.2 - Calidad y pertinencia desde preescolar hasta postsecundaria

Proyecto: **240277 -Construcción del laboratorio global del aprendizaje para todos en la institución universitaria pascual bravo**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 500 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 500

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación				
PB77CA Documentos de planeación elaborados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 220208600

Descripción B/P/S: Elaborar un modelo de articulación de los niveles de formación que facilite el tránsito a la educación superior.

Observación B/P/S: Actualmente se avanza en el desarrollo del modelo de articulación entre los diferentes niveles de formación en el marco del Laboratorio Global del Aprendizaje para Todos.

Programa: 1.2.6 - Medellín, distrito de la educación transformadora

Proyecto: **240274 -Desarrollo integral en ciencia, tecnología, innovación y extensión en la iu pascual bravo**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.311 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.311 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.311

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación				
PB74AB Documentos de planeación elaborados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 220208600

Descripción B/P/S: Consolidar una agenda propia de ciencia, tecnología, innovación y extensión, articulada a las agendas nacionales e internacionales para aportar a la calidad y transformación de vidas y al desarrollo sostenible en sus zonas de influencia.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico

Componente: 1.2 - Educación para el progreso social

Programa: 1.2.1 - Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria

Proyecto: **250005 -25pp99-apoyo para el acceso y permanencia para la educacion supeior pascual bravo medellin, antioquia**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 98% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 17.038 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 17.038

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión documental				
PB05AA Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior	**Número**	**4.847**	**5.596**	**115%**

Código. Ind. SUIFP: 220206500

Descripción B/P/S: Como parte integral de la estrategia de acceso y permanencia en la educación superior, es fundamental reconocer los beneficiarios de los cursos de artes y oficios, programas preuniversitarios institucionales y técnicos laborales, ya que estos actúan como puentes efectivos hacia la educación superior formal

Observación B/P/S: Teniendo en cuenta que se contaba con la disponibilidad de recursos, se logró beneficiar a mas personas

PB05AB	**Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior**	**Número**	**1.620**	**1.565**	**97%**


Código. Ind. SUIFP: 220206200


Descripción B/P/S: Contribuir al incremento de la cobertura, promoción y generación de estrategias que beneficien a la participación en educación superior de los habitantes de la Ciudad de Medellín; garantizándoles acceso y permanencia a programas de Educación Superior.

Observación B/P/S: Teniendo en cuenta que se contaba con la disponibilidad de recursos, se logró beneficiar a mas personas.


Fondo de Valorización de Medellín - Fonvalmed


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2025

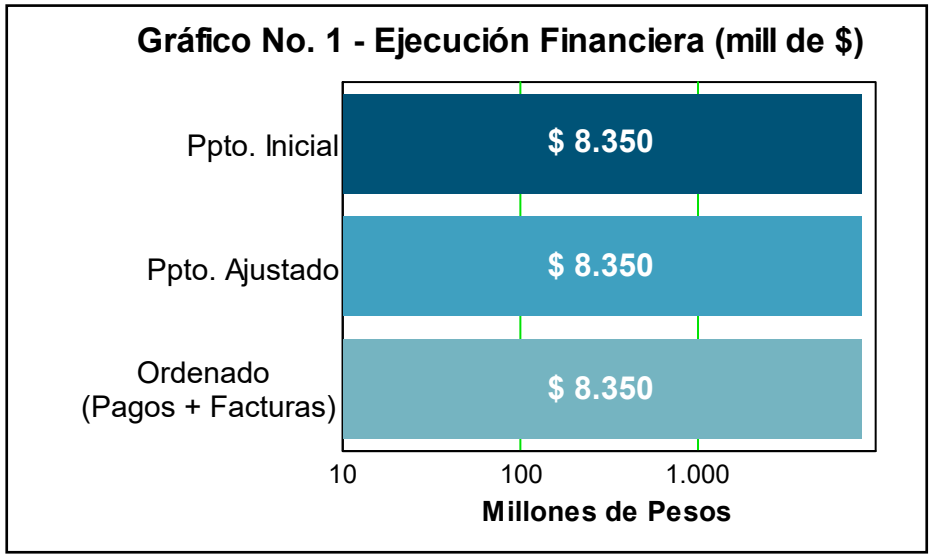


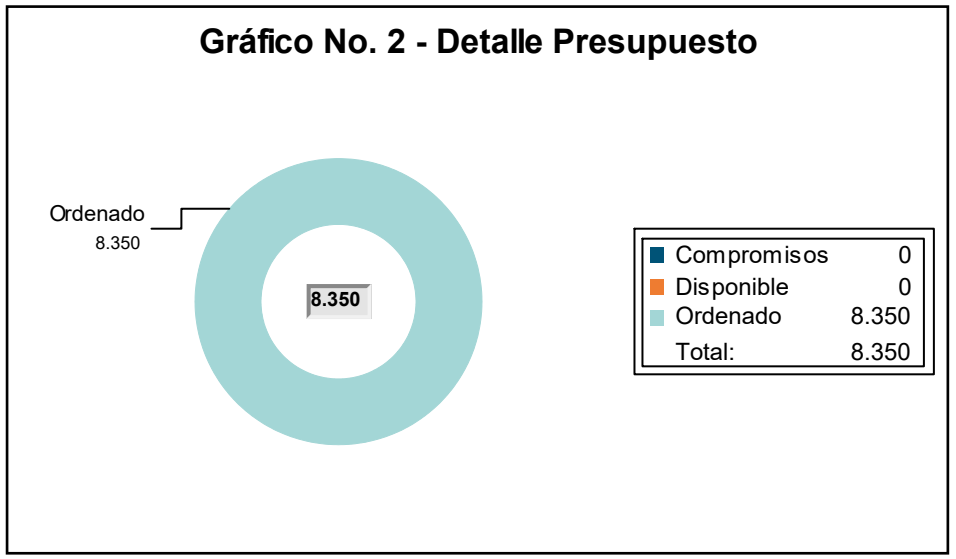

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre de 2025 comprende pagos y facturas

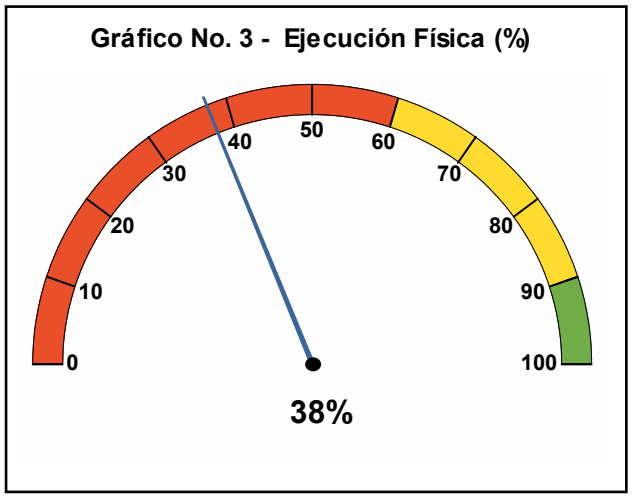

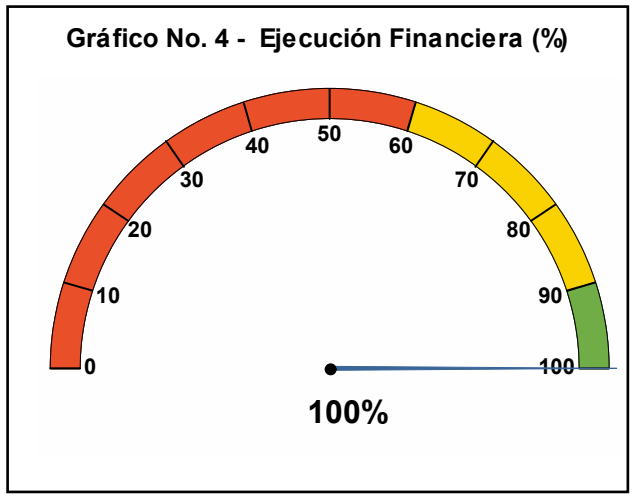

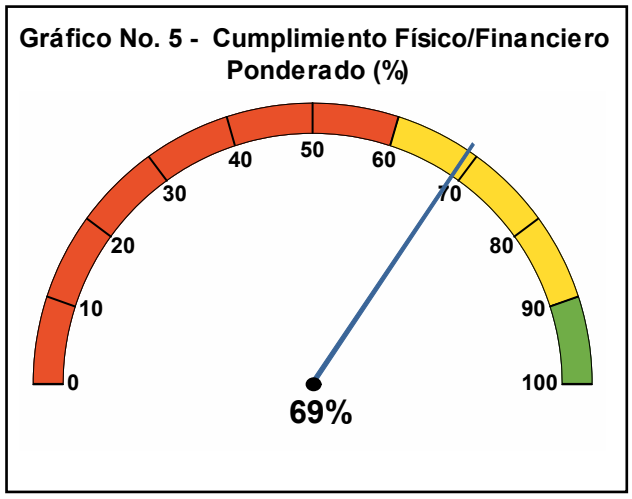

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito
Programa: 3.3.2 - Gestión del Plan de Ordenamiento Territorial y sus instrumentos

Proyecto: 240340 -Estudios de proyectos de infraestructura sujetos a financiación del pot

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 300 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 300

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Estudios de pre inversión e inversión				
FV40AA Estudios o diseños realizados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 400203400

Descripción B/P/S: Mide el número de estudios y diseños elaborados para determinar la viabilidad financiera de proyectos a través de los instrumentos del Subsistema de financiación del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. Incluye la realización de estudios de prefactibilidad para la ejecución de proyectos.

Pilar: 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo
Componente: 4.1 - Infraestructura para un modelo de ciudad sostenible
Programa: 4.1.3 - Renovación urbana integral

Proyecto: 100003 -Ampliación avenida 34 en doble calzadaampliación avenida 34 en doble calzada

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 50%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.500 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.500

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vía urbana construida				
FV03BA Vía urbana construida	**Kilómetro**	**0,31**	**0**	**0%**

Código. Ind. SUIFP: 240211300

Descripción B/P/S: Mide los kilómetros de vía construidas del proyecto.

Observación Proyecto: La obra presenta un avance físico del 20% de la primera etapa de la obra. Se continúa con actividades como aprovechamiento forestal, movimiento de tierras, excavación de pilas, gestión social e instalación de cerramientos provisionales correspondientes a la primera etapa de la obra. Se realizó el pago de anticipo por un valor de $3.946.171.022, de los cuales la interventoría ha soportado una ejecución financiera aproximada de $2.532 millones. La obra avanza en sus componentes técnico, ambiental, social y forestal, y se han atendido de manera prioritaria todas las PQRS presentadas por la comunidad. Asimismo, se cuenta con la señalización del PMT aprobada por la Secretaría de Movilidad.

Proyecto: 130355 -Paso a desnivel de la carretera el tesoro con la via linares (carrera 29d)

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 50%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.700 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.700 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.700

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Vía urbana construida

FV55BB	**Vía urbana construida**	**Kilómetro**	**0,01**	**0**	**0%**

Código. Ind. SUIFP: 240211300

Descripción B/P/S: Mide los kilómetros de vía construidas del proyecto.

Observación B/P/S: Se iniciaron los contratos de obra e interventoría que fueron adjudicados a los consorcios LINARES AP-GAF 25 y Loma del Tesoro, respectivamente. Se tuvo previsto dentro de ambos contratos un pago anticipado equivalente al 1%, con la finalidad de garantizar la caja de los contratistas en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 175 de 2025, relacionado con la reactivación del impuesto de Timbre Nacional.

Observación Proyecto: Tras la aprobación del permiso de aprovechamiento forestal por parte del AMVA el 28 de febrero, se dio inicio al proceso de solicitud de vigencias futuras ante el Concejo de Medellín, de acuerdo a los tiempos establecidos por el Concejo para su presentación, debate y aprobación , la cual que fue obtenida el 21 de agosto. Este trámite, indispensable para garantizar la viabilidad financiera del proyecto, permitió avanzar hacia la etapa de selección mediante licitación pública para la construcción de la obra y concurso de méritos para la interventoría, cumpliendo los plazos mínimos establecidos en la contratación estatal y atendiendo las diferentes observaciones por parte de los proponentes, lo que nos llevó finalmente a la suscripción de los contratos y actas de inició debidamente legalizadas el 30 de diciembre. Es importante destacar que, aunque el indicador quedó en 0 frente a la meta programada de la construcción de 10 metros de vía para el año 2025, este resultado obedece a la rigurosidad y a las necesidades propias de los procesos normativos y contractuales que garantizan la transparencia y calidad del proyecto. Con la planeación y gestión ya completadas para el inicio de la obra, el proyecto cuenta con todas las condiciones para avanzar en su ejecución durante 2026, reafirmando nuestro compromiso con el cumplimiento integral de los objetivos trazados y la entrega de una infraestructura de alta calidad.

Proyecto: 240339 -Fortalecimiento administrativo al fondo de valorización de medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.850 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.850 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.850

Descripción del Avance


Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
FV39AA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	**Número**	**1**	**1**	**100%**


Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Mide el avance de Servicio de asistencia técnica como apoyo a los procesos administrativos, técnicos, jurídicos y logísticos del Fondo de Valorización de Medellín.


Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín - Apev


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2025

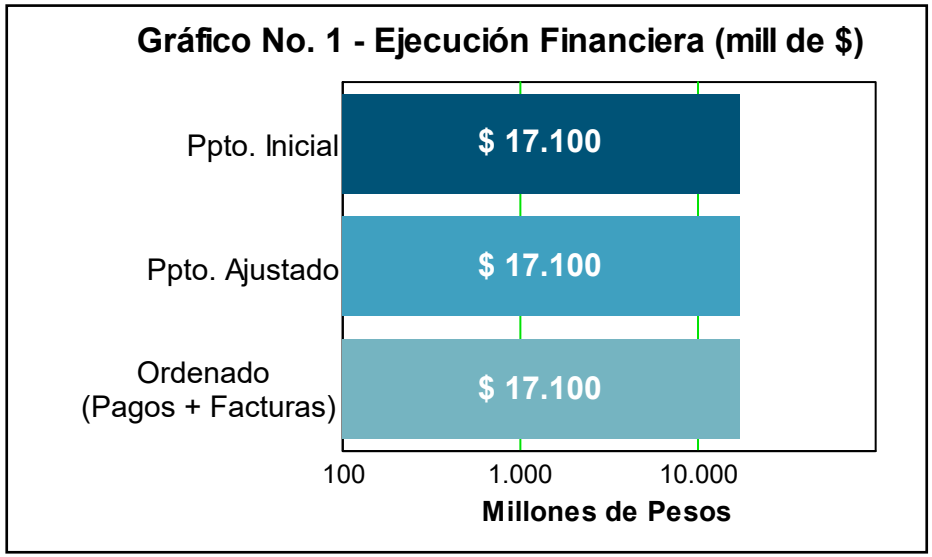


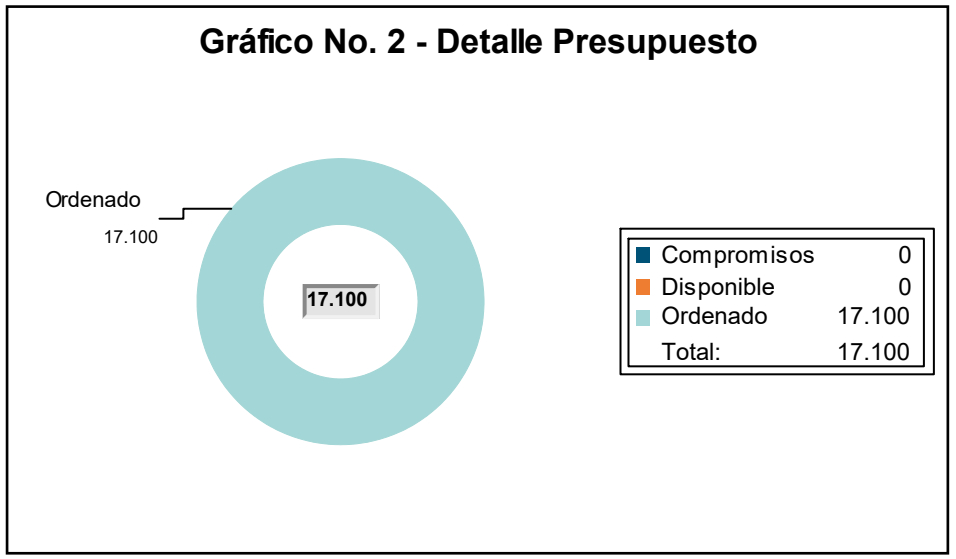

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre de 2025 comprende pagos y facturas

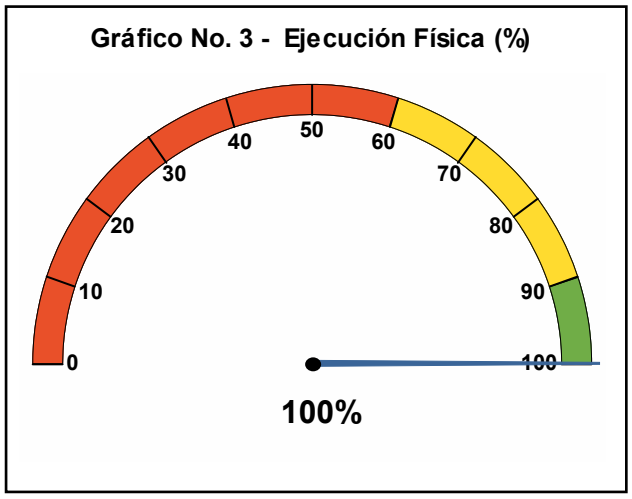

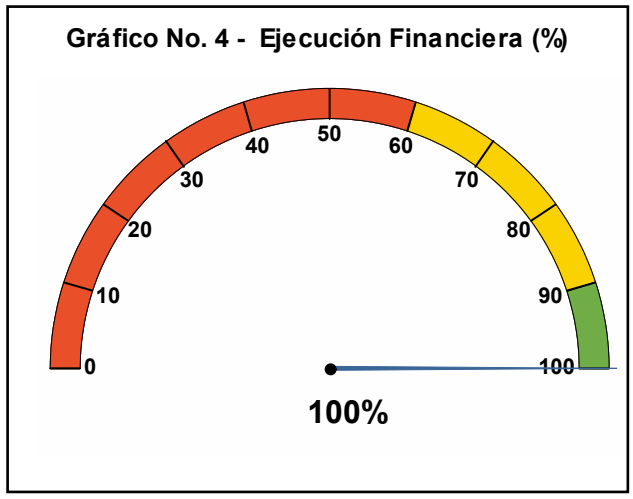

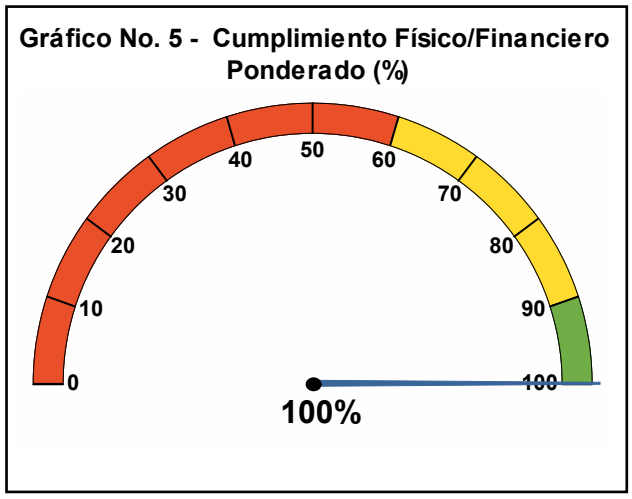

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.4 - Confianza ciudadana en la gestión pública institucional
Programa: 3.4.3 - Gestión fiscal y financiera de la Hacienda Pública

Proyecto: **240222 -Administración del recurso destinado al saneamiento del pasivo pensional de apev**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 17.100 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 17.100 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 17.100

Descripción del Avance


Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Infraestructuras culturales dotadas				
PE22AA Personas beneficiadas con el pago de deudas laborales	**Número**	**876**	**876**	**100%**


Código. Ind. SUIFP: 459903500

Descripción B/P/S: Corresponde al pago del pasivo pensional de los exfuncionarios de Empresas Varias de Medellín ESP.


Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - Isvimed


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2025

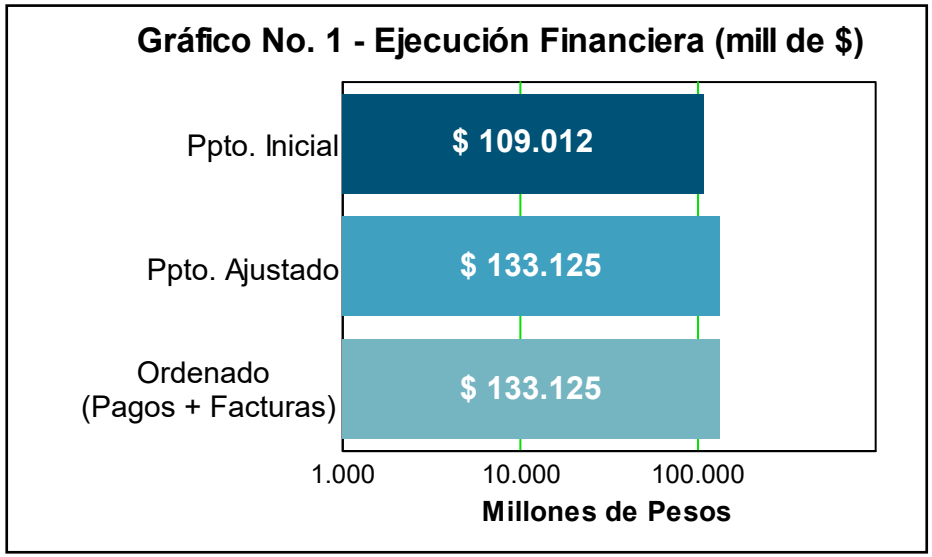


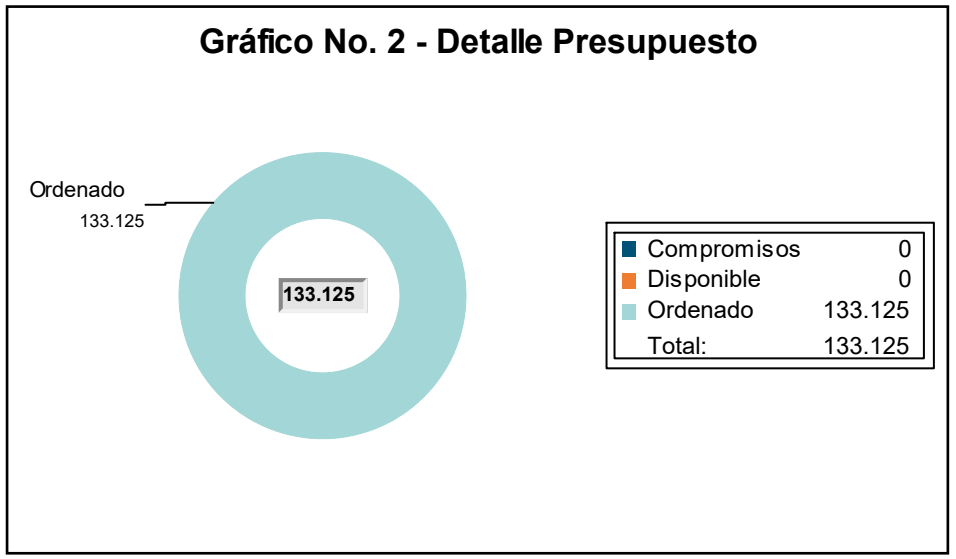

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre de 2025 comprende pagos y facturas

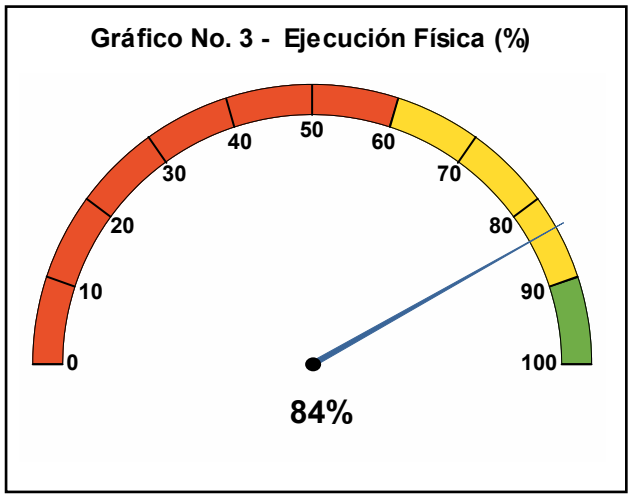

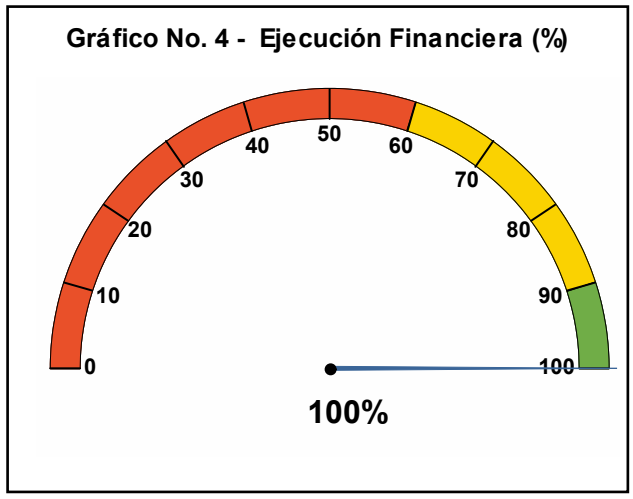

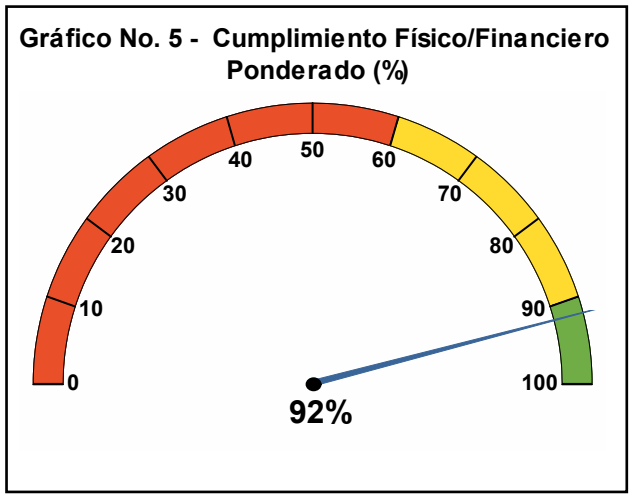

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo
Componente: 4.2 - Viviendas dignas, espacios seguros para las familias de Medellín
Programa: 4.2.1 - Acceso a vivienda en condiciones dignas para todos

Proyecto: **240198 -Desarrollo de estrategias para la adquisición de vivienda en condiciones dignas en medellin**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 78% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 89%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 38.858 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 46.289 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 46.289

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda				
IV98BA Hogares beneficiados con adquisición de vivienda	**Número**	**1.300**	**669**	**51%**

Código. Ind. SUIFP: 400103100

Descripción B/P/S: Hogares beneficiados con subsidio distrital para la adquisición de vivienda. Mide la cantidad de hogares con subsidios asignados para vivienda nueva y usada por parte del Isvimed.

Observación B/P/S: Otorgamos 996 subsidios para la adquisición de vivienda, lo que evidencia una ejecución parcial frente a la meta programada. Aunque en septiembre de 2025 se ofertaron 1.199 viviendas, una proporción de los hogares potencialmente beneficiarios no alcanzó la etapa de asignación del subsidio dentro de la vigencia, debido a que los procesos de verificación del cierre financiero, teniendo en cuenta que los hogares se encontraban en trámite de preaprobación de crédito. Adicionalmente, los cambios recientes en la política nacional de vivienda y sus efectos macroeconómicos inciden sustancialmente en el cumplimiento de la meta.

IV98BB Asistencias técnicas realizadas	**Número**	**2.500**	**4.905**	**196%**

Código. Ind. SUIFP: 400104500

Descripción B/P/S: Asistencias técnicas de acompañamiento social realizadas. Hace referencia a la cantidad de asistencias técnicas de acompañamiento social realizadas en el marco de las líneas de acción que integran la Subdirección Poblacional del Isvimed.

Observación B/P/S: Realizamos 4.905 asistencias técnicas de acompañamiento social, superando la meta del año 2025 y fortaleciendo la gestión habitacional del Distrito. Se destacan las caracterizaciones, el taller de inducción con nuevos hogares, las visitas de acompañamiento familiar, la verificación de habitabilidad y las estrategias de fortalecimiento interinstitucional. La meta fue superada por la acogida que han tenido las estrategias en el sector público, privado, cajas de compensación, entre otros, para acompañar a las familias que buscan una solución definitiva de vivienda.

IV98BC Hogares beneficiados con arrendamiento de vivienda	**Número**	**2.700**	**2.244**	**83%**

Código. Ind. SUIFP: 400103300

Descripción B/P/S: Servicio de apoyo financiero para arrendamiento de vivienda para la generación de soluciones habitacionales ágiles e inmediatas dirigidas a la población.

Programa: 4.2.2 - Mejoramiento integral de barrios

Proyecto: **240211 -Mejoramiento de las condiciones habitacionales de las familias en medellín**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 87% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 94%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 69.587 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 84.342 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 84.342

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda				
IV11AA Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda	**Número**	**5.000**	**3.080**	**62%**

Código. Ind. SUIFP: 400103200

Descripción B/P/S: Hogares beneficiados con subsidio distrital para mejoramiento de vivienda. Permite conocer la cantidad de hogares beneficiados con subsidios asignados para mejoramiento de vivienda los cuales le permiten a los hogares superar las condiciones inadecuadas de habitabilidad, y cuya ejecución de obras de mejoramiento busca que la vivienda pueda superar el déficit cualitativo de vivienda.

IV11AB	**Documentos de planeación elaborados**	**Número**	**600**	**600**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 400100400

Descripción B/P/S: Hogares beneficiados mediante resoluciones de reconocimiento de edificaciones. Cuantifica la cantidad de hogares beneficiados con Reconocimientos de Edificaciones, donde el Curador Urbano declara mediante Resolución, la existencia de construcciones de vivienda sin obtener las licencias respectivas, lo cual permite avanzar en la legalidad de las construcciones, en su consolidación como espacios óptimos para ser habitados y habilitar las viviendas para conexión de servicios públicos.

IV11AC	**Bienes fiscales saneados y titulados**	**Número**	**450**	**450**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 400100700

Descripción B/P/S: Bienes fiscales saneados o titulados. Cuantifica el número de bienes fiscales, en los que sean beneficiadas las unidades prediales con la titulación mediante cesión gratuita, donde se encuentran construidas las viviendas habitadas por las familias.

Programa: 4.2.3 - Fortalecimiento institucional del sistema Distrital Habitacional

Proyecto: 240210 -Fortalecimiento del sistema distrital habitacional con visión urbano-regional

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 267 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 264 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 264

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación					
IV10BA	**Documentos de planeación elaborados**	**Número**	**2**	**2**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 400100400

Descripción B/P/S: Sesiones del Consejo Consultivo Distrital de Política Habitacional realizadas. Número de sesiones del Consejo Consultivo Distrital de Política Habitacional - CCDPH realizadas con el fin de dinamizar el subsistema habitacional PEHMED2030.

Observación B/P/S: Realizamos dos (2) sesiones del Consejo Consultivo Distrital de Política Habitacional (CCDPH) para dinamizar el subsistema habitacional del Plan Estratégico Habitacional de Medellín con visión al año 2030 (PEHMED2030) y avanzar en la implementación de las políticas habitacionales del Distrito.

Programa: 4.2.4 - Asistencia integral, regulación y control al inquilinato

Proyecto: 240209 -Asistencia social e integral a los inquilinatos en medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 287 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 287

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable					
IV09CA	**Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social**	**Número**	**100**	**301**	**301%**

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Inquilinatos acompañados socialmente. Es una medida que cuantifica el número de inquilinatos de la ciudad con acompañamiento social en concordancia con la Política Pública para los Inquilinatos del Distrito de Medellín.

Observación B/P/S: Acompañamos socialmente a 301 inquilinatos priorizados, superando la meta establecida para el año 2025. La meta fue superada debido al fortalecimiento de la articulación interinstitucional y a la implementación de acciones integrales como microtalleres, actividades lúdicas, campañas educativas y acompañamientos constantes, así como al compromiso de los actores que hacen parte de la mesa de inquilinatos, lo que permitió una cobertura amplia y sostenida en el acompañamiento social a estos espacios.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo
Componente: 4.2 - Viviendas dignas, espacios seguros para las familias de Medellín
Programa: 4.2.2 - Mejoramiento integral de barrios

Proyecto: **250032 -25pp99-mejoramiento de vivienda en medellin**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 62% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 81%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.943 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.943

Descripción del Avance


Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vivienda de Interés Social mejoradas				
IV32AC Vivienda de interés social mejoradas	**Número**	**180**	**112**	**62%**


Código. Ind. SUIFP: 400104400

Descripción B/P/S: Implementación, actualización y sostenimiento de caracterización de Medios y Procesos Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos - MAICC.


Agencia para la Educación Superior - Sapiencia


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2025

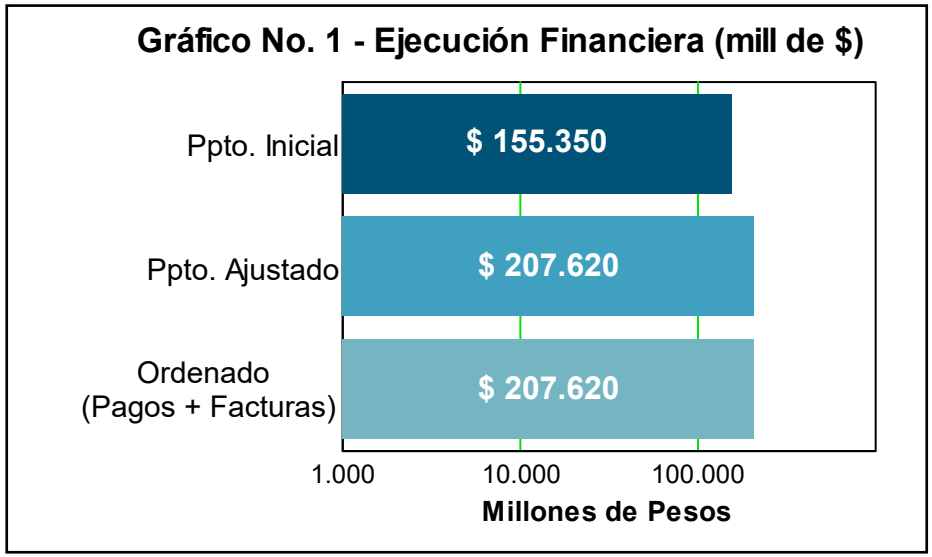


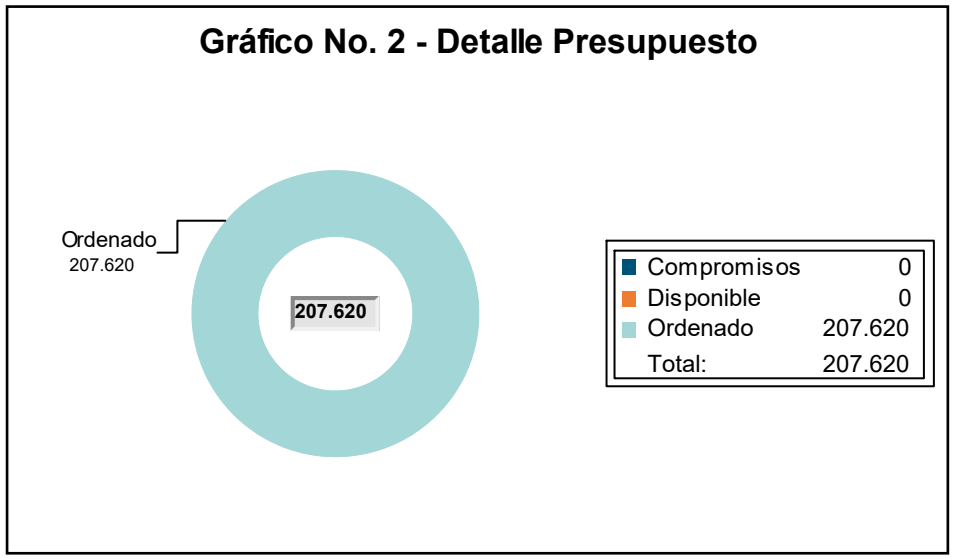

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre de 2025 comprende pagos y facturas

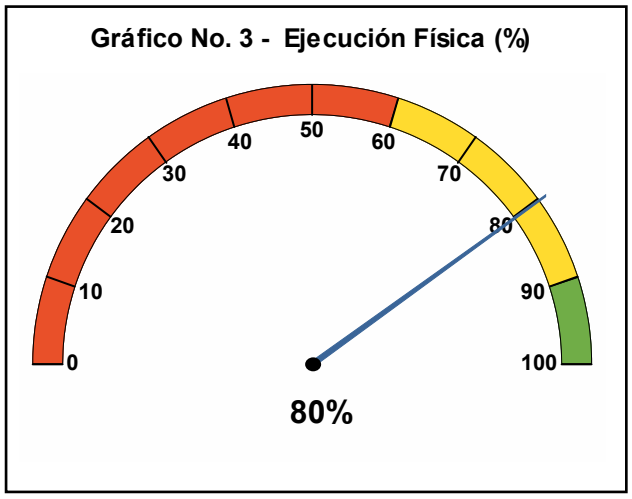

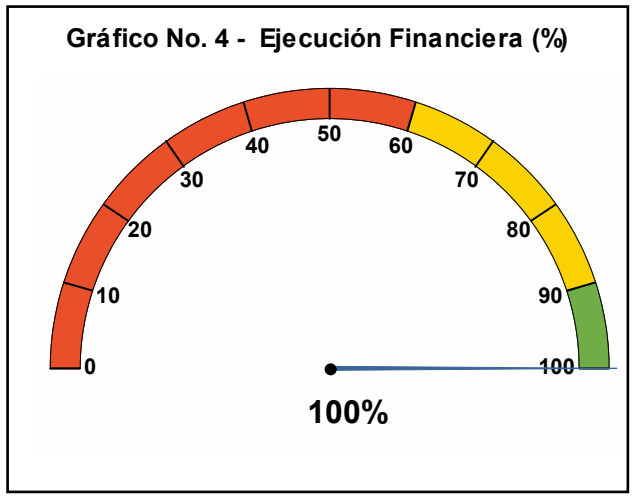

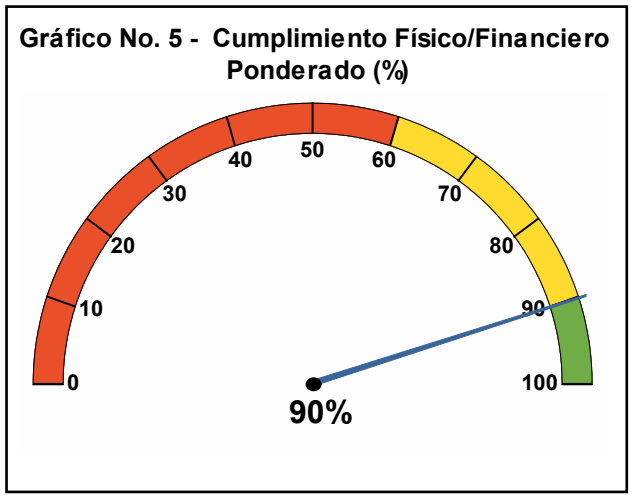

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.2 - Educación para el progreso social
Programa: 1.2.1 - Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria

Proyecto: **240298 -Fortalecimento institucional para la gestión de la educación postsecundaria**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 7.774 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.774 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.774

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios tecnológicos				
AS98CA Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	**Porcentaje**	**95**	**100**	**105%**

Código. Ind. SUIFP: 459900700

Descripción B/P/S: Corresponde a la disponibilidad de los servicios tecnológicos de la Agencia de Educación Postsecundaria Sapiencia.

Observación B/P/S: Durante el periodo reportado, Durante el periodo se gestionaron pagos y licencias, informes de seguridad MSPI, soporte y mejoras al Sistema Integrado de Información (Aurora, Minotauro, Giros, ODES), apoyo a convocatorias académicas, ajustes en la sede electrónica según ITA, optimización de servicios en la nube, seguimiento de inventario tecnológico y despliegue de nuevo canal wifi para visitantes.

AS98CB Sistema de gestión actualizado	**Número**	**9**	**9**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459903700

Descripción B/P/S: Contempla actividades de apoyo, necesarias para la actualización del sistema de gestión y de desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG

Observación B/P/S: A la fecha de corte se cuenta con la actualización del sistema de gestión y de desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en los procesos de atención al ciudadano, gestión documental, cartera, presupuesto, contabilidad, talento humano, sistemas de información, gestión administrativa, recursos físicos y gestión de bienes

AS98CC Sistema de gestión documental implementado	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459901700

Descripción B/P/S: Corresponde a las actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por la Agencia de Educación Postsecundaria Sapiencia, desde su origen hasta su destino final.

Observación B/P/S: Al corte del mes de diciembre se cuenta con el informe de seguimiento de la política de gestión documental basada en MIPG

Proyecto: **240301 -Aprovechamiento de la ciudadela occidente**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 92% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 96%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.554 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.554 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.554

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral				
AS01BA Sedes de instituciones de educación superior mejoradas	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 220207200

Descripción B/P/S: Corresponde al mantenimiento locativo y estructural de la Ciudadela Occidente.

Observación B/P/S: Durante el periodo se realiza mantenimiento locativo de la Ciudadela, se realiza pintura, mantenimiento de equipos, cerramiento de la cancha sintética, cambio de luminaria, adecuación de espacios, entre otros.

AS01BB	**Programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo**	**Número**	**4**	**3**	**75%**

Código. Ind. SUIFP: 220206700

Descripción B/P/S: Corresponde a convenios logrados para mejorar la oferta formativa en la Ciudadela Occidente.

Observación B/P/S: Se encuentra en la fase final convenio con la Secretaría de Desarrollo Económico que busca ampliar la oferta de cursos y actividades formativas en las industrias creativas, especialmente en los campos audiovisual, cultural y digital. La alianza se articulará con iniciativas como la Comisión Fílmica y el Distrito Cinema, en coherencia con los objetivos estratégicos de ciudad y la vocación cultural y tecnológica de la Ciudadela, y actualmente está en proceso de firma y revisión.

AS01BC	**Ambientes de aprendizaje dotados**	**Número**	**30**	**30**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 220205000

Descripción B/P/S: Corresponde a la dotación y disponibilidad mobiliaria y tecnológica de los espacios ofertados en la Ciudadela Occidente.

Observación B/P/S: Durante el periodo se mantuvieron los mismos ambientes de aprendizaje dotados previamente. En estos espacios se realizó mantenimiento a los equipos de computo y al mobiliario, incluyendo mesas y sillas. Cada ambiente cuenta con un inventario, facilitando la trazabilidad y priorización según el estado de los elementos y su uso operativo. Estas labores contribuyeron en conservar en optimas condiciones los espacios destinados a la formación y el desarrollo de actividades académicas.

Proyecto: 240302 -Fortalecimiento del acceso y permanencia en la educación postsecundaria sapiencia

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 86% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 93%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 114.427 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 114.308 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 114.308

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de política					
AS02FA	**Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso a la educación superior**	**Número**	**200**	**217**	**109%**

Código. Ind. SUIFP: 220206300

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas que reciben becas para acceso a la educación postsecundaria (Mejores Bachilleres).

Observación B/P/S: A la fecha se cuenta han legalizado un total de 217 becas a mejores bachilleres del Distrito de Medellín.

AS02FB	**Beneficios otorgados**	**Número**	**28.467**	**28.443**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 220206207

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas que reciben becas para acceso a la educación postsecundaria a través de la estrategia Matricula Cero.

Observación B/P/S: Al mes de diciembre a partir de los convenios suscritos con las tres (3) IES distritales y las cuatro (4) IES departamentales, luego del proceso de conciliación realizado con cinco (5) de estas instituciones, se ha establecido que 28.443 estudiantes han sido apoyados con Matrícula Cero en la vigencia 2025

AS02FC	**Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para la permanencia en la educación superior**	**Número**	**5.523**	**3.283**	**59%**

Código. Ind. SUIFP: 220206100

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas que reciben becas o créditos condonables para continuidad en la educación postsecundaria.

Observación B/P/S: Al mes de diciembre, el acumulado de estudiantes desfinanciados, que renovaron su crédito es de 6932: 2025-1 3649 y 2025-2 3283. Es importante aclarar que este indicador hace referencia a los estudiantes desfinanciados de las convocatorias de los años 2022 y 2023 que han continuado con sus estudios. Dicho esto, la cantidad de estudiantes disminuye cada semestre debido a la dinámica de novedades académicas que se presentan, entre las cuales se contemplan: deserción, suspensión del beneficio, suspensión del programa, graduación, entre otras causales; lo anterior implica que, para las siguientes vigencias, los estudiantes que salen temporalmente del beneficio, pueden reingresar al conteo del indicador.

Programa: 1.2.7 - Consolidación del Sistema de Innovación e Investigación en Educación del distrito de Medellín

Proyecto: 240303 -Consolidación del sistema de investigación, innovación y emprendimiento del distrito de medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.684 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.178 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.178

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Salón comunal adecuado					
AS03DA	**Programas y proyectos financiados**	**Número**	**19**	**19**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 390600900

Descripción B/P/S: Corresponde al número de proyectos de investigación financiados por el Distrito de Medellín a través de la Agencia de Educación Postsecundaria Sapiencia

Observación B/P/S: Se realizó la entrega de los premios Medellín Investiga se realizó el 20 de noviembre, con la premiación y financiación de 19 proyectos académicos de investigación

Proyecto: **240304 -Aprovechamiento de las capacidades del observatorio de educación postsecundaria - odes -**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 39% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 69%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 513 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 513 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 513

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda					
AS04DA	**Contenidos educativos para la educación superior producidos**	**Número**	**23**	**9**	**39%**

Código. Ind. SUIFP: 220207000

Descripción B/P/S: Corresponde al número de documentos con la estrategia de comunicaciones implementada, piezas gráficas, coloquio de educación postsecundaria y cátedra OdeS.

Observación B/P/S: Se reportan las piezas gráficas y publicaciones asociadas a la realización del 5to Coloquio de Educación Superior, realizado en el marco de los premios Medellín Investiga

AS04DB	**Documentos de estudios e investigación en educación superior realizados**	**Número**	**21**	**8**	**38%**

Código. Ind. SUIFP: 220208000

Descripción B/P/S: Corresponde al número documentos de estudios y encuestas, Boletines e infografías, asociadas a la educación postsecundaria en el Distrito de Medellín.

Observación B/P/S: Se reportan 9 productos de información: 4 informes técnicos y 4 notas temáticas realizadas por el Observatorio de Sapiencia

Observación Proyecto: El bajo cumplimiento de los valores estadísticos de este proyecto, obedecen a contingencias contractuales presentadas a los largo de la vigencia 2025, lo que dificultó la consolidación de información de base necesaria para la producción de la documentación y piezas inicialmente programadas.

Programa: 1.2.8 - Distrito bilingüe

Proyecto: **240299 -Fortalecimiento de alianzas para la educación postsecundaria**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 427 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 419 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 419

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para la prestación de transporte público masivo de pasajeros					
AS99BA	**Programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo**	**Número**	**2**	**3**	**150%**

Código. Ind. SUIFP: 220206700

Descripción B/P/S: Corresponde a las articulaciones logradas con el sector productivo para visibilizar la gestión de la Agencia de Educación Postsecundaria Sapiencia

Observación B/P/S: Al mes de diciembre se realizó alianza con la Universidad San Buenaventura para proyecto de empleabilidad con impacto a 60 persona, alianza con la Institución Universitaria Pascual Bravo en colaboración con el proceso de Investigación de la Subdirección, para la realización del Laboratorio de Innovación textil 4.0: hemisferio vivo, en el marco de Colombia Moda, y alianza con la Universidad de Antioquia a través de un convenio interadministrativo, para el desarrollo del programa Ruta Reskilling Medellín.

Proyecto: 240300 - Implementación del programa bilingüismo sapiencia

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.112 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.938 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.938

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de divulgación en temas relacionados con los servicios de apoyo a la compra pública					
AS00CA	**Instituciones de educación superior fortalecidas en competencias comunicativas en idiomas extranjeros**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 220208500

Descripción B/P/S: Corresponde al fortalecimiento de la Agencia para formar personas en inglés como segunda lengua.

Observación B/P/S: Al corte del mes de diciembre se ha contado con la participación de 9018 personas en estrategias de formación en inglés, mediante cursos ofertados en convenio con Eafit, proceso de formación con Esumer, Universidad de Antioquia y plataforma @medellin

Componente: 1.3 - Desarrollo económico, productividad y competitividad

Programa: 1.3.1 - Formación y empleo

Proyecto: 240305 - Implementación del programa vision4rios en el distrito de medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 96% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 98%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 15.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 17.800 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 17.800

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información implementado					
AS05BA	**Sistemas de información implementados**	**Número**	**2**	**2**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 220205400

Descripción B/P/S: Corresponde a las convocatorias para acceso a procesos formativos a través del programa Vision4rios

Observación B/P/S: Se conformó el banco de oferentes tanto para programas técnico Laboral ETDH, como el banco de oferentes para Cursos Cortos Modulares 2025.

AS05BB	**Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior**	**Número**	**5.000**	**4.462**	**89%**

Código. Ind. SUIFP: 220206500

Descripción B/P/S: Corresponde al número de cursos financiados en áreas de la industria 4.0

Observación B/P/S: Durante el periodo de referencia, a través de la plataforma @Medellín, se formaron 3673 personas en habilidades digitales, innovación y tecnologías 4.0, y 789 personas en competencias relacionadas con las industrias creativas y del entretenimiento, lo cual refleja el compromiso con la transformación digital, la adopción de tecnologías emergentes en la educación superior y el impulso al talento creativo en sectores con alto potencial de innovación cultural.

AS05BC	**Programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo**	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 220206700

Descripción B/P/S: Corresponde a las articulaciones logradas entre la educación superior y el sector productivo.

Observación B/P/S: A la fecha de corte se adelanta el relacionamiento con actores del sector educativo y productivo, con el fin de articular su participación en el proyecto Estud-IA (antes Vision4RIOS).

Programa: 1.3.11 - Medellín, capital creativa

Proyecto: 240297 -Implementación del ecosistema de la ciudadela digital universitaria @medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.861 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.443 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.443

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información de la Educación para el Trabajo- ETDH actualizad				
AS97BA Sistemas de información para la educación para el trabajo- etdh actualizados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 220204100

Descripción B/P/S: Corresponde al mantenimiento y disponibilidad de la plataforma @medellin

Observación B/P/S: Durante el periodo reportado se avanzó en el fortalecimiento de la Ciudadela Digital @Medellín, con logros destacados en la actualización de sistemas y módulos, el desarrollo de nuevas herramientas para la automatización de matrículas e inscripciones, y la optimización de la infraestructura tecnológica. Se implementaron procesos de integración y conectividad con servicios externos, se corrigieron errores y se realizaron acciones de soporte técnico que garantizan la estabilidad y seguridad de las plataformas. Asimismo, se consolidaron prácticas de automatización en los despliegues y se elaboraron manuales técnicos que facilitan la sostenibilidad y continuidad operativa. En conjunto, estos avances reflejan una gestión eficiente, orientada a la innovación, la mejora continua y la consolidación de un ecosistema digital más robusto, escalable y al servicio de la comunidad educativa.

AS97BB Programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 220206700

Descripción B/P/S: Corresponde a las articulaciones logradas con el sector productivo para promover la educación digital.

Observación B/P/S: Se firmó memorando de entendimiento con el equipo de futbol Formas íntimas para acceder a formación a través de la plataforma @Medellín

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico

Componente: 1.2 - Educación para el progreso social

Programa: 1.2.1 - Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria

Proyecto: 250002 -25pp99-fortalecimineto del acceso y permanencia en la educacion postsecundaria sapiencia medellin

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 54% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 77%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 51.246 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 51.246

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión documental				
AS02GA Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior	**Número**	**909**	**488**	**54%**

Código. Ind. SUIFP: 220206500

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas que acceden a cupos para educación superior a través del Presupuesto participativo.

Observación B/P/S: A la fecha de corte, se cuenta con la legalización de 488 beneficiarios correspondientes a la convocatoria 2025-2: ENLAZA MUNDOS PP: 15 EXTENDIENDO FRONTERAS EDUCATIVAS PP: 122 FONDO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 351.

Observación Proyecto: El resultado reportado en este proyecto se origina en el comportamiento de la convocatoria correspondiente al segundo semestre de 2025. Si bien los cupos fueron priorizados por la comunidad, la asignación real está sujeta a la demanda de los estudiantes y del cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención del beneficio.

Componente: 1.3 - Desarrollo económico, productividad y competitividad

Programa: 1.3.1 - Formación y empleo

Proyecto: **250003 -25pp99-implementacion del programa visionarios en el distrito de medellin**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 50%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 448 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 448

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión documental					
AS03EA	**Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior**	**Número**	**100**	**0**	**0%**

Código. Ind. SUIFP: 220206500


Descripción B/P/S: Corresponde a las personas que acceden a cupos para educación superior a través del Presupuesto participativo.


Observación B/P/S: El reporte de las personas formadas en Habilidades Digitales e Industrias Culturales y Creativas con financiamiento por Presupuesto Participativo en los programas de Cursos Cortos Modulares se encuentra condicionado al cronograma de ejecución del Convenio Interadministrativo No. 451 de 2025. Dado que las actividades académicas iniciaron entre octubre y noviembre de 2025, fue necesaria la formalización de una prórroga de la vigencia del convenio con el fin de garantizar el cumplimiento de la totalidad de las horas de formación programadas. En consecuencia, el proceso de cierre académico y certificación se proyecta para mayo de 2026. A la fecha, se cuenta con un avance preliminar de 77 personas matriculadas (Comuna 5: 30, Comuna 9: 30, Comuna 90: 17); el consolidado definitivo de personas certificadas se establecerá una vez se surta el cierre administrativo correspondiente.

Observación Proyecto: La financiación PP para la vigencia actual, destinada a beneficiar personas de las comunas 05, 09 y 90, en el marco de la Convocatoria 01 de Cursos Cortos Modulares 2025, se encuentra actualmente en fase de ejecución desde el mes de noviembre de 2025. Por lo anterior, se conocerá el número real de beneficiarios certificados al cierre del primer trimestre de 2026.


Museo Casa de la Memoria


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2025

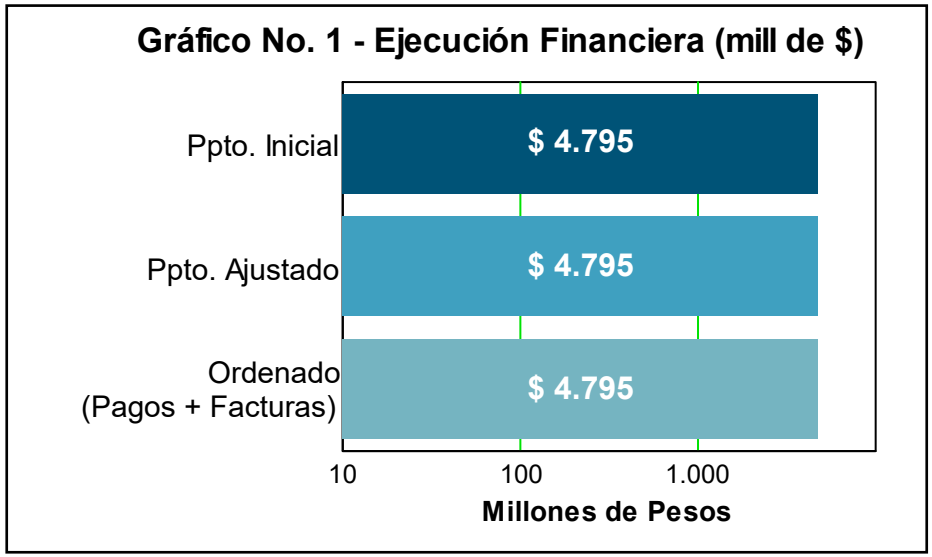


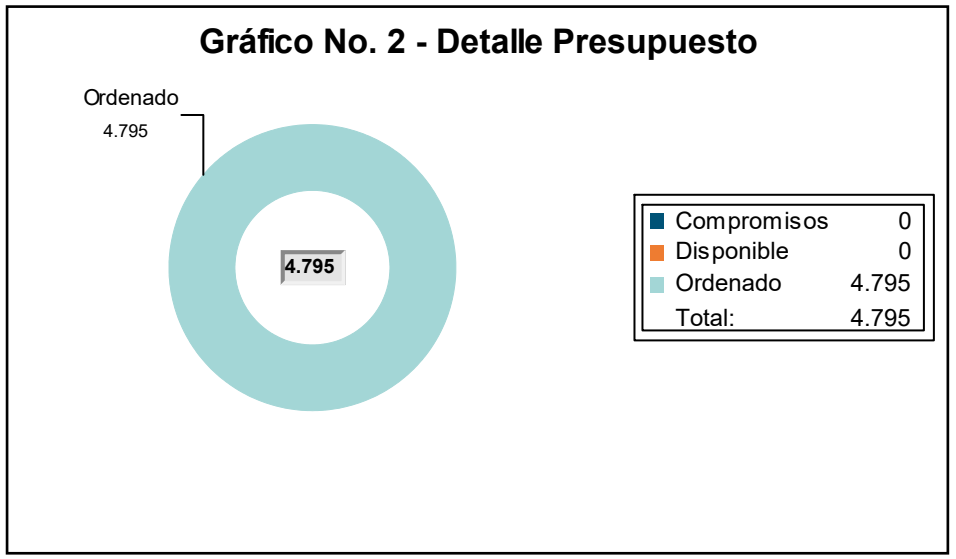

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre de 2025 comprende pagos y facturas

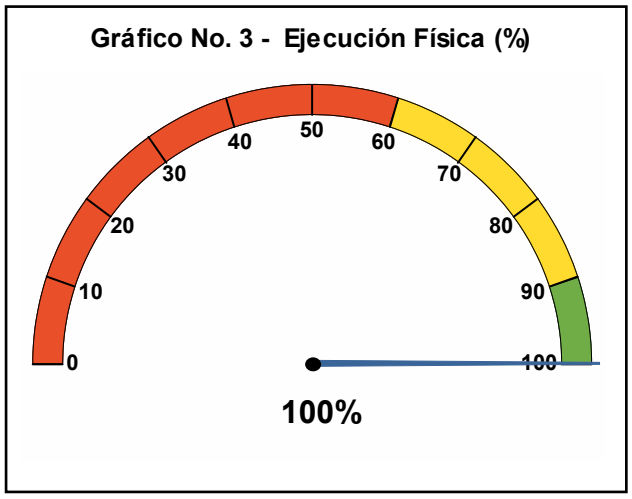

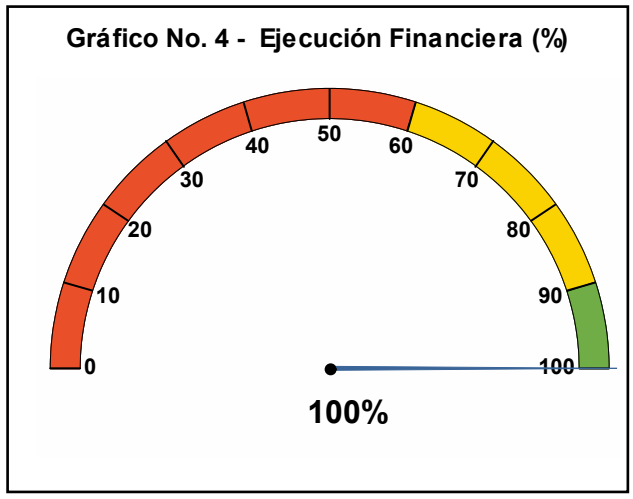

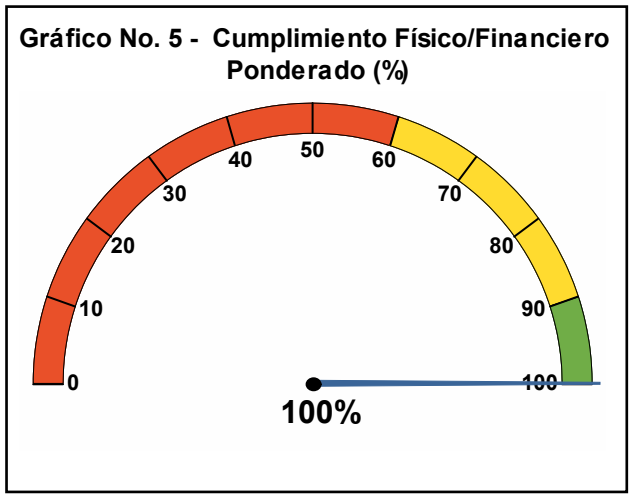

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente
Componente: 2.4 - Paz, víctimas y Derechos Humanos
Programa: 2.4.2 - Atención – reparación integral a víctimas del conflicto armado y Justicia Transicional y Restaurativa

Proyecto: **240200 -Contribución a la gestión del conocimiento, circulación y democratización del saber**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 889 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 889 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 889

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
MM00AA Personas capacitadas	**Número de personas**	**40.000**	**55.536**	**139%**

Código. Ind. SUIFP: 459903000

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas que participan e interactúan con los contenidos y actividades del Museo, en acciones como: - Laboratorios para la reflexión, creación y activación de los procesos expositivos. - Experiencias expositivas - Procesos de sensibilización y activación pedagógica - Formación en temas focalizados - Eventos culturales, artísticos y académicos - Recorridos guiados y a pie por el Museo Casa de la Memoria

Observación B/P/S: El Museo Casa de la Memoria ha alcanzado un impacto significativo, beneficiando a 55.536 personas a través de su diversificada oferta cultural y pedagógica. Esta incluye recorridos guiados presenciales, visitas autónomas a las salas de exposición y amplia programación de eventos artísticos, culturales y formativos.

Proyecto: **240204 -Apoyo a organizaciones sociales y de víctimas que impulsen la construcción de memorias, la transformación social y la superación del conflicto**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 409 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 409 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 409

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de satisfacción y garantías de no repetición a víctimas del conflicto armado				
MM04AA Víctimas que acceden a medidas de satisfacción y de garantías de no repetición a nivel individual	**Número**	**500**	**791**	**158%**

Código. Ind. SUIFP: 410109200

Descripción B/P/S: Personas victimas que participan de los contenidos, eventos y acciones desarrolladas por el Museo Casa de la Memoria.

Observación B/P/S: Atendimos durante el 2025, más de 791 víctimas registradas en el Registro Único de Víctimas (RUV), ofreciéndoles participación en actividades que incluyen contenidos en salas de exposición, eventos culturales, artísticos, pedagógicos y otras acciones desarrolladas por el Museo, enfocadas en la memoria histórica del conflicto armado y la construcción de paz.

MM04AB Medidas de reparación simbólica apoyadas	**Número**	**20**	**22**	**110%**

Código. Ind. SUIFP: 410109400

Descripción B/P/S: Corresponde a las conmemoraciones y eventos de reparación simbólica realizados por el Museo Casa de la Memoria.

Observación B/P/S: El Museo Casa de la Memoria logró realizar 22 actos conmemorativos de valor simbólico. Estas acciones tienen como objetivo impactar positivamente la memoria histórica y fomentar el reconocimiento del daño sufrido. Además, promueven la participación activa y colaborativa de las víctimas, posicionándolas como protagonistas esenciales en la construcción de su propia reparación.

MM04AC Prácticas artísticas, culturales y pedagógicas implementadas	**Número**	**80**	**97**	**121%**

Código. Ind. SUIFP: 410110100

Descripción B/P/S: Desarrollo de prácticas artísticas, culturales y pedagógicas, eventos académicos y acciones del Museo Casa de la Memoria, orientadas a víctimas y públicos diversos.

Observación B/P/S: Durante el periodo 2025, el Museo Casa de la Memoria ejecutó un total de 97 procesos sociales. Esta amplia oferta abarcó prácticas artísticas, culturales, pedagógicas, recorridos de memoria y eventos académicos, facilitando la interacción y el diálogo entre víctimas y públicos diversos en un mismo espacio de encuentro.

MM04AD	**Eventos de participación realizados**	**Número**	**32**	**38**	**119%**

Código. Ind. SUIFP: 410103800

Descripción B/P/S: Corresponde a los procesos de fortalecimiento de organizaciones sociales, civiles y de victimas, desarrollados por el Museo Casa de la Memoria.

Observación B/P/S: Durante el periodo 2025, se consolidó el fortalecimiento y la asistencia técnica dirigida a organizaciones sociales, civiles y de víctimas en el Distrito. En total, se ejecutaron 38 procesos enfocados en potenciar sus competencias y capacidades para la construcción de la memoria.

Proyecto: 240206 Implementación de estrategias organizacionales y comunicacionales en favor del museo casa de la memoria

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.526 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.526 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.526

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
MM06AP Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Corresponde a la gestión y el fortalecimiento de los procesos estratégicos y administrativos del Museo Casa de la Memoria.

Observación B/P/S: Durante el periodo 2025, el Museo Casa de la Memoria impulsó y consolidó el fortalecimiento y la eficiencia de sus procesos estratégicos y administrativos.

MM06AQ	**Personas capacitadas**	**Número de personas**	**20**	**20**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459903000

Descripción B/P/S: Servidores públicos y contratistas, que participan de espacios formativos (diplomados, cursos o talleres) para el desarrollo y fortalecimiento de la gestión institucional y comunicacional del Museo Casa de la Memoria.

Observación B/P/S: El Museo Casa de la Memoria logró la certificación de 20 integrantes de su equipo (servidores públicos y contratistas) en el tema de "Sensibilización en Habilidades Blandas".

Proyecto: 240207 Generación de experiencias museográficas y pedagógicas en clave de memoria

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 819 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 819 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 819

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de museología				
MM07AA Proyectos expositivos realizados	**Número**	**5**	**7**	**140%**

Código. Ind. SUIFP: 410108900

Descripción B/P/S: Hace referencia a la planeación y ejecución de proyectos expositivos desarrollados por el Museo Casa de la Memoria.

Observación B/P/S: A partir de la investigación y la curaduría, el Museo Casa de la Memoria ha desarrollado siete (7) proyectos expositivos y museográficos. Estos se han llevado a cabo tanto en las instalaciones del Museo como en otros sitios del Distrito, lo que ha permitido la aplicación de técnicas de diseño y museografía, así como la identificación de diversas prácticas artísticas.

MM07AB	**Iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente**	**Número**	**4**	**4**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 410101100

Descripción B/P/S: Corresponde a las cuatro (4) iniciativas ganadoras durante el desarrollo de la convocatoria pública de estímulos del Museo Casa de la Memoria.

Observación B/P/S: Durante el periodo 2025, el Museo Casa de la Memoria formalizó la entrega de los cuatro (4) estímulos correspondientes a las iniciativas seleccionadas de su convocatoria pública.

Proyecto: 240208 -Mantenimiento y adecuación de espacios del museo casa de la memoria

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 152 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 152 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 152

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Museos de Memoria Histórica adecuados				
MM08AA Museos de memoria histórica adecuados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 410100300


Descripción B/P/S: Infraestructura física del Museo Casa de la Memoria, intervenida con obras de mantenimiento y adecuación de espacios.


Observación B/P/S: A lo largo de 2025, el Museo Casa de la Memoria realizo acciones para el mantenimiento de su infraestructura. Estas acciones incluyeron la ejecución de tareas periódicas y rutinarias en los espacios físicos que lo demandaron, con el fin de garantizar su correcta funcionalidad y conservación.

Observación Proyecto: Tal y como se ha realizado históricamente, los avances definitivos del proyecto de inversión 240208 Mantenimiento y adecuación de espacios del Museo Casa de la Memoria, se reportan en el mes diciembre de 2025 con la presentación del informe final de ejecución del Plan de Mantenimiento del MCM de la vigencia 2025, a cargo del área de bienes y mantenimiento. Con corte a diciembre 31 de 2025, se acreditará además el cumplimiento del 100% al indicador Museos de Memoria Histórica adecuados


Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público - Privadas


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2025

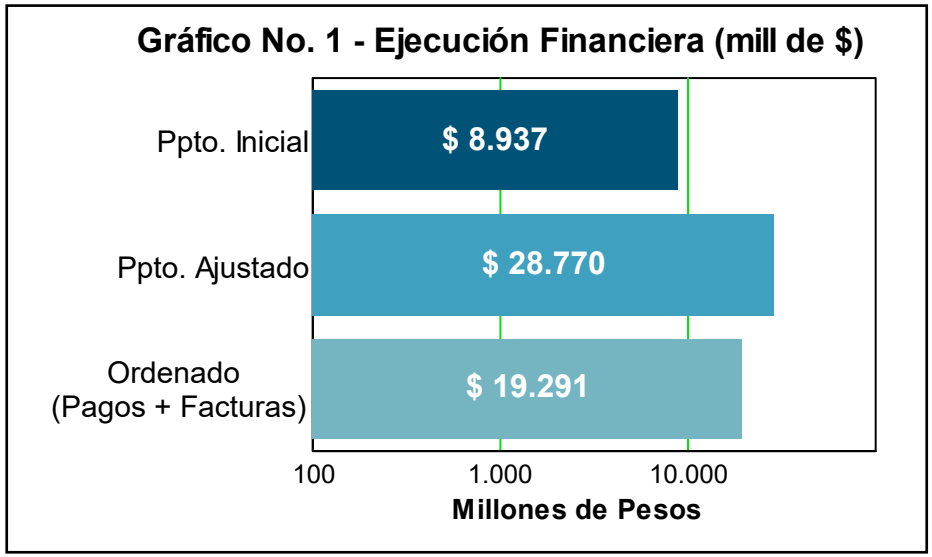


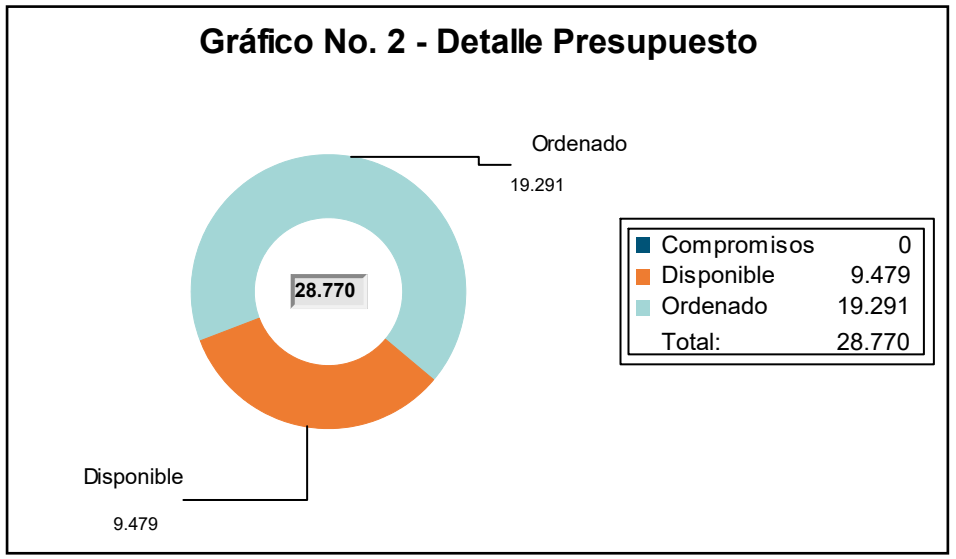

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre de 2025 comprende pagos y facturas

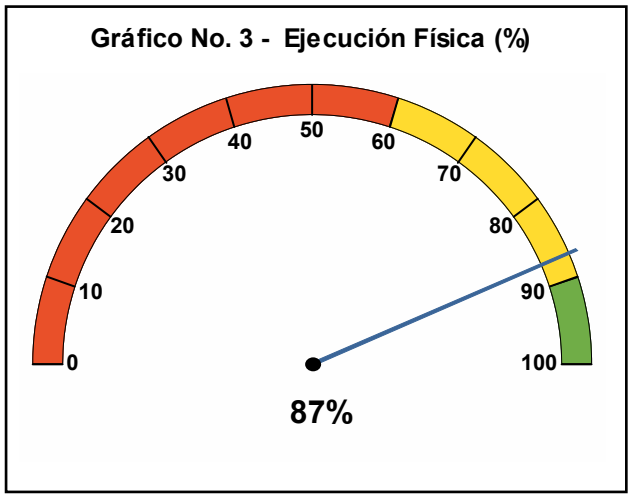

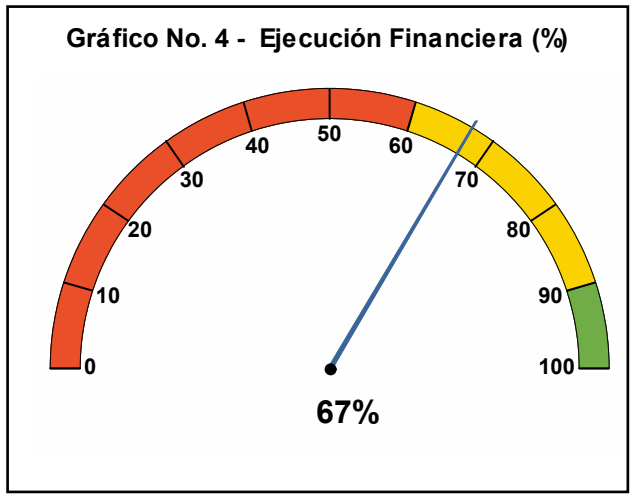

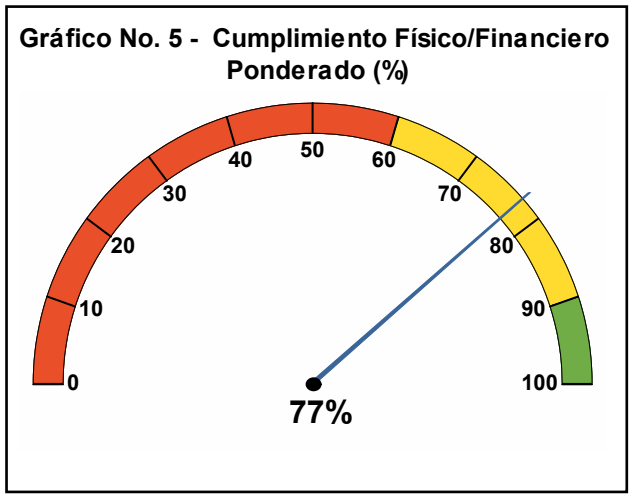

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.5 - Arte y cultura al alcance de todos
Programa: 1.5.4 - Bibliotecas, lectura, memoria y patrimonio

Proyecto: **240266 -Desarrollo del laboratorio del sistema de patrimonio cultural distrital**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 663 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 663 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 663

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos Investigación				
AP66AA Documentos de investigación realizados	**Número**	**2**	**2**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 330200100

Descripción B/P/S: Número de Documentos técnicos de soporte sobre las acciones implementadas en cinco líneas: conectar. Identificar, formular, gestionar y evaluar el laboratorio.

Observación B/P/S: Al cierre de año se finalizan los siguientes documentos tecnicos:Memorias de intervención de plaza botero y plazuela Nutibara, e intervención de parque botero,adiciconal a esto se construyen y el DTS Actualización y construcción de expedientes de declaratoria BIC.

AP66BA Capacitaciones realizadas	**Número**	**4**	**4**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 330207800

Descripción B/P/S: Número de capacitaciones realizadas a la comunidad en general en temas patrimonio.

Observación B/P/S: Se realizalSocialización y capacitación a propietarios de BIC en Centro Tradicional y para el público en general convenio interadministrativo 4600106090 - Proyecto de actualización fichas de inventario de BIC Distrito de Medellín.

AP66CA Documentos de lineamientos técnicos realizados	**Número**	**0,4**	**0,4**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 330200200

Descripción B/P/S: Número de documentos con metodologías y documentos de sistematización realizados para articular las gestiones administrativas para la declaratoria y manejo de bienes de interés cultural.

Observación B/P/S: Se finaliza el documento laboratorio vivo de patrimonio que contiene la justificación , los objetivos, las líneas estrategicas,la matriz operativa, el cronograma de implementación etc.

Proyecto: **240267 -Implementación del plan integral de gestión de prado**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 50% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 75%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 647 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 647 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 647

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación				
AP67AA Documentos de planeación elaborados	**Número**	**0,4**	**0,4**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 400201600

Descripción B/P/S: Documento técnico de soporte de la actualización del plan integral de gestión de Prado.

Observación B/P/S: Se realizó la consolidación final del documento técnico de la Etapa Preliminar. Contiene: reseña histórica, análisis urbanístico, identificación Patrimonio Cultural Inmaterial y Mueble, estrategia de acercamiento a la comunidad y conclusiones generales.

AP67BA Espacio publico adecuado	**Metro cuadrado**	**4.000**	**0**	**0%**

Código. Ind. SUIFP: 400202000

Descripción B/P/S: Metros cuadrados de espacio público adecuado y cualificación de las fachadas del barrio Prado.

Observación B/P/S: Para el periodo no se generan avances. Se priorizo en el desarrollo del plan integral de gestión prado en su fase de planeación y documentación.

Observación Proyecto: Dentro de la implementación del Plan Integral de Gestión de Prado, la Agencia ha concentrado sus esfuerzos en la fase de planeación, quedando pendiente para las vigencias siguientes las acciones de infraestructura, con el fin de dar cumplimiento al indicador se han adelantado las siguientes acciones: Se realizó un diagnóstico de las fichas de inventario BICS del barrio Prado, identificando el estado de la valoración actual y las oportunidades de mejora, que serán consideradas en el proceso de actualización programado para 2026. Se elaboró el concepto de norma de los BIC de Prado, levantando información relacionada con: normatividad aplicable, tipo de obras permitidas, usos, y oportunidades en aspectos de movilidad, diseño, espacialidad y funcionalidad de los inmuebles. Se inició la actualización del Plan Integral de Gestión de Prado, construyéndose un documento preliminar que consolida: la reseña histórica del barrio, el análisis urbanístico, la identificación del PCI asociado al sector, el análisis preliminar del patrimonio cultural y las estrategias de relacionamiento con la comunidad. Finalmente, respecto a las estrategias de infraestructura, la Agencia tiene previsto para 2026 el desarrollo de diseños de intervención en espacios priorizados; sin embargo, será necesario gestionar recursos adicionales para su ejecución

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana

Componente: 3.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito

Programa: 3.3.2 - Gestión del Plan de Ordenamiento Territorial y sus instrumentos

Proyecto: **240269 -Aplicación y gestión de los instrumentos de financiación del pot**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 55% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 77%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.098 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 20.891 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 11.412

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
AP69AA Documentos de lineamientos técnicos realizados	**Número**	**4.000**	**4.628**	**116%**

Código. Ind. SUIFP: 459901800

Descripción B/P/S: Informe técnico de viabilidad de proyectos de aplicación de los instrumentos del POT.

Observación B/P/S: Total acumulado 2025 4.628, y Noviembre: 490, así: 316 de mesas, 19 de juegos infantiles, 144 de eventos, 7 conceptos de módulos de venta; y finalmente 4 conceptos de otras categorías

AP69BA Documentos de investigación elaborados	**Número**	**4.000**	**4.628**	**116%**

Código. Ind. SUIFP: 459902600

Descripción B/P/S: Documentos técnicos de soporte sobre el desarrollo o la aplicación de proyectos de los instrumentos del POT.

Observación B/P/S: Estos documentos se asocian a los esquemas, planimetrías y preliquidaciones construidas en e proceso de análisis de las solicitudes de Aprovechamiento Económico.

AP69CA Documentos de política elaborados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459903200

Descripción B/P/S: Documentos técnicos para la implementación o aplicación de los instrumentos del POT.

Observación Proyecto: La ejecución financiera se ubicó por debajo de la ejecución física debido a los siguientes factores: Automatización de procesos en la Agencia, que permitió optimizar tiempos y recursos operativos, entre ellos: • El cálculo de la liquidación del valor del aprovechamiento, componente del informe técnico de viabilidad. • El proceso de envío de facturas, el cual optimizó el uso del recurso asignado al trámite. • La implementación local del sistema Mercurio. Estandarización del proceso, lo que mejoró la oportunidad en la emisión de conceptos técnicos, se unificaron criterios y requisitos de información. Giro de recursos adicionales por parte del Distrito para ser utilizados en compensaciones por transferencias patrimoniales, instrumento que no había sido contemplado en la planeación inicial del indicador.

Componente: 3.4 - Confianza ciudadana en la gestión pública institucional

Programa: 3.4.3 - Gestión fiscal y financiera de la Hacienda Pública

Proyecto: **240260 -Formulación , promoción y evaluación de proyectos de asociaciones público privadas**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 87% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 94%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.338 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.338 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.338

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Estudios de preinversión				
AP60AA Estudios de preinversión elaborados	**Número**	**1**	**1**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459900600

Descripción B/P/S: Resoluciones de iniciativas privadas aprobadas o rechazadas en fase de prefactibilidad y/o factibilidad, Estudios de prefactibilidad y factibilidad de iniciativas públicas.

Observación B/P/S: Evaluación del proyecto de Asociación Publico Privada de Iniciativa Pública MOVIC, que busca desarrollar parqueaderos, comercio y servicios en la U.D Atanasio Girardot. 12 diciembre se emitió concepto favorable paso a factibilidad.

AP60BA Personas capacitadas	**Número**	**800**	**594**	**74%**

Código. Ind. SUIFP: 459903000

Descripción B/P/S: Capacitaciones a Empresas, Entidades del Conglomerado; Entidades del Sector Público; Servidores Públicos) en los conceptos del mecanismo APP; Socializaciones del estado de los proyectos a los ciudadanos.

Observación B/P/S: Se consolida las capacitación en en total fueron 594 asistentes, si bien no se cumple la meta para el año vigente , para el 2026 se iniciara el curso con U digital en APP.

Programa: 3.4.8 - Generando valor Inmobiliario

Proyecto: **240270 -Formulación de oportunidades y proyectos inmobiliarios en bienes fiscales**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.108 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.108 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.108

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
AP70AA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	**Número**	**1**	**2**	**200%**

Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Asistencia técnica a entidades, organismos y dependencias para la conformación de una base de datos maestros del inventario de bienes inmuebles analizado y su respectiva oportunidad.

Observación B/P/S: Estos documentos se asocian a los esquemas, planimetrías y preliquidaciones construidas en e proceso de análisis de las solicitudes de Aprovechamiento Económico.

AP70BA Estudios de preinversión elaborados	**Número**	**4**	**4**	**100%**

Código. Ind. SUIFP: 459900600

Descripción B/P/S: Informe de Estudios a cualquier nivel sobre la estructuración o gestión/supervisión contractual de proyectos inmobiliarios.

Observación B/P/S: Informe de Elegibilidad predio Metrosalud Robledo, Informe de Elegibilidad hospital Infantil -,Informe de Elegibilidad hospital General mas evaluación iniciativa privada Bodega la Mansión , Ejecución contractual contrato No.4600094043 Salón Prado.

Proyecto: **240271 -Estudios para la promoción y la construcción de instrumentos para el aprovechamiento económico de bienes fiscales**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 81% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 91%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 516 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 516 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 516

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Estudios de pre inversión e inversión				
AP71AA Estudios o diseños realizados	**Número**	**1**	**0,62**	**62%**

Código. Ind. SUIFP: 400203400

Descripción B/P/S: Informe de Estudios para la formulación de instrumentos de gestión estratégica y aprovechamiento económico.

Observación B/P/S: Se realiza solicitud de prorroga al contrato dado que se presentaron los siguientes novedades : condiciones de seguridad en algunos sectores durante la realización de encuestas de hogares, inclusión de puntos adicionales para el levantamiento de informacion,retrasos en la entrega e información secundaria ,alta rotación del personal de campo, hurtos de equipos etc.

AP71BA Entidades territoriales asistidas técnicamente	**Número**	**4**	**10**	**250%**

Código. Ind. SUIFP: 400200100

Descripción B/P/S: Promoción/ socialización para la gestión estratégica y aprovechamiento económico a las entidades territoriales.

Observación B/P/S: Mesas de negociación Plaza la América ,Desayuno con constructores agremiados a la Lonja para la promoción de proyectos -,Espacio de promoción de proyectos CCI Cartagena con inversionistas privados.

Pilar: 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo

Componente: 4.1 - Infraestructura para un modelo de ciudad sostenible

Programa: 4.1.4 - Espacios públicos inclusivos y accesibles

Proyecto: **240268 -Mejoramiento y cualificación del paisaje y el espacio público**

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 13% **Ejec. Financiera :** 100% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 56%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.567 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.607 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.607

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Espacio publico adecuado				
AP68AA Espacio publico adecuado	**Metro cuadrado**	**16.300**	**2.111**	**13%**

Código. Ind. SUIFP: 400202000

Descripción B/P/S: Metros cuadrados de espacio público del Distrito de Medellín cualificado y su mejoramiento integral.

Observación Proyecto: En el año 2025 se han adelantado diseños en fase de proyecto, incorporando estudios técnicos para su ejecución, de dos iniciativas en el marco del programa Plan Centro: Mantenimiento Parque Berrío, con 3.826 m² de cualificación, y Mantenimiento Plaza Botero, con 18.635 m² de cualificación del espacio público. Ambos proyectos cuentan con concepto favorable por parte de la Unidad de Proyectos Estratégicos – DAP, y sus procesos de ejecución tienen estimado iniciar a finales de enero y en el mes de marzo, respectivamente. Adicionalmente, cuatro proyectos se encuentran en una fase avanzada de diseño, en etapa de anteproyecto arquitectónico, los cuales suman un área total de intervención y cualificación del espacio público de 27.573 m².
