

Seguimiento 30 de junio de 2017

Plan de Acción

Medellín

Cuenta Con Vos



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos



Presentación

El Plan de Acción es un instrumento gerencial en cuya formulación anual se proyectan las metas de producto que se espera obtener por cada uno de los proyectos de inversión, acorde con la misión de las áreas funcionales y de éstas con las políticas, programas y proyectos previstos en cada vigencia, para el cumplimiento del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Medellín cuenta con vos”.

Teniendo en cuenta que este instrumento presenta en forma resumida los productos, bienes y servicios que entregan las dependencias y entes descentralizados que hacen parte del presupuesto general del Municipio, utilizando un monto de recursos asignados durante la anualidad con el fin de lograr los respectivos objetivos de los proyectos de inversión, su seguimiento se constituye en insumo fundamental para realizar el monitoreo de las acciones de cada dependencia y para la toma oportuna de decisiones.

El presente informe comprende el seguimiento al Plan de Acción con corte a 30 de junio de 2017 para la Administración Central y la Agencia para la Educación Superior – SAPIENCIA, el Colegio Mayor de Antioquia, el Instituto del Deporte y la Recreación – INDER, el Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM, el Tecnológico Pascual Bravo, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED, Telemedellín, el Museo Casa de la Memoria y la Agencia para la gestión del paisaje, el patrimonio y APP.

La información que se presenta cumplió los protocolos técnicos y fue reportada por las dependencias y entidades descentralizadas responsables de la misma, fue procesada en el módulo de Formulación y Seguimiento de Proyectos – Project System en la plataforma corporativa SAP, con los productos bienes o servicios, (parciales o definitivos) que materializan la ejecución del proyecto durante la vigencia, así como la información financiera del mismo que incluye el presupuesto inicial, el presupuesto ajustado y la ordenación presupuestal.

El seguimiento al Plan de Acción, se elabora con base en los siguientes datos:

- a. La información contenida en la formulación del Plan de Acción para el año 2017 suministrada por cada dependencia al inicio de la vigencia, actualizada y ajustada en el mes de junio, en cumplimiento de las disposiciones orgánicas vigentes, con base en el Plan de Desarrollo 2016-2019 “Medellín cuenta con Vos”.
- b. La Ejecución Financiera de los proyectos de la administración central, la cual corresponde a las cifras oficiales reportadas por la Secretaría de Hacienda y comprende los pagos, facturas y compromisos a la fecha de corte. Adicionalmente, para los establecimientos públicos, en los proyectos que reciben transferencias municipales, se incorpora la información suministrada por cada entidad sobre los aportes de recursos propios.





c. La Cantidad Ejecutada: Esta información, es suministrada por cada Dependencia de acuerdo con el avance del proyecto durante el año.

d. Observaciones: Son notas que cada Dependencia hace en la medida en que considera debe hacer claridad sobre los valores reportados o los proyectos en general.

A partir de los datos anteriores, la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica calcula la Eficacia de los Productos y la Síntesis de los Proyectos, la cual incluye Eficacia, Ejecución Financiera e Índice de gestión del proyecto.

Los datos que se presentan en el reporte son:

Nombre de la Dependencia	Nombre de la Secretaria o Ente Descentralizado
Proyectos de Iniciativas Institucionales	Proyectos de Inversión que se formulan para el cumplimiento de las metas establecidas.
Dimensión	Código y nombre de la Dimensión del Plan de Desarrollo al cual pertenece el proyecto de inversión
Reto	Código y nombre del Reto del Plan de Desarrollo al cual pertenece el Proyecto de Inversión
Programa	Código y nombre del programa del Plan de Desarrollo al cual pertenece el Proyecto de Inversión

Proyecto PD	Código y nombre del Proyecto del Plan de Desarrollo al cual pertenece el Proyecto de Inversión
Código del Proyecto	Código del Proyecto según su registro en el banco de programas y proyectos (Bpin)
Nombre del Proyecto	Nombre del Proyecto (Abreviado a 40 caracteres, por requerimiento del sistema SAP)
Información Financiera	Corresponde con información a la fecha de corte, expresada en millones de pesos
Presupuesto Inicial	Corresponde al presupuesto inicial de la vigencia, aprobado por el Concejo, expresado en millones de Pesos (POAI 2017)
Presupuesto Ajustado	Corresponde al presupuesto del Proyecto.
Ejec. Financiera	Presupuesto Ejecutado del Proyecto (Pagos, Facturas y compromisos).
Nombre y Código de los Productos/bienes /servicios	Código asignado a cada uno de los productos, bienes o servicios del proyecto (Se utilizan dos letras iniciales que hace referencia a la dependencia, los dos últimos números consecutivos del proyecto más dos letras aleatorias.
Unidad de Medida	Unidad utilizada para cuantificar el bien o servicio





Cantidad Planeada	Cantidad programada para ser ejecutada durante el año, para el bien o servicio
Cantidad Ejecutada	Avance reportado por la dependencia responsable, para el bien, servicio o actividad.
Eficacia Producto	Relación, expresada en porcentaje, entre la cantidad ejecutada y la cantidad planeada
Observación B/S	Información del bien o servicio que complementa las cifras programadas (opcional)
Observación Proyecto	Información que complementa las cifras presentadas de cada proyecto (opcional)
Síntesis Proyecto	
Eficacia	Valor promedio de las eficacias de los productos del proyecto, expresado en porcentaje. Para su cálculo, las eficacias de productos mayores al 100% se toman como 100%, con el fin de no generar distorsiones en los resultados
Ejec. Financiera	Relación expresada en porcentaje, entre la ejecución financiera y el presupuesto ajustado del proyecto.



Proyectos de Presupuesto Participativo	Son aquellos proyectos de iniciativa de las comunidades, priorizados en el proceso de planeación local y presupuesto participativo.
Proyectos con saldos no ejecutables	Corresponde a los saldos de los proyectos de destinación específica no ejecutables, pero que deben aparecer en el presupuesto hasta tanto los contratos o convenios se liquiden y los saldos sean reintegrados.
Proyectos con ejecución de saldos (vigencia anterior)	Son aquellos proyectos cuyo presupuesto corresponde a ajustes o reservas con productos reportados en la vigencia anterior.

El presente informe de seguimiento se publica en la página web del Municipio de Medellín www.medellin.gov.co y se remite a las entidades de control político y social.



Avance Físico y Financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos Públicos





Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

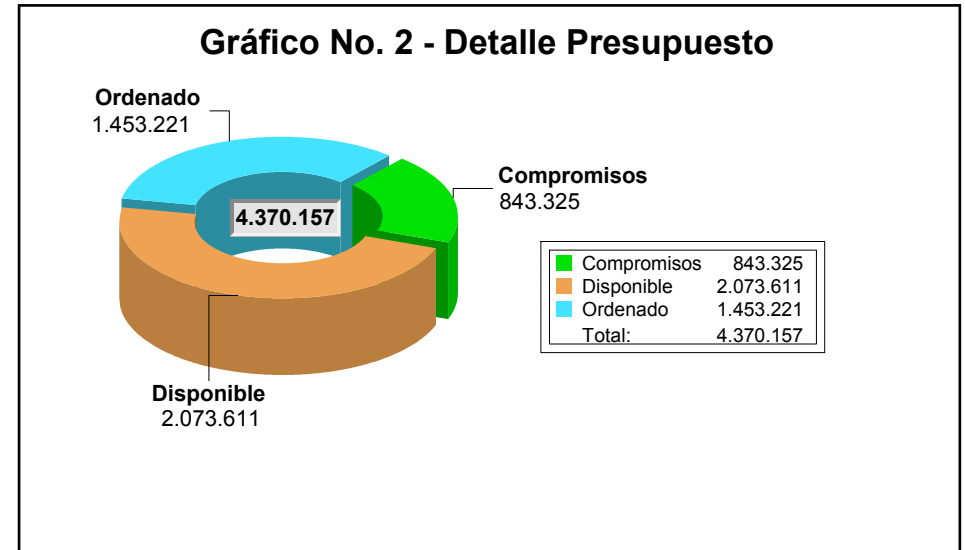
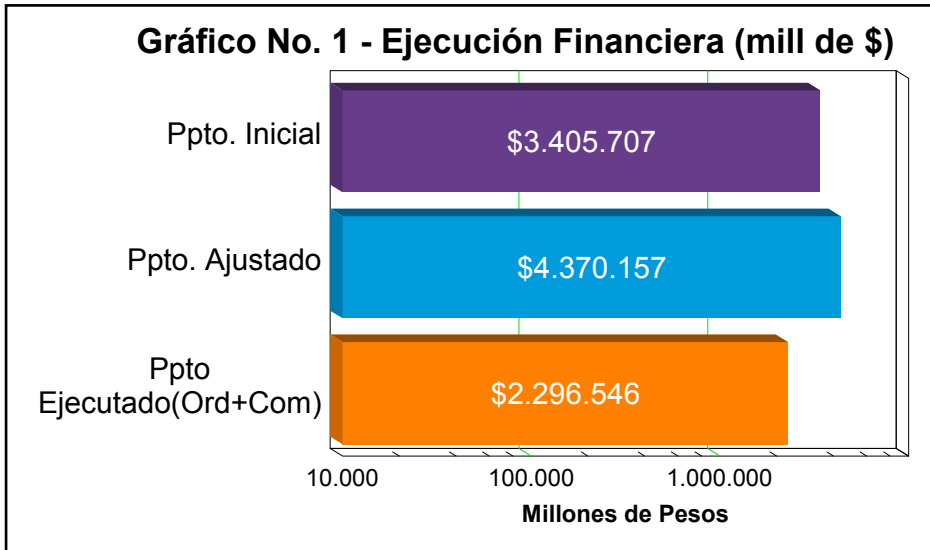


Ejecución presupuestal al mes de Junio, comprende pagos, compromisos y facturas

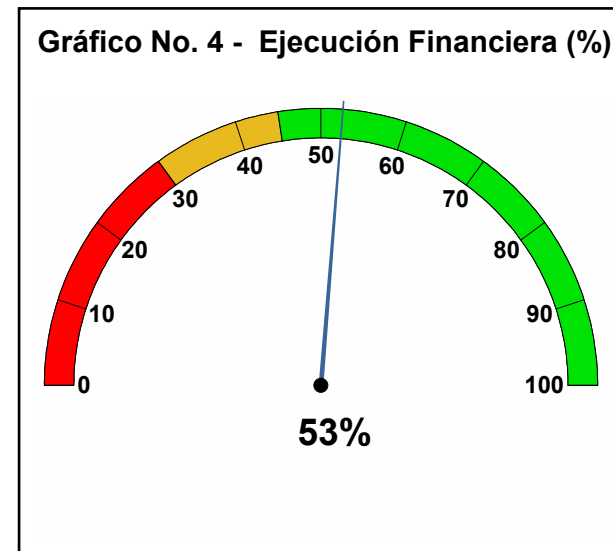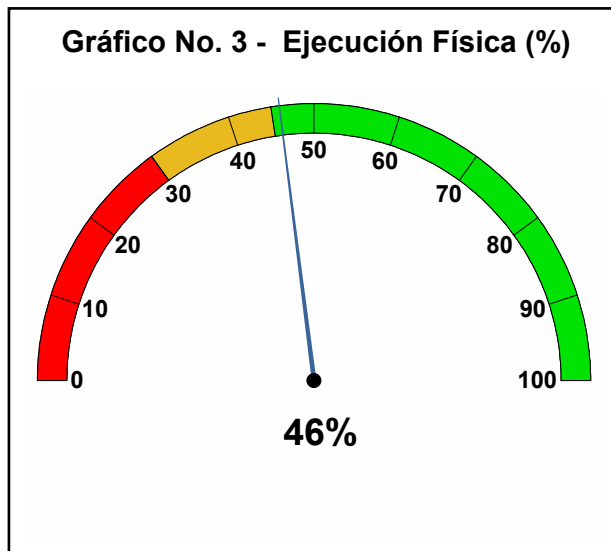

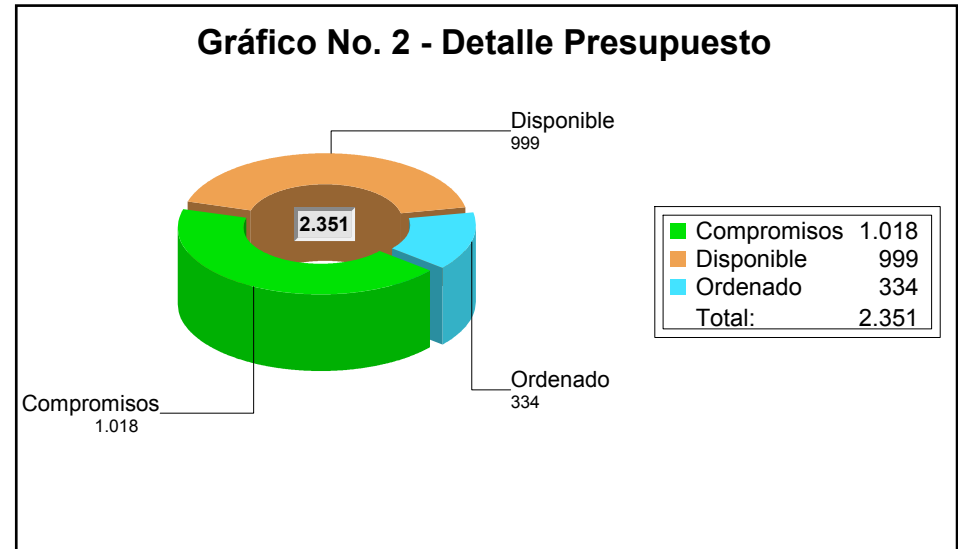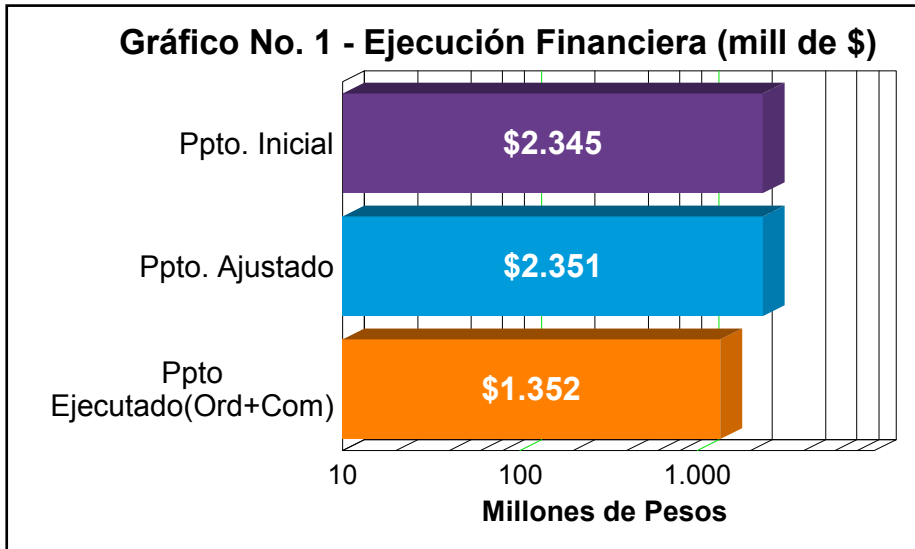

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

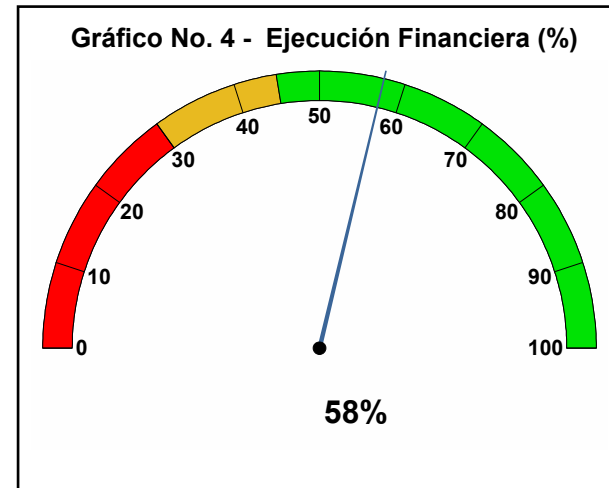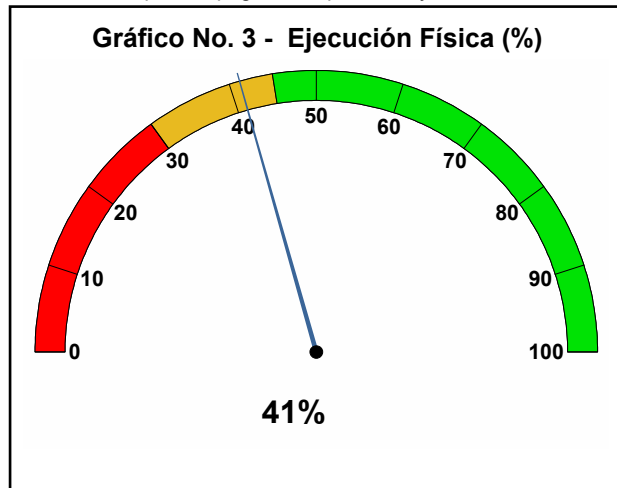

La ejecución financiera comprende pagos, facturas y los compromisos a la fecha de corte. Para el caso de los establecimientos públicos, la Ejecución Financiera se compone de dos cifras: una información obtenida del sistema, que corresponde únicamente a la cifra del presupuesto transferido desde el Municipio al estapúblico, y otra información suministrada por cada entidad que corresponde a los recursos propios invertidos por proyecto.

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 - Medellín bien administrado

Programa: 1.3.1 - Gobierno visible

Proyecto PD: 1.3.1.1 Alcaldía en el territorio

Proyecto: 160376 - Fortalecimiento de la alcaldía en el territorio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 57%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.055 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.055 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.166

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PV76AA Encuentros del alcalde en territorio	Número	50	28	56%
Observación B / S: Encuentros del Alcalde y su gabinete en el territorio				
PV76AB Socialización de gestión pública	Número	50	28	56%
Observación B / S: Socializaciones de contenidos a la Ciudadanía sobre los programas, proyectos e intervenciones en el territorio.				
PV76AC Atención y gestión de solicitudes	Número	500	185	37%
Observación B / S: Solicitudes, comentarios, aportes, observaciones realizados en los recorridos				
PV76AD Medición de percepción	Número	1	0	0%
Observación B / S: La Medición se realizará en el último trimestre del año 2017				
PV76AE Fortalecimiento desp. alcalde y privada	Porcentaje	100	50	50%
Observación B / S: A través del apoyo técnico la Secretaría Privada y el despacho Alcalde fortalecen la presencia institucional, el relacionamiento con gremios, la implementación de la estrategia de relaciones públicas y protocolo.				

Proyecto PD: 1.3.1.4 Gobernabilidad del conglomerado público

Proyecto: 160387 - Fortalecimiento de la gobernabilidad del conglomerado público

Síntesis Proyecto: Eficacia : 51% Ejec. Financiera : 62%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 290 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 290 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 180

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PV87AA Revisión y ajuste manuales de gestión	Porcentaje	100	50	50%
Observación B / S: consolidación de la versión N°1. de los Manuales de Gestión del Conglomerado Público a saber: Gobierno Corporativo, Gestión Financiera, Ambientes de Control y Gobernanza de las Comunicaciones.				
PV87AB Operatización de los manuales de gestión	Porcentaje	30	20	67%
Observación B / S: Consolidado del avance de implementación de los manuales de gestión por parte de las dependencias responsables, acciones, directrices, políticas, lineamientos impartidos por las dependencias responsables al Conglomerado Público				
PV87AC Eventos sensibilización, formación, cultur	Número	5	2	40%
Observación B / S: Eventos: Consejo de Gobierno Ampliado del Conglomerado Público. Martes 20 de Junio 2017, Salón 4 de Plaza Mayor. Encuentro con el conglomerado Público Municipio de Medellín para socialización de buenas prácticas desde la Gestión Humana. Miércoles 14 de Junio de 2017				
PV87AE Plataforma tecnológica gobierno corp.	Porcentaje	100	50	50%
Observación B / S: Diseño, modelamiento y desarrollo de la herramienta tecnológica para Gobierno Corporativo y Conglomerado Público				

PV87AF Lineamientos estratégicos gobierno corp. Porcentaje 100 50 50%

Observación B / S: Coordinación de la representación del Municipio en las Asambleas ordinarias de las entidades descentralizadas.

Designación de miembros de junta y o consejo directivo en las entidades descentralizadas.

Fortalecimiento del direccionamiento, la coordinación y el control ejercido desde el ente central para el cumplimiento de los fines Municipales.

PV87AG Mediciones del modelo conglomerado Porcentaje 100 50 50%

Observación B / S: Dentro del Proceso de revisión, ajuste y actualización de los pilares de gestión se contempla un numeral dedicado a indicadores. Módulo de Mediciones en el diseño, modelamiento y desarrollo de la plataforma tecnológica.

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto PD: 1.3.1.4 Gobernabilidad del conglomerado público



Proyecto: 120360 - Administración de información corporativa de entes descentralizados

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0



Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5

Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2017

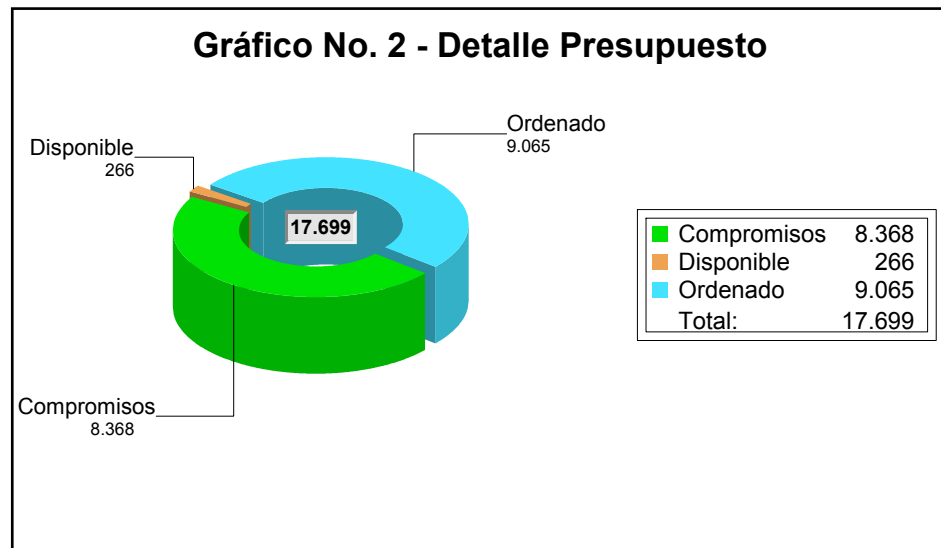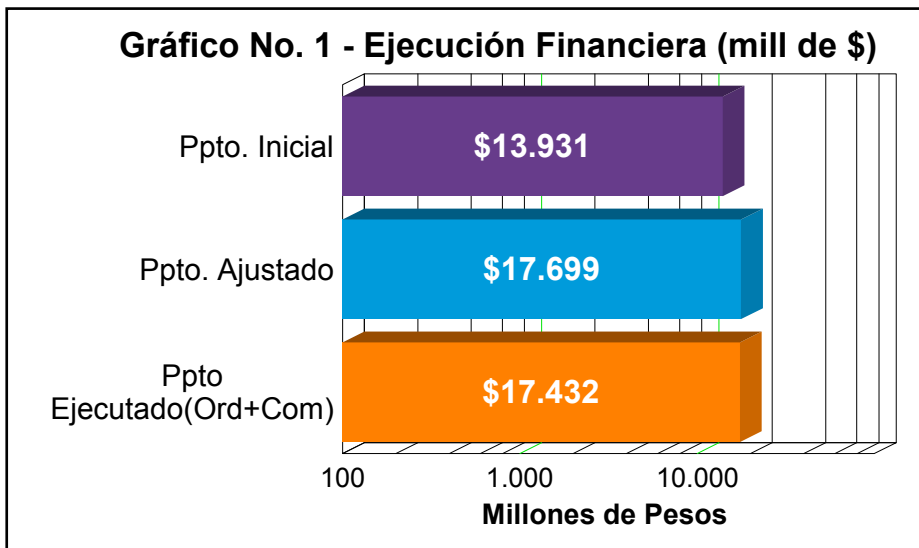

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

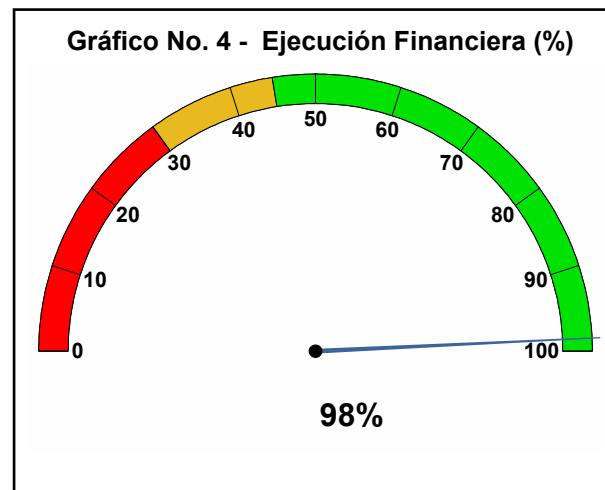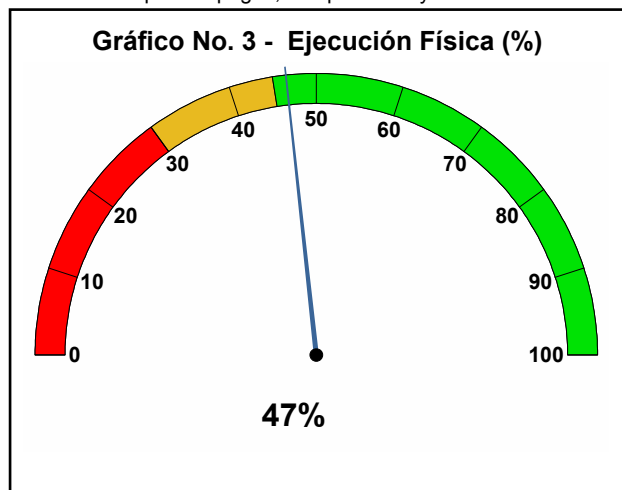

La ejecución financiera comprende pagos, facturas y los compromisos a la fecha de corte. Para el caso de los establecimientos públicos, la Ejecución Financiera se compone de dos cifras: una información obtenida del sistema, que corresponde únicamente a la cifra del presupuesto transferido desde el Municipio al estapúblico, y otra información suministrada por cada entidad que corresponde a los recursos propios invertidos por proyecto.

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.1 - Gestión de la cultura ciudadana
Proyecto PD: 1.1.1.3 Comunicación para la movilización, la participación y la cultura ciudadana
Proyecto: 160399 - Difusión de la comunicación para la movilización, la participación y la cultura ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 86%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 690

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO99AA Programa de tv comunitario	Número	40	20	50%
CO99AB Estrategia de redes comunitaria	Porcentaje	100	50	50%
CO99AC Estrategia de dialogos territoriales	Porcentaje	100	50	50%
CO99AD Estrate de apoyo y fortal en territorio	Porcentaje	100	75	75%

Reto: 1.2 - Medellín participativa
Programa: 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación
Proyecto PD: 1.2.1.6 Medios ciudadanos para la interacción y movilización social
Proyecto: 160400 - Desarrollo de medios ciudadanos para la interacción y movilización social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 42% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 800

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO00AA Documento de caracterización de medios	Número	1	1	100%
CO00AB Documento formulación política pública	Número	1	0	0%
CO00AC Medición de audiencia de medios	Porcentaje	100	25	25%

Reto: 1.3 - Medellín bien administrado
Programa: 1.3.1 - Gobierno visible
Proyecto PD: 1.3.1.5 Comunicación informativa, corporativa e institucional dirigida a la ciudadanía y en articulación con el Conglomerado Público Municipio de Medellín
Proyecto: 160401 - Divulgación de las estrategias de comunicaciones

Síntesis Proyecto: Eficacia : 51% Ejec. Financiera : 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.470 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.398

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO01AA Estrategia apoyo gobern comunica publica	Porcentaje	100	50	50%
CO01AB Estrate eventos y posicionamie de marca	Porcentaje	100	50	50%
CO01AC Programas de tv y radio institucional	Meses	11	6	55%
CO01AD Estrategia de comunicación pública	Porcentaje	100	50	50%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.1 - Gestión de la cultura ciudadana
Proyecto PD: 1.1.1.3 Comunicación para la movilización, la participación y la cultura ciudadana
Proyecto: 160665 - 17pp99-difusión de la comunicación para la movilización

Síntesis Proyecto: Eficacia : 14% Ejec. Financiera : 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.931 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.931

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO65DA Sitios web actualizados	Número	14	0	0%
Observación B / S: Proceso de contratación				
CO65DB Procesos comunicacionales fortalecidos	Número	15	0	0%
Observación B / S: Proceso de contratación				
CO65DC Horas de capacitación	Número	195	0	0%
Observación B / S: Proceso de contratación				
CO65DD Medios impresos comunitarios	Número	91	0	0%
Observación B / S: Proceso de contratación				
CO65DE Producción audiovisual	Número	60	0	0%
Observación B / S: Proceso de contratación				
CO65DF Programa de radio	Número	257	0	0%
Observación B / S: Proceso de contratación				
CO65DG Estrategia apoyo fortalecimiento territo	Número	1	1	100%
Observación B / S: Proceso de contratación				

Reto: 1.2 - Medellín participativa
Programa: 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación
Proyecto PD: 1.2.1.6 Medios ciudadanos para la interacción y movilización social
Proyecto: 150105 - 16pp1-fortalecimiento y apoyo al proceso de cultura en popular

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 27 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 27

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO05AA Produccion audiovisual Observación B / S: Proceso de contratación	minutos	8	4	50%
CO05AC Diplomado en produccion audiovisual Observación B / S: Proceso de contratación	Horas	120	80	67%
CO05AD Programacion programa radial Observación B / S: Proceso de contratación	Horas	200	200	100%
CO05AE Produccion programacion Observación B / S: Proceso de contratación	Horas	20	20	100%
CO05AF Capacitacion en radio Observación B / S: Proceso de contratación	Horas	4	4	100%

Proyecto: 150108 - 16pp4-fortalecimiento y apoyo al proceso de comunicaciones

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 82 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 82

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO08AA Produccion ediciones periodico comunitar Observación B / S: Proceso de contratación	Número	3	1	33%

Proyecto: 150109 - 16pp5-fortalecimiento a los procesos de comunicación en castilla

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO09AA Produ e impresión periodico com castilla Observación B / S: Proceso de contratación	Número	2	0	0%

Proyecto: 150119 - 16pp14-periódico comunitario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO19AB Ediciones del periodico comunitario Observación B / S: Proceso de contratación	Número	3	1	33%

Proyecto: 150122 - 16pp15-fortalecimiento de procesos de comunicación comunitaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO22AA Taller para el trabajo en red Observación B / S: Proceso de contratación	Horas	20	20	100%
CO22AB Taller procesos comunitarios Observación B / S: Proceso de contratación	Horas	20	20	100%

Proyecto: 150167 - 16pp50-fortalecimiento a medios y procesos de comunicación en san sebastián de palmitas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 22% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO67AA Ediciones periodico la nota Observación B / S: Proceso de contratación	Número	4	2	50%
CO67AB La nota franja radial Observación B / S: Proceso de contratación	Programa	27	10	37%
CO67AE Carteleras informacion veredales Observación B / S: Proceso de contratación	Número	4	0	0%
CO67AF Notas periodicticas para carteleras Observación B / S: Proceso de contratación	Número	12	0	0%

Proyecto: 150473 - 16pp13-comunicaciones para las víctimas del conflicto

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO73AC Video Observación B / S: Proceso de contratación	Número	1	1	100%

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto PD: 1.2.1.6 Medios ciudadanos para la interacción y movilización social

Proyecto: 150104 - 16pp1-fortalecimiento y apoyo al proceso de comunicaciones en popular

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25

Proyecto: 150106 - 16pp2-fortalecimiento y apoyo al proceso de comunicaciones en santa cruz

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 32	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 32
Proyecto:	150107 - 16pp3-fortalecimiento y apoyo al proceso de comunicaciones en manrique		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18
Proyecto:	150110 - 16pp6-fortalecimiento al sistema de comunicación en doce de octubre		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6
Proyecto:	150111 - 16pp7-articulación de procesos de comunicación en robledo		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15
Proyecto:	150112 - 16pp8-comunicación para la integración en villa hermosa		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0
Proyecto:	150113 - 16pp9-fortalecimiento a medios y procesos de comunicación en buenos aires		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13
Proyecto:	150114 - 16pp10-fortalecimiento a medios y procesos de comunicación en la candelaria		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15
Proyecto:	150116 - 16pp11-fortalecimiento de los sistemas de comunicación para la convivencia , la participación y el reconocimiento d		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16
Proyecto:	150117 - 16pp12-periodismo comunitario para la movilización		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4
Proyecto:	150168 - 16pp60-apoyo y fortalecimiento a los proceso de comunicación en san cristóbal		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12
Proyecto:	150169 - 16pp70-escuela corregimental de comunicaciones		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7
Proyecto:	150171 - 16pp80-fortalecimiento a medios y procesos de comunicación en san antonio de prado		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 54	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 54
Proyecto:	150172 - 16pp90-fortalecimiento a los procesos de comunicación en santa elena		

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

Proyecto: 150355 - 16pp13-fortalecimiento de la red de medios en san javier

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6

Proyecto PD: 1.3.1.5 Comunicación informativa, corporativa e institucional dirigida a la ciudadanía y en articulación con el Conglomerado Público Municipio de Medellín

Proyecto: 080527 - Diseño y desarrollo de polít

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 120361 - Comunicación organizacional para la gestión de lo público



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25

Proyecto: 120362 - Estrategias de comunicación política para la democracia participativa



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 163 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 163

Secretaría de Evaluación y Control

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2017

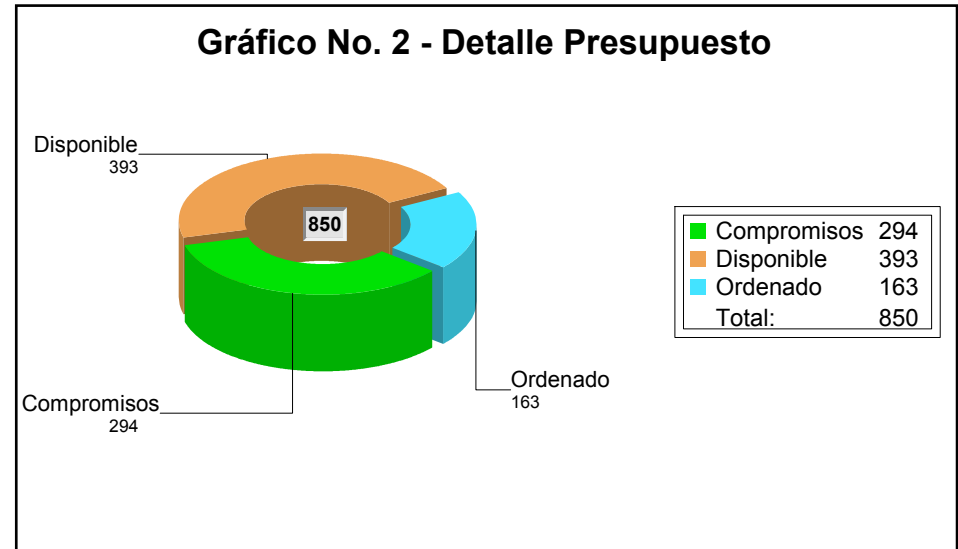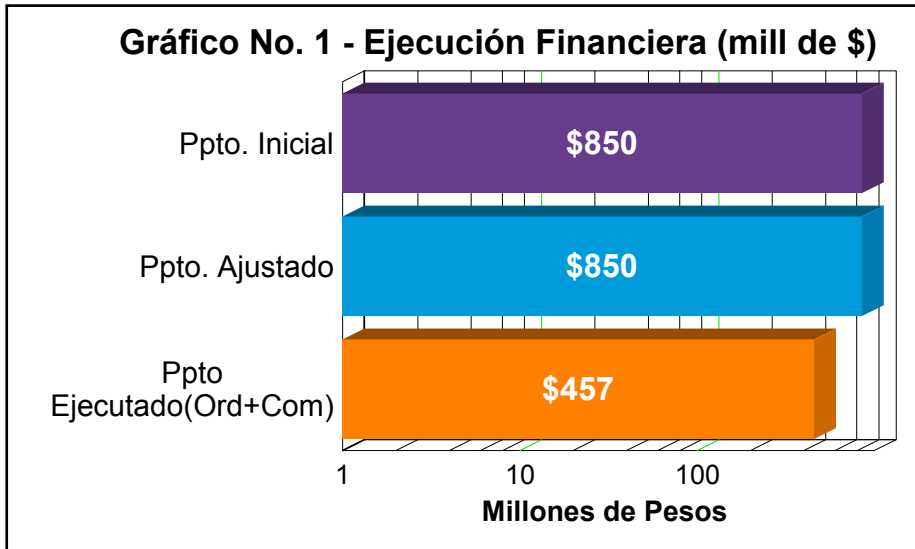

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

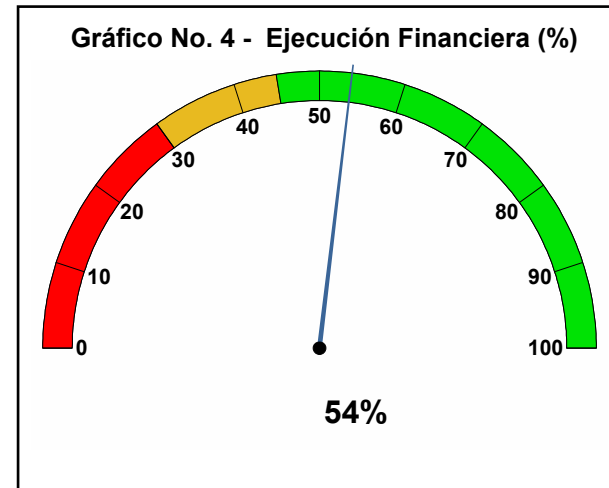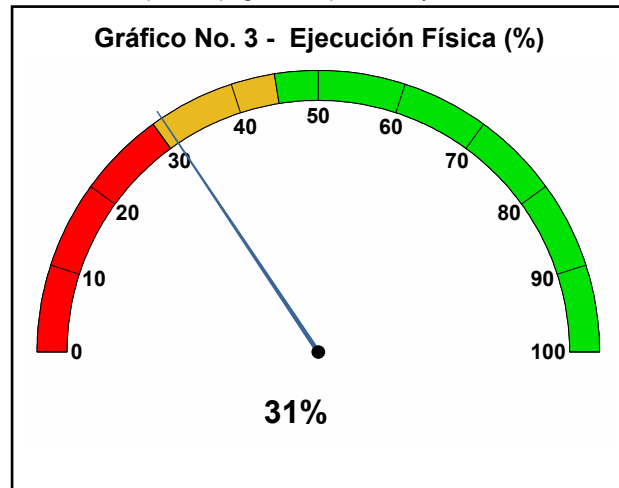

La ejecución financiera comprende pagos, facturas y los compromisos a la fecha de corte. Para el caso de los establecimientos públicos, la Ejecución Financiera se compone de dos cifras: una información obtenida del sistema, que corresponde únicamente a la cifra del presupuesto transferido desde el Municipio al estapúblico, y otra información suministrada por cada entidad que corresponde a los recursos propios invertidos por proyecto.

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.3 - Medellín bien administrado
Programa: 1.3.1 - Gobierno visible
Proyecto PD: 1.3.1.3 Proyecto social lucha contra la corrupción
Proyecto: 160367 - Prevención de la lucha contra la corrupción

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 67%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 68 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 65 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 44

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
EV67AA Auditorías a la vista realizadas	Eventos	1	0	0%

Observación B / S: La auditoría a la vista se programó para el segundo semestre

Programa: 1.3.2 - Transparencia como modelo de gestión
Proyecto PD: 1.3.2.3 Medellín, incluido en el Índice de Transparencia de grandes ciudades
Proyecto: 160369 - Identificación de medellín, en el índice de transparencia de grandes ciudades

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 110 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 110 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
EV69AA Metodología realizada	Número	1	0	0%

Observación B / S: La metodología se desarrollará en el segundo semestre

Programa: 1.3.4 - Gestión efectiva
Proyecto PD: 1.3.4.1 Comprometidos con la integralidad del ser
Proyecto: 160370 - Desarrollo de buenas prácticas de transparencia y autocontrol en los servidores públicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 26%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 45 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 42 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
EV70AB Campañas de sensibilización realizadas	Número	1	0	0%
Observación B / S: Actividad que se desarrollara en el segundo semestre de la vigencia				
EV70AC Libro publicado	Número	1	0	0%
Observación B / S: Actividad a realizar en el segundo semestre de la vigencia				

Proyecto PD: 1.3.4.2 Realizar procesos integrales de evaluación institucional que permitan mejorar la gestión

Proyecto: 120192 - Transparencia administrativa, una realidad en la gestión administrativa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
EV92BF Distintivo auditores para campo	Número	25	25	100%

Observación B / S: la meta se cumplió en el trimer trimestre

Proyecto: 160372 - Desarrollo de procesos integrales de evaluación institucional que permitan mejorar la gestión

Síntesis Proyecto: Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 70%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 570 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 570 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 396

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
EV72AA Plan de auditorias desarrolladas	Porcentaje	100	45,5	46%

Proyecto PD: 1.3.4.6 Sistemas de gestión inteligentes para un buen gobierno

Proyecto: 160371 - Administración y automatización de procesos de control interno



Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 57 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 57 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0



Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
EV71AA Proceso sistematizada	Número	1	0	0%

Observación B / S: Esto se realiza en el segundo semestre de la vigencia

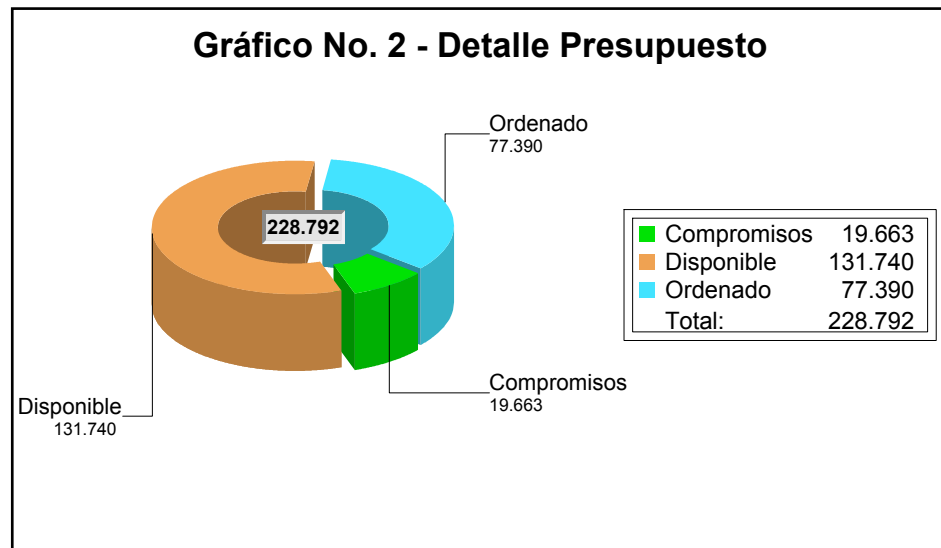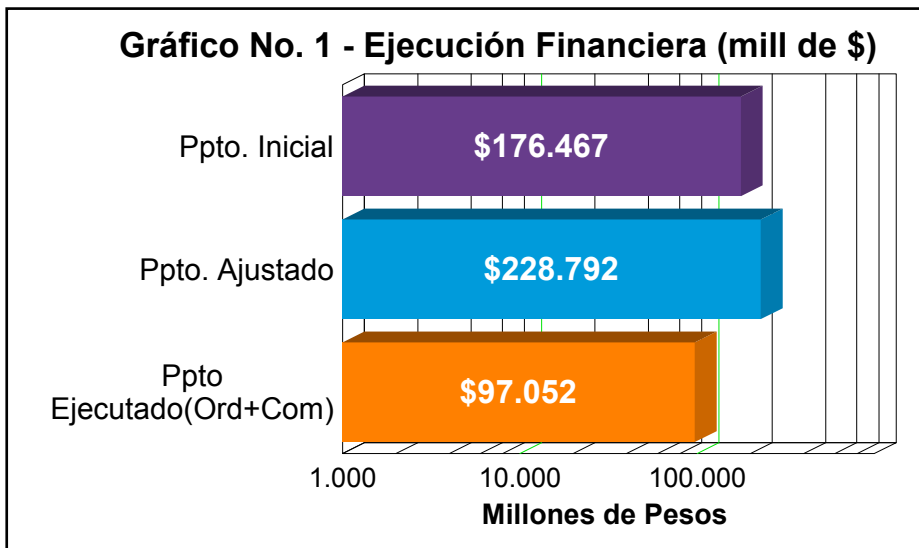

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

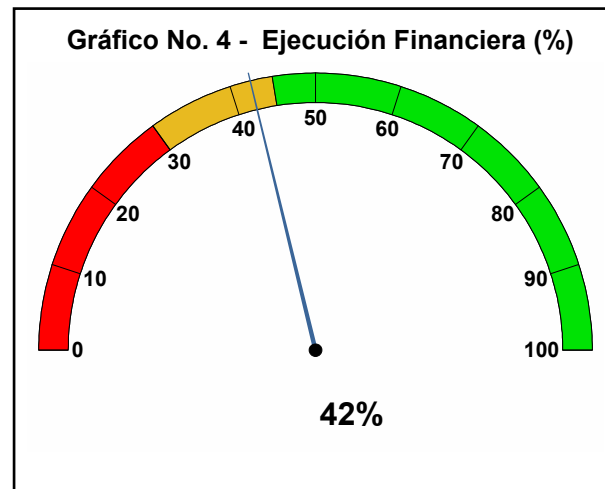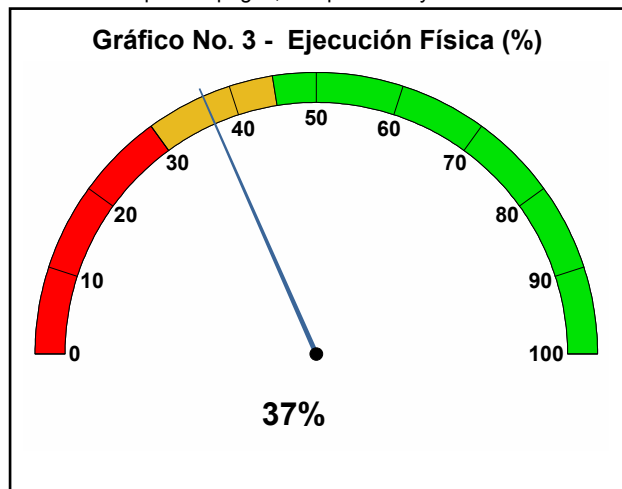

La ejecución financiera comprende pagos, facturas y los compromisos a la fecha de corte. Para el caso de los establecimientos públicos, la Ejecución Financiera se compone de dos cifras: una información obtenida del sistema, que corresponde únicamente a la cifra del presupuesto transferido desde el Municipio al estapúblico, y otra información suministrada por cada entidad que corresponde a los recursos propios invertidos por proyecto.

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.3 - Medellín bien administrado
Programa: 1.3.3 - Excelente manejo de las finanzas y los recursos públicos
Proyecto PD: 1.3.3.1 Fortalecimiento de la gestión fiscal y financiera del municipio de Medellín
Proyecto: 160129 - Implementación de estrategias para la gestión de recursos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 94%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.335 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.776 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.556

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA29AD Modelo oferta institucional implementado	Unidad	1	0	0%
Observación B / S: El contrato inició en el mes de abril. Para el desarrollo del Modelo de Gestión, hay una estrategia de comunicaciones para el fortalecimiento de las finanzas públicas del municipio de Medellín, con los agentes del orden nacional que permitan unir sinergias para la gestión de recursos.				
HA29AF Marco fiscal mediano plazo ajustado	Unidad	1	0	0%
Observación B / S: Se entregó el primer ajuste con corte a marzo, el marco definitivo se presenta el 10 de octubre con el proyecto de presupuesto.				
HA29AG Plan financiero elaborado	Unidad	1	0	0%
Observación B / S: Se entregó el primer ajuste con corte a marzo, el marco definitivo se presenta el 10 de octubre con el proyecto de presupuesto.				
HA29AN Presupuesto elaborado	Unidad	1	1	100%

Proyecto: 160428 - Aportes asocapitales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 52 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 52 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 52

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA28AD Aportes asocapitales	Mill pesos	52	52	100%

Proyecto: 160429 - Administración de la información contable del municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 91%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.157 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.538 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.404

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA29AA Estados financieros consolidados	Número	5	3	60%
HA29AC Cuentas depuradas	Porcentaje	95	37	39%
HA29AE Órdenes de pago revisadas según demanda	Porcentaje	100	50	50%
HA29BA Capacitaciones y conceptos	Porcentaje	100	45	45%

Proyecto: 160430 - Implementación normas internacionales de contabilidad para el sector público

Síntesis Proyecto: Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 74%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.156 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 853

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA30AA Planos empresariales	Porcentaje	100	50,3	50%
HA30AB Capacitaciones	Número	4	3	75%
HA30AC Modelos financieros	Porcentaje	100	15	15%
Observación B / S: En proceso de recolección de información para determinar los modelos.				
HA30AE Parametrización de la plataforma sap	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Estas actividades se desarrollarán a partir del segundo semestre de 2017, toda vez que se deben realizar después de los planos empresariales.				
HA30AF Manual políticas contab aproba/sensibili	Porcentaje	100	90	90%
HA30AG Pruebas funcionales	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Estas actividades se desarrollarán a partir del segundo semestre de 2017, toda vez que se deben realizar después de las parametrizaciones del sistema de información				

Proyecto PD: 1.3.3.2 Gestión y control de los ingresos municipales

Proyecto: 160390 - Fortalecimiento de la gestión y control en la administración, fiscalización y liquidación de los ingresos tributarios

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 88%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.615 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.067 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.429

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA90AR Plan de procesamiento de declaraciones	Porcentaje	100	50	50%
HA90AS Apoyo en el alcance jurídico tributario	Porcentaje	100	50	50%
HA90AT Actualización de la cuenta corriente tri	Porcentaje	100	50	50%
HA90AV Plan de control a contribuyentes con índ	Porcentaje	100	50	50%
HA90AW Servicio de registro de novedades e insc	Porcentaje	100	50	50%
HA90AX Canales de información y sensibilización	Número	3	1	33%
HA90AY Proyectos e implementaciones en el siste	Número	21	4	19%
Observación B / S: Estos proyectos presentan ejecución baja ya que normalmente siguen un cronograma de desarrollo prueba y puesta en marcha, hasta el momento van cuatro proyectos en orden priorizados, el cumplimiento por el periodo no está atado a una proporcionalidad en la realización del proyecto, ya que el cronograma de los proyectos tecnológicos varia en la complejidad de lo que se quiere hacer por el sist de infor.				
HA90AZ Apoy gest títulos ejecut cobro realizado	Porcentaje	100	14	14%
Observación B / S: Se está en una etapa previa de gestión y depuración de los datos e información necesarios para tener control de la deuda con el fin de poder certificar correctamente los títulos a lanzar				

Proyecto PD: 1.3.3.3 Normalización de la cartera morosa del municipio de Medellín

Proyecto: 160433 - Administración de excedentes de liquidez

Síntesis Proyecto: Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 94%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 223 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 223 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 209

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA33BB Rendimientos financieros	Número	51.428.571.430	24.030.713.678	47%

Proyecto: 160434 - Normalización de la cartera morosa del municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 77%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.595 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.711 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.159

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA34AA Cartera normalizada resoluci proyectadas	Número	5.926	4.427	75%
HA34AB Cartera recuperada	Mill pesos	118.128	62.707,95	53%
HA34AR Procesos depurados y con controles	Porcentaje	55	0	0%

Observación B / S: El indicador esta en construcción se reporta para el proximo periodo.

Programa: 1.3.4 - Gestión efectiva

Proyecto PD: 1.3.4.6 Sistemas de gestión inteligentes para un buen gobierno

Proyecto: 160501 - Administración documental masiva hacienda pública

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 69%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 746 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.216 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 839

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA01BC Almacenaje y custodia de archivos	Porcentaje	100	0	0%

Observación B / S: Mediante subasta No. 0009011875 la secretaria de Suministros adjudico contrato mediante Resolución SSS-555 de junio 2 de 2017, y contrato 4600070719 y cuyo supervisor es el Dr. Freddy Alberto Espinosa Yepes
El compromiso presupuestal 4700051358 de la Secretaría de Hacienda a la fecha no presenta ejecución.

HA01BD Valoración documental	Porcentaje	100	0	0%
------------------------------	------------	-----	---	----

Observación B / S: Se suscribio contrato No. 4600071124 de 2017 el 6 de julio de 2017, el cual se encuentra en tramite de incorporación de recursos y acta de inicio.

HA01BE Digitalización de imágenes	Número	1.598.251	0	0%
-----------------------------------	--------	-----------	---	----

Observación B / S: Mediante licitación pública No. 0070006170 la secretaria de Suministros adjudico contrato mediante Resolución SSS-660 de junio 30 de 2017, a la fecha se encuentra en tramite la legalización del contrato.

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.3 - Medellín se construye desde el arte y la cultura

Programa: 4.3.2 - Movilización por la cultura

Proyecto PD: 4.3.2.2 Fortalecimiento del Museo de Antioquia

Proyecto: 010135 - Museo de antioquia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 528 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 528 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA35AA Pago cuota adqui.inmueble vigencia futur	Mill pesos	528	0	0%

Observación B / S: Los recursos se ejecutan en el mes de octubre, conforme a lo estipulado en la escritura.

Reto: 4.5 - Medellín innovadora
Programa: 4.5.3 - Internacionalización
Proyecto PD: 4.5.3.3 Fondo local para la investigación científica del sistema de educación superior
Proyecto: 170037 - Adquisición acciones plaza mayor

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA37AB Adquisición de acciones	Número	954.139	0	0%

Observación B / S: Pendiente reunión de Junta para expedir reglamento emisión de acciones.

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible
Reto: 5.1 - Medellín se integra con la región, el Área Metropolitana y la Nación
Programa: 5.1.1 - Gestión de planes regionales y metropolitanos
Proyecto PD: 5.1.1.2 Túnel de Occidente
Proyecto: 001806 - Túnel de occidente (convenio)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.567 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.775 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA06AA Aportes tunel occidente vigencia futura	Mill pesos	3.567	0	0%

Observación B / S: Se adicionaron recursos del balance. Los recursos serán destinados para atender asuntos pendientes del convenio, a través de ISVIMED.

Reto: 5.3 - Medellín gestiona sus sistemas de movilidad
Programa: 5.3.1 - Fortalecimiento a la integración multimodal del transporte público
Proyecto PD: 5.3.1.1 Mejorar el Sistema de Transporte Masivo del Área Metropolitana (Apoyo Plan Maestro SITVA)
Proyecto: 040320 - Acuerdo metro

Síntesis Proyecto: Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 42%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 55.925 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 62.951 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26.400

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA20AA Pago acuerdo metro	Mill pesos	55.925	26.400	47%

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.2 - Proyectos Integrales para Medellín

Programa: 6.2.2 - Implementación de proyectos estratégicos

Proyecto PD: 6.2.2.1 Estrategia Proyectos Urbanos Integrales

Proyecto: 160431 - Administración de obligaciones urbanísticas – decreto 2167 de 2014

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 28.968 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 47.197 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA31AN Administración de recursos	Mill pesos	28.968	0	0%

Observación B / S: A la fecha no se han solicitado recursos para la adquisición de predios y/o a la construcción de equipamientos colectivos y de espacio público. Se incorporarán recursos por \$28.968.284.632 por concepto de recursos del balance.

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.1 - Medellín ciudad verde y sostenible

Programa: 7.1.6 - Sistema de Gestión Ambiental Integral y cambio climático

Proyecto PD: 7.1.6.3 Intervenciones sociales y ambientales integrales

Proyecto: 160432 - Asistencia ambiental por transferencias al área metropolitana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 53% Ejec. Financiera : 51%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 71.256 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 73.993 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 38.040

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA32BA Cumplimiento de los aportes de ley	Millones	71.256	38.040	53%

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto PD: 1.3.3.1 Fortalecimiento de la gestión fiscal y financiera del municipio de Medellín

Proyecto: 120114 - Sostenibilidad de la calidad de la información contable del municipio de medellín

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1

Proyecto: 150059 - Implementación normas internacionales de contabilidad para sector público

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 628 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 628

Proyecto PD: 1.3.3.2 Gestión y control de los ingresos municipales

Proyecto: 120065 - Modernización de los sistemas de recaudo, diversificación de los medios de pagos en la tesorería del municipio de I

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 172 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 172

Proyecto: 120079 - Fortalecimiento para el control de la evasión y elusión tributaria

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50

Proyecto: 120159 - Soporte a las aplicaciones que administran las rentas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 198 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 198

Proyecto PD: 1.3.3.3 Normalización de la cartera morosa del municipio de Medellín

Proyecto: 120144 - Administración financiera de los excedentes de liquidez- equipo de inversiones-subsecretaría de tesorería

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22

Proyecto: 120195 - Normalización de la cartera morosa del municipio de medellín



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 29 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 29

Proyecto PD: 1.3.4.6 Sistemas de gestión inteligentes para un buen gobierno



Proyecto: 120066 - Organización, registro, control digital y físico de la documentación de la secretaría de hacienda

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2017

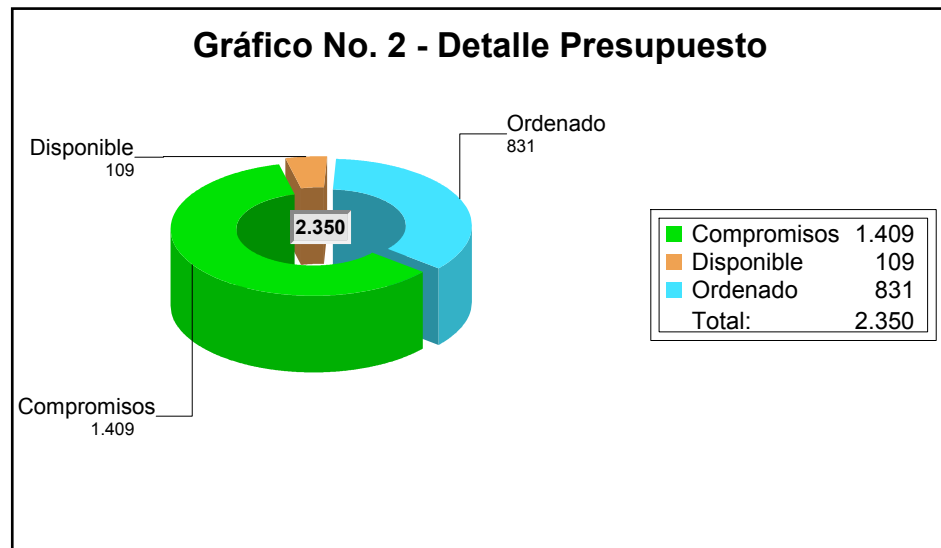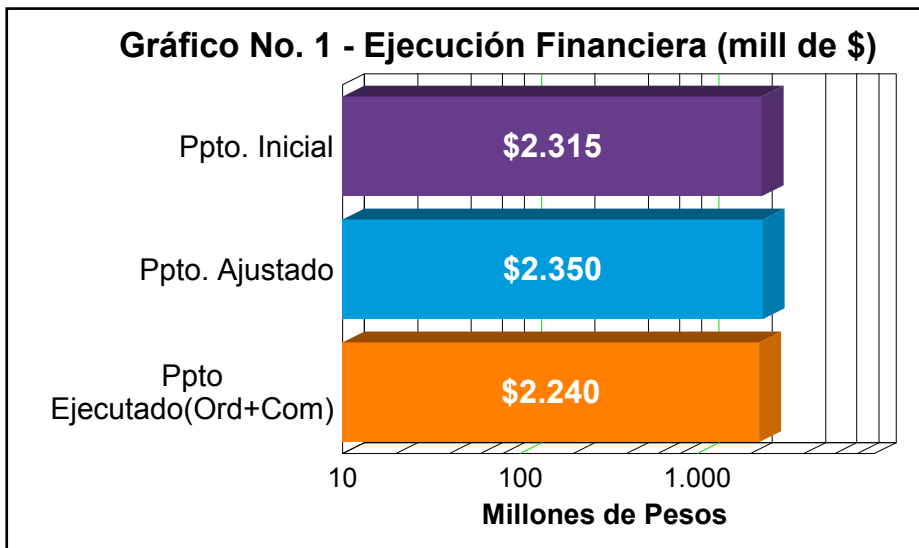

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

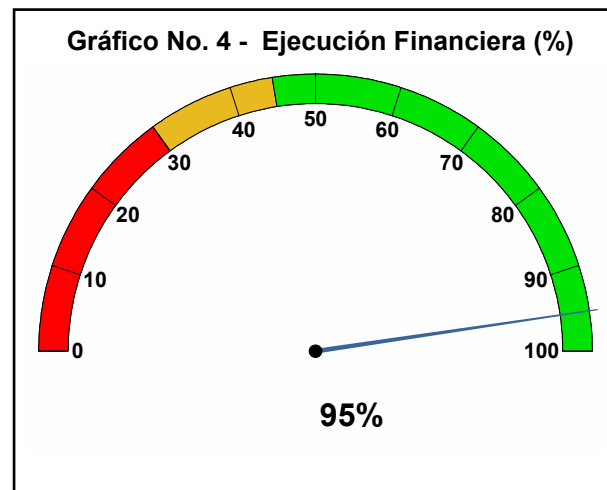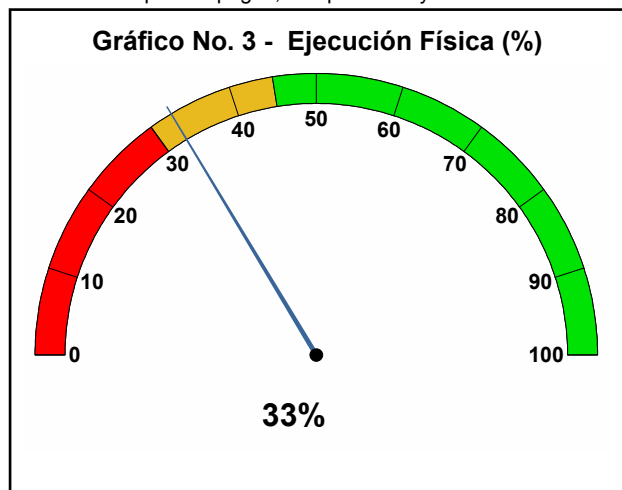

La ejecución financiera comprende pagos, facturas y los compromisos a la fecha de corte. Para el caso de los establecimientos públicos, la Ejecución Financiera se compone de dos cifras: una información obtenida del sistema, que corresponde únicamente a la cifra del presupuesto transferido desde el Municipio al estapúblico, y otra información suministrada por cada entidad que corresponde a los recursos propios invertidos por proyecto.

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 - Medellín bien administrado

Programa: 1.3.4 - Gestión efectiva

Proyecto PD: 1.3.4.8 Gerencia jurídica pública

Proyecto: 160407 - Apoyo a la transferencia del conocimiento jurídico

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 94%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.360 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.420 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.331

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GE07AA Espacios de reflexión jurídica	Número	41	19	46%
Observación B / S: Se han concebido los siguientes espacios de reflexión jurídica: conformación del Grupo de Estudio; sesiones académicas, mesas de trabajo y de estudio para definir estrategias de defensa y asuntos en cumplimiento de órdenes judiciales; recorridos académico jurídico con comunidad académica del derecho y realización de Cátedras Jurídicas, todos en pro del fortalecimiento del proceso Gestión Jurídica				
GE07AB Generación de contenidos jurídicos	Número	10	2	20%
Observación B / S: A partir de los grupos de estudio se estructuran documentos jurídicos en temas de ley de garantías, notificaciones y actos administrativos. Así mismo, se han generado contenidos jurídicos: Compilación sobre los códigos de ética en el Conglomerado Público e Informe final de la investigación sobre la política de educación física en el Municipio de Medellín.				

Proyecto: 160408 - Administración de la información jurídica

Síntesis Proyecto: Eficacia : 32% Ejec. Financiera : 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 955 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 895 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 874

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GE08AA Némesis mejorado y actualizado	Porcentaje	100	26,21	26%
Observación B / S: Se avanza en la ejecución del Plan de trabajo estructurado para las mejoras del sistema, equivalente a 13 requerimientos, entre los que se resaltan: Adaptación a Normas Internacionales y Cálculo Pasivo Contingente (NIIF), Masc, Cargue y publicación de información Gestoría judicial, Módulo de Cobro coactivo, entre otros.				
GE08AB Biblioteca jurídica virtual actualizada	Porcentaje	100	30	30%
Observación B / S: Se adelanta el análisis de los conceptos jurídicos que han sido emitidos por la Secretaría General desde el año 2012 y la integración de la recolección de la gacetas expedidas entre enero y junio de la presente anualidad, con la finalidad de incorporarlas a la publicación ASTREA, cargue proyectado para el mes de julio.				
GE08AC Portal jurismed rediseñado	Porcentaje	100	40	40%
Observación B / S: Revisado el estado actual del Portal Jurismed, el cual está fuera del aire, se analizó la estructura técnica, gráfica y de contenidos que deberá tener, se evaluó la accesibilidad y usabilidad del sitio, efectuando una revisión de las plantillas con las que cuenta el portal www.medellin.gov.co que servirán como base para proyectar el rediseño de Jurismed.				

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto PD: 1.3.4.8 Gerencia Jurídica Pública

Proyecto: 120368 - Gerencia jurídica en el municipio de medellín



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0

Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 35



Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 35

Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2017

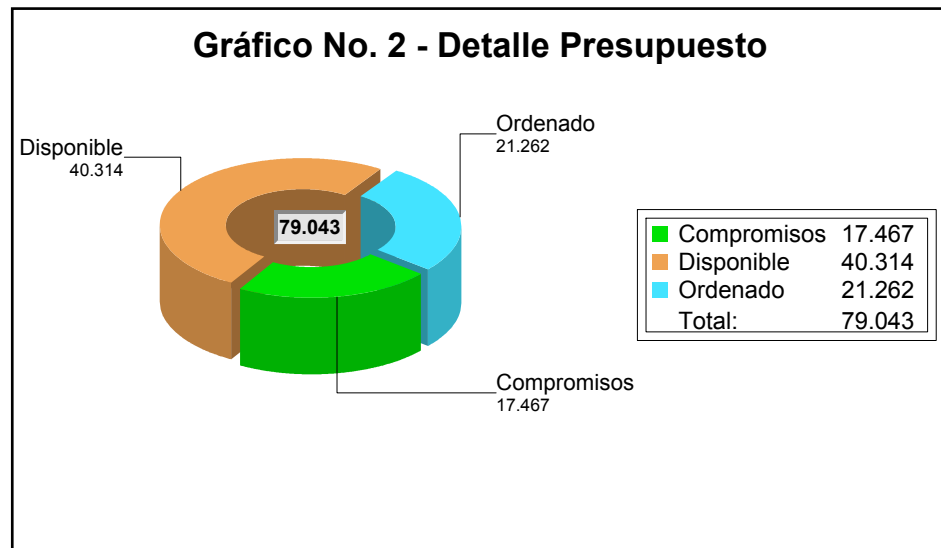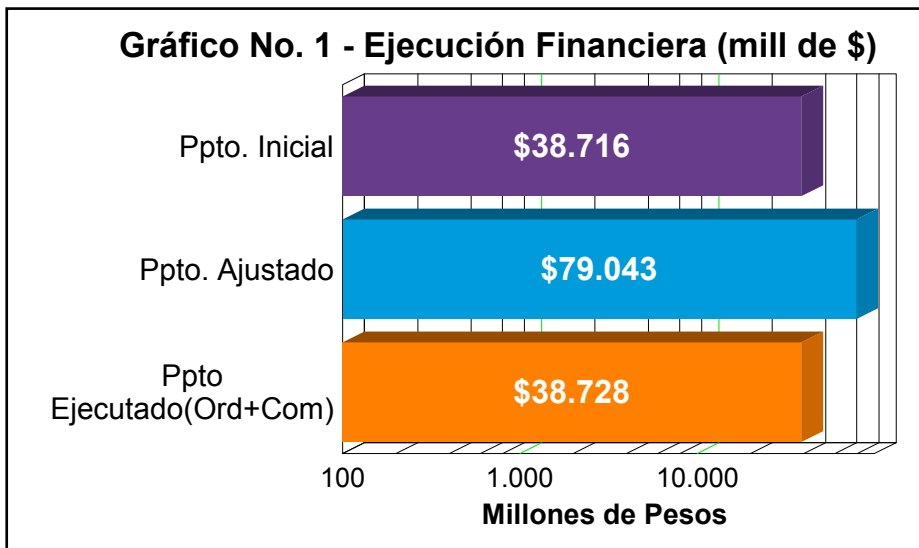

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

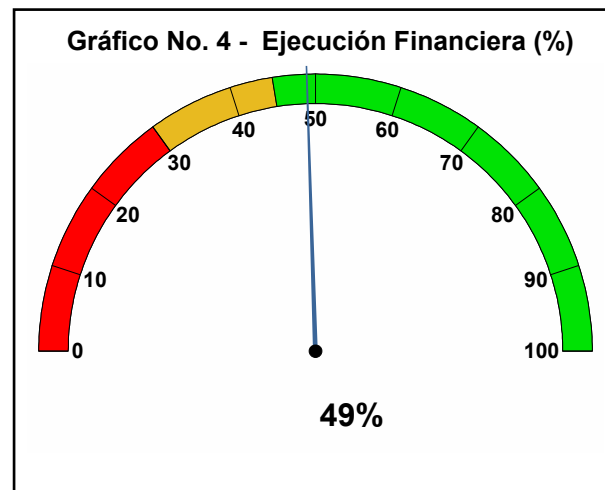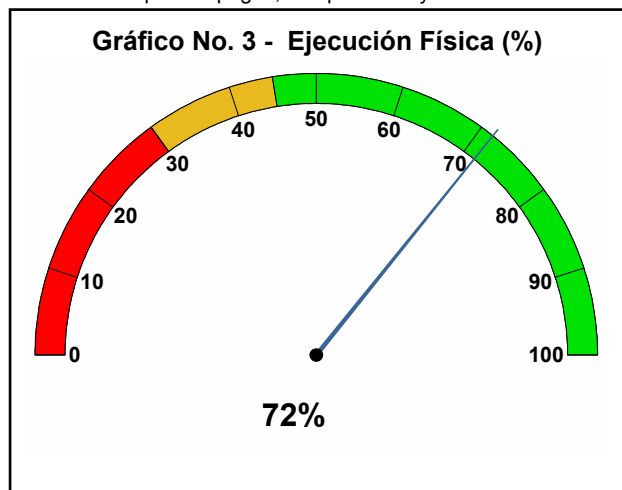

La ejecución financiera comprende pagos, facturas y los compromisos a la fecha de corte. Para el caso de los establecimientos públicos, la Ejecución Financiera se compone de dos cifras: una información obtenida del sistema, que corresponde únicamente a la cifra del presupuesto transferido desde el Municipio al estapúblico, y otra información suministrada por cada entidad que corresponde a los recursos propios invertidos por proyecto.

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.3 - Medellín bien administrado
Programa: 1.3.2 - Transparencia como modelo de gestión
Proyecto PD: 1.3.2.2 Estrategia Gobierno en línea

Proyecto: 160183 - Implementación de la estrategia de gobierno en línea

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 576 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 576 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH83AA Servicios y tramites implementados	Número	10	5	50%

Observación B / S: Duplicado de documento de cobro de industria y comercio y Duplicado de documento de cobro de industria y comercio para retenedores

Proyecto PD: 1.3.2.4 Gerenciar el sistema de servicio a la ciudadanía

Proyecto: 160184 - Fortalecimiento del sistema de servicio a la ciudadanía

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 91%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.118 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.057 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.775

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH84AA Contac center gestionado	Porcentaje	90	85,6	95%

Observación B / S: Porcentaje de nivel de servicio de llamadas entrantes, contestadas y abandonadas

Programa: 1.3.4 - Gestión efectiva

Proyecto PD: 1.3.4.1 Comprometidos con la integralidad del ser

Proyecto: 120231 - Soluciones de vivienda para servidores municipales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19.071 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Buenos días, mediante Decreto Provisional 796 de julio 11, se están trasladando estos recursos al proyecto nuevo - 160179 APOYO A LAS SOLUCIONES DE VIVIENDA y al valor estadístico créditos adjudicados

Proyecto: 160179 - Apoyo a las soluciones de vivienda

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 41%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 17.648 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23.711 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.660

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH79AA Creditos adjudicados	Número	120	146	122%

Observación B / S: Se adjudicaron 146 créditos: 9 para trabajadores oficiales, 12 para pensionados y 125 para empleados. Para obreros la modalidad de préstamo: 6 para Compra y 1 para mejora, 2 créditos por segunda vez 1 para compra y 1 para mejoramiento. Para jubilados la modalidad de préstamo: 10 para compra y 2 para reforma. Para empleados: Compra 93, Mejora 19 e Hipoteca 8 y 5 créditos por segunda vez de los cuales 3 para compra y 2 para mejoramiento.

Proyecto: 160187 - Compromiso con la integralidad del ser

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 79%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.594 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.874 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.272

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH87AA Centro de bienestar sostenido	Porcentaje	100	60	60%

Observación B / S: 37 actividades (cine, lectura, tecnología, cuerpo y salud, inteligencia financiera, entre otros) en EL RECREO, a las cuales asistieron 418 servidores. 2.308 Ingresos al CAPF y se dictaron Charlas de reducción tejido graso, alimentación y ejercicio, y entrenamiento para la reducción de tejido graso, 28 servidores beneficiados. EL JARDIN, con 58 Servidores beneficiados del Jardín Infantil

Proyecto: 160198 - Aportes al fonpet - ley 549 de 1999

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 85%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 141 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 141 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 120

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH98AA Transferencias realizadas	Número	11	5	45%

Observación B / S: Por un total acumulado de \$116.115.538

Proyecto PD: 1.3.4.6 Sistemas de gestión inteligentes para un buen gobierno

Proyecto: 160191 - Consolidación de los sistemas de gestión inteligentes para un buen gobierno

Síntesis Proyecto: Eficacia : 30% Ejec. Financiera : 69%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 374 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 374 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 258

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH91AA Manuales de funciones sistematizados	Número	5.000	0	0%

Observación B / S: Se está trabajando en el desarrollo del aplicativo en el sistema SAP que permitirá la Sistematización de los manuales de funciones, a la fecha se tiene un 28% de avance en este proceso.

GH91AB Seguimiento sistema gestión de calidad	Porcentaje	100	60	60%
---	------------	-----	----	-----

Observación B / S: Se llevaron a cabo las auditorías internas de calidad, a los 27 procesos y 24 sedes, entre el 24 de abril y el 12 de mayo de 2017, con los siguientes productos: Programa de Auditorías Internas, -Capacitación a 14 Auditores Líderes, 13 Internos y 13 Observadores sobre desarrollo de competencias para llevar a cabo el ciclo de auditorías internas al Sistema Integral de Gestión de la Alcaldía de Medellín durante el año 2017. Capacitación dictada por el SENA sobre Gestión Integral de Auditorías Internas, dirigida a 12 servidores de la Unidad de Planeación Organizacional, 14 Auditores Líderes, 13 Internos y 13 Observadores. Informe final de auditoría interna

Proyecto PD: 1.3.4.7 Evolución de las TIC para una organización digital

Proyecto: 160193 - Innovación de las tic para una organización digital

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 85%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.024 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26.764 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22.670

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH93AA Disponibilidad plataforma tic	Porcentaje	99,6	99,75	100%

Observación B / S: Disponibilidad acumulada de la plataforma tecnológica

Proyecto: 160196 - Administración documental eficiente y transparente al ciudadano

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 13%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 240 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.720 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 220

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH96AA Programa gestion documental implementado	Porcentaje	60	30	50%

Observación B / S: Elaboración y aprobación del Programa de Gestión documental y Actualización de ocho Procedimientos de Gestión Documental: Planeación documental, Producción y recepción, Gestión y trámite, Organización, Transferencia, Disposición de documentos, Preservación a largo plazo y Valoración

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto PD: 1.3.2.4 Gerenciar el sistema de servicio a la ciudadanía

Proyecto: 120371 - Fortalecimiento mascercas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50

Proyecto: 120372 - Gestión de servicios

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 46 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 46

Proyecto PD: 1.3.4.1 Comprometidos con la integralidad del ser

Proyecto: 120225 - Gestión integral del talento humano

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 124 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 124

Proyecto PD: 1.3.4.7 Evolución de las TIC para una organización digital

Proyecto: 120012 - Fortalecimiento de la cultura de la tecnología de las tic



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 514 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 514

Proyecto: 120226 - Modernización e integración de la gestión documental



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20

Secretaría Suministros y Servicios

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2017

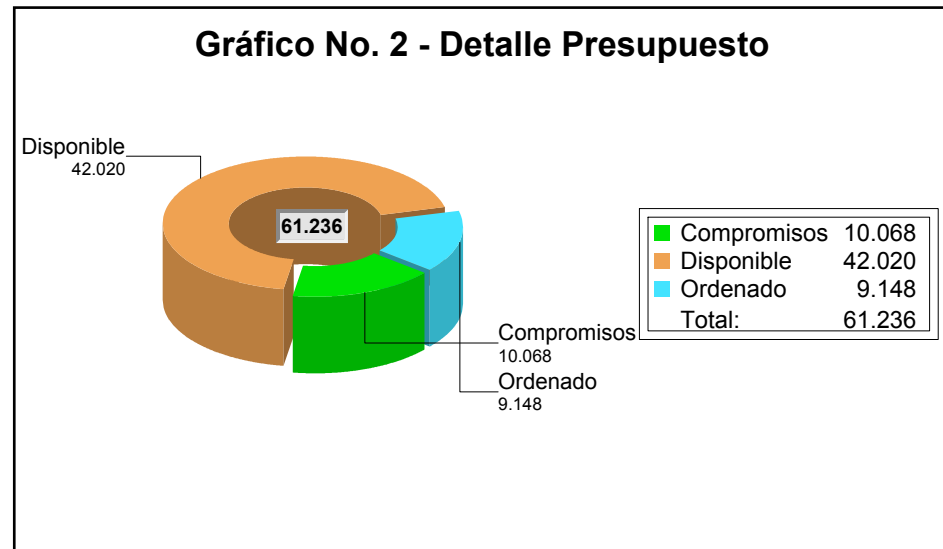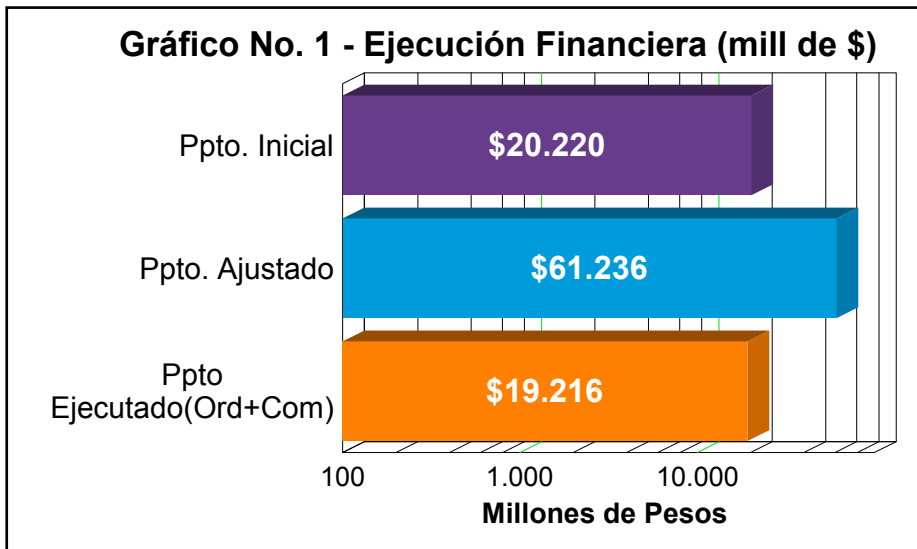

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

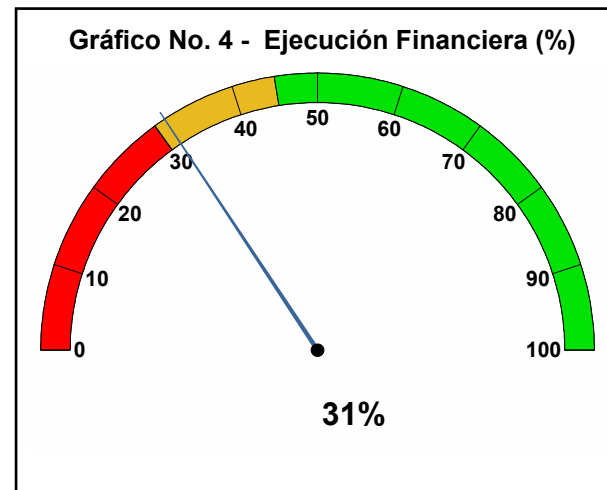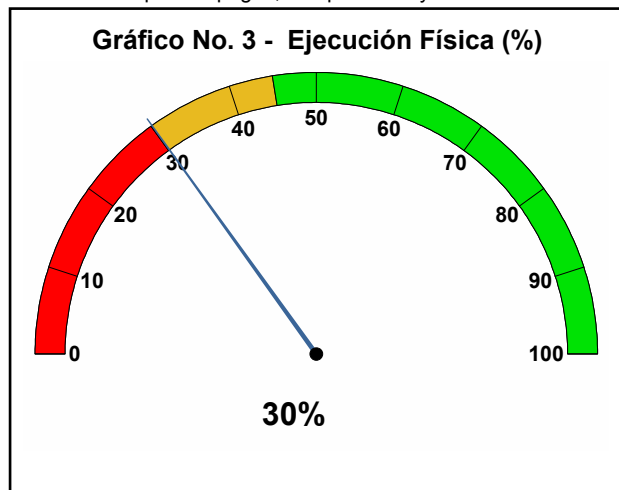

La ejecución financiera comprende pagos, facturas y los compromisos a la fecha de corte. Para el caso de los establecimientos públicos, la Ejecución Financiera se compone de dos cifras: una información obtenida del sistema, que corresponde únicamente a la cifra del presupuesto transferido desde el Municipio al estapúblico, y otra información suministrada por cada entidad que corresponde a los recursos propios invertidos por proyecto.

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.3 - Medellín bien administrado
Programa: 1.3.2 - Transparencia como modelo de gestión
Proyecto PD: 1.3.2.1 Ferias de la transparencia con vos
Proyecto: 160202 - Desarrollo ferias de la transparencia con vos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 437 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SS02AB Feria de la transparencia realizada	Número	1	0	0%
SS02AD Plan de comunicaciones ejecutado	Porcentaje	100	0	0%

Programa: 1.3.4 - Gestión efectiva
Proyecto PD: 1.3.4.3 Gestión eficiente para la adquisición de bienes y servicios
Proyecto: 120230 - Bienes muebles para la prestación de servicios con calidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 102 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 102

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SS30AA Bienes suministrados	Número	106	106	100%

Proyecto: 160204 - Administración eficiente para la adquisición de bienes y servicios

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.428 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.275 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.754

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SS04AB Procesos de contratación apoyados	Porcentaje	100	100	100%
SS04AC Herra-sist contratacion pública dise/soc	Porcentaje	100	50	50%
SS04AE Estrategía compra diseñada y socializada	Porcentaje	100	50	50%

Proyecto PD: 1.3.4.4 Compras públicas sostenibles

Proyecto: 160650 - Formulación modelo compras públicas sostenibles

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SS50AA Model compras públicas diseñado/socializ	Porcentaje	100	0	0%

Proyecto PD: 1.3.4.5 Gestión y conservación de activos

Proyecto: 160206 - Administración y conservación de activos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 33%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.391 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20.901 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.910

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SS06AF Bienes muebles gestionados	Meses	12	6	50%
SS06AG Bienes inmuebles gestionados	Meses	12	6	50%

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.2 - Proyectos Integrales para Medellín

Programa: 6.2.2 - Implementación de proyectos estratégicos

Proyecto PD: 6.2.2.1 Estrategia Proyectos Urbanos Integrales

Proyecto: 160208 - Inversiones por obligaciones urbanísticas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.081 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.524 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SS08AA Predios adquiridos	Número	1	0	0%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Dimensión:	Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
1	- Creemos en la confianza ciudadana		
1.3	- Medellín bien administrado		
1.3.4	- Gestión efectiva		
1.3.4.5	Gestión y conservación de activos		
	080304 Adquisición de Bienes Inmueb	\$ 0,00000	\$ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto PD: 1.3.2.1 Ferias de la transparencia con vos

Proyecto: 120234 - Transparencia en la gestión contratación pública

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13

Proyecto PD: 1.3.4.3 Gestión eficiente para la adquisición de bienes y servicios

Proyecto: 120011 - Renovación parque automotor

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3

Proyecto PD: 1.3.4.5 Gestión y conservación de activos

Proyecto: 120228 - Mantenimiento del centro administrativo municipal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 468 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 468

Proyecto: 120229 - Mantenimiento sedes administrativas municipales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 788 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 788



Proyecto: 130293 - Adquisición y adecuación sedes administrativas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9



Proyecto PD: 6.2.2.1 Estrategia Proyectos Urbanos Integrales

Proyecto: 120292 - Inversión de obligaciones urbanísticas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22.696 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 168

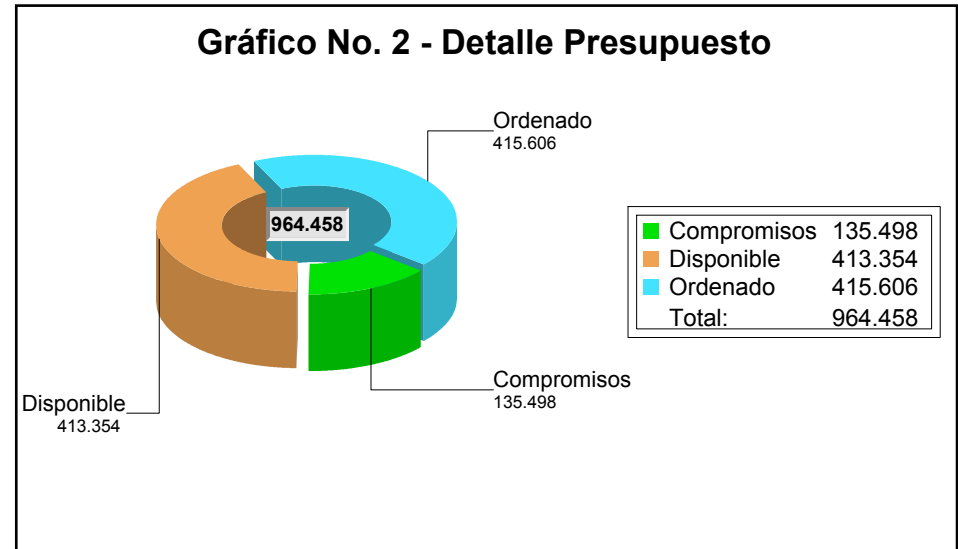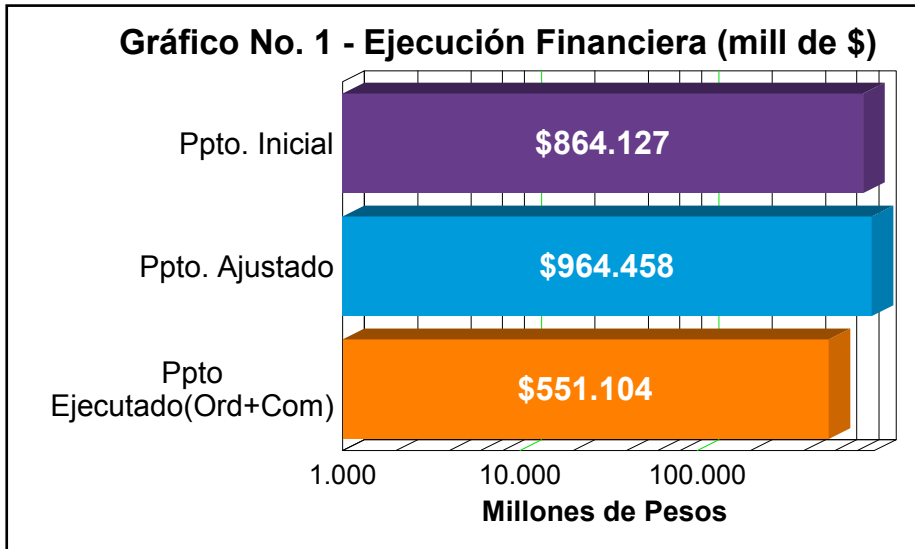

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

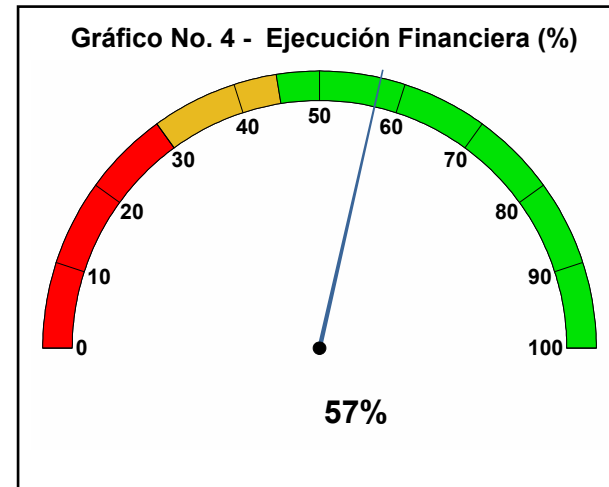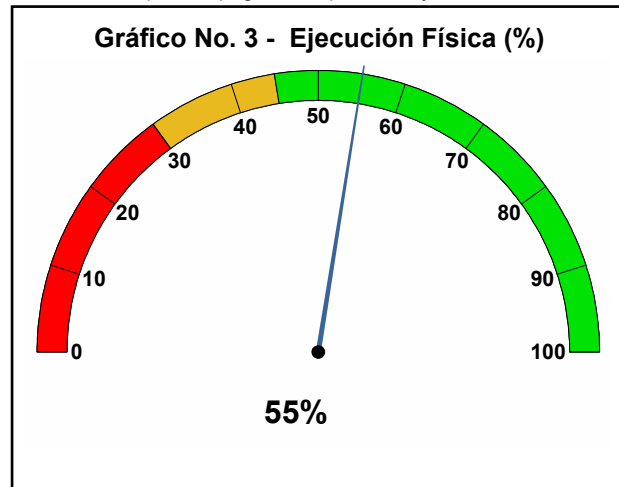

La ejecución financiera comprende pagos, facturas y los compromisos a la fecha de corte. Para el caso de los establecimientos públicos, la Ejecución Financiera se compone de dos cifras: una información obtenida del sistema, que corresponde únicamente a la cifra del presupuesto transferido desde el Municipio al estapúblico, y otra información suministrada por cada entidad que corresponde a los recursos propios invertidos por proyecto.

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.4 - Formación para la transformación de la cultura ciudadana
Proyecto PD: 1.1.4.2 Escuela abierta para el desarrollo de la ciudadanía
Proyecto: 160254 - Implementación de escuela abierta para el desarrollo de la ciudadanía

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED54AF Personas en form d proces d aprop tecn	Número	300	0	0%

Observación B / S: Se encuentra en proceso precontractual y de planeación para iniciar ejecución.

Reto: 1.3 - Medellín bien administrado
Programa: 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno
Proyecto PD: 1.3.5.8 Implementar el sistema de información territorial para la medición de impactos basados en la transversalización de las acciones
Proyecto: 160257 - Implementación del sistema de información territorial del sector educativo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 135 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED57AC Est grad 11 q aplican encuest expectativ	Número	4.000	0	0%
Observación B / S: Este proceso contractual se ejecutará a partir del segundo semestre del año 2017. Se encuentra en Etapa de Contratación				
ED57AD Egresados que aplican encuesta de sgto	Número	800	0	0%
Observación B / S: Este proceso contractual se ejecutará a partir del segundo semestre del año 2017. Se encuentra en Etapa de Contratación				
ED57AE Personas q aplican encuesta ambiente esc	Número	20.272	0	0%

Observación B / S: Este proceso contractual se ejecutará a partir del segundo semestre del año 2017. Se encuentra en Etapa de Contratación

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana
Reto: 2.3 - Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio
Programa: 2.3.4 - Ciudadanía activa por la paz
Proyecto PD: 2.3.4.2 La educación en Medellín le apuesta a la paz y la convivencia
Proyecto: 160259 - Fortalecimiento de la escuela en entorno protector

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.735 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.191 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.536

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED59AÑ le acompañadas con atención psicosocial	Número	174	175	101%
Observación B / S: El Programa Escuela Entorno Protector acompaña desde su componente psicosocial a 175 Instituciones Educativas, brindando asesoría y asistencia técnica a niños, niñas y adolescentes, padres y madres.				

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa

Programa: 4.1.1 - Educación inicial, preescolar, básica y media

Proyecto PD: 4.1.1.1 Fortalecimiento de la educación inicial - Buen Comienzo

Proyecto: 160263 - Desarrollo institucional y servicio de atención desde la gestación hasta los 5 años para el fortalecimiento de la educ

Síntesis Proyecto: Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 76%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 71.034 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 103.489 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 78.405

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED63AD Niñ@s mujeres gest y lactant atend	Número	87.858	80.103	91%
Observación B / S: En 04 de abril se firmó el convenio 1210 de 2017, con el ICBF, por ende se incluye en la cifra de población atendida, los beneficiarios reportados por el ICBF como gestión territorial. La cifra de atención incluye 9.210 mujeres gestantes y lactantes y 70.893 niña(o)s				
ED63AE Centro documentación en funcionamiento	Número	1	1	100%
ED63AF Festival buen comienzo realizado	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se seleccionaron los operadores logísticos y cerativos mediante Plaza Mayor para la materialización del Festival Buen Comienzo, igualmente la planeación y conceptualización pedagógica de las salas interactivas. El festival se llevará a cabo durante el segundo semestre.				

Proyecto PD: 4.1.1.3 Permanencia en el sistema escolar

Proyecto: 080154 - Pago de personal docente sgp

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 51 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Se encuentra en trámite de traslado para el proyecto 160354 en el mes de julio, por lo tanto no se crea valor estadístico.

Proyecto: 080531 - Contratación de la prestación del servicio educativo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.025 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.025

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED31AU Campaña publicitaria matricula 2017	Número	1	1	100%

Proyecto: 160266 - Aportes para el pago de personal docente sgp instituciones educativas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 47%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 405.788 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 405.788 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 188.948

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED66AB Pago del personal docente sgp realizado	Número	14	6	43%

Proyecto: 160267 - Aportes para el pago de personal docente municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 42% Ejec. Financiera : 38%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 71.458 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 62.498 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23.575

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED67AB Pago catorcenal docents municip realizad	Número	26	11	42%

Proyecto: 160268 - Aportes patronales docentes de instituciones educativas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 55%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 58.891 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 58.891 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 32.572

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED68AB Pago aportes patronales docents realizad	Número	12	6	50%

Proyecto: 160270 - Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 66%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 58.382 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 83.990 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 55.366

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED70AF Sedes educativas en funcionamiento	Número	420	420	100%

Proyecto: 160272 - Servicio educativo para jóvenes en edad escolar

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 31.886 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 32.177 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 32.152

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED72AC Cupos contrat prest serv educ edad esco	Número	27.200	27.515	101%

Observación B / S: En el mes de mayo hubo cupos adicionales, para la atención de niños, niñas y jóvenes en riesgo de desescolarización en zona vulnerable de la ciudad. La matrícula a la fecha es 26.006 estudiantes, que corresponde a un 95% de la cobertura educativa ofertada.

ED72AD Campaña publicit matric 2018 realizada	Porcentaje	80	0	0%
---	------------	----	---	----

Observación B / S: Se dará inicio a la etapa precontractual a partir del mes de julio

Proyecto: 160275 - Aportes para la gratuidad educativa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 81%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 25.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25.400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20.543

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED75AK I.e. beneficiadas con gratuidad	Número	210	212	101%
Observación B / S: IE San Agustín, IE Lusitania y IE La Pastora, les giraron con la Res.09885 del 15 mayo 2017. De la Res. 10878 les giraron a 211 y quedó faltando la IE Dinamarca debido a cambio de cuenta bancaria.				

Proyecto: 160276 - Servicio educativo para jóvenes en extraedad, adultos y analfabetas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.019 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.519 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.974

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED76AB Cupos esc ofert prest serv educ extraed	Número	25.600	25.600	100%
Observación B / S: 25.600 cupos contratados para la atención de jóvenes en extra edad y adultos, con cumplimiento del 100% de la meta. La matrícula a la fecha es de 25.319 estudiantes, que corresponde al 99% de la cobertura educativa ofertada.				

Proyecto: 160279 - Aportes para el pago de servicios públicos de instituciones educativas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 29% Ejec. Financiera : 38%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.202 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.441 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.775

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED79AA Pago de servic públic a ie ofic realiza	Número	12	6	50%
Observación B / S: A la fecha se han realizado los pagos mensuales correspondientes.				
ED79AB Sedes educ con pozos sépticos atendidos	Número	24	2	8%
Observación B / S: Mantenimiento de pozos sépticos de dos Sedes Educativas del Corregimiento de Santa Elena efectuados durante el mes de junio.				

Proyecto: 160280 - Desarrollo de estrategias para la permanencia en el sistema escolar y pae

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 75%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 18.530 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21.102 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.811

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED80AF Est asegurad con póliza contra accident	Número	450.000	450.000	100%
Observación B / S: El número total estimado de estudiantes de las sedes educativas oficiales y de cobertura contratada, al igual que los niños, niñas y madres gestantes del programa Buen Comienzo, se encuentra cubiertos por una póliza de accidentes personales escolares, hasta el 10 de diciembre de 2017				
ED80AG Estud d ie of benefi con transport esc	Número	10.600	10.670	101%

Proyecto: 160282 - Aportes para el pago del personal administrativo de instituciones educativas**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 43%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 18.517 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.518 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.925**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED82AA Pago de personal admvo oficial realizado	Número	14	6	43%

Proyecto: 160284 - Desarrollo institucional para fortalecer la gestión educativa**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 91%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.110 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.688 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.017**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED84AC Programas y proyectos gestionados	Porcentaje	100	100	100%
ED84AD Sedes educ fortalecidas administrativam	Número	420	420	100%

Proyecto: 160286 - Aportes para el pago del ascenso en el escalafón**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.067 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.067 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0**Observación Proyecto:** Los recursos serán trasladados en el segundo semestre del año a los proyectos 160267 y 160266 para cubrir las solicitudes de ascenso, por lo tanto no se crea valor estadístico.**Proyecto: 160288 - Aportes para el pago de arrendamiento de inmuebles para instituciones educativas****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.353 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.242 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.242**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED88AC Sedes arrendadas	Número	24	23	96%

Observación B / S: Se han efectuado los pagos de manera oportuna. El contrato de arrendamiento 4600068612 de 2017 para el funcionamiento de la Sec. Esc. La Anunciación se dio por terminado de manera anticipada y solo se pagaron los meses de enero y febrero.**Proyecto PD: 4.1.1.4 Inclusión en el sistema escolar****Proyecto: 160313 - Desarrollo de estrategias para la inclusión en el sistema escolar****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 73% Ejec. Financiera : 92%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.182 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.758 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.062**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

ED13AF	Establec educati con estrateg inclusivas	Número	155	208	134%
Observación B / S: El número de establecimientos educativos reportado, corresponde a los beneficiados con las estrategias UAI (132), Óyeme (49) y docente de apoyo (27).					
ED13AG	Est condic enferm atend con mpf	Número	100	619	619%
Observación B / S: El logro es superior a lo proyectado dado que se logró firmar un convenio con los centros hospitalarios de la ciudad y las cajas de compensación familiar para que suministraran las bases de datos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en estado de hospitalización para ser atendidos con los modelos pedagógicos flexibles de la SEM. enfermedad perteneciente al Régimen Subsidiado de Salud					
ED13AH	Est extraed secund atend con mpf	Número	416	2.499	601%
Observación B / S: Logro superior por caracterización realizada en el año 2016. Continuidad en el proceso reconociendo que en junio estaban en vacaciones.					
ED13AI	le con grup étnicos atend con mpf	Número	20	23	115%
ED13AJ	Estud habit cll en proces resocializ	Número	35	235	671%
Observación B / S: Se atienden 145 menores de edad por medio de cobertura contratada en la Corporación Combos y 90 adultos cobertura contratada con CEDECO población enviada por Inclusión Social					
ED13AK	Est condic reinteg vid civil atend mpf	Número	140	140	100%
Observación B / S: Se iniciaron clases el 15 de junio con 140 participantes de las FARC					
ED13AL	Est condic adult iletrado aten mpf	Número	1.000	0	0%
Observación B / S: El MEN definió a principios de junio que no se asignan recursos a Medellín, por tanto se consigue recurso propio para inicio de actividades para el segundo semestre.					
ED13AM	Est srpa atend con mpf	Número	400	928	232%
Observación B / S: Se atiende población de libertad vigilada, no privación de libertad y privación de libertad. Es una población fluctuante, entra y sale del sistema de manera permanente.					
ED13AN	Estudiant rural atend con mpf	Número	54	0	0%
Observación B / S: Se dará inicio a las actividades en el mes de julio					
ED13AÑ	Est grup poblac atnd enfo dif	Número	8.000	9.658	121%
Observación B / S: A Junio 30 se han atendido 9658 estudiantes con discapacidad. 7.090 a través del contrato No 4600070029 de 2017 (UAI). 80 con discapacidad auditiva contrato N° 4600069936 de 2017 (apoyo a personas con discapacidad auditiva en proceso de oralización) 132 mediante contrato 4600069147 de 2017 con la Fundación Universitaria Católica del Norte y 2356 atendidos por 28 docentes de apoyo de planta.					
ED13AO	Est talen excep atnd enfo dif	Número	183	0	0%
Observación B / S: El paro magisterial dificultó el inicio, el cual está previsto para el mes de julio.					

Proyecto PD: 4.1.1.5 Educación media y articulación con la educación superior

Proyecto: 160316 - Fortalecimiento de la educación media en articulación con la educación superior y la educación para el trabajo y el d

Síntesis Proyecto: Eficacia : 66% Ejec. Financiera : 41%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.247 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.742

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED16AA le oficiales en media técnica	Número	155	158	102%
Observación B / S: Se están llevando a cabo todos los procesos administrativos de orientación y atención a las instituciones educativas oficiales para el desarrollo del proyecto en la presente vigencia.				
ED16AB Estudiantes en media técn estrateg nodos	Número	16.585	17.694	107%
Observación B / S: A través de las instituciones educativas se hace el reporte en el SIMAT de los estudiantes en Media Técnica, dado que varias I.E. están a la espera de expedición de la resolución que los habilita, aún no hacen su reporte.				
ED16AC Estudiantes atendidos en la imgvv	Número	560	366	65%
Observación B / S: La Institución Maestro Guillermo Vélez Vélez, está regularizando su matrícula, además se encuentra al día en los procesos contractuales y con el personal profesional idoneo para el buen funcionamiento del programa.				
ED16AD Estudiantes en program d orientación voc	Número	3.000	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en procesos precontractuales para iniciar desarrollo.				

Reto: 4.2 - Medellín, camino a la excelencia y la calidad
Programa: 4.2.1 - Gestión escolar para el mejoramiento de la calidad
Proyecto PD: 4.2.1.1 Transformación de la gestión escolar desde el PEI

Proyecto: 160322 - Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes para el mejoramiento de la calidad educativa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 21% Ejec. Financiera : 54%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 744 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 589 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 319

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED22AE Inst educativas actualizadas en pei	Número	35	22	63%
Observación B / S: Con corte a 30 de junio de 2017 se ha acompañado 22 instituciones educativas en el inicio de la aplicación de la ruta de Asistencia técnica (socialización de la ruta, creación del equipo de calidad, cronograma a partir del diagnóstico del PEI), en algunas instituciones avanza el proceso de actualización de algunos aspectos identificados en el diagnóstico.				
ED22AF le con diagnóstico en gestión de riesgos	Número	228	0	0%
Observación B / S: El desarrollo de acciones para el logro de lo planeado se lleva a cabo a través de un convenio que iniciará en el segundo semestre de la vigencia.				
ED22AG le con acompañamiento en sost model gest	Número	37	0	0%
Observación B / S: Se firmó contrato el 7 de junio, se reportarán avances a partir del mes de julio. El paro dificultó acciones en junio.				

Proyecto PD: 4.2.1.3 Incentivos para la calidad

Proyecto: 160325 - Mejoramiento de la calidad mediante incentivos y reconocimientos para las instituciones e integrantes de la comunic

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 40%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 400

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED25AF Estab educ q aportan al mejora d calidad	Número	24	0	0%
Observación B / S: De acuerdo con las características propias del programa, este valor estadístico solo podrá ser reportado el 30 de noviembre de 2017.				
ED25AH Eventos de lanzamiento y reconocimiento	Número	2	0	0%
Observación B / S: Para el Evento de Reconocimiento y según las características propias del programa, este valor estadístico solo podrá ser reportado el 30 de noviembre de 2017 .				

Programa: 4.2.2 - Maestros, maestras y directivos líderes de la calidad y la excelencia

Proyecto PD: 4.2.2.1 Maestros y maestras sujetos del saber - Mov

Proyecto: 080271 - Formación de docentes diferentes áreas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 48 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 48

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED71AE Maestr en proces gestión conoc ie joséag	Número	30	30	100%

Proyecto: 150302 - Dotación y operación del centro de innovación del maestro mova

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 244 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 244

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED02AE Form cont doc a través de pp form maes	Número	250	250	100%

Proyecto: 160330 - Mejoramiento de la calidad a través de la operación y formación de maestros, maestras y agentes educativos sujetos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 56%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.584 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.784 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.555

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED30AD Maestr@s y agentes educativos formados	Número	760	363	48%
ED30AE Proyec investig present por maestros	Número	35	25	71%
Observación B / S: 25 anteproyectos entregados por maestros están en proceso de acompañamiento y asesoría en la formulación de los proyectos				
ED30AF Estrategias educa diseñadas por maestros	Número	780	403	52%
Observación B / S: Se avanzó en 151 estrategias nuevas acompañadas y asesoradas. Se recepcionarán otras estarteias y se les hará la debida orientación pedagógica desde el equipo MOVA				
ED30AG Docentes partic en redes de conocimiento	Número	163	249	153%
Observación B / S: Se presentó mayor demanda a la esperada en la conformación de cada una de las redes. Se está en los procesos de orientacón acada una de las redes.				
ED30AH Docent y directiv doc en formac continua	Número	900	432	48%
Observación B / S: Culminaron proceso de formación 69 docentes nuevos en diferentes temáticas. Continúan los procesos de formación.				

Proyecto PD: 4.2.2.3 Bienestar docente

Proyecto: 160333 - Desarrollo humano y bienestar laboral de maestros, maestras y directivos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 85%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.120 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 954

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED33AD Docent y dir doc particip día del maestr	Número	3.700	3.537	96%
Observación B / S: La actividad desarrollada en el Parque los Tamarindos, tuvo una participación de 2,937 docentes y la actividad del Teatro de la Universidad de Medellin unos 600 (se registra la mitad de los asistentes proporcional al recurso de este proyecto que se destinó para la actividad.				
ED33AE Docen y dir doc partic juegos magisterio	Número	1.200	767	64%
Observación B / S: Docentes y Directivos Docentes que participaron en la etapa eliminatoria interna de Medellin para participar en Juegos Departamentales				
ED33AF docent-direc beneficiad activ bienestar	Número	2.300	941	41%

Proyecto: 160336 - Aportes para el pago de estímulos a docentes catorcenales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 29%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 70 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 70 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED36AE Estímulos educativos entregados	Número	20	10	50%

Observación B / S: Se postularon 12 funcionarios, de los cuales 2 de ellos no cumplieron con los requisitos.

Programa: 4.2.3 - Promoción de las capacidades y talentos de estudiantes

Proyecto PD: 4.2.3.1 Estrategia para el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivas

Proyecto: 160339 - Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 31% Ejec. Financiera : 82%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.870 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.449

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED39AI Estudiant particip en 1 prueba olimp con	Porcentaje	95	0	0%
Observación B / S: Se firmaron contratos. Se programó la primera prueba el 25 de julio.				
ED39AJ Estab ed participants prueba olimp con	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Se firmaron contratos. Se programó la primera prueba el 25 de julio.				
ED39AK Estudiantes particip 2 prueba olimp con	Porcentaje	95	0	0%
Observación B / S: Se firmaron contratos. Se programó la primera prueba el 25 de julio.				
ED39AL Estudiantes becados olimp del conocimien	Número	5	0	0%
Observación B / S: Se firmaron contratos. Se programó la primera prueba el 25 de julio.				
ED39AM Estudiantes ganad estímulos econ olimp c	Número	5	0	0%
Observación B / S: Se firmaron contratos. Se programó la primera prueba el 25 de julio.				
ED39AN Transmisiones de olimp del conocimiento	Número	12	0	0%
Observación B / S: Se firmaron contratos. Se programó la primera prueba el 25 de julio.				
ED39AÑ Estudiantes en formación d dlo competen	Número	35.000	2.800	8%
Observación B / S: Se han realizado 4 encuentros con alumnos de 11°				
ED39AO le acompañadas en procesos pruebas saber	Número	157	163	104%
Observación B / S: 163 instituciones educativas oficiales atendidas en grado noveno, décimo y undécimo.				
ED39AP Docentes en formación de eval por compet	Número	600	228	38%
Observación B / S: En proceso formativo 228 docentes				
ED39AQ Estudian en form d nuevos ambient virtua	Número	15.000	16.128	108%
Observación B / S: Se presentó mayor demanda de estudiantes a quienes se les logró otorgar las licencias para iniciar procesos de formación.				
ED39AR Docent en form d manejo herra virtuales	Número	120	350	292%
Observación B / S: Hubo mayor demanda de los maestros para los procesos de formación, se amplía capacidad atendiendolos. Actualmente los docentes participan activamente con su IEO.				

Proyecto PD: 4.2.3.2 Educación complementaria para el fortalecimiento de las capacidades humanas y los talentos

Proyecto: 160342 - Implementación de la educación complementaria**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 61%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.718**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED42AB Estud atend en rutas educ complementaria	Número	15.521	0	0%

Observación B / S: Los proyectos del programa Educación Complementaria ya se encuentran en territorio, se está a la espera de las bases de datos de los estudiantes matriculados**Proyecto PD: 4.2.3.3 Estrategias de profundización y formación en lengua extranjera****Proyecto: 160343 - Fortalecimiento en lenguas extranjeras****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 49%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 494**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED43AA Personas benefic proces fortal leng extr	Número	4.347	0	0%

Observación B / S: Uno de los procesos se encuentra en etapa precontractual y en el otro se entregarán licencias para estudiantes en la semana del 11 al 14 de julio de 2017.**Proyecto PD: 4.2.3.4 Bachillerato internacional****Proyecto: 160345 - Implementación de bachillerato internacional****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 30 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED45AE le en proces d imp bachillerato internac	Número	1	0	0%

Observación B / S: La institución educativa oficial identificada para el proceso de implementación no contaba con los requerimientos físicos para su desarrollo, por lo cual está en el análisis otra IEO. Se avanza en el modelo pedagógico.**Programa: 4.2.4 - Ambientes de aprendizaje para la calidad de la educación****Proyecto PD: 4.2.4.1 Mejoramiento de ambientes de aprendizaje****Proyecto: 080011 - Construcción, reposición y terminación de equipamientos educativos del municipio de medellin****Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1**Observación Proyecto:** Se encuentra en trámite de traslado para el proyecto 160354 en el mes de julio, por lo tanto no se crea valor estadístico.**Proyecto: 080029 - Construcción de jardines infantiles de calidad para la atención integral a la primera infancia en el municipio de mede**

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 43%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.857 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 796

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED29AF Construcción ji y ci buen comienzo	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se encuentra en proceso de entrega el Jardín Lusitania

Proyecto: 080098 - Dotación de mobiliario escolar

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 81%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 174 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 141

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED98AC Instituciones educativas dotadas	Número	20	33	165%

Observación B / S: La meta fue superada considerando que según el proceso precontractual, el proponente al cual se adjudico el proceso, ofertó un precio inferior al que se tenía proyectado, lo que permitió aumentar las cantidades significativamente.

Proyecto: 080441 - Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas educativas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 42% Ejec. Financiera : 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.024 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.975

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED41AB Obras de mantenimiento	Número	85	36	42%

Proyecto: 080554 - Dotación de mejores ambientes de aprendizaje de instituciones educativas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.100

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED54AG Sedes educativas dotadas	Número	11	11	100%

Proyecto: 080561 - Dotación de jardines infantiles de calidad para la atención integral a la primera infancia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 88%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 513 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 450

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED61AC Dotación jard inf atenc integ prim infan	Número	1	1	100%

Proyecto: 100024 - Adecuación y mantenimiento de espacios destinados a la atención de la primera infancia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Se encuentra en trámite de traslado para el proyecto 160354 en el mes de julio, por lo tanto no se crea valor estadístico.

Proyecto: 160347 - Fortalecimiento de tecnologías de la información

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 82%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.895 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.847 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.295

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED47AC Equipos cómputo ie con licencia y conect	Número	51.000	51.000	100%
ED47AD Mesa de ayuda contratada para inst educ	Número	1	1	100%

Proyecto: 160350 - Construcción, reposición y terminación de equipamientos educativos para el mejoramiento de ambientes de aprend

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED50AÑ Plantas físicas educativas construídas	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se llevara acabo la construcción de IE Tricentenario

Proyecto: 160351 - Construcción de jardines y centros infantiles para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje y la atención integri

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 22%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.060 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.060 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 235

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED51AD Jardín infantil construído	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se prevé entregar el Jardín Lusitania durante el 2do semestre del 2017

Proyecto: 160352 - Dotación de mobiliario para instituciones educativas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED52AA le oficiales que reciben dotación	Número	50	0	0%

Observación B / S: El proceso de contratación del mobiliario escolar, se encuentran en elaboración de estudios previos y análisis de mercado, según las necesidades reportadas por los rectores de las diferentes I.E.

Proyecto: 160353 - Desarrollo plan de lectura y bibliotecas escolares**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 26 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 37 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 37**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED53AE biblio escol manten actul y sopor janiu	Número	43	43	100%

Proyecto: 160354 - Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas educativas para el mejoramiento de ambientes de aprend**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 21% Ejec. Financiera : 34%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.414**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED54AE instituciones educativas intervenidas	Número	103	22	21%

Observación B / S: La ejecución de las obras se realizará en el 2do semestre del año 2017.**Proyecto: 160355 - Dotación de mejores ambientes de aprendizaje de instituciones educativas****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED55AE Instituciones educativas dotadas	Número	20	0	0%

Observación B / S: El proceso de contratación se encuentran en elaboración de estudios previos**2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)****Dimensión:** 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos**Reto:** 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa**Programa:** 4.1.1 - Educación inicial, preescolar, básica y media**Proyecto PD:** 4.1.1.1 Fortalecimiento de la educación inicial - Buen Comienzo**Proyecto: 160607 - 17pp3-asistencia a primera infancia mediante buen comienzo****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 470 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 470 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 438**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED07AA Niñ@s de primera infancia en atención	Número	175	175	100%

Observación B / S: Continúa la intervención con 175 niños y niñas en atención a primera infancia.

Proyecto PD: 4.1.1.3 Permanencia en el sistema escolar

Proyecto: 160608 - 17pp99-mejoramiento en la calidad de la educación mediante acciones de inclusión escolar

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 322 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 322 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 322

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED08AC le of en proces de fortaleci en disc c-8	Número	15	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en socialización con rectores se espera dar inicio a finales de julio.				
ED08AD le con atención en nee en la comuna 15	Número	3	3	100%
Observación B / S: Se está llevando a cabo la intervención en las 3 Instituciones educativas				
ED08AE le con atención en nee en la comuna 8	Número	15	15	100%
Observación B / S: Se esta llevando a cabo la intervención en las 15 Instituciones educativas				

Proyecto: 160629 - 17pp70-prevención de la deserción escolar mediante transporte escolar para los estudiantes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 184 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 184 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 184

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED29AE Estudiantes con transp esc recargas c70	Número	441	441	100%
Observación B / S: Contrato en ejecución				

Proyecto PD: 4.1.1.5 Educación media y articulación con la educación superior

Proyecto: 160630 - 17pp3-mejoramiento en la calidad educativa mediante orientación vocacional

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 253 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 253 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 253

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED30AC Estudiantes en forma de orientación voc	Número	1.054	0	0%
Observación B / S: Se tiene previsto el inicio de la intervención en el tercer trimestre del año.				

Reto: 4.2 - Medellín, camino a la excelencia y la calidad

Programa: 4.2.1 - Gestión escolar para el mejoramiento de la calidad

Proyecto PD: 4.2.1.1 Transformación de la gestión escolar desde el PEI

Proyecto: 160631 - 17pp8-implementación del plan de desarrollo educativo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 40%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 82 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 82 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 32

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED31AL Plan dilo educ implementado en la c-8	Número	1	0	0%
Observación B / S: Inicia en el mes de julio con la convocatoria de las mesas de trabajo				

Programa: 4.2.3 - Promoción de las capacidades y talentos de estudiantes

Proyecto PD: 4.2.3.1 Estrategia para el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivas

Proyecto: 160632 - 17pp99-mejoramiento en la calidad educativa mediante evaluación por competencias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 476 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 586 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 586

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED32AC Estud en formac en preuniversitar c14	Número	35	0	0%
Observación B / S: Se dará inicio a la intervención en el mes de julio				
ED32AD Estud en formac en preuniversitar c8	Número	192	0	0%
Observación B / S: se dará inicio a la intervención en el mes de julio				
ED32AE Estud en formación pruebas saber c90	Número	88	88	100%
Observación B / S: Se encuentran en formación 88 estudiantes				
ED32AF Estud en formación pruebas saber c8	Número	192	192	100%
Observación B / S: Se encuentran en formación 192 estudiantes				
ED32AG Estud en formación pruebas saber c2	Número	1.289	577	45%
Observación B / S: Se encuentra en formación 577 estudiantes de grado 11, que presentaran las pruebas saber en agosto iniciarán en julio 577 de grado 10 y 135 de grado 5 que presentarán sus pruebas a final de año.				
ED32AI Estudiant en formación pruebas saber c14	Número	35	35	100%
Observación B / S: Se encuentra en ejecución con 35 estudiantes				
ED32AJ Estudiantes en formac pruebas saber c60	Número	423	423	100%
Observación B / S: Se encuentra en ejecución con 423 estudiantes				

Proyecto PD: 4.2.3.2 Educación complementaria para el fortalecimiento de las capacidades humanas y los talentos

Proyecto: 150125 - 16pp2-educación con pertinencia y calidad para estudiantes y comunidad en santa cruz

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 103 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 103

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED25AI Instituciones educativas dotadas c2	Número	6	0	0%
Observación B / S: Se han realizado entregas parciales, se espera la entrega total durante el segundo semestre.				

Proyecto: 160634 - 17pp99-fortalecimiento a la calidad educativa mediante educación complementaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 20% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.082 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.082 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.082

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED34AC Estudiantes en formación en robótica c2	Número	471	471	100%
ED34AM Estu formación investigación escolar c8	Número	280	0	0%
Observación B / S: Se hizo socialización con rectores, la intervención iniciará en el mes de julio.				
ED34AN Estudiantes en semilleros de investi c10	Número	200	0	0%
Observación B / S: La intervención iniciará en julio con 200 estudiantes				
ED34AÑ Estudiantes en form huertas escolar c90	Número	20	0	0%
Observación B / S: En el mes de julio iniciará la intervención con 20 estudiantes de la comuna 90				
ED34AO Estud interv estrat preven desercc esc c6	Número	1.125	0	0%
Observación B / S: Iniciará en julio con la contratación de profesionales y las convocatorias de los estudiantes en las diferentes Instituciones Educativas de la comuna 6				

Proyecto PD: 4.2.3.3 Estrategias de profundización y formación en lengua extranjera

Proyecto: 150131 - 16pp12-educación con calidad para los habitantes de la américa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 69 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 69

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED31AT Personas en formación segunda lengua c12	Número	100	120	120%
Observación B / S: Por eficiencia del recurso se brindó formación a 20 estudiantes más en Francés, por lo cual hubo un total de 120 personas en formación				

Proyecto: 150135 - 16pp14-capacitación en lengua extranjera en el poblado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 51% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 40 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 40

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED35AG Personas formadas en segunda lengua c14	Número	75	38	51%
Observación B / S: Se presentó una deserción del 49,33%				

Proyecto: 150173 - 16pp15-calidad educativa en guayabal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 98 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 98

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED73AE Personas en formación en segunda lengua	Número	150	150	100%

Observación B / S: Debido al paro educativo las actividades fueron suspendidas y se reinicia el proceso formativo en el mes de julio.

Proyecto: 160635 - 17pp99-formación en segunda lengua

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 83%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 422 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 506 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 422

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED35AD Estudiantes en form de segunda lengua c2	Número	62	62	100%
Observación B / S: Continúan en proceso formativo 62 estudiantes				
ED35AE Personas en formación segunda lengua c8	Número	125	125	100%
Observación B / S: Continúan en proceso formativo 125 personas				
ED35AF Personas en proces formac 2da lengua c10	Número	100	100	100%
Observación B / S: En proceso formativo 100 personas de la comuna 10				
ED35AH Personas en formación segunda lengua c12	Número	120	0	0%
Observación B / S: Se dará inicio al proceso formativo en el segundo semestre				

Programa: 4.2.4 - Ambientes de aprendizaje para la calidad de la educación

Proyecto PD: 4.2.4.1 Mejoramiento de ambientes de aprendizaje

Proyecto: 130351 - Jve-80 centro infantil buen comienzo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED51AE Diseños arquitectónicos ci buen comienzo	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se recibió concepto del DAP imposibilitando el desarrollo del equipamiento inicialmente planeado, por lo cual se requiere nuevo diseño arquitectónico

Proyecto: 130702 - Jve-50-14 ampliacion y adecuación del centro educativo la aldea

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.029 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED02AK Diseños arquitectónicos c.e. la aldea	Número	1	0	0%

Observación B / S: De los 3 predios cuya adquisición se tenía prevista, sólo se pudo adquirir uno, por lo cual se realizará nuevo diseño arquitectónico

Proyecto: 150127 - 16pp5-mantenimiento y/o adecuación de infraestructura en instituciones educativas públicas de castilla

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 492 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 492

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED27AB Mantenimiento y adecuación a i.e ofici c5	Número	17	17	100%

Proyecto: 150132 - 16pp13-educación con calidad para los habitantes de san javier

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED32AH Instituciones educativas dotadas c13	Número	1	1	100%

Observación B / S: Finalizado en junio

Proyecto: 150174 - 16pp80-fortalecimiento de las capacidades en la educación de san antonio de prado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED74AD Instituciones educativas dotadas c80	Número	3	3	100%

Proyecto: 160638 - 17pp99-mejoramiento en la calidad educativa mediante mantenimiento a infraestructura educativa y dotación escolar

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 62%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.051 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.051 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 654

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED38AD le con dotac escolar para media técni c3	Número	12	0	0%

Observación B / S: Las resoluciones para las transferencias de fondos se realizarán en el mes de julio, una vez transferido el recurso las instituciones educativas proceden a la compra de la dotación.

ED38AE le con dotac escolar para media técc c16	Número	10	0	0%
---	--------	----	---	----

Observación B / S: las resoluciones para las transferencias de fondos se realizarán en el mes de julio, una vez transferido el recurso las i.e proceden a la compra de la dotación.

ED38AF Sedes educativas dotadas en la c70	Número	7	0	0%
---	--------	---	---	----

Observación B / S: Fue recibida la canasta educativa por parte de las instituciones Educativas y se pasó al equipo encargado de la compra.

ED38AG Mantenimiento a infraestructura educ c14	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual

ED38AH Mantenimiento a infraestructura educ c16	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

Observación B / S: En estudios previos

ED38AI Jardines infantiles dotados c-14	Número	2	0	0%
---	--------	---	---	----

Observación B / S: A la espera de recibir la canasta educativa por parte de los jardines de buen comienzo c-14

ED38AJ Mantenimiento y adec buen comienzo c14

Número

1

0

0%

Observación B / S: Se llevará a cabo la intervención en el segundo semestre 2017

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

	Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
Dimensión:	4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos		
Reto:	4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa		
Programa:	4.1.1 - Educación inicial, preescolar, básica y media		
Proyecto PD:	4.1.1.1 Fortalecimiento de la educación inicial - Buen Comienzo		
	080547 Niños y Niñas 0-12 Meses Sis	\$ 38,05637	\$ 0,0
	090069 Educacion Inicial 1 A 4 Años	\$ 4.326,28958	\$ 0,0
Proyecto PD:	4.1.1.3 Permanencia en el sistema escolar		
	050051 Ampliacion de Cobertura Educativa Para Atender Poblacion Vulnerable Mediante Contratacion Prestacion Servicio Educativo	\$ 8,18500	\$ 0,0
Proyecto PD:	4.1.1.5 Educación media y articulación con la educación superior		
	080039 Articulación de la Educación Media Con la Formación Técnica y Tecnológica y el Mundo Productivo	\$ 0,00000	\$ 0,0
Reto:	4.2 - Medellín, camino a la excelencia y la calidad		
Programa:	4.2.4 - Ambientes de aprendizaje para la calidad de la educación		
Proyecto PD:	4.2.4.1 Mejoramiento de ambientes de aprendizaje		
	020195 Dotación y Adecuación de La	\$ 0,01501	\$ 0,0
	130274 Plan de Lectura y Bibliotecas Escolares	\$ 0,15885	\$ 0,2
	130345 Jve-60- Construcción de Las Segundas Etapas de Las Instituciones Educativas la Huerta y Alfonso Upegui Orozco Del Municipio de Medellín	\$ 0,00000	\$ 0,0
	130712 Jve-02-Mantenimiento de la Infraestructura le Fe y Alegría José María Vélaz y Mejoramiento le de la Comuna 2, Santa Cruz	\$ 0,03014	\$ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto PD: 1.3.5.8 Implementar el sistema de información territorial para la medición de impactos basados en la transversalización de las acciones

Proyecto: 080075 - Laboratorio de la calidad de la educación

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15

Proyecto PD: 2.3.4.2 La educación en Medellín le apuesta a la paz y la convivencia

Proyecto: 140089 - Escuelas para la vida

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4

Proyecto PD: 4.1.1.1 Fortalecimiento de la educación inicial - Buen Comienzo

Proyecto: 080546 - Formación de agentes educativos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5

Proyecto: 140177 - Atención desde la gestación hasta los 5 años

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.193 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.484

Proyecto: 150126 - 16pp3-educación con calidad para todas y todos los habitantes de manrique

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 70 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 70

Proyecto: 150133 - 16pp14-atención integral de niños y niñas entre los 3 meses y los 5 años en el poblado

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12

Proyecto PD: 4.1.1.3 Permanencia en el sistema escolar

Proyecto: 080357 - Fortalecimiento institucional para la descentralización educativa

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 236 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 236

Proyecto: 080424 - Servicios escolares complementarios

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.295 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.276

Proyecto: 080442 - Servicio educativo para jóvenes en extraedad, adultos y analfabetas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 550 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 550

Proyecto: 080446 - Pago de servicios públicos de instituciones educativas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 213 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12

Proyecto:	080537 - Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 814	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 814
Proyecto:	150306 - Gestión transporte escolar alternativo		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2
Proyecto PD:	4.1.1.4 Inclusión en el sistema escolar		
Proyecto:	080300 - Atención a población con necesidades educativas especiales, discapacidad y talentos excepcionales		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.110	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.110
Proyecto PD:	4.2.1.1 Transformación de la gestión escolar desde el PEI		
Proyecto:	080550 - Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes de mejoramiento		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 115	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 115
Proyecto PD:	4.2.1.3 Incentivos para la calidad		
Proyecto:	080559 - Premios ciudad de medellín a la calidad de la educación		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 453	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 453
Proyecto PD:	4.2.2.3 Bienestar docente		
Proyecto:	080480 - Desarrollo personal y bienestar laboral de docentes		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 96	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 96
Proyecto PD:	4.2.3.1 Estrategia para el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivas		
Proyecto:	120348 - Formación de estudiantes		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 143	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 143
Proyecto PD:	4.2.3.2 Educación complementaria para el fortalecimiento de las capacidades humanas y los talentos		
Proyecto:	140091 - Jornada complementaria		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19

Proyecto PD: 4.2.4.1 Mejoramiento de ambientes de aprendizaje

Proyecto: 080422 - Consultoría, estudios y diseños para equipamientos educativos oficiales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16

Proyecto: 080522 - Fortalecimiento de tecnologías de la información

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 362 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 193

Proyecto: 150134 - 16pp14-adecuación y mantenimiento de espacios deportivo-recreativos de la i.e santa catalina de siena en el poblado



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 32 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 32

Proyecto: 150136 - 16pp16-mantenimiento y/o adecuación de infraestructura en instituciones educativas públicas de belén



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 295 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 295

Secretaría de Participación Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2017

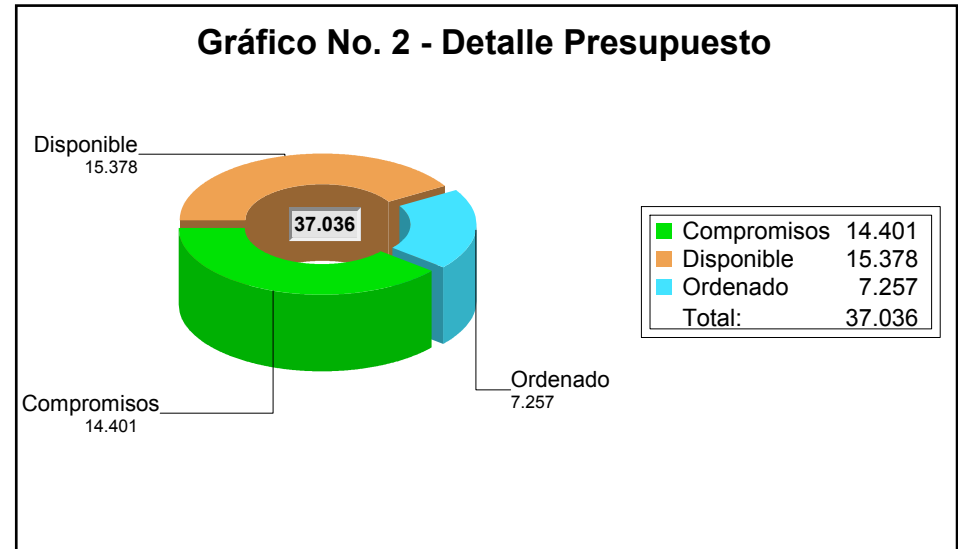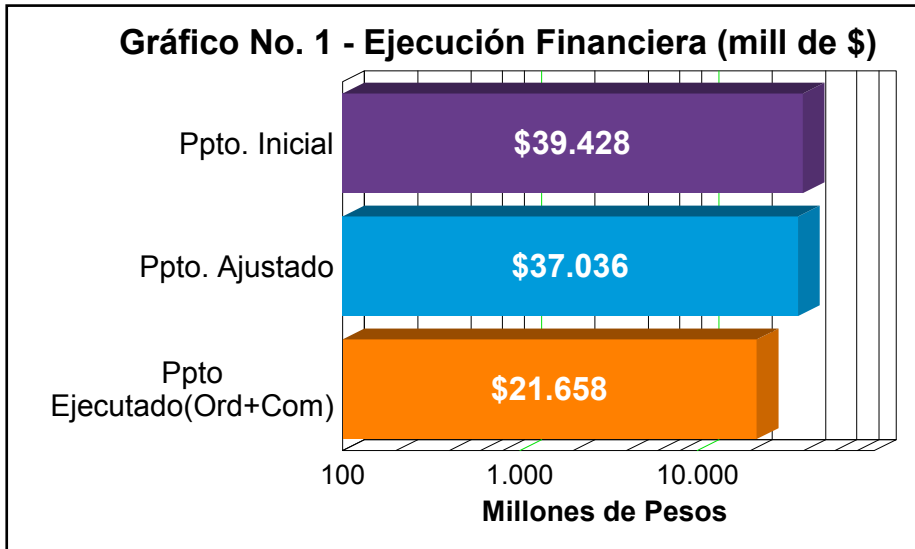

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

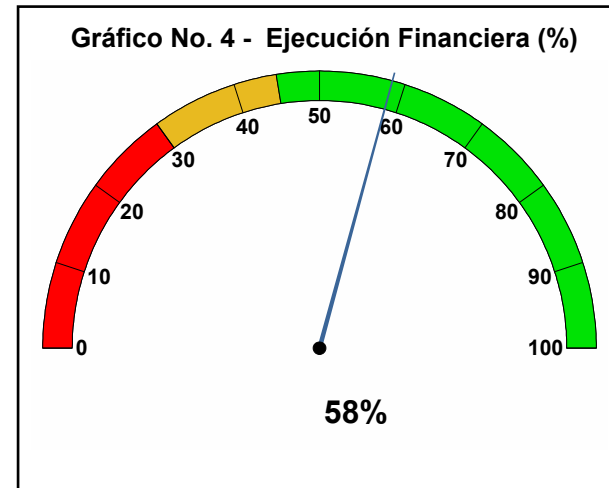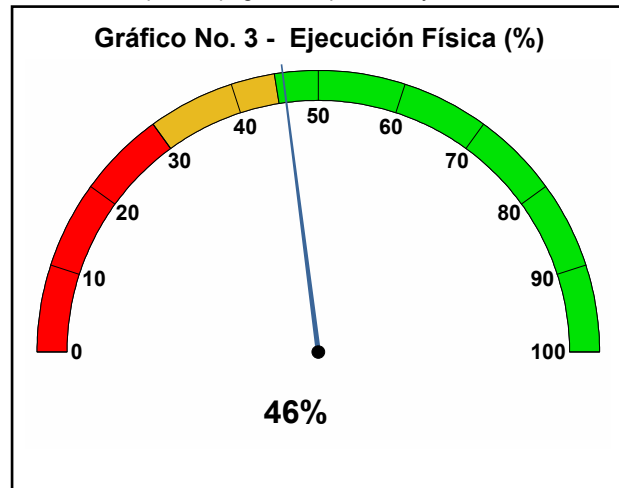

La ejecución financiera comprende pagos, facturas y los compromisos a la fecha de corte. Para el caso de los establecimientos públicos, la Ejecución Financiera se compone de dos cifras: una información obtenida del sistema, que corresponde únicamente a la cifra del presupuesto transferido desde el Municipio al estapúblico, y otra información suministrada por cada entidad que corresponde a los recursos propios invertidos por proyecto.

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.2 - Medellín participativa
Programa: 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación
Proyecto PD: 1.2.1.1 Promoción y protección del derecho a la participación
Proyecto: 160111 - Protección del derecho a la participación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 29% Ejec. Financiera : 88%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 703

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC11AC Cmpc fortalecido	Porcentaje	100	40	40%
PC11AD Agenda del cmpc implementada - smp	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: El contrato se encuentra en su fase inicial con la Universidad de Antioquia, tendrá su desarrollo en el segundo semestre de la presente anualidad, inició el 14 de junio de 2017.				
PC11AF Plan comunicación diseñado implementado	Porcentaje	100	25	25%
Observación B / S: Corresponde a una fase diagnóstica para dar inicio en el segundo semestre de la presente anualidad.				
PC11AG Plan incentivos implementado	Porcentaje	100	50	50%

Proyecto PD: 1.2.1.2 Apoyo y acompañamiento a las Juntas Administradoras Locales JAL - JAL ando con vos

Proyecto: 160112 - Apoyo a las juntas administradoras locales jal - jal ando con vos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 79% Ejec. Financiera : 40%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.005

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC12AH Asistencia técnica ediles jal	Número	100	60	60%
Observación B / S: La asistencia técnica se impartió a 60 ediles, puntualmente en asuntos jurídicos. El proceso formativo para la totalidad de los ediles tendrá lugar en el segundo semestre.				
PC12AI Acuerdos para la incidencia suscritos	Número	21	19	90%
PC12AJ Jal acompañadas materialmente	Número	21	21	100%
PC12AK Acciones articulac viabilizada apoyadas	Número	160	106	66%

Proyecto PD: 1.2.1.3 Organismos comunales, integrales y modernos

Proyecto: 160113 - Consolidación de organismos comunales integrales y modernos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 34% Ejec. Financiera : 66%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.107 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.392

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC13BP Organizaciones acompañadas	Número	480	274	57%
PC13BQ Acciones articulac viabilizada apoyadas	Número	50	20	40%
PC13BR Adecuaci parametrización plataforma arco	Porcentaje	100	20	20%

Observación B / S: Se avanza en la parametrización de los módulos de registro e identificación de las JAC, para dar inicio a la segunda fase en el segundo semestre.

PC13BS Plan incentivos implementado	Porcentaje	100	50	50%
PC13BT Actuacion vic realizadas	Número	300	115	38%
PC13BX Curso básico comunal operando	Número	35	0	0%

Observación B / S: La ejecución de este proceso será mediante el contrato interadministrativo con el Colegio Mayor de Antioquia. El proceso precontractual se encuentra en elaboración de minuta y su inicio se tiene proyectado a finales del mes de julio.

Proyecto PD: 1.2.1.4 Promoción y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las redes sociales

Proyecto: 160114 - Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las redes sociales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 27% Ejec. Financiera : 83%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 830

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC14AR Estrategia fortalecimie cds implementada	Porcentaje	100	66	66%
PC14AT Adecuaci parametrización plataforma arco	Porcentaje	100	20	0%

Observación B / S: Se avanza en la estructuración de la parametrización, a través de la caracterización de las organizaciones de la sociedad civil

PC14AV Procesos formativos realizados	Número	3	0	0%
---------------------------------------	--------	---	---	----

Observación B / S: La ejecución de este proceso será mediante el contrato interadministrativo con el Colegio Mayor de Antioquia. El proceso precontractual se encuentra en elaboración de minuta y su inicio se tiene proyectado a finales del mes de julio.

PC14AW Acciones articulac viabilizada apoyadas	Número	30	14	47%
PC14AY Escenarios de participación realizados	Número	6	0	0%

Observación B / S: La ejecución de este proceso será mediante el contrato interadministrativo con el Colegio Mayor de Antioquia. El proceso precontractual se encuentra en elaboración de minuta y su inicio se tiene proyectado a finales del mes de julio.

Proyecto PD: 1.2.1.5 Red de formación e investigación para la participación ciudadana

Proyecto: 160115 - Fortalecimiento de la red de formación e investigación para la participación ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 60%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC15BL Escuela red fortalecida	Porcentaje	100	46	46%
PC15BN Índice parti ciuda validado medido	Porcentaje	100	35	35%
PC15BÑ Acciones articulac viabilizada apoyadas	Número	10	7	70%

Proyecto PD: 1.2.1.7 Niñez y juventud construyendo ciudad

Proyecto: 160116 - Construcción de ciudad con la participación de niños y jóvenes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 68% Ejec. Financiera : 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.040 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.984

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC16BQ Procesos formativos particip realizados	Porcentaje	100	46	46%
PC16CE Modelo territorial implementado	Porcentaje	100	46	46%
PC16CF Diagnóstico procesos formativos	Número	1	1	100%
PC16CG Plataforma tecnologica sistematizada	Porcentaje	100	50	50%
PC16CH Plan formación formulado	Número	1	1	100%

Proyecto PD: 1.2.1.9 Infraestructura física y tecnológica para la participación

Proyecto: 160117 - Mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica para la participación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 36% Ejec. Financiera : 67%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.528 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.355

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC17BB Cds sedes telecentros administrados	Número	144	68	47%
PC17BC Estrate fortale telecentros implementado	Porcentaje	100	60	60%
PC17BD Construcción mantenimiento realizadas	Número	40	0	0%

Observación B / S: Se elabora diagnóstico de sedes para adecuaciones físicas , actualmente la contratación se encuentra en en etapa previa en la secretaría de suministros.

Programa: 1.2.2 - Presupuesto Participativo

Proyecto PD: 1.2.2.1 Vos sos Presupuesto Participativo

Proyecto: 160118 - Consolidación vos sos presupuesto participativo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 67%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.261 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.793 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.201

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC18AD Estrategia comunicaciones implementada	Porcentaje	100	20	20%
Observación B / S: Corresponde a la implementación de la estrategia de comunicaciones de Planeación Local y Presupuesto Participativo en su fase 0 - construcción de la reglamentación de Planeación Local y Presupuesto Participativo y su estrategia de 21 días en el territorio.				
PC18AE Acuerdo municipal modificado aprobado	Número	1	1	100%
PC18AF Subsistema seguimiento diseñado	Porcentaje	100	48	48%
PC18AG Acciones articulac viabilizada apoyadas	Número	100	81	81%

PC18AH	Estrategia territorial implementada	Porcentaje	100	20	20%
Observación B / S: 21 día en el territorio: Se hace presencia en las 16 comunas y 5 corregimientos, con el apoyo de los 21 dinamizadores en los 86 encuentros realizados con Juntas Administradoras Locales, organizaciones sociales, Juntas de acción comunal y anteriores delegados de presupuesto participativo.					
PC18AI	Estrategia pedagogica implementada	Porcentaje	100	20	20%
Observación B / S: Corresponde al proceso metodológico implementado en la estrategia de los 21 días en el territorio.					

Proyecto PD: 1.2.2.2 Presupuesto Participativo joven cuenta con vos

Proyecto: 160119 - Fortalecimiento del presupuesto participativo joven cuenta con vos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 117 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 117 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 117

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC19AA Iniciativas jóvene cons dllo formuladas	Número	21	0	0%
Observación B / S: Proceso formativo que se realizó a jóvenes en el marco de "El Líder Sos vos" se eligieron 21 planes de transformación en 21 instituciones educativas, la idea es seguir el proceso articulados con la Secretaria de Educación, para trabajar con los jóvenes esas 21 iniciativas.				
PC19AE Proceso formativo dllo local jovenes	Porcentaje	100	50	50%

Reto: 1.3 - Medellín bien administrado

Programa: 1.3.2 - Transparencia como modelo de gestión

Proyecto PD: 1.3.2.5 Lo público cuenta con vos

Proyecto: 160120 - Control social - lo público cuenta con vos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 28% Ejec. Financiera : 58%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 232

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC20AA Ciudadanos participantes control social	Número	9.000	862	10%
Observación B / S: Corresponde a los participantes en diferentes iniciativas de control social, entre ellas la rendición de cuentas de la s JAL, el mayor logro se obtendrá con el desarrollo de la estrategia de gestión visible de principio a fin (Día Blanco), que se ejecuta en el mes de noviembre.				
PC20AB Iniciativas control social fortalecidas	Número	20	5	25%
Observación B / S: Durante el primer semestre se realiza el proceso de planeación de las acciones, su implementación se realizará en el segundo semestre.				
PC20AC Desarrollar capaci ciudad control social	Porcentaje	100	35	35%
PC20AE Estrategia gest visible diseñada ejecuta	Porcentaje	100	35	35%
PC20AF Campañ prom control soc formulada implem	Porcentaje	100	35	35%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.2 - Medellín participativa

Programa: 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación

Proyecto PD: 1.2.1.1 Promoción y protección del derecho a la participación

Proyecto: 160568 - 17pp99-fortalecimiento de la participación para el desarrollo local

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 69%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 896 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 896 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 616

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC68AA Mesa concertación comuna 3 conformada	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Se tiene prevista la ejecución para el segundo semestre.				
PC68AC Proceso fortalecimien consejo comunal c9	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Se tiene prevista la ejecución para el segundo semestre.				
PC68AD Proc fortalecimiento relaci vecinales c6	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Se tiene prevista la ejecución para el segundo semestre.				
PC68AE Proceso gestión dlo local c 10	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Se tiene prevista la ejecución para el segundo semestre.				
PC68AF Proc promoción dlo local c15 mov	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Se tiene prevista la ejecución para el segundo semestre.				
PC68AH Proceso fortalecimiento consejo comunal	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Se tiene prevista la ejecución para el segundo semestre.				
PC68AI Fortalecimiento agenda pública jal	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Se tiene prevista la ejecución para el segundo semestre.				

Proyecto PD: 1.2.1.2 Apoyo y acompañamiento a las Juntas Administradoras Locales JAL - JAL ando con vos

Proyecto: 150284 - 16pp10-apoyo plan de trabajo jal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 45 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 45

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC84AE Compra equipos tecnologicos (r)	Número	6	6	100%

Proyecto: 150285 - 16pp10-fomento de la gobernabilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 43 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 43

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC85AS Compra equipos tecnologicos (r)	Número	6	6	100%

Proyecto: 160569 - 17pp99-apoyo a las juntas administradoras locales de medellín

Síntesis Proyecto:

Eficacia : 0%

Ejec. Financiera : 6%

Información Financiera:

Ppto Inicial (mill de \$): \$ 505

Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 805

Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 46

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC69AA Acuerdos incidencia comuna 1 realizada	Número	1	0	0%
PC69AB Jal materialmente comuna 1 acompañada	Número	1	0	0%
PC69AE Jal materialmente comuna 2 acompañada	Número	1	0	0%
PC69AF Acuerdos incidencia comuna 5 realizada	Número	1	0	0%
PC69AG Jal materialmente comuna 5 acompañada	Número	1	0	0%
PC69AH Acuerdos incidencia comuna 6 realizada	Número	1	0	0%
PC69AI Jal materialmente comuna 6 acompañada	Número	1	0	0%
PC69AJ Acuerdos incidencia comuna 9 realizada	Número	1	0	0%
PC69AK Jal materialmente comuna 9 acompañada	Número	1	0	0%
PC69AL Acuerdos incidencia comuna 10 realizada	Número	1	0	0%
PC69AM Jal materialmente comuna 10 acompañada	Número	1	0	0%
PC69AN Acuerdos incidencia comuna 11 realizada	Número	1	0	0%
PC69AÑ Jal materialmente comuna 11 acompañada	Número	1	0	0%
PC69AO Acuerdos incidencia comuna 13 realizada	Número	1	0	0%
PC69AP Jal materialmente comuna 13 acompañada	Número	1	0	0%
PC69AQ Acuerdos incidencia comuna 14 realizada	Número	1	0	0%
PC69AR Jal materialmente comuna 14 acompañada	Número	1	0	0%
PC69AT Acuerdos incidencia comuna 2 realizada	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: La ejecución de este proceso será mediante el contrato interadministrativo con el Colegio Mayor de Antioquia. El proceso precontractual se encuentra en elaboración de minuta y su inicio se tiene proyectado a finales del mes de julio.

Proyecto PD: 1.2.1.3 Organismos comunales, integrales y modernos

Proyecto: 150274 - 16pp2-proyecto de participación ciudadana en santa cruz

Síntesis Proyecto:

Eficacia : 75%

Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera:

Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0

Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 180

Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 180

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC74BL Telecentros funcionando (r)	Número	5	5	100%
PC74BN Compra equipos tecnologicos (r)	Número	2	2	100%
PC74BO Org com capacitadas (r)	Número	14	0	0%
Observación B / S: el convenio de asociación que soporta este valor estadístico, se encuentra en proceso de liquidación. Se esta en revisión del informe de productos				
PC74BQ Personas formadas (r)	Número	37	37	100%

Proyecto: 150275 - 16pp3-fortalecimiento de capacidades ciudadanas y condiciones organizativas para la participación democrática en

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 163 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 163

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC75AZ Telecentro dotado (r)	Número	1	1	100%
PC75BA Telecentros adecuados (r)	Número	3	3	100%
PC75BC Personas formadas (r)	Número	19	19	100%

Proyecto: 150276 - 16pp4-proyecto de promoción y fortalecimiento de la participación a organizaciones sociales y comunitarias en aran

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 195 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 195

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC76AK Telecentros funcionando (r)	Número	3	3	100%
PC76AM Compra equipos tecnologicos (r)	Número	4	4	100%
PC76AN Organizaciones comunales apoyadas (r)	Número	1	0	0%
Observación B / S: el convenio de asociación que soporta este valor estadístico, se encuentra en proceso de liquidación. Se esta en revisión del informe de productos				
PC76AÑ Personas formadas (r)	Número	12	12	100%

Proyecto: 150280 - 16pp8- fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 73 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 73

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC80AH Pasantia realizada (r)	Número	1	1	100%
PC80AI Planes trabajos ejecutados (r)	Número	4	4	100%
PC80AJ Telecentros funcionando (r)	Número	4	4	100%
PC80AL Personas formadas (r)	Número	31	31	100%

Proyecto: 150289 - 16pp12-participación social y liderazgo en los ciudadanos en la américa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 64 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 64

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC89AZ Compra equipos tecnologicos (r)	Número	14	14	100%

Proyecto: 150294 - 16pp15-fortalecimiento de la participación ciudadana en guayabal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 81 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 81

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC94AG Telecentros funcionando (r)	Número	1	1	100%
PC94AI Personas formadas (r)	Número	44	44	100%

Proyecto: 150298 - 16pp70-promoción y fortalecimiento de la convivencia para niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores en altavista

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 37 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 37

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC98AR Telecentros funcionando (r)	Número	4	4	100%
PC98AT Organizaciones comunales apoyadas (r)	Número	8	0	0%
Observación B / S: el convenio de asociación que soporta este valor estadístico, se encuentra en proceso de liquidación. Se esta en revisión del informe de productos				
PC98AV Personas formadas (r)	Número	1	1	100%

Proyecto: 160570 - 17pp99-fortalecimiento a organizaciones comunales (jac, jvc, asocomunal)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 9%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.092 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.297 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 284

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC70AA Plan trabajo ranking comuna 1 elaborado	Número	21	0	0%
PC70AB Organizaciones comuna 1 acompañadas	Número	21	0	0%
PC70AC Plan trabajo ranking comuna 2 elaborado	Número	14	0	0%
PC70AD Organizaciones comuna 2 acompañadas	Número	14	0	0%
PC70AE Plan trabajo ranking comuna 4 elaborado	Número	18	0	0%
PC70AF Organizaciones comuna 4 acompañadas	Número	18	0	0%
PC70AG Plan trabajo ranking comuna 5 elaborado	Número	22	0	0%
PC70AH Organizaciones comuna 5 acompañadas	Número	22	0	0%
PC70AI Plan trabajo ranking comuna 6 elaborado	Número	24	0	0%
PC70AJ Organizaciones comuna 6 acompañadas	Número	24	0	0%
PC70AK Plan trabajo ranking comuna 8 elaborado	Número	11	0	0%
PC70AL Organizaciones comuna 8 acompañadas	Número	11	0	0%
PC70AM Plan trabajo ranking comuna 9 elaborado	Número	23	0	0%
PC70AN Organizaciones comuna 9 acompañadas	Número	23	0	0%
PC70AÑ Plan trabajo ranking comuna 10 elaborado	Número	13	0	0%
PC70AO Organizaciones comuna 10 acompañadas	Número	13	0	0%

PC70AP Plan trabajo ranking comuna 14 elaborado	Número	11	0	0%
PC70AQ Organizaciones comuna 14 acompañadas	Número	11	0	0%
PC70AR Plan trabajo ranking comuna 15 elaborado	Número	16	0	0%
PC70AT Organizaciones comuna 15 acompañadas	Número	16	0	0%
PC70AV Plan trabajo ranking comuna 16 elaborado	Número	33	0	0%
PC70AX Organizaciones comuna 16 acompañadas	Número	33	0	0%
PC70AY Plan trabajo ranking comuna 70 elaborado	Número	19	0	0%
PC70AZ Organizaciones comuna 70 acompañadas	Número	19	0	0%

Observación Proyecto: La ejecución de este proceso será mediante el contrato interadministrativo con el Colegio Mayor de Antioquia. El proceso precontractual se encuentra en elaboración de minuta y su inicio se tiene proyectado a finales del mes de julio.

Proyecto PD: 1.2.1.4 Promoción y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las redes sociales

Proyecto: 150271 - 16pp1-promoción y fortalecimiento de la participación en popular

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 224 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 224

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC71AM Telecentros funcionando (r)	Número	5	5	100%

Proyecto: 150277 - 16pp5-visibilización de las organizaciones sociales, comunales, semilleros y telecentros

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 35 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 35

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC77AH Telecentros funcionando (r)	Número	2	2	100%
PC77AJ Organizaciones comunales apoyadas (r)	Número	8	8	100%
PC77AK Plan de trabajo asocomunal apoyado (r)	Número	1	1	100%
PC77AL Personas formadas (r)	Número	32	32	100%

Proyecto: 150279 - 16pp7-visibilización de las organizaciones sociales y comunales, semilleros y telecentros

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 117 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 117

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC79AF Telecentro dotado (r)	Número	2	2	100%
PC79AG Telecentros funcionando (r)	Número	2	2	100%
PC79AI Personas formadas (r)	Número	23	23	100%

Proyecto: 150281 - 16pp9-promoción y apoyo a las organizaciones sociales y comunales**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 199 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 199**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC81AI Telecentros funcionando (r)	Número	3	3	100%
PC81AK Compra equipos tecnologicos (r)	Número	6	6	100%
PC81AL Personas formadas (r)	Número	31	31	100%

Proyecto: 150282 - 16pp10-fortalecimiento de la participación ciudadana en la candelaria**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 55 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 55**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC82AI Eventos realizados (r)	Número	3	3	100%
PC82AJ Asesorias realizadas (r)	Número	32	32	100%

Proyecto: 150283 - 16pp10-estrategia de proyección del centro de integración comunitaria hacia las sedes sociales chagualo, prado cen**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 29 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 29**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC83AB Plan estraté g cib ejecutado (r)	Porcentaje	20	20	100%

Proyecto: 150287 - 16pp11-proyecto integral para la participación ciudadana en laureles estadio**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC87AK Telecentros funcionando (r)	Número	1	1	100%
PC87AM Personas formadas (r)	Número	14	14	100%

Proyecto: 150290 - 16pp13-fortalecimiento a la red de organizaciones en san javier**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 95 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 95

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC90AS Plan de trab linea 1 ejecutado (r)	Número	1	1	100%
PC90AV Evento de cierre realizado (r)	Número	1	1	100%
PC90AX Proc de gest, comu y for ejecutado (r)	Número	1	1	100%

Proyecto: 150293 - 16pp14-fortalecimiento, modernización y apoyo de los planes de trabajo de las organizaciones sociales y comunitari

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 72 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 72

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC93AF Compra equipos tecnologicos (r)	Número	3	3	100%

Proyecto: 150297 - 16pp60-fortalecimiento de la participación ciudadana en san cristóbal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 84 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 84

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC97AD Org com capac fortalecidas (r)	Número	18	18	100%

Proyecto: 160571 - 17pp99-fortalecimiento a organizaciones y redes sociales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 18%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.935 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.031 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 367

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC71AN Organizaciones fortalecidas comuna 1	Porcentaje	100	0	0%

Observación B / S: La ejecución de este proceso será mediante el contrato interadministrativo con el Colegio Mayor de Antioquia. El proceso precontractual se encuentra en elaboración de minuta y su inicio se tiene proyectado a finales del mes de julio.

PC71AO Conformación mesa vivi comuna 2	Porcentaje	100	0	0%
--	------------	-----	---	----

Observación B / S: La ejecución de este proceso será mediante el contrato interadministrativo con el Colegio Mayor de Antioquia. El proceso precontractual se encuentra en elaboración de minuta y su inicio se tiene proyectado a finales del mes de julio.

PC71AP Organizaciones fortalecidas comuna 2	Porcentaje	100	0	0%
---	------------	-----	---	----

Observación B / S: La ejecución de este proceso será mediante el contrato interadministrativo con el Colegio Mayor de Antioquia. El proceso precontractual se encuentra en elaboración de minuta y su inicio se tiene proyectado a finales del mes de julio.

PC71AQ Organizaciones fortalecidas comuna 5	Porcentaje	100	0	0%
---	------------	-----	---	----

Observación B / S: La ejecución de este proceso será mediante el contrato interadministrativo con el Colegio Mayor de Antioquia. El proceso precontractual se encuentra en elaboración de minuta y su inicio se tiene proyectado a finales del mes de julio.

PC71AR Organizaciones fortalecidas comuna 6	Porcentaje	100	0	0%
---	------------	-----	---	----

Observación B / S: La ejecución de este proceso será mediante el contrato interadministrativo con el Colegio Mayor de Antioquia. El proceso precontractual se encuentra en elaboración de minuta y su inicio se tiene proyectado a finales del mes de julio.

PC71AS Organizaciones fortalecidas comuna 8	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: La ejecución de este proceso será mediante el contrato interadministrativo con el Colegio Mayor de Antioquia. El proceso precontractual se encuentra en elaboración de minuta y su inicio se tiene proyectado a finales del mes de julio.				
PC71AT Organizaciones fortalecidas comuna 9	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: La ejecución de este proceso será mediante el contrato interadministrativo con el Colegio Mayor de Antioquia. El proceso precontractual se encuentra en elaboración de minuta y su inicio se tiene proyectado a finales del mes de julio.				
PC71AV Conformación mesa vivi comuna 10	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: La ejecución de este proceso será mediante el contrato interadministrativo con el Colegio Mayor de Antioquia. El proceso precontractual se encuentra en elaboración de minuta y su inicio se tiene proyectado a finales del mes de julio.				
PC71AW Rid fortalecida comuna 10	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: La ejecución de este proceso será mediante el contrato interadministrativo con el Colegio Mayor de Antioquia. El proceso precontractual se encuentra en elaboración de minuta y su inicio se tiene proyectado a finales del mes de julio.				
PC71AX Colectivos fortalecidos comuna 10	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: La ejecución de este proceso será mediante el contrato interadministrativo con el Colegio Mayor de Antioquia. El proceso precontractual se encuentra en elaboración de minuta y su inicio se tiene proyectado a finales del mes de julio.				
PC71AY Organizaciones fortalecidas comuna 11	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: La ejecución de este proceso será mediante el contrato interadministrativo con el Colegio Mayor de Antioquia. El proceso precontractual se encuentra en elaboración de minuta y su inicio se tiene proyectado a finales del mes de julio.				
PC71AZ Mesa derechos fortalecida comuna 11	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: La ejecución de este proceso será mediante el contrato interadministrativo con el Colegio Mayor de Antioquia. El proceso precontractual se encuentra en elaboración de minuta y su inicio se tiene proyectado a finales del mes de julio.				
PC71BA Red de hip hop fortalecida comuna 13	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: La ejecución de este proceso será mediante el contrato interadministrativo con el Colegio Mayor de Antioquia. El proceso precontractual se encuentra en elaboración de minuta y su inicio se tiene proyectado a finales del mes de julio.				
PC71BC Red c13 fortalecida comuna 13	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: La ejecución de este proceso será mediante el contrato interadministrativo con el Colegio Mayor de Antioquia. El proceso precontractual se encuentra en elaboración de minuta y su inicio se tiene proyectado a finales del mes de julio.				
PC71BD Organizaciones fortalecidas comuna 14	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: La ejecución de este proceso será mediante el contrato interadministrativo con el Colegio Mayor de Antioquia. El proceso precontractual se encuentra en elaboración de minuta y su inicio se tiene proyectado a finales del mes de julio.				
PC71BE Organizaciones fortalecidas comuna 70	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: La ejecución de este proceso será mediante el contrato interadministrativo con el Colegio Mayor de Antioquia. El proceso precontractual se encuentra en elaboración de minuta y su inicio se tiene proyectado a finales del mes de julio.				

Proyecto PD: 1.2.1.5 Red de formación e investigación para la participación ciudadana

Proyecto: 160572 - 17pp99-fortalecimiento de la formación para la participación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 77%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 406 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 406 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 314

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC72AC Escuela forma políti comu 4 funcionando	Número	1	1	100%
PC72AD Proc forma parti d la com 8 funcionando	Número	1	0	0%
Observación B / S: La ejecución de este proceso será mediante el contrato interadministrativo con el Colegio Mayor de Antioquia. El proceso precontractual se encuentra en elaboración de minuta y su inicio se tiene proyectado a finales del mes de julio.				
PC72AE Escuela forma polít comu 10 funcionando	Número	1	1	100%

PC72AF Proc forma parti com 14 funcionando	Número	1	0	0%
Observación B / S: Durante el primer semestre se adelantaron acciones de concertación con la comunidad en el territorio, Este proceso empezara su implementación en el segundo semestre.				
PC72AG Observato part ciuda com 15 funcionando	Número	1	1	100%
PC72AH Escuela alto estu soc com 15 funcionando	Número	1	1	100%

Proyecto PD: 1.2.1.7 Niñez y juventud construyendo ciudad

Proyecto: 150296 - 16pp50-apoyo y fortalecimiento a grupos y espacios participativos en san sebastián de palmitas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 157 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 157

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC96AG Telecentro dotado (r)	Número	1	1	100%
PC96AH Telecentros adecuados (r)	Número	1	1	100%
PC96AJ Personas formadas (r)	Número	26	26	100%

Proyecto: 150299 - 16pp80-fortalecimiento y modernización de las organizaciones comunales de san antonio de prado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 40 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 40

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC99AO Telecentros funcionando (r)	Número	2	2	100%
PC99AQ Personas formadas (r)	Número	1	1	100%

Proyecto: 160573 - 17pp99-consolidación de procesos formativos para la participación de niños, niñas y jóvenes de la ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.180 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.520 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.397

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC73AD Semilleros infantil comu 1 funcionando	Número	7	7	100%
PC73AF Semilleros infantil comu 2 funcionando	Número	8	8	100%
PC73AH Semilleros infantil comu 3 funcionando	Número	7	7	100%
PC73AJ Semilleros infantil comu 4 funcionando	Número	10	10	100%
PC73AL Semilleros infantil comu 5 funcionando	Número	1	1	100%
PC73AN Semilleros infantil comu 8 funcionando	Número	3	3	100%
PC73AO Semilleros infantil comu 9 funcionando	Número	12	12	100%
PC73AQ Semilleros infantil comu 13 funcionando	Número	39	39	100%
PC73AS Semilleros infantil comu 14 funcionando	Número	3	3	100%

PC73AV Semilleros infantil comu 15 funcionando	Número	4	4	100%
PC73AX Semilleros infantil comu 50 funcionando	Número	3	3	100%
PC73AZ Semilleros infantil comu 70 funcionando	Número	3	3	100%
PC73BB Semilleros infantil comu 80 funcionando	Número	4	4	100%
PC73BD Semilleros infantil comu 60 funcionando	Número	14	14	100%
PC73BE Semilleros infantil comu 12 funcionando	Número	5	0	0%

Observación B / S: Se llevaron a cabo reuniones con la comunidad para la priorización de los recursos, se incorporaron en el presupuesto el 8 junio, mediante el Decreto 0437. Este proceso empezara su implementación en el segundo semestre.

Proyecto PD: 1.2.1.9 Infraestructura física y tecnológica para la participación

Proyecto: 150273 - 16pp1-formación en competencias digitales telecentros

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC73BF Personas formadas (r)	Número	1	1	100%

Proyecto: 150288 - 16pp12-fortalecimiento telecentros en la américa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 142 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 142

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC88AK Telecentro dotado (r)	Número	3	3	100%
PC88AL Telecentros adecuados (r)	Número	5	5	100%
PC88AN Personas formadas (r)	Número	111	111	100%

Proyecto: 150292 - 16pp13- creación y fortalecimiento de telecentros

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 78 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 78

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC92AZ Telecentro dotado (r)	Número	1	1	100%
PC92BI Telecentros adecuados (r)	Número	3	3	100%
PC92BK Personas formadas (r)	Número	20	20	100%

Proyecto: 150295 - 16pp16-fortalecimiento a los planes de trabajo de las organizaciones comunitarias en belén

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 190 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 190

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC95AI Telecentros funcionando (r)	Número	2	2	100%
PC95AK Compra equipos tecnologicos (r)	Número	4	4	100%
PC95AL Proceso formativo (r)	Número	5	0	0%
Observación B / S: el convenio de asociación que soporta este valor estadístico, se encuentra en proceso de liquidación. Se esta en revisión del informe de productos				
PC95AM Personas formadas (r)	Número	14	14	100%

Proyecto: 150301 - 16pp90-fortalecimiento a proyectos y programas de participación ciudadana en santa elena

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC01AD Telecentros funcionando (r)	Número	3	3	100%
PC01AF Personas formadas (r)	Número	3	3	100%

Proyecto: 160574 - 17pp99-fortalecimiento de la infraestructura para la participación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 39%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.601 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.946 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 750

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC74BR Estrateg fortal telecentro c11 implement	Porcentaje	100	66	66%
PC74BS Estrateg fortal telecentro c2 implement	Porcentaje	100	55	55%
PC74BT Estrateg fortal telecentro c1 implement	Porcentaje	100	55	55%
PC74BV Estrateg fortal telecentro c115implement	Porcentaje	100	66	66%
PC74BW Telecentro comuna 15 creado	Porcentaje	100	45	45%
PC74BX Estrateg fortal telecentro c6 implement	Porcentaje	100	67	67%
PC74BY Estrateg fortal telecentro c70 implement	Porcentaje	100	87	87%
PC74BZ Estrateg fortal telecentro c8 implement	Porcentaje	100	56	56%
PC74CA Estrateg fortal telecentro c80 implement	Porcentaje	100	66	66%
PC74CB Estrateg fortal telecentro c9 implement	Porcentaje	100	66	66%
PC74CC Estrateg fortal telecentro c12 implement	Porcentaje	100	35	35%

Programa: 1.2.2 - Presupuesto Participativo

Proyecto PD: 1.2.2.1 Vos sos Presupuesto Participativo

Proyecto: 160666 - 17pp13-actualización presupuesto participativo - inclusión

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 401 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 401 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC66AC Acciones priorización y planeacion comun	Porcentaje	100	50	50%

Proyecto: 160667 - 17pp11-actualización presupuesto participativo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 799 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 799 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC67AA Acciones priorización y planeacion comun	Porcentaje	100	45	45%

Proyecto: 160668 - 17pp13-actualización presupuesto participativo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 40 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 40 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC68AG Acciones priorización y planeacion comun	Porcentaje	100	40	40%

Proyecto: 160669 - 17pp12-actualización presupuesto participativo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.750 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 345 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC69AS Acciones priorización y planeacion comun	Porcentaje	100	60	60%

Proyecto: 160670 - 17pp60-actualización presupuesto participativo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.345 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC70BA Acciones priorización y planeacion comun	Porcentaje	100	100	100%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Dimensión:	1	Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
Reto:	1.2	- Creemos en la confianza ciudadana		
Programa:	1.2.1	- Medellín participativa		
Proyecto PD:	1.2.1.1	- Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación		
	1.2.1.9	Infraestructura física y tecnológica para la participación		
		130463 Jve-80 Construcción Centro Integral de Desarrollo Comunitario Comuna 80	\$ 0,00400	\$ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto PD: 1.2.1.1 Promoción y protección del derecho a la participación

Proyecto: 150278 - 16pp6- formación ciudadana y constitucional

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 109 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 109

Proyecto PD: 1.2.1.4 Promoción y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las redes sociales

Proyecto: 120216 - Mejoramiento de organizaciones y redes sociales gestoras del desarrollo local y municipal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22

Proyecto PD: 1.2.1.5 Red de formación e investigación para la participación ciudadana

Proyecto: 150272 - 16pp1-observatorio social en popular

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 34 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 34

Proyecto PD: 1.2.1.7 Niñez y juventud construyendo ciudad

Proyecto: 150291 - 16pp13-continuidad de semilleros de participación ciudadana infantil y escuelas juveniles en san javier

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 116 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 116

Proyecto PD: 1.2.1.9 Infraestructura física y tecnológica para la participación

Proyecto: 120214 - Dotación sedes sociales para la participación y la integración ciudadana

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3

Proyecto PD: 1.2.2.1 Vos sos Presupuesto Participativo



Proyecto: 120205 - Implementación presupuestación participativa

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18



Proyecto PD: 1.3.2.5 Lo público cuenta con vos

Proyecto: 120210 - Promoción al control social a la gestión pública en el municipio de medellín

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23

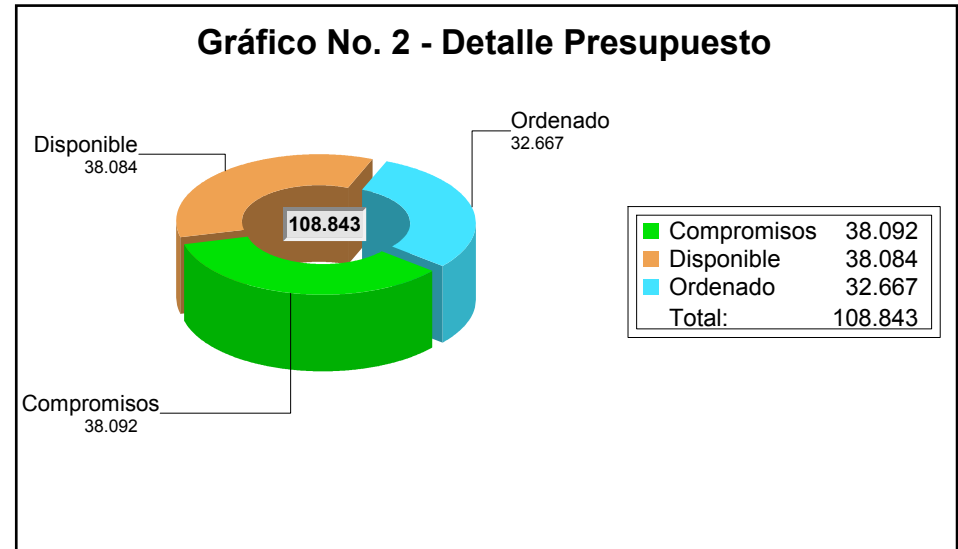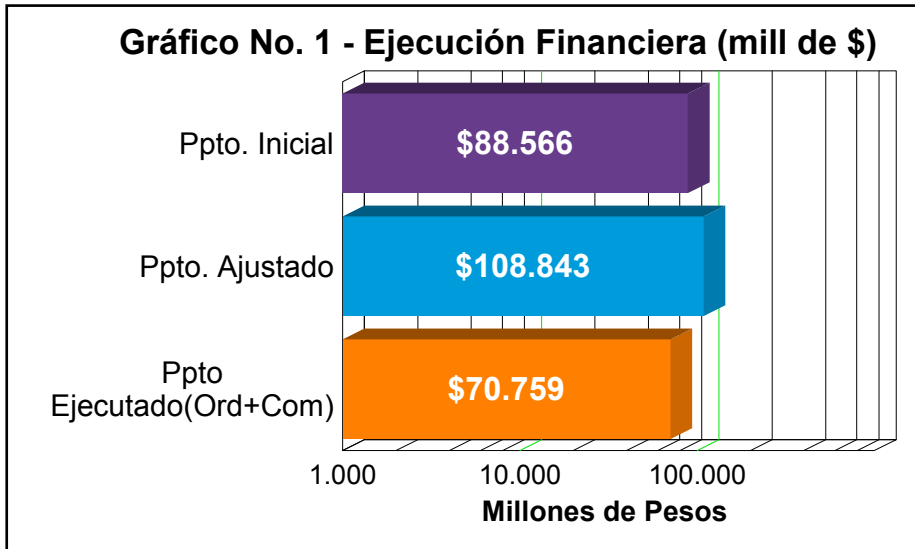

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

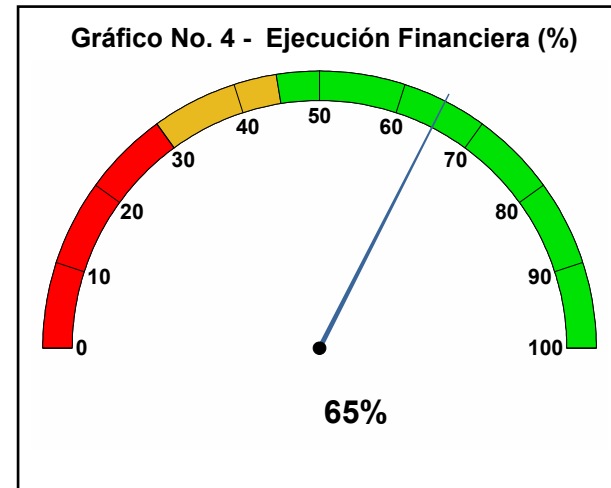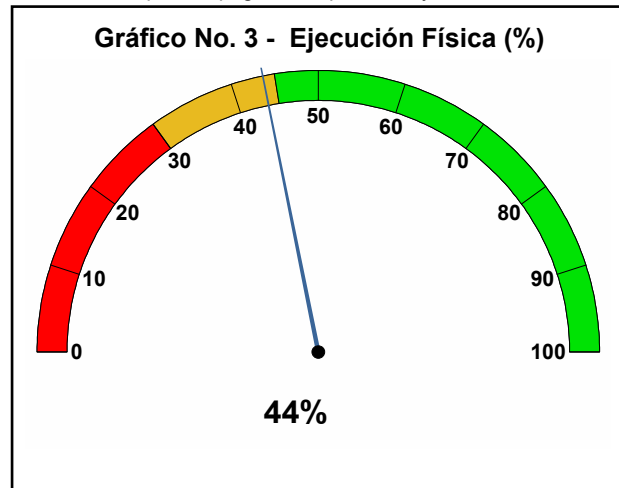

La ejecución financiera comprende pagos, facturas y los compromisos a la fecha de corte. Para el caso de los establecimientos públicos, la Ejecución Financiera se compone de dos cifras: una información obtenida del sistema, que corresponde únicamente a la cifra del presupuesto transferido desde el Municipio al estapúblico, y otra información suministrada por cada entidad que corresponde a los recursos propios invertidos por proyecto.

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.1 - Gestión de la cultura ciudadana
Proyecto PD: 1.1.1.1 Medellín se la juega por la cultura ciudadana
Proyecto: 160076 - Implementación del laboratorio de cultura ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 350 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 341

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU76AF Laboratorio de cultura implementado	Número	1	0	0%

Observación B / S: El Laboratorio de Cultura Ciudadana se encuentra en desarrollo. Finaliza su operación de este año en diciembre.

Proyecto: 160077 - Formulación, desarrollo e implementación de la política pública de cultura ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU77AF Política pública de cultura formulada	Número	1	0	0%

Observación B / S: El equipo de trabajo ya está construyendo un plan de trabajo para la Política Pública. Inicia la etapa de alistamiento a mediados de julio.

Proyecto PD: 1.1.1.2 Implementar el plan promotor de cultura ciudadana

Proyecto: 160078 - Fortalecimiento al sistema municipal de cultura

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 400

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU78AM Espacios de participación funcionando	Número	25	24	96%

Observación B / S: Se eligió el Consejo Corregimental de Cultura de Santa Elena

CU78AN Encuentros culturales realizados	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

Observación B / S: Se está programando para agosto

Proyecto: 160079 - Fortalecimiento al sector artístico mediante la aplicación de acciones de sostenibilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 59%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 936

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU79AE Mercado cultural realizado	Número	1	0	0%
CU79AF Entidades apoyadas	Número	8	0	0%

Observación Proyecto: En proceso de contratación

Programa: 1.1.2 - Creemos confianza

Proyecto PD: 1.1.2.1 Cultura del Sí

Proyecto: 160080 - Aplicación de la encuesta de cultura ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU80AC Encuesta de cultura realizada	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se encuentra en las fases finales de contratación. Debería iniciar a aplicarse en el mes de julio.

Proyecto: 160081 - Implementación de campañas de cultura ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.550 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.550 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.519

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU81AC Estrategias de cultura civica realizadas	Número	2	0	0%

Observación B / S: Las estrategias de Cultura Parque y En los Pedales del ciclista están en desarrollo y terminan en los meses de diciembre y octubre, respectivamente.

CU81AD Campañas de pedagogia ciudadana adelanta Número 1 1 100%

Observación B / S: La Campaña de pedagogía ciudadana "Portate Bien" (capítulo Convivencia) se implementó entre febrero y abril. En ese periodo se reportó una reducción en las riñas de la ciudad y un alcance metropolitano de la campaña. Se realizaron más de 30 actividades y activaciones en puntos priorizados de la campaña de parte de la Secretaría de Cultura Ciudadana y la Secretaría de Seguridad y Convivencia.

Programa: 1.1.3 - Medellín cuenta con todos

Proyecto PD: 1.1.3.1 Fortalecer el voluntariado ciudadano

Proyecto: 160082 - Fortalecimiento del voluntariado ciudadano

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 164 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 164 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 164

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU82AF Voluntarios certificados	Número	2.297	0	0%

Observación B / S: La certificación final de las horas de voluntariado se realizan en noviembre. Pero los voluntarios han estado adelantando acciones voluntarias para sumar el tiempo de certificación de acuerdo al cronograma interno.

Proyecto PD: 1.1.3.3 Creación de ecosistemas de transformación cultural

Proyecto: 160083 - Desarrollo de la estrategia de promoción de diversidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 705 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 705 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 675

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU83AI Eventos sobre diversidad e intercultural	Número	1	0	0%
Observación B / S: La Fiesta de la Diversidad se realiza en el mes de octubre.				
CU83AJ Diversidades en diálogo realizadas	Número	2	0	0%
Observación B / S: Las estrategias de Diversidad en Diálogo se terminan en el mes de octubre.				

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

Proyecto PD: 1.1.5.2 Héroes de la legalidad

Proyecto: 160084 - Implementación de héroes de la legalidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU84AF Encuentro de cocreación y reconocimiento	Número	1	0	0%
Observación B / S: El encuentro de Héroes de la Legalidad se realiza en el mes de noviembre.				

Reto: 1.3 - Medellín bien administrado

Programa: 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno

Proyecto PD: 1.3.5.8 Implementar el sistema de información territorial para la medición de impactos basados en la transversalización de las acciones

Proyecto: 160085 - Desarrollo del sistema de información cultural

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 611 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 304

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU85AB Sistema cultural implementado	Porcentaje	30	15	50%
Observación B / S: Se han adelantado procesos con el eje temático de eventos, infraestructura, pedagogía y Encuesta de Cultura				

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social
Reto: 3.2 - Medellín Digna
Programa: 3.2.1 - Medellín para la niñez y la adolescencia
Proyecto PD: 3.2.1.3 Incentivar la niñez talentosa
Proyecto: 160086 - Apoyo a la niñez talentosa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 20%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU86AC Estímulos otorgados a niños talentosos	Número	49	0	0%

Observación B / S: En definiciones administrativas para contratación

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos
Reto: 4.3 - Medellín se construye desde el arte y la cultura
Programa: 4.3.1 - Bibliotecas, lectura y patrimonio para contribuir al desarrollo de la ciudadanía
Proyecto PD: 4.3.1.1 Bibliotecas conectando territorios
Proyecto: 120187 - Dotación de equipamientos y centros culturales, nuevos y existentes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 130 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 130

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU87AB Equipamientos existentes dotados	Número	1	1	100%

Proyecto: 160087 - Dotación de equipamientos culturales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 6%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 95

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU87AC Equipamientos dotados	Número	6	0	0%

Observación B / S: En proceso de contratación

Proyecto: 160088 - Adecuación y mantenimiento de las infraestructuras culturales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 10% Ejec. Financiera : 26%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 359

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU88AF Centros culturales adecuados	Número	20	2	10%

Observación Proyecto: En espera de inicio de contrato

Proyecto: 160089 - Fortalecimiento de bibliotecas para conectar territorios

Síntesis Proyecto: Eficacia : 77% Ejec. Financiera : 91%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.028 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.294 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.774

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU89AG Bibliotecas al servicio de la comunidad	Número	33	33	100%

Observación B / S: 9 Parques Biblioteca
12 de proximidad
5 BPP y filiales
6 centros de documentación
1 Casa de la lectura infantil

CU89AH Eventos académicos ejecutados o promovidos	Número	4	1	25%
---	--------	---	---	-----

Observación B / S: Encuentro de bibliotecas comunitarias llevado a cabo el 20 de mayo en el marco de la 11ª Feria Popular del Libro.

CU89AI Mat.bibliográfico y audiovisual nuevo	Número	2.500	2.412	96%
--	--------	-------	-------	-----

Observación B / S: En el primer trimestre se ingresan y disponen al público 1908 materiales nuevos y en el segundo 504.

CU89AK Estímulos otorgados a bibliotecas comunitarias	Número	8	7	88%
---	--------	---	---	-----

Observación B / S: Se otorgaron 7 estímulos, uno quedó desierto

Proyecto PD: 4.3.1.2 Lectura, escritura y oralidad

Proyecto: 160090 - Implementación del plan de lectura, escritura y oralidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 15% Ejec. Financiera : 82%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.291

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU90AC Eventos del libro y la lectura realizados	Número	3	1	33%

Observación B / S: Feria Popular Días del Libro - 19 y 20 de mayo

CU90AE Publicaciones realizadas	Número	10	0	0%
---------------------------------	--------	----	---	----

Observación B / S: En proceso de contratación

CU90AG Acciones de promoción de lectura realizadas	Número	4	1	25%
--	--------	---	---	-----

Observación B / S: Club de lectura internacional Medellín-Barcelona

CU90AH Acciones de formación realizadas	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

Observación B / S: En proceso de contratación

Proyecto PD: 4.3.1.3 Archivo Histórico de Medellín y Patrimonio Documental

Proyecto: 160091 - Fortalecimiento del archivo histórico de Medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 76%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 705 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 705 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 537

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU91AP Descripción documental	Metro	40	28	70%
Observación B / S: La descripción documental incluyó la identificación del contenido, contexto y estructura de unidades documentales en niveles de catálogo (folio a folio) y serie documental (Unidades de conservación). Este proceso técnico archivístico se realizó de acuerdo a las reglas de la descripción multinivel, establecidas por las normas ISAD (g) y NTC 4095.				
CU91AQ Imágenes digitalizadas	Número	7.000	0	0%
Observación B / S: Está estipulada para cumplirse en el segundo semestre de 2017.				
CU91AR Folios restaurados	Número	7.200	2.692	37%
Observación B / S: La restauración estuvo enfocada a folios del Fondo Concejo que se encontraban en mal estado de conservación. Los procesos se realizaron folio a folio: des-encuadernación, limpieza y refuerzos estructurales, según su necesidad.				
CU91AS Folios conservados	Número	7.000	3.121	45%
Observación B / S: La conservación estuvo enfocada a folios del Fondo Personería de Medellín, al cual se les hizo procesos de limpieza e intervenciones menores.				

Proyecto PD: 4.3.1.4 Puesta en valor de los patrimonios y las memorias culturales

Proyecto: 160092 - Implementación de las estrategias de puesta en valor del patrimonio cultural

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 48%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 801 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 801 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 388

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU92AF Mediaciones entre ciudadanía-patrimonio	Número	10	4	40%
Observación B / S: -Estímulos a iniciativas ciudadanas entorno a las memorias y los patrimonios culturales de Medellín - "Espiral de las memorias y los patrimonios culturales de Medellín" -Conversatorios "Tardes de Prado" -Activaciones patrimoniales del centro de documentación musical "El Jordán"				

Proyecto: 160093 - Restauración y recuperación del patrimonio mueble e inmueble

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 75%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 749

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU93AE Bienes de valor patrimonial intervenidos	Número	30	0	0%
Observación B / S: Inicia contrato en julio				

Proyecto: 160094 - Investigación cultural y del patrimonio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 20%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 40

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU94AG Estimulos otorgados	Número	2	2	100%

Programa: 4.3.2 - Movilización por la cultura
Proyecto PD: 4.3.2.1 Fortalecimiento de la red Casas de la Cultura
Proyecto: 160095 - Fortalecimiento de la red casas de la cultura

Síntesis Proyecto: Eficacia : 35% Ejec. Financiera : 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.027 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.927 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.836

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU95AH Asistentes a casas de cultura (visitante)	Número	300.000	211.389	70%

Observación B / S: Correspondiente a Casas de Cultura 103740 y Centro de Desarrollo cultural Moravia 107649

CU95AI Vinculados a formación en casas de la cu	Número	2.461	0	0%
---	--------	-------	---	----

Observación B / S: No se reportan avances en estos procesos debido a que el contrato con la Fundación CasaTeatro El Poblado -entidad aliada con la cual se opera y dinamiza la formación y el fomento a la participación en la Red de Casas de Cultura- inicio su ejecución a finales del mes de junio. Se planea iniciar con todos los procesos para el mes de julio.

Programa: 4.3.3 - Creación, Formación, Fomento y Circulación artística y cultural
Proyecto PD: 4.3.3.1 Fortalecimiento convocatorias públicas de arte y cultura
Proyecto: 140060 - Fortalecimiento de la infraestructura para el desarrollo de las artes escénicas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 13%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.823 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 237

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU60AD Apoyo infraestructura de las artes escén	Número	2	0	0%

Observación B / S: En espera de legalizar apoyos

Proyecto: 160096 - Fortalecimiento de la infraestructura para el desarrollo de las artes escénicas de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU96AB Equipamiento apoyado	Número	1	0	0%

Observación B / S: En espera de recursos para definir proceso

Proyecto: 160097 - Consolidación de las convocatorias públicas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 86%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.426 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.426 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.519

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU97AC Iniciativas culturales apoyadas	Número	150	153	102%
Observación B / S: 31 Apoyos concertados				
26 Salas Abiertas				
48 Becas				
42 Circulación				
5 ensayos				
1 residencia artística				

Proyecto PD: 4.3.3.2 Redes de formación artística y cultural

Proyecto: 160098 - Fortalecimiento redes de formación artística y cultural

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.750 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.189

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU98AF Vinculados a los procesos de formación	Número	6.460	6.710	104%
Observación B / S: Artes Escénicas 538				
Artes Visuales 450				
Danza 577				
Música 5145				

Proyecto PD: 4.3.3.3 Formación de públicos – Tarjeta única ciudadana

Proyecto: 160099 - Formación de públicos - tarjeta única ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 40%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.000

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU99AC Visitas gratuitas teatros,museos y parque	Número	834.524	382.016	46%

Proyecto: 160100 - Apoyo parque explora

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 91%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.264

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Proyecto: 160101 - Apoyo a iniciativas y entidades culturales**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 11% Ejec. Financiera : 76%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.344 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.351 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.055**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU01AB Eventos apoyados	Número	134	15	11%

Observación Proyecto: Correspondientes a apoyos a eventos y a entidades musicales**Proyecto: 160102 - Consolidación de eventos de ciudad****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 37%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.887 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.272**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU02AC Evento ident.ciudad y ferias realiz-apoy	Número	8	2	25%

Observación B / S: Hay Festival, Festival Internacional de tango**Proyecto: 160103 - Desarrollo de programación artística en las uvas****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 49%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 788**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU03AB Actividades artísticas y culturales real	Número	50	0	0%

Observación B / S: En Convocatoria pública

CU03AC Vinculados a formación en uvas	Número	900	0	0%
---------------------------------------	--------	-----	---	----

Observación B / S: En proceso de programación**Proyecto PD: 4.3.3.4 Intercambios culturales con el mundo (Ciudades Hermanas y aliados de Medellín)****Proyecto: 160104 - Fortalecimiento de los intercambios culturales con el mundo****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU04AA Intercambios realizados	Número	1	0	0%

Observación B / S: En definición administrativa para contratación

Proyecto PD: 4.3.3.5 Apoyar la producción audiovisual y cinematográfica en Medellín

Proyecto: 160105 - Implementación de la cinemateca municipal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 15%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 480 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 480 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 73

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU05AF Actividades académicas realizadas	Meses	6	1	17%
Observación B / S: Se realizaron talleres de gestión audiovisual para los gestores de Casas de la Cultura, Sistema de Bibliotecas y Uvas; y para los coordinadores de Bibliotecas y Parques Biblioteca				
CU05AG Ciclos y muestras audiovisuales realizad	Meses	6	1	17%
Observación B / S: Se realizaron ciclos audiovisuales en los equipamientos culturales de la Secretaría de Cultura Ciudadana: Biblioteca Santa Elena, Casa de la Cultura de Popular, Biblioteca San Javier.				

Reto: 4.4 - Medellín con acceso al empleo

Programa: 4.4.4 - Creación y fortalecimiento empresarial

Proyecto PD: 4.4.4.3 Apoyar emprendimiento social, educativo, cultural, deportivo y artesanal

Proyecto: 160106 - Apoyo a emprendimientos culturales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 450 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 450

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU06AC Apoyo a emprendimientos culturales	Número	33	150	455%
Observación B / S: Se inició proceso con 150 emprendimientos gracias a una alianza realizada con Comfama				

Proyecto PD: 4.4.4.8 Distrito de Innovación y Emprendimiento

Proyecto: 160107 - Formación a artistas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 9%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 853 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 73

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU07AA Artistas formados	Número	150	0	0%
Observación B / S: En proceso de contratación				

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.4 - Medellín vuelve a su Centro

Programa: 6.4.1 - Articulación entre planes para la recuperación integral del Centro

Proyecto PD: 6.4.1.2 Plan cultural del Centro

Proyecto: 160108 - Formulación e implementación del plan cultural del centro

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 320 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 320 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU08AG Plan cultural formulado	Porcentaje	40	0	0%
Observación B / S: En proceso de contratación				

Proyecto: 160109 - Desarrollo de mercados artesanales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 76%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 379

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU09AB Mercado artesanal realizado	Número	13	6	46%

Programa: 6.4.4 - Presencia institucional y gobernabilidad

Proyecto PD: 6.4.4.3 Todos podemos conocer y volver al Centro

Proyecto: 160613 - Recuperación de espacios culturales en el centro

Síntesis Proyecto: Eficacia : 27% Ejec. Financiera : 66%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 865 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 865 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 575

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU13AK Activaciones cult y art realizadas	Número	15	7	47%
Observación B / S: Retretas dominicales				
CU13AM Beneficiarios en eventos	Número	855	65	8%
Observación B / S: Correspondientes a Ciudad al Centro				

Proyecto PD: 6.4.4.4 Eventos de ciudad en el Centro

Proyecto: 160612 - Implementación de eventos de ciudad en el centro

Síntesis Proyecto: Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 80%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 400

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Observación B / S: En el segundo trimestre se realizaron 2 conversatorios Ciudad al Centro.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos
Reto: 4.3 - Medellín se construye desde el arte y la cultura
Programa: 4.3.1 - Bibliotecas, lectura y patrimonio para contribuir al desarrollo de la ciudadanía
Proyecto PD: 4.3.1.1 Bibliotecas conectando territorios
Proyecto: 150087 - 16pp10-apropiación social del patrimonio de la candelaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 82 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 82

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU87CA Actividades reconoc.del patr.cult.realiz	Número	4	4	100%

Observación B / S: Este proyecto orientado solo al componente de Memoria y Patrimonio se ejecutó con el Museo de Antioquia mediante Contrato No.4600067633 y terminó el pasado 31 de mayo.

Proyecto PD: 4.3.1.4 Puesta en valor de los patrimonios y las memorias culturales

Proyecto: 160614 - 17pp99-divulgación de memoria y patrimonio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 379 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 379 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU14AF Giras culturales c2	Número	13	0	0%
CU14AG Aprop y divulg.memoria y patr c10	Número	9	0	0%
CU14AI Directorio cult.patrimonial c16	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: Está en proceso de estudios previos para realizar un nuevo contrato con Museo De antioquia para el tema de memoria y patrimonio. Esto durará unos dos meses, para iniciar ejecución en agosto aproximadamente

Programa: 4.3.2 - Movilización por la cultura

Proyecto PD: 4.3.2.1 Fortalecimiento de la red Casas de la Cultura

Proyecto: 160615 - 17pp99-fortalecimiento del sector cultural - redes y colectivos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 79%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 440 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 485 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 382

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU15AG Red cultural c1 fortalecida	Número	1	0	0%
CU15AH Red cultural c3 fortalecida	Número	1	0	0%
CU15AI Mesa de cultura c9 fortalecida	Número	1	0	0%
CU15AJ Diplomado c12 realizado	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: Se ejecutará mediante el Contrato No 4600070749 de 2017, con Metroparques, que tiene por objeto: Contrato interadministrativo de mandato para la realización de la agenda cultural y artística y el fortalecimiento del sector cultural en el marco del PLYPP, año 2017, el cual está para la firma, para luego iniciar labores a principios del mes de julio.

Programa: 4.3.3 - Creación, Formación, Fomento y Circulación artística y cultural

Proyecto PD: 4.3.3.1 Fortalecimiento convocatorias públicas de arte y cultura

Proyecto: 150098 - 16pp90-articulación y fortalecimiento cultural

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 35 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 35

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU98CB Mto instrumentos musicales realizado	Número	1	1	100%

Observación B / S: El componente Fortalecimiento del Sector Cultural - Mantenimiento de Instrumentos Musicales terminó a satisfacción el pasado 20 de marzo de 2017.

Proyecto: 160616 - 17pp99-fortalecimiento del sector cultural - estímulos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 18%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.856 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.946 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 350

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU16AD Estímulos otorgados comuna 1	Número	9	0	0%
CU16AF Estímulos otorgados comuna 2	Número	13	0	0%
CU16AG Estímulos otorgados comuna 3	Número	11	0	0%
CU16AH Estímulos otorgados comuna 4	Número	25	0	0%
CU16AI Estímulos otorgados comuna 5	Número	4	0	0%
CU16AJ Estímulos otorgados comuna 6	Número	20	0	0%
CU16AK Estímulos otorgados comuna 8	Número	6	0	0%
CU16AL Estímulos otorgados comuna 9	Número	11	0	0%
CU16AM Estímulos otorgados comuna 11	Número	2	0	0%
CU16AN Estímulos otorgados comuna 13	Número	10	0	0%
CU16AÑ Estímulos otorgados comuna 14	Número	19	0	0%
CU16AO Estímulos otorgados comuna 15	Número	7	0	0%
CU16AP Estímulos otorgados comuna 16	Número	16	0	0%
CU16AQ Estímulos otorgados comuna 80	Número	17	0	0%

Observación Proyecto: Se vienen realizando el proceso de selección de beneficiarios, el cual inició el día 29 marzo con la publicación de los términos y cerró el 15 de mayo. Después de realizada la evaluación de las propuestas entre el 01 y el 27 de junio, actualmente se realiza el proceso de legalización para el otorgamiento de los estímulos a los ganadores.

Proyecto PD: 4.3.3.2 Redes de formación artística y cultural

Proyecto: 150078 - 16pp2-fortalecimiento de las dinámicas artísticas y culturales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU78CE Investigación de memoria y patr.cultural	Número	1	1	100%

Observación B / S: El componente ejecutado con el Museo de Antioquia mediante Contrato No. 46000196, que consistió en la realización de 13 giras culturales y una recuperación de la memoria fotográfica, se ejecutó al 100% y finalizó el 31 de mayo de 2017.

Proyecto: 150079 - 16pp3-fortalecimiento y proyección de los procesos artísticos de manrique

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 185 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 185

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU79CB Procesos de formación artística realizad	Número	44	44	100%

Observación B / S: El componente de Formación, contratado con la Corporación al Servicio del Beneficio Ambiental CORSERBA, mediante Contrato No.4600067129, fue ejecutado al 100% y finalizó el 15 de abril de 2017 luego de una ampliación.

Proyecto: 150083 - 16pp7-el arte y la cultura una opción de vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 162 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 162

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU83CB Procesos de formación artística realizad	Número	44	44	100%

Observación B / S: El componente de Formación, contratado con la Corporación Educativa Nuevo Espacio - CORENUESPA, mediante Contrato No.4600067152, fue ejecutado al 100% y finalizó el 15 de abril de 2017 luego de una ampliación.

Proyecto: 150084 - 16pp8-cultura y educación: programas transformadores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 71 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 71

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

CU97CD Diseño del sistema de gestión cult.real	Número	1	1	100%
Observación B / S: El componente Fortalecimiento el Sector Cultural que comprende el Diseño del Sistema de Gestión Cultural y las Ferias de Mercadeo Cultural, se ejecutó al 100% y finalizó el 15 de abril de 2017.				
CU97CE Ferias de mercadeo cultural realizadas	Número	1	1	100%
Observación B / S: El componente Fortalecimiento el Sector Cultural que comprende el Diseño del Sistema de Gestión Cultural y las Ferias de Mercadeo Cultural, se ejecutó al 100% y finalizó el 15 de abril de 2017.				

Proyecto: 160617 - 17pp99-formación cultural y artística

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 4%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.902 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.342 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 133

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU17AA Talleres de formación comuna 1 realizado	Número	41	0	0%
Observación B / S: Se viene realizando la contratación mediante el proceso de selección No. 9011927. El cuál de acuerdo al cronograma finalizará el 6 de julio, fecha en la cual será publicado el informe final				
CU17AB Talleres de formación comuna 2 realizado	Número	12	0	0%
Observación B / S: Se viene realizando la contratación mediante el proceso de selección No. 9011927. El cuál de acuerdo al cronograma finalizará el 6 de julio, fecha en la cual será publicado el informe final.				
CU17AC Talleres de formación comuna 3 realizado	Número	39	0	0%
Observación B / S: Se viene realizando la contratación mediante el proceso de selección No. 9011908. El cuál de acuerdo al cronograma finalizó el 20 de junio, cuando se publicó el infome final en el que se declaró desierto. Luego de esto se empezará de nuevo con el proceso para ser montado en pliegos.				
CU17AD Talleres de formación comuna 5 realizado	Número	24	0	0%
Observación B / S: Se viene realizando la contratación mediante el proceso de selección No. 9011908. El cuál de acuerdo al cronograma finalizó el 20 de junio, cuando se publicó el infome final en el que se declaró desierto. Luego de esto se empezará de nuevo con el proceso para ser montado en pliegos.				
CU17AE Talleres de formación comuna 6 realizado	Número	23	0	0%
Observación B / S: Se viene realizando la contratación mediante el proceso de selección No. 9011961. El cuál de acuerdo al cronograma finalizará el 5 de julio, fecha en la será publicado el informe final				
CU17AF Talleres de formación comuna 8 realizado	Número	15	0	0%
Observación B / S: Se viene realizando la contratación mediante el proceso de selección No. 9011949. El cuál de acuerdo al cronograma finalizará el 6 de julio, fecha en la será publicado el informe final				
CU17AG Talleres de formación comuna 11 realizad	Número	17	0	0%
Observación B / S: Se viene realizando la contratación mediante el proceso de selección No. 9011928. El cuál de acuerdo al cronograma finalizará el 11 de julio, fecha en la será publicado el informe final				
CU17AH Talleres de formación comuna 13 realizad	Número	26	0	0%
Observación B / S: Se viene realizando la contratación mediante el proceso de selección No. 9011929. El cuál de acuerdo al cronograma finalizará el 7 de julio, fecha en la será publicado el informe final				
CU17AI Talleres de formación comuna 14 realiza	Número	33	0	0%
Observación B / S: Se viene realizando la contratación mediante el proceso de selección No. 9011929. El cuál de acuerdo al cronograma finalizará el 7 de julio, fecha en la será publicado el informe final				
CU17AJ Talleres de formación comuna 15 realizad	Número	27	0	0%
Observación B / S: Se viene realizando la contratación mediante el proceso de selección No. 9011926. El cuál de acuerdo al cronograma finalizará el 5 de julio, fecha en la será publicado el informe final				
CU17AK Talleres de formación comuna 16 realizad	Número	44	0	0%
Observación B / S: Se viene realizando la contratación mediante el proceso de selección No. 9011926. El cuál de acuerdo al cronograma finalizará el 5 de julio, fecha en la será publicado el informe final				
CU17AN Talleres de formación comuna 70 realizad	Número	19	0	0%

Observación B / S: Se viene realizando la contratación mediante el proceso de selección No. 9011961. El cuál de acuerdo al cronograma finalizará el 5 de julio, fecha en la será publicado el informe final

CU17AÑ Talleres de formación comuna 9 realizado	Número	24	0	0%
---	--------	----	---	----

Observación B / S: Se viene realizando la contratación mediante el proceso de selección No. 9011949. El cuál de acuerdo al cronograma finalizará el 6 de julio, fecha en la será publicado el informe final

CU17AO Talleres de formación comuna 10 realizad	Número	11	0	0%
---	--------	----	---	----

Observación B / S: Se viene realizando la contratación mediante el proceso de selección No. 9011949. El cuál de acuerdo al cronograma finalizará el 6 de julio, fecha en la será publicado el informe final

CU17AP Talleres de formación c60 realizados	Número	9	0	0%
---	--------	---	---	----

Observación B / S: Está en etapa de estudios previos. El día 18 de julio según el cronograma, se publicarán en el SECOP los prepliegos para iniciar el proceso de contratación.

CU17AQ Talleres de formación c12 realizados	Número	39	0	0%
---	--------	----	---	----

Observación B / S: Está en etapa de estudios previos. El día 18 de julio según el cronograma, se publicarán en el SECOP los prepliegos para iniciar el proceso de contratación.

Proyecto PD: 4.3.3.3 Formación de públicos – Tarjeta única ciudadana

Proyecto: 150077 - 16pp1-continuidad y fortalecimiento del plan de desarrollo cultural

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 54 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 54

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU77CB Procesos de formación artística realizad	Número	57	57	100%

Observación B / S: El componente de Formación, se ejecutó al 100% con Metroparques, mediante Contrato No.4600067633. Luego de una ampliación finalizó el pasado 15 de abril de 2017.

Proyecto: 150085 - 16pp9-formación, programación y fortalecimiento de la gestión cultural

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 97 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 97

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU85CB Procesos de formación artística realizad	Número	31	31	100%

Observación B / S: El componente de Formación, contratado con la Corporación Educativa Nuevo Espacio - CORENUESPA, mediante Contrato No.4600067402, fue ejecutado al 100% y finalizó el 15 de abril de 2017 luego de una ampliación.

Proyecto: 150086 - 16pp10-promoción del arte y la cultura de la candelaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU86CB Procesos de formación artística realizad	Número	16	16	100%

Observación B / S: El componente de Formación, contratado con la Corporación Educativa Nuevo Espacio - CORENUESPA, mediante Contrato No.4600067402, fue ejecutado al 100% y finalizó el 15 de abril de 2017 luego de una ampliación.

Proyecto: 150089 - 16pp12 plan de desarrollo cultural de la américa**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 277 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 277**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU89CB Procesos de formación artística realizad	Número	49	49	100%
Observación B / S: El componente de Formación, contratado con la Corporación al Servicio del Beneficio Ambiental CORSERBA, mediante Contrato No.4600067614, fue ejecutado al 100% y finalizó el 15 de abril de 2017 luego de una ampliación..				
CU89CD Investigación de memoria y patr. cult.re	Número	1	1	100%
Observación B / S: El componente ejecutado con el Museo de Antioquia que es la Recuperación de la Memoria Oral, se encuentra en un 100% de ejecución y finalizó el pasado 31 de mayo de 2017.				

Proyecto: 150090 - 16pp13-arte y cultura para la vida y la convivencia**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 60 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 60**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU90FB Procesos de formación artística realizad	Número	36	36	100%
Observación B / S: El componente de Formación, contratado con la Corporación Educativa Nuevo Espacio - CORENUESPA, mediante Contrato No.4600067193, fue ejecutado al 100% y finalizó el 15 de abril de 2017 luego de una ampliación.				

Proyecto: 150091 - 16pp14-desarrollo cultural de el poblado**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 234 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 234**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU91CA Procesos de formación artística realizad	Número	49	49	100%
Observación B / S: El componente de Formación, contratado con la Corporación Educativa Nuevo Espacio - CORENUESPA, mediante Contrato No.4600067192, fue ejecutado al 100% y finalizó el 15 de abril de 2017 luego de una ampliación.				

Proyecto: 150095 - 16pp60-apoyo y fortalecimiento a la agenda y plan cultural**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 215 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 215**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU95FB Procesos de formación artística realizad	Número	14	14	100%
Observación B / S: El componente de Formación, contratado con la Corporación Educativa Nuevo Espacio - CORENUESPA, mediante Contrato No.4600067193, fue ejecutado al 100% y finalizó el 15 de abril de 2017 luego de una ampliación.				
CU95FC Investigación de memoria y patr.cult.rea	Número	1	1	100%

Observación B / S: El componente de Memoria y Patrimonio, ejecutó sin contratiempos con el Museo de Antioquia mediante Contrato No. 46000196, terminadno el pasado 31 de mayo de 2017.

Proyecto: 160618 - 17pp99-implementación de agenda artística y cultural

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 82%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.672 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.252 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.304

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU18AH Acti artísti y culturales c1 realizadas	Número	10	0	0%
CU18AI Acti artísti y culturales c2 realizadas	Número	3	0	0%
CU18AJ Acti artísti y culturales c3 realizadas	Número	10	0	0%
CU18AK Acti artísti y culturales c4 realizadas	Número	16	0	0%
CU18AL Acti artísti y culturales c5 realizadas	Número	12	0	0%
CU18AM Acti artísti y culturales c6 realizadas	Número	14	0	0%
CU18AN Acti artísti y culturales c8 realizadas	Número	11	0	0%
CU18AÑ Acti artísti y culturales c9 realizadas	Número	13	0	0%
CU18AO Acti artísti y culturales c10 realizadas	Número	16	0	0%
CU18AP Acti artísti y culturales c11 realizadas	Número	8	0	0%
CU18AQ Acti artísti y culturales c14 realizadas	Número	4	0	0%
CU18AR Acti artísti y culturales c15 realizadas	Número	2	0	0%
CU18AS Acti artísti y culturales c16 realizadas	Número	21	0	0%
CU18AT Acti artísti y culturales c13 realizadas	Número	8	0	0%
CU18AU Acti artísti y culturales c60 realizadas	Número	14	0	0%
CU18AV Acti artísti y culturales c12 realizadas	Número	17	0	0%

Observación Proyecto: Se ejecutará mediante el Contrato No 4600070749 de 2017, con Metroparques, que tiene por objeto: Contrato interadministrativo de mandato para la realización de la agenda cultural y artística y el fortalecimiento del sector cultural en el marco del PLYPP, año 2017, el cual está para la firma, para luego iniciar labores a principios del mes de julio.

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto PD: 1.1.1.2 Implementar el plan promotor de cultura ciudadana

Proyecto: 120179 - Desarrollo y fortalecimiento de la cultura como sector

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto PD: 1.1.3.3 Creación de ecosistemas de transformación cultural

Proyecto: 130326 - Equipamento cultural y comunitario

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.249 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 88

Proyecto PD: 4.3.1.1 Bibliotecas conectando territorios

Proyecto: 120173 - Bibliotecas, lecturas y desarrollo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 252 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 227

Proyecto PD: 4.3.1.4 Puesta en valor de los patrimonios y las memorias culturales

Proyecto: 120170 - Divulgación y apropiación del patrimonio cultural material e inmaterial

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto PD: 4.3.2.1 Fortalecimiento de la red Casas de la Cultura

Proyecto: 120178 - Fortalecimiento de los centros de desarrollo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10

Proyecto PD: 4.3.3.1 Fortalecimiento convocatorias públicas de arte y cultura

Proyecto: 120189 - Convocatorias públicas para la democratización de la cultura

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4

Proyecto PD: 4.3.3.2 Redes de formación artística y cultural

Proyecto: 120176 - Formación y creación para la ciudadanía

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto PD: 4.3.3.3 Formación de públicos – Tarjeta única ciudadana

Proyecto: 120174 - Cultura ciudadana en equidad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1

Proyecto: 120180 - Parque explora operación

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 120181 - Fomento de identidad de ciudad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13

Proyecto: 120188 - Programa de formación de públicos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9

Proyecto: 150081 - 16pp5-continuidad de los programas que promueven el arte y la cultura

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3

Proyecto: 150094 - 16pp16-apoyo al festival de mitos y leyendas de belén



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 150096 - 16pp70-apoyo a la semana cultural altavista 2016



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 124 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 124

Proyecto: 150215 - Agenda artística y cultural uvas y casas de música

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3

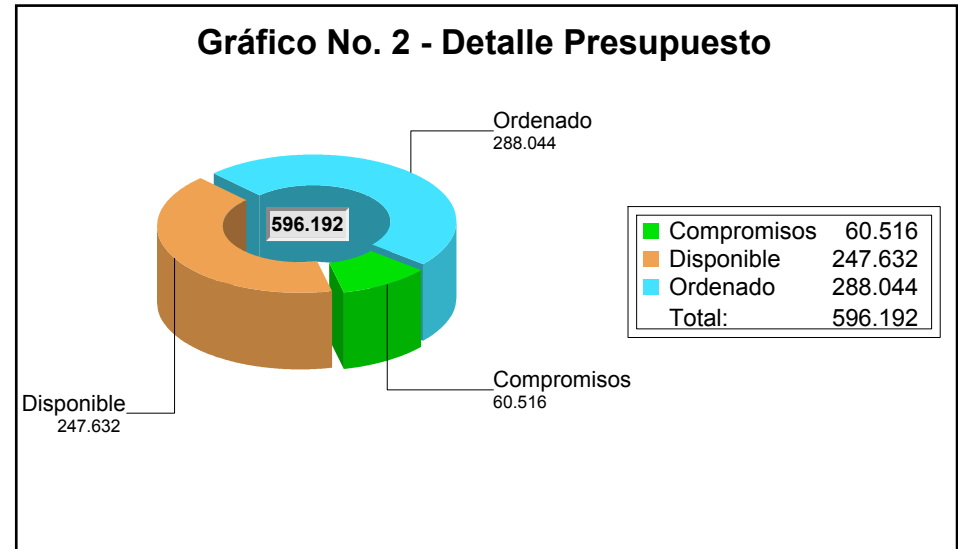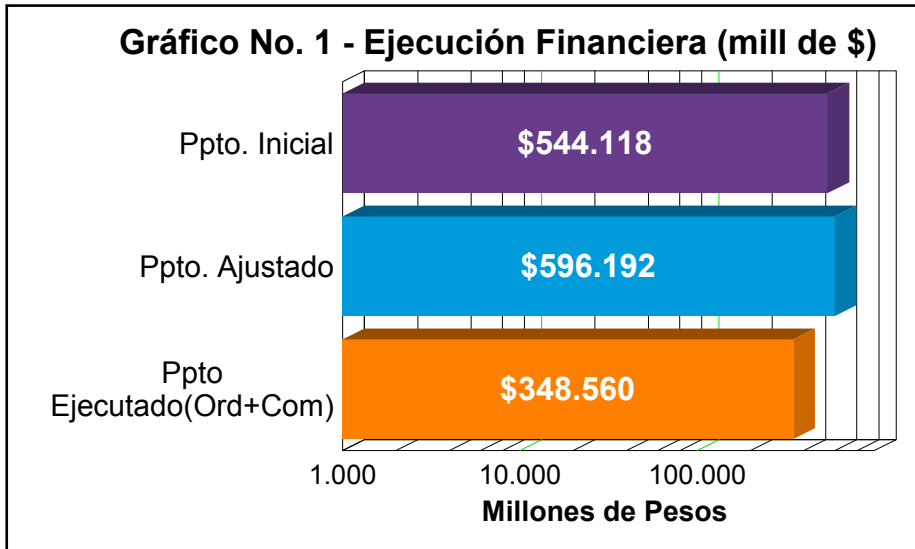

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

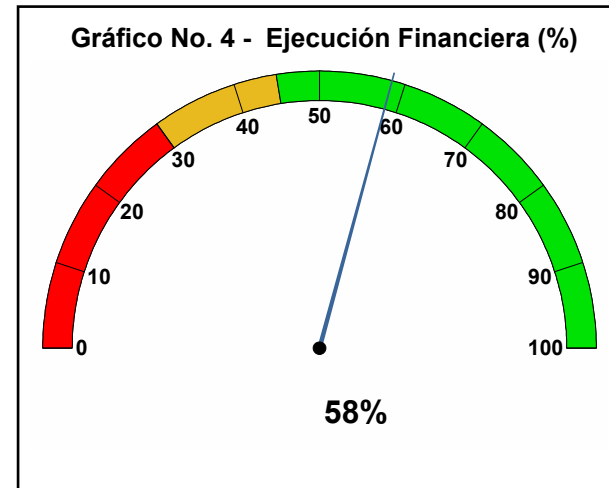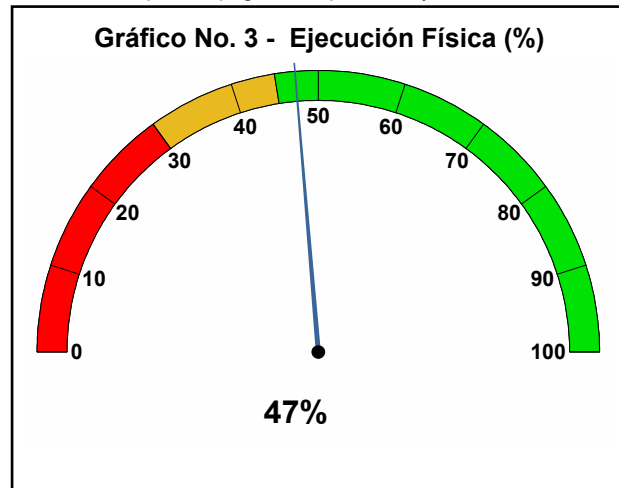

La ejecución financiera comprende pagos, facturas y los compromisos a la fecha de corte. Para el caso de los establecimientos públicos, la Ejecución Financiera se compone de dos cifras: una información obtenida del sistema, que corresponde únicamente a la cifra del presupuesto transferido desde el Municipio al estapúblico, y otra información suministrada por cada entidad que corresponde a los recursos propios invertidos por proyecto.

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes
Proyecto PD: 1.1.5.7 Cultura del cuidado para una Medellín saludable
Proyecto: 160226 - Desarrollo de estrategias en cultura del cuidado para una medellín saludable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.271 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.238 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.473

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL26BA Guia_enfoq_educac_salud_cultura_cuidado	Número	1	1	100%
SL26BB Número de alianzas evs.	Número	260	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato inicia ejecución en julio				
SL26BC Procesos educativos en evs.	Número	250	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato e inicia actividades en el mes de julio				
SL26BD Estrategia primer consumo implementada	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato e inicia actividades en el mes de julio				
SL26BE Familias_intervenidas_riesgos_priorizado	Número	3.574	2.407	67%
SL26BF Emp_sector formal interv_acciones iec-m	Número	300	105	35%
SL26BG Grupos sector informal intervenidos	Número	14	9	64%
SL26BH Nro_grupos_sector_informal_caracterizados	Número	3	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato e inicia actividades en el mes de julio				
SL26BI Sedes educativas intervenidas con iec -m	Número	300	300	100%
SL26BJ Niños_promoc_s.bucal_entorno_educativo	Número	19.800	14.023	71%
SL26BK Intervenciones breves psico sociales	Número	18.000	7.537	42%
SL26BL Jornadas_saludables_entorno_educativo	Número	100	46	46%
SL26BM Madres preventoras capacitadas_spa	Número	450	248	55%
Observación B / S: Se suscribió contrato e inicia actividades en el mes de julio				
SL26BN Centros_de_escucha_s.mental_y_srr	Número	7	4	57%
SL26BO Aat_eapb_guias_promoción_y_prevencion	Número	9	9	100%
SL26BP Ips's con aat centros excelencia	Número	54	31	57%

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social
Reto: 3.1 - Medellín para vivir más y mejor
Programa: 3.1.1 - Fortalecimiento del acceso a los servicios de salud
Proyecto PD: 3.1.1.1 Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud
Proyecto: 160228 - Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 27% Ejec. Financiera : 80%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 61 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 132 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 106

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL28CD Ips's capacitadas en pamec	Número	150	50	33%
SL28CH Visitas búsqueda activa ips y e.cosmetic	Número	120	24	20%

Observación B / S: El contrato inicio el 15 de junio de 2017, y las visitas se inician el 22 de junio, el valor reportado corresponde a las visitas realizadas del 22 al 30 de junio de 2017.

Proyecto PD: 3.1.1.2 Fortalecimiento a la red pública en salud con calidad y humanización

Proyecto: 160229 - Fortalecimiento a la red pública en salud con calidad y humanización

Síntesis Proyecto: Eficacia : 65% Ejec. Financiera : 83%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.489 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.309 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.762

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL29AC U_hospit_red_púb_adec_atención_s_mental	Número	1	1	100%
SL29AD U_hospit_red_púb_adec_maternoperinatal	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato e inicia actividades en el mes de julio				
SL29AF Upss_metrosalud_fortalecid_mejora_acceso	Número	9	9	100%
Observación B / S: En diciembre se calcula al final del contrato				
SL29AJ Personas_con_gestion_acceso_oportu_salud	Número	168.000	102.960	61%

Proyecto: 170027 - Aportes para el cubrimiento del pasivo prestacional del sector salud del municipio de medellín al 31 de diciembre de

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 767 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL27DA Pasivo prestacional salud (metrosalud)	Porcentaje	1	1	100%

Proyecto PD: 3.1.1.3 Gestión de la atención prehospitalaria, urgencias, emergencias y desastres

Proyecto: 160230 - Servicio de atención pre hospitalaria, urgencias, emergencias y desastres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 69%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.397 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.816

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL30AA Sist_aph_urgenci_emerg_desast_operando	Días	365	181	50%
SL30AC Sede adecuada programa aph	Porcentaje	50	0	0%
Observación B / S: En Contratación de adecuaciones				

Proyecto PD: 3.1.1.4 Gestión del aseguramiento en salud

Proyecto: 160231 - Administración y gestión del aseguramiento en salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 53%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 470.167 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 489.395 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 256.971

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL31AA Gestión aseguramiento régimen subsidiado	Porcentaje	100	50	50%

Proyecto PD: 3.1.1.5 Gestión de la prestación del servicio de salud a la población pobre no afiliada

Proyecto: 160232 - Administración y gestión de la prestación del servicio de salud a la población pobre no afiliada

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 18.060 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.197 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18.156

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL32AA Acceso_servicios_salud_primer_nivel_ppna	Meses	12	6	50%

Programa: 3.1.2 - Gestión de estrategias en salud

Proyecto PD: 3.1.2.1 Implementación modelo integral de atención en salud

Proyecto: 160233 - Implementación modelo integral de atención en salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 48 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 48 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL33AA Diseño plan implementación del mias	Porcentaje	80	0	0%

Observación B / S: En proceso de contratación

Proyecto PD: 3.1.2.2 Abordaje integral sociosanitario para la prevención del embarazo adolescente y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos

Proyecto: 160234 - Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para la prevención del embarazo adolescente y la promoción de los d

Síntesis Proyecto: Eficacia : 2% Ejec. Financiera : 71%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 983 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 983 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 700

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

SL34AA Plan integral sexualidad y derechos ssr	Número	1	0	0%
Observación B / S: En proceso de contratación				
SL34AC Serviv_amigables_ssr_adolesc_y_jóvenes	Número	18.926	2.817	15%
Observación B / S: El contrato es por 8 meses, acta de inicio fue el 17 abril pero actividades en campo partir de mayo. Por acta de inicio debería tener el 30,6% de productos ejecutados. Por tiempo en productivo el 25%. Se puede justificar el pequeño retraso por el paro en el sector educativo, ya que la mayoría de estos centros se encuentran en las instituciones educativas.				
SL34AD Análisis situacional abordaje ssr	Porcentaje	80	0	0%
Observación B / S: En proceso de contratación				
SL34AE Mapeo de recursos y servicios de ssr	Porcentaje	80	0	0%
Observación B / S: En proceso de contratación				
SL34AF Propuesta rutas atención integral ssr	Porcentaje	80	0	0%
Observación B / S: En proceso de contratación				
SL34AG Plan monitoreo y evaluación de rutas-ssr	Porcentaje	80	0	0%
Observación B / S: En proceso de contratación				

Proyecto PD: 3.1.2.3 Abordaje integral de atención sociosanitaria, salud mental y adicciones

Proyecto: 160261 - Desarrollo del abordaje integral de atención sociosanitaria, salud mental y adicciones

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 330 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 330 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL61BA Prop_ política_pública s.mental_adiccion	Número	1	0	0%
Observación B / S: En proceso de contratación				
SL61BB Mapeo_actores_capacid_s.mental_adiccion	Número	1	0	0%
Observación B / S: En proceso de contratación				
SL61BD Análisis situacional en salud mental	Número	1	0	0%
Observación B / S: En proceso de contratación				
SL61BE Diseño sistema monitoreo y evaluacion sm	Porcentaje	80	0	0%
Observación B / S: En proceso de contratación				

Proyecto PD: 3.1.2.4 Abordaje integral socio sanitario para poblaciones especiales

Proyecto: 160265 - Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para poblaciones especiales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 80 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 80 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL65AE Analisis_atención_ss_poblac_especiales	Número	1	0	0%
Observación B / S: En proceso de contratación				
SL65AF Ruta_ss_pobl_especiales_adaptad_socializ	Número	1	0	0%
Observación B / S: En proceso de contratación				

Proyecto PD: 3.1.2.5 Abordaje integral de atención de las enfermedades crónicas no transmisibles

Proyecto: 160269 - Desarrollo del abordaje integral para la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 80 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 80 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL69AF Rutas_ecnt_ss_adaptada_socializada_eapb Observación B / S: En proceso de contratación	Número	1	0	0%
SL69AG Análisis situacional ecnt Observación B / S: En proceso de contratación	Porcentaje	100	0	0%
SL69AH Mapeo de recursos y servicios de ecnt Observación B / S: En proceso de contratación	Porcentaje	80	0	0%

Programa: 3.1.3 - Gobernanza y gobernabilidad para la salud

Proyecto PD: 3.1.3.1 Gestión territorial y participación social en salud

Proyecto: 160274 - Desarrollo de la gestión territorial y participación social en salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 94%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 974 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 916

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL74CA Diagnóst_planificar_empod_planes_salud	Porcentaje	100	33	33%
SL74CB Articul intra e intersectorial gt y pss	Número	21	21	100%
SL74CC Ssm_fortal_recur_físic_tecnol_logíst_hum	Meses	12	6	50%

Proyecto PD: 3.1.3.2 Gestión de la información y el conocimiento en salud

Proyecto: 160278 - Fortalecimiento para la gestión de la información y el conocimiento en salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 997

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL78AD Herram_acceso_uso_información_disponibl	Número	7	7	100%
SL78AF Unid_gestión_información_conocimie_oper.	Meses	12	6	50%
SL78AG Asistenc_técnica_gest_informac_operando	Meses	12	6	50%

Programa: 3.1.4 - Vigilancia integral en salud

Proyecto PD: 3.1.4.1 Vigilancia al acceso de los servicios en salud

Proyecto: 160281 - Implementación de la vigilancia al acceso de los servicios en salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 62%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 193 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 301 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 188

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL81AA Visitas_supervisión_acceso a ips	Número	101	26	26%
Observación B / S: El contrato inicio en marzo, se iniciaron visitas en el mes de abril; se ajusta logro en SAP, a la fecha se han realizado 26 visitas lo que representa un 25,7% de eficacia.				
SL81AC Mejoram cobertura afiliació global sgsss	Porcentaje	2	2	100%

Proyecto PD: 3.1.4.2 Vigilancia epidemiológica

Proyecto: 160287 - Desarrollo de la estrategia en vigilancia epidemiológica para la salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 59% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.551 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.551 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.551

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL87AE Cooperac_tecn_ips_eventos_salud_pública	Número	531	225	42%
SL87AG Número encuentros_covecom comunitario	Número	231	152	66%
SL87AK Upgd_monitoreadas_vig_epidemiológica	Número	80	39	49%
SL87AL Espacios socialización iec	Número	26	13	50%
SL87AM Interv_vig_epidemiologica prev -control	Número	19.916	14.856	75%
SL87AN Eventos salud pública y riesgo bai -bac	Número	866	670	77%
SL87AO Brotes eventos interés salud pública	Número	121	67	55%

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible

Reto: 5.3 - Medellín gestiona sus sistemas de movilidad

Programa: 5.3.5 - Por la calidad del aire que respiramos

Proyecto PD: 5.3.5.4 Vigilancia epidemiológica de los efectos en la salud por la calidad del aire

Proyecto: 160290 - Desarrollo de un modelo de vigilancia epidemiológica de los efectos en salud por la calidad del aire

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 120 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 251 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 251

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL90AP Interpolac espacial contamin pm10_pm2,5	Número	1	0	0%

Observación B / S: El resultado se tiene al finalizar el contrato

SL90AQ Relación morbimortalidad con pm2.5 y pm10

Número

1

0

0%

Observación B / S: El resultado se tiene al finalizar el contrato

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente
Reto: 7.1 - Medellín ciudad verde y sostenible
Programa: 7.1.7 - Salud Ambiental
Proyecto PD: 7.1.7.1 Establecimientos y servicios sanos, seguros y saludables

Proyecto: 160292 - Control de los riesgos en salud para establecimientos y servicios sanos, seguros y saludables

Síntesis Proyecto: Eficacia : 21% Ejec. Financiera : 91%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.266

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL92BA Vsiitas_inspecc_vigilados_y_ccontrol eap	Número	2.564	489	19%
Observación B / S: El contrato se inició operativamente el 15 de mayo				
SL92BB Procesos_sancionat_establec_infraectores	Número	650	0	0%
Observación B / S: Se ha ejecutado el 50% de los 650 procesos sancionatorios				
SL92BC Proceso_educatv_sanitarios_y_ambientales	Número	312	74	24%
Observación B / S: El contrato inicio el 22 de mayo.				
SL92BD Diagnost_calidad_microbiológica_alimento	Número	979	197	20%
Observación B / S: El contrato inicio el 15 de mayo.				
SL92BE Visitas opticas y establecim similares	Número	500	200	40%

Proyecto PD: 7.1.7.2 Gestión integral para la prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis

Proyecto: 160295 - Control y gestión integral para la prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis

Síntesis Proyecto: Eficacia : 19% Ejec. Financiera : 73%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.473 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.272

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL95BA Levant_entomol_busq_eliminación_criadero	Número	60.130	19.714	33%
SL95BB Vigilancia virológ y monito larvitrapas	Número	14.450	4.706	33%
SL95BC Movilización ie y atención quejas x vect	Número	1.533	400	26%
Observación B / S: La actividad comprende el desarrollo de actividades en establecimientos educativos que por presentarse el paro educativo durante los meses de Mayo y Junio; estas no se pudieron desarrollar. La atención de quejas sanitarias se desarrolla a demanda y su estimación se efectuó con base en históricos.				
SL95BD Esterilizacion_de_perros_y_gatos	Número	18.576	426	2%
Observación B / S: Fecha de inicio 15 de junio de 2017.				
SL95BE Vacunacion_antirrabica_perros_y_gatos	Número	120.000	8.414	7%
Observación B / S: El contrato al cual pertenecen estas actividades tiene acta de inicio de 02 de junio de 2017.				
SL95BF Seguimiento agrsion animales_rabia	Número	550	175	32%

SL95BG Visitas_ivc_establec_veterinarios_	Número	700	44	6%
Observación B / S: El contrato al cual pertenecen estas actividades tiene acta de inicio de 02 de junio de 2017.				
SL95BH Atención integral quejas_roedores	Número	450	54	12%
Observación B / S: El contrato al cual pertenecen estas actividades tiene acta de inicio de 02 de junio de 2017.				
SL95BI Control quimico de vectores	Número	81.160	31.292	39%
SL95BJ Gestion del conocimiento etv y zoonosis	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se entrega en diciembre				

Proyecto PD: 7.1.7.3 Gestión integral de riesgos sanitarios del ambiente

Proyecto: 160296 - Control y gestión integral de riesgos sanitarios del ambiente

Síntesis Proyecto: Eficacia : 31% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.336 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.307 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.307

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL96BB Nro_visitas_ivc_piscinas_y_similares	Número	1.580	585	37%
SL96BD Establecimiento_ivc_riesgo quimico	Número	275	105	38%
SL96BE Quejas sanitarias atendidas	Número	8.200	2.235	27%
Observación B / S: El contrato 4600069568 de 2017 tiene acta de inicio del 22 de marzo y se inician labores el 6 de abril de 2017, una vez se realizó por parte del ITM (contratista) el proceso de contratación de personal. Al mes de junio se proyectó atender 1056 quejas y lo real atendido fue de 2235 quejas quedando por atender 5965 quejas.				
SL96BF visitas de ivc_rhs_carsa	Número	1.403	537	38%
SL96BG Tomas_muestras_agua, recreat y consumo h	Número	2.983	931	31%
SL96BH Estrategia de intervención de ruido	Número	536	82	15%

Observación B / S: El contrato inicio el 23 de marzo. Durante los meses de abril y mayo las intervenciones disminuyen por motivo de lluvia. Igualmente la demanda de mediciones ha disminuido.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 - Cultura Medellín

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

Proyecto PD: 1.1.5.7 Cultura del cuidado para una Medellín saludable

Proyecto: 150074 - 16pp3-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en manrique

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 89 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 89

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL74BB Personas beneficiadas protesis dentales	Número	125	125	100%

Proyecto: 150139 - 16pp1-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en popular

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 212 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 212

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL39AA Personas benef promoción comport saludab	Número	372	372	100%
SL39BA Personas beneficiadas protesis dentales	Personas	318	318	100%
SL39BD Promocion salud visual (personas benef)	Personas	101	101	100%

Proyecto: 150140 - 16pp2-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en santa cruz

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 294 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 294

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL40AC Personas beneficiadas protesis dentales	Puntos	74	74	100%
SL40AD Promoc salud en hogares seleccionados	Número	159	159	100%

Proyecto: 150143 - 16pp4-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en aranjuez

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 309 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 309

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL43AD Personas beneficiadas protesis dentales	Número	373	373	100%
SL43AH Personas beneficiadas vacuna hepatitis a	Número	86	86	100%

Proyecto: 150144 - 16pp5-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en castilla

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 456 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 456

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL44AA Personas benef promoción comport saludab	Número	620	620	100%
SL44AF Personas beneficiadas protesis dentales	Número	295	295	100%
SL44AH Promocion salud visual (personas benef)	Número	686	686	100%

Proyecto: 150145 - 16pp6-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en doce de octubre

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 467 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 467

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL45AA Personas benef promoción comport saludab	Número	848	848	100%
SL45AC Personas beneficiadas protesis dentales	Número	59	59	100%
SL45AI Promocion salud visual (personas benef)	Número	927	0	0%

Observación B / S: Se suscribió contrato e inicia actividades en el mes de julio

Proyecto: 150146 - 16pp7-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en robledo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 198 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 198

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL46AB Personas beneficiadas protesis dentales	Número	27	27	100%
SL46AC Promocion salud visual (personas benef)	Número	824	824	100%

Proyecto: 150147 - 16pp8-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en villa hermosa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 320 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 320

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL47AA Personas benef promoción comport saludab	Número	123	123	100%
SL47AF Promocion salud visual (personas benef)	Número	454	454	100%

Proyecto: 150148 - 16pp9-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en buenos aires

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 266 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 266

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL48AA Personas benef promoción comport saludab	Número	570	570	100%
SL48AD Personas beneficiadas protesis dentales	Número	105	105	100%

Proyecto: 150149 - 16pp10-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la candelaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 410 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 410

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL49AA Personas benef promoción comport saludab	Número	837	837	100%
SL49AE Promocion salud visual (personas benef)	Número	306	306	100%

Proyecto: 150189 - 16pp11-promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población en laureles estadio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 77 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 77

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL89BA Personas benef promoción comport saludab	Número	234	234	100%

Proyecto: 150202 - 16pp12-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la américa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 202 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 202

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL02BA Personas benef promoción comport saludab	Número	480	480	100%
SL02BD Personas beneficiadas protesis dentales	Número	228	228	100%
SL02BE Promocion salud visual (personas benef)	Número	186	186	100%

Proyecto: 150203 - 16pp13-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en san javier

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 222 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 222

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL03BB Personas beneficiadas protesis dentales	Número	474	474	100%
SL03BC Promocion salud visual (personas benef)	Número	150	150	100%

Proyecto: 150204 - 16pp14-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en el poblado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 206 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 206

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL04BA Personas benef promoción comport saludab	Número	47	47	100%
SL04BJ Promocion salud visual (personas benef)	Número	541	541	100%

Proyecto: 150205 - 16pp15-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en guayabal**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 305 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 305**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL05BA Personas benef promoción comport saludab	Número	160	160	100%
SL05BG Promocion salud visual (personas benef)	Número	380	380	100%

Proyecto: 150206 - 16pp16-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en belén**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 337 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 337**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL06AC Personas benef promoción comport saludab	Número	177	177	100%
SL06AE Personas beneficiadas protesis dentales	Número	333	333	100%
SL06AF Promocion salud visual (personas benef)	Número	361	361	100%

Proyecto: 150209 - 16pp60-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en san cristóbal**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 205 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 205**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL09BD Personas beneficiadas protesis dentales	Número	244	244	100%
SL09BG Promocion salud visual (personas benef)	Número	569	569	100%

Proyecto: 150211 - 16pp80-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en san antonio de prado**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 387 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 387**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL11AM Personas benef promoción comport saludab	Número	219	219	100%
SL11AO Personas beneficiadas protesis dentales	Número	308	308	100%
SL11AP Personas beneficiadas vacuna neumococo	Número	113	113	100%
SL11AQ Promocion salud visual (personas benef)	Número	784	784	100%

Proyecto: 150212 - 16pp90-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en santa elena

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 38 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 38

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL12BA Personas benef promoción comport saludab	Número	121	121	100%

Proyecto: 160562 - 17pp99-fortalecimiento de la cultura del cuidado para una medellín saludable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 1% Ejec. Financiera : 86%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.735 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.865 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.564

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL62AA C1_salud_visual_promoción salud	Número	1.129	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62AB C1_ortodoncia_niños(as)_6-10 años	Número	315	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62AC C1_prótesis_parciales_removibles	Número	422	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62AD C1_comportamientos_saludables_evs	Número	341	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62AE C1_estrategia_familias_cuidadoras	Número	250	1	0%
Observación B / S: Las comunas que priorizaron recursos de planeación local y presupuesto participativo son: 1-2-5 y 10, para dar inicio a estas actividades se debe socializar con las comisiones de salud las actividades que corresponden al componente, las fechas para las socializaciones están sujetas a la disponibilidad de los delegados, hasta que no socialice no comienzan actividades en las comunas.				
SL62AF C1_vac_neumococo_mayore_50 años.	Número	563	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62AG C1_prevenición_conducta_suicida	Número	215	0	0%
Observación B / S: En proceso de contratación				
SL62AH C2_comportamientos_saludables_evs	Número	140	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62AI C2_ortodoncia_niños(as)_6-10 años	Número	425	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62AJ C2_prótesis_parciales_removibles	Número	246	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62AK C2_salud_visual_promoción salud	Número	1.271	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62AL C2_estrategia_familias_cuidadoras	Número	65	64	98%
SL62AM C2_aderencia_tratam_pacientes_tb	Número	46	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato está en socialización				
SL62AN C2_vacunacion_neumococo_mayores_50 años	Número	202	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62AO C2_prevenición_conducta_suicida	Número	273	0	0%
Observación B / S: En proceso de contratación				

SL62AP C2_familias fuertes y resilientes	Número	165	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62AQ C2_ssr_prevenç_embarazo_adolecente-simul	Número	135	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62AR C3_salud_visual_promoción_salud	Número	1.695	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62AS C3_prótesis_parciales_removibles	Número	1.013	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62AT C3_ortodoncia_niños(as)_6-10 años	Número	441	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62AU C3_vacunacion_neumococo_mayores_50 años.	Número	703	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62AV C3_prevencción_conducta_suicida	Número	350	0	0%
Observación B / S: En proceso de contratación				
SL62AW C4_ssr_prev_emb_adolecente-simul	Número	997	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62AX C4_salud_visual_promoción_salud	Número	2.621	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62AY C4_s_mental_primer_consumo	Número	3.080	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62AZ C4_ortodoncia_niños(as)_6-10 años	Número	840	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62BA C5_salud_visual_promoción_salud	Número	565	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62BB C5_prótesis_parciales_removibles	Número	423	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62BC C5_interv_población_con_sobrepeso	Número	179	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62BD C5_estrategia_familias_cuidadoras	Número	75	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62BF C5_prevencción_conducta_suicida	Número	230	0	0%
Observación B / S: En proceso de contratación				
SL62BG C5_vacunacion_neumococo_mayores_50_años	Número	327	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62BH C5_vac_hepatitis_niños_5 a 14 años	Número	396	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62BI C5_vac_influenza de 3 a 50 años	Número	738	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62BJ C5_aderencia_tratam_pacientes_tb	Número	49	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato está en socialización				
SL62BK C5_ssr_ampliación_servicios_amigables	Número	2.588	234	9%
Observación B / S: El contrato es por 8 meses, acta de inicio fue el 17 abril pero actividades en campo partir de mayo. Se puede justificar el pequeño retraso por el paro en el sector educativo, ya que la mayoría de estos centros se encuentran en las instituciones. También dicho componente fue priorizado en la comuna 5 con recursos de planeación local y presupuesto participativo.				
SL62BL C5_familias_fuertes_y_resilientes	Número	105	0	0%

Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62BM C5_ortodoncia_niños(as)_6-10 años	Número	189	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62BN C6_salud visual_promoción salud	Número	2.824	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62BO C6_ortodoncia_niños(as)_6-10 años	Número	1.379	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62BP C6_prótesis_parciales_removibles	Número	282	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62BQ C6_vacunacion_neumococo_mayores_50 años	Número	281	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62BR C6_vacunacion_influenza_de_3_a_50 años	Número	317	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62BS C6_vacunacion_hepatitis_niños_5 a 14 año	Número	255	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62BT C6_ssr_prevenç_embarazo_adolescente-simul	Número	997	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62BU C7_comportamientos_saludables_evs	Número	2.322	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62BV C7_vacunacion_neumococo_mayores_50 años	Número	915	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62BW C7_vacunac_hepatitis_niños_5 a 14 años	Número	1.242	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62BX C7_vacunación_influenza de 3 a 50 años	Número	2.065	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62BY C7_ortodoncia_niños(as)_6-10 años	Número	1.050	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62BZ C7_prótesis_parciales_removibles	Número	1.126	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62CA C7_salud visual_promoción salud	Número	2.769	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62CB C8_salud visual_promoción salud	Número	339	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62CC C8_vacunacion_neumococo_mayores_50 años	Número	422	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62CD C8_vacunacion_hepatitis_niños_5-14 años	Número	170	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62CE C8_prótesis_parciales_removibles	Número	535	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62CF C8_ortodoncia_niños(as)_6-10 años	Número	462	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62CG C8_comportamientos_saludables_evs	Número	892	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62CH C9_comportamientos_saludables_evs	Número	1.829	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				

SL62CI	C10_s.mental_prevencc_consum_spa_drogodep	Número	1.052	0	0%
	Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62CJ	C10_familias fuertes y resilientes	Número	135	0	0%
	Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62CK	C10_estrategia_familias_cuidadora	Número	130	0	0%
	Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62CL	C10_salud_visual_promoción_salud	Número	1.158	0	0%
	Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62CM	C10_prótesis_parciales_removibles	Número	352	0	0%
	Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62CN	C10_ortodoncia_niños(as)_6-10 años	Número	431	0	0%
	Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62CO	C13_ortodoncia_niños(as)_6-10 años	Número	898	0	0%
	Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62CP	C13_salud_visual_promoción_salud	Número	1.129	0	0%
	Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62CQ	C13_prótesis_parciales_removibles	Número	1.099	0	0%
	Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62CS	C14_ortodoncia_niños(as)_6-10 años	Número	189	0	0%
	Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62CT	C14_salud_visual_promoción_salud	Número	1.093	0	0%
	Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62CU	C14_vacunacion_neumococo_mayor_50 años	Número	624	0	0%
	Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62CV	C14_vacunacion_influenza de 3 a 50 años	Número	1.408	0	0%
	Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62CW	C14_vacunacion_hepatitis_niños_5 a 14	Número	755	0	0%
	Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62CX	C14_intervencion_población_con_sobrepeso	Número	58	0	0%
	Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62CY	C15_salud_visual_promoción_salud	Número	1.129	0	0%
	Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62CZ	C15_comportamiento_saludables_evs	Número	169	0	0%
	Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62DA	C15_vac_neumococo_mayor_50 años.	Número	563	0	0%
	Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62DB	C15_vacunación_hepatitis_niños_5 a 14	Número	1.192	0	0%
	Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62DC	C15_ortodoncia_niños(as)_6-10 años	Número	168	0	0%
	Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62DD	C15_aderencia_tratamiento_pacientes_tb	Número	35	0	0%
	Observación B / S: Se suscribió contrato está en socialización				
SL62DE	C15_prótesis_parciales_removibles	Número	113	0	0%
	Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62DF	C16_salud_visual_promoción_salud	Número	1.356	0	0%

Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62DG C16_ortodoncia_niños(as)_6-10 años	Número	504	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62DH C16_prótesis_parciales_removibles	Número	563	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62DI C16_comportamiento_saludables_evs	Número	441	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62DJ C16_s.mental_prev_consum_spa_drogodepend	Número	2.103	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62DK C16_familias fuertes y resilientes	Número	45	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62DL C16_vacunacion_hepatitis_niños_5 a 14	Número	1.072	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62DM C16_vacunacion_neumococo_mayor_50 años.	Número	857	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62DN C50_ortodoncia_niños(as)_6-10 años	Número	210	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62DO C70_ortodoncia_niños(as)_6-10 años	Número	370	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62DP C70_prótesis_parciales_removibles	Número	297	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62DQ C70_salud visual_promoción salud	Número	489	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62DR C80_familias fuertes y resilientes	Número	255	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62DS C80_s.mental_prev_consumo_spa_drogodepen	Número	1.052	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62DT C80_salud visual_promoción salud	Número	565	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62DU C80_prótesis_parciales_removibles	Número	282	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62DV C80_ortodoncia_niños(as)_6-10 años	Número	420	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62DW C80_comportamiento_saludables_evs	Número	216	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62DX C60_salud visual promoción salud	Número	546	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62DY C60_ortodoncia niños(as) 6-10 años	Número	224	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62DZ C60_prótesis_parciales_removibles	Número	300	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62EA C60_n.occ_salud visual promoción salud	Número	339	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62EB C60_n.occ_ortodoncia niños(as) 6-10 años	Número	168	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				

SL62EC C60_n.occ_ prótesis parciales removibles	Número	216	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62ED C12_ salud visual promoción salud	Número	1.129	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62EF C12_ortodoncia niños(as) 6-10 años	Número	105	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62EH C12_sm-violencia intrafamiliar	Número	300	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62EI C12_aderencia tratamiento pacientes tb	Número	106	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato está en socialización				
SL62EJ C12_ vacunac hepatitis niños 5 -14 años	Número	511	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62EK C12_ vacunación neumococo mayor 50 años	Número	844	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62EL C12_ vacunación influenza 3 a 50 años	Número	953	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				
SL62EN C5_s.mental_prev_consumo_spa_drog	Número	978	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato esta en socialización e inscripciones con la comunidad				

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.1 - Medellín para vivir más y mejor

Programa: 3.1.3 - Gobernanza y gobernabilidad para la salud

Proyecto PD: 3.1.3.1 Gestión territorial y participación social en salud

Proyecto: 160563 - 17pp99-apoyo a la gestión territorial y participación social en salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 34%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.846 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.091 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.062

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL63BA C1_partic_social_salud_y_gest_territoria	Número	1	0	0%
Observación B / S: Está en proceso de contratación				
SL63BB C1_censo_personas_con_discapacidad	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato, esta ejecución, se tienen datos al final del año				
SL63BC C1_fortac_partc_seminar_método_coaching	Número	101	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato está en socialización				
SL63BD C1_eval_monit_seguimin_proyect_salud	Número	1	0	0%
Observación B / S: En proceso de contratación				
SL63BE C2_fortac_partc_semin_mét_coaching	Número	315	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato está en socialización				
SL63BF C3_partic_soc_salud_y_gest_territ	Número	1	0	0%
Observación B / S: Está en proceso de contratación				
SL63BG C3_censo_personas_con_discapacidad	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato, esta ejecución, se tienen datos al final del año				

SL63BH C3_eval_monit_seguim_proyect_salud	Número	1	0	0%
Observación B / S: En proceso de contratación				
SL63BI C4_partic_soc_salud_y_gest_territ	Número	1	0	0%
Observación B / S: Está en proceso de contratación				
SL63BJ C4_fortac_partc_semin_mét_coaching	Número	150	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato está en socialización				
SL63BK C5_partic_soc_salud_y_gest_territorial	Número	1	0	0%
Observación B / S: Está en proceso de contratación				
SL63BL C15_partic_soc_salud_y_gest_territ	Número	1	0	0%
Observación B / S: Está en proceso de contratación				
SL63BM C15_fortac_partc_seminario_métod_coachin	Número	52	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato está en socialización				
SL63BN C16_partic_soc_salud_y_gest_territ	Número	1	0	0%
Observación B / S: Está en proceso de contratación				
SL63BO C16_fortac_partc_semin_mét_coachin	Número	35	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato está en socialización				
SL63BP C60_fortac_partc_seminario_coaching	Número	35	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato está en socialización				
SL63BQ C60_n.occ_seminario método coaching	Número	44	0	0%
Observación B / S: Se suscribió contrato está en socialización				
SL63BR C12_partic_soc_salud_y_gestion_territori	Número	1	0	0%
Observación B / S: Está en proceso de contratación				

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.1 - Medellín ciudad verde y sostenible

Programa: 7.1.7 - Salud Ambiental

Proyecto PD: 7.1.7.2 Gestión integral para la prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis

Proyecto: 160564 - 17pp99-apoyo a la gestión integral para la prevención y control de enfermedades transmitidas por zoonosis

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 372 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 372 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 352

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL64BA C1_control_roedores_con_product_quimicos	Número	285	0	0%
Observación B / S: Está programado su ejecución a partir del mes de agosto				
SL64BB C1_esterilizacion_de_caninos_y_felinos	Número	389	0	0%
Observación B / S: Está programado su ejecución a partir del mes de agosto				
SL64BC C1_vacunación_para_canino_y_felinos	Número	155	0	0%
Observación B / S: Está programado su ejecución a partir del mes de agosto				
SL64BD C1_desparasitación_caninos_y_felinos	Número	346	0	0%
Observación B / S: Está programado su ejecución a partir del mes de agosto				
SL64BE C3_esterilizacion_de_caninos_y_felinos	Número	381	0	0%
Observación B / S: Está programado su ejecución a partir del mes de agosto				

SL64BF C3_vacunación_para_canino_y_felinos	Número	86	0	0%
Observación B / S: Está programado su ejecución a partir del mes de agosto				
SL64BG C3_desparasitación_caninos_y_felinos	Número	181	0	0%
Observación B / S: Está programado su ejecución a partir del mes de agosto				
SL64BH C4_esterilización_de_caninos_y_felinos	Número	679	0	0%
Observación B / S: Está programado su ejecución a partir del mes de agosto				
SL64BI C4_vacunación_para_canino_y_felinos	Número	155	0	0%
Observación B / S: Está programado su ejecución a partir del mes de agosto				
SL64BJ C4_desparasitación_caninos_y_felinos	Número	324	0	0%
Observación B / S: Está programado su ejecución a partir del mes de agosto				
SL64BK C80_esterilización_de_caninos_y_felinos	Número	300	0	0%
Observación B / S: Está programado su ejecución a partir del mes de agosto				
SL64BL C80_vacunación_para_canino_y_felinos	Número	254	0	0%
Observación B / S: Está programado su ejecución a partir del mes de agosto				
SL64BM C80_desparasitación_caninos_y_felinos	Número	292	0	0%
Observación B / S: Está programado su ejecución a partir del mes de agosto				

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Dimensión:	3	Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
Reto:	3.1	- Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social		
Programa:	3.1.3	- Medellín para vivir más y mejor		
Proyecto PD:	3.1.3.2	- Gobernanza y gobernabilidad para la salud		
		Gestión de la información y el conocimiento en salud		
		040025 Mejoramiento Sistema Integral de Información en Salud	\$ 137,54259	\$ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto PD: 1.1.5.7 Cultura del cuidado para una Medellín saludable

Proyecto: 120026 - Prevención de los riesgos en salud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 414 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 414

Proyecto: 120029 - Promoción y educación en salud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.338 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.338

Proyecto: 150207 - 16pp50-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en palmitas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 24 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 24

Proyecto: 150210 - 16pp70-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en altavista

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16

Proyecto PD: 3.1.1.2 Fortalecimiento a la red pública en salud con calidad y humanización

Proyecto: 120352 - Dotac adecuac capacid resolu

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 130296 - Centro integral de servicios ambulatorios para la mujer y la familia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 101 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 97

Proyecto: 130318 - Reposición unidad hospitalaria buenos aires

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.740 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.684

Proyecto PD: 3.1.1.3 Gestión de la atención prehospitalaria, urgencias, emergencias y desastres

Proyecto: 120037 - Programa de apoyo a las redes de atención en salud con énfasis en la red de urgencias, emergencias y desastres

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 608 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 608

Proyecto PD: 3.1.1.4 Gestión del aseguramiento en salud

Proyecto: 120038 - Gestión para el aseguramiento en el régimen subsidiado

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto PD: 3.1.1.5 Gestión de la prestación del servicio de salud a la población pobre no afiliada

Proyecto: 120041 - Acceso a los servicios de salud a la población no asegurada

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto PD: 3.1.4.2 Vigilancia epidemiológica

Proyecto: 120028 - Vigilancia epidemiológica para la salud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 236 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 236



Proyecto PD: 7.1.7.3 Gestión integral de riesgos sanitarios del ambiente

Proyecto: 120027 - Control de factores de riesgo del ambiente, consumo y zoonosis



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 432 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 432

Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2017

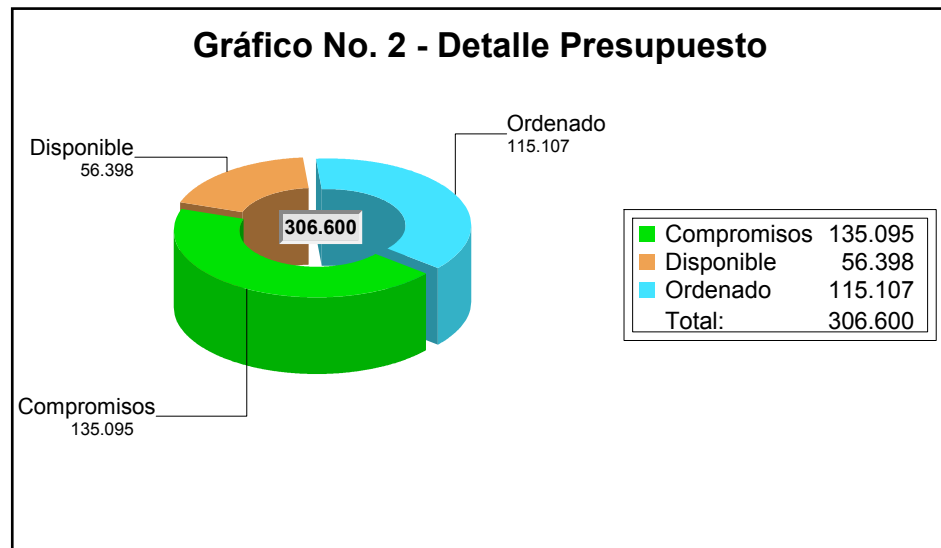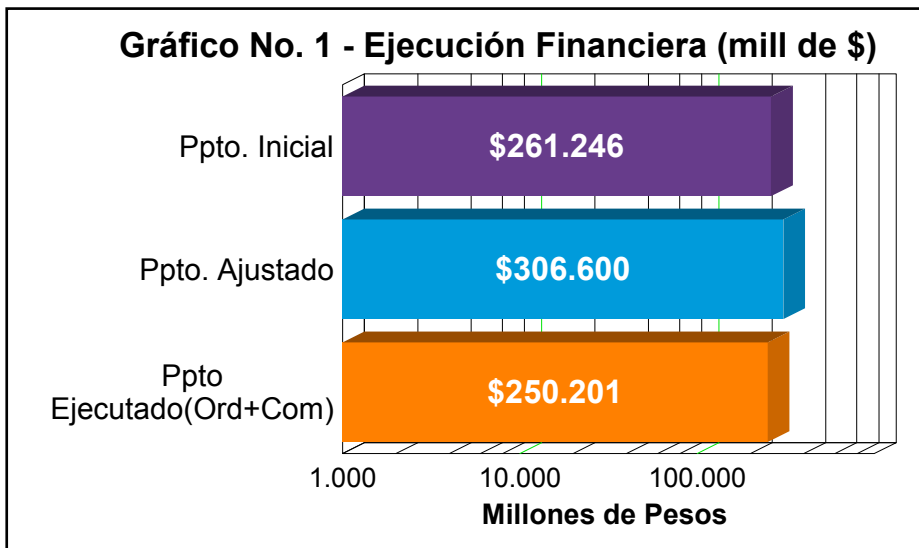

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

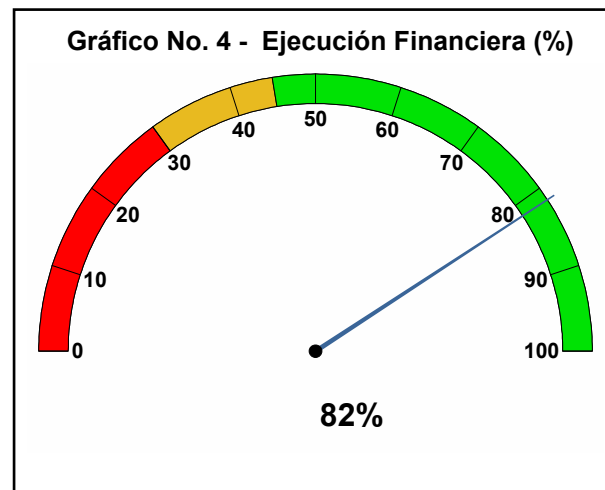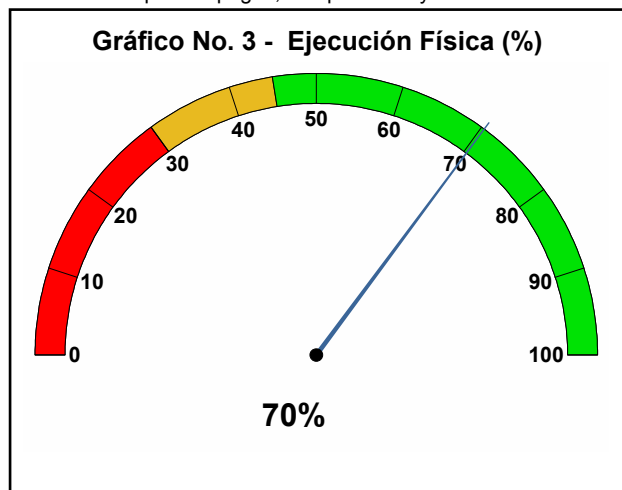

La ejecución financiera comprende pagos, facturas y los compromisos a la fecha de corte. Para el caso de los establecimientos públicos, la Ejecución Financiera se compone de dos cifras: una información obtenida del sistema, que corresponde únicamente a la cifra del presupuesto transferido desde el Municipio al estapúblico, y otra información suministrada por cada entidad que corresponde a los recursos propios invertidos por proyecto.

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.4 - Formación para la transformación de la cultura ciudadana
Proyecto PD: 1.1.4.4 Medellín ciudad diversa
Proyecto: 160306 - Implementación estrategia medellín ciudad diversa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 85 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 85 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS06AJ Conf mesa inter contra rac, disc, xenof	Número	1	0	0%
IS06AL Even ciud recon sobr disc, racis y xenof	Número	1	0	0%
IS06AM Estr sens situa discr, racism y xeno med	Número	1	0	0%
IS06AN Interv ccion cont discrim, rac y xenofob	Número	3	0	0%

Observación Proyecto: Las acciones de este proyecto se realizarán a través de un convenio de cooperación internacional el cual se encuentra en etapa precontractual y revisión y aprobación de la Secretaría General y la Secretaría de Suministros y Servicios.

Reto: 1.3 - Medellín bien administrado
Programa: 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno
Proyecto PD: 1.3.5.6 Red de observatorios para la trazabilidad del impacto social
Proyecto: 160304 - Administración del conocimiento para la investigación social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 36%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 36

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS04AF Dis estr met pa imp d mod admon de infor	Porcentaje	100	45,91	46%

Proyecto PD: 1.3.5.8 Implementar el sistema de información territorial para la medición de impactos basados en la transversalización de las acciones

Proyecto: 160307 - Fortalecimiento del sistema de información para el bienestar y la inclusión social -sibis

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 37%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 193 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 193 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 72

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS07AI Sistema sibis fortalecido	Número	1	0	0%

Observación B / S: Las acciones a través de las cuales se dará cumplimiento a este producto se encuentran en etapa precontractual. Se solicita el Aval de la Subsecretaría de Tectología y Gestión de la Información para adelantar la contratación de la actualización y mejoramiento del Sistema de Información SIBIS.

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana
Reto: 2.2 - En Medellín convive toda la ciudadanía
Programa: 2.2.4 - Prevención de las violencias
Proyecto PD: 2.2.4.3 Prevención y atención de violencias sexuales y la trata de personas
Proyecto: 160308 - Prevención y atención de las violencias sexuales y trata de personas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS08AA Campañas de sensibilización	Número	2	1	50%
Observación B / S: Durante el primer semestre se adelantaron 17 actividades para cumplir con el desarrollo de una de las campañas de sensibilización de trata.				
IS08AB Asesoría en atención inmediata y mediata	Porcentaje	100	100	100%
IS08AC Asesorías restablecimiento de derechos	Porcentaje	100	100	100%

Reto: 2.3 - Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio
Programa: 2.3.1 - Promoción de los derechos humanos
Proyecto PD: 2.3.1.1 Gestión del Sistema Municipal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
Proyecto: 160309 - Administración del sistema municipal de derechos humanos y derecho internacional humanitario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 21% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 419 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.309 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.309

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS09AP Infor estad cuant cual publi viol dh dih	Número	2	0	0%
Observación B / S: Se inició el 21-03-2017 contrato interadministrativo No. 4600069603, para el desarrollo del proyecto y a la fecha se han desarrollado actividades de planeación e inducción y se están realizando acciones en la construcción de este producto.				
IS09AQ Doc metodo pedag implem sist mpal dh dih	Número	1	1	100%
IS09AR Conversatori política pca dh y sist mpal	Número	21	1	5%
Observación B / S: El conversatorio fue realizado en el auditorio de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.				
IS09AS Plan mpal prevenc promoc violaciones dh.	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se inició el 21-03-2017 contrato interadministrativo No. 4600069603, para el desarrollo del proyecto y a la fecha se han desarrollado actividades de planeación e inducción y se están realizando acciones en la construcción de este producto.				
IS09DJ Pers vulnerab capac en habi para la vida	Número	280	0	0%
Observación B / S: El contrato Interadministrativo N° 4600070469 suscrito con el ITM inicia el 06/07/2017 y se encuentra en etapa de planeación de actividades				

Proyecto PD: 2.3.1.2 Pedagogía para la cultura de los Derechos Humanos

Proyecto: 160310 - Construcción pedagogía para la cultura de los derechos humanos**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 260 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 260 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 260**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS10AA Actv lud pedag promo implement sist mpal	Número	6	0	0%
Observación B / S: Se inició el 21-03-2017 contrato interadministrativo No. 4600069603, para el desarrollo del proyecto y a la fecha se han desarrollado actividades de planeación e inducción y se están realizando acciones en la construcción de este producto.				
IS10AB Convers experienc formación cultura dh	Número	6	6	100%
IS10AC Difusion situacion de dh en las comunas	Número	21	0	0%
Observación B / S: Se inició el 21-03-2017 contrato interadministrativo No. 4600069603, para el desarrollo del proyecto y a la fecha se han desarrollado actividades de planeación e inducción y se están realizando acciones en la construcción de este producto.				
IS10AD Piezas public construc cultura de dh paz	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se entregó todo el diseño está pendiente para la impresión.				

Proyecto PD: 2.3.1.3 Gestión territorial y fortalecimiento de actores sociales para el ejercicio de los Derechos Humanos**Proyecto: 160312 - Fortalecimiento de actores sociales y gestión territorial para el ejercicio de los derechos humanos****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 28% Ejec. Financiera : 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 484 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 484 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 484**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS12AJ Encuentros prom preve dh con comunidad.	Número	6	6	100%
IS12AK Campañ vecinal reconoc prácticas pacífic	Número	6	2	33%
Observación B / S: En el mes de junio se realizaron dos campañas en la comuna 10 y en el corregimiento de San Cristobal.				
IS12AN Capacit terr promo preven dh cultura paz	Número	21	0	0%
Observación B / S: Se inició el 21-03-2017 contrato interadministrativo No. 4600069603, para el desarrollo del proyecto y a la fecha se han desarrollado actividades de planeación e inducción y se están realizando acciones en la construcción de este producto.				
IS12AO Talleres sensibilización en cultura paz	Número	21	2	10%
Observación B / S: Se realizaron dos talleres de sensibilización en las comunas 11 y 7				
IS12AP Semilleros formación en dh	Número	21	1	5%
Observación B / S: Se inició el 21-03-2017 contrato interadministrativo No. 4600069603, para el desarrollo del proyecto y a la fecha se han desarrollado actividades de planeación e inducción y se están realizando acciones en la construcción de este producto.				
IS12AQ Festivales de oferta institucional	Número	5	1	20%
Observación B / S: Se inició el 21-03-2017 contrato interadministrativo No. 4600069603, para el desarrollo del proyecto y a la fecha se han desarrollado actividades de planeación e inducción y se están realizando acciones en la construcción de este producto.				

Proyecto PD: 2.3.1.4 Atención integral a víctimas y/o testigos de delitos de alto impacto social**Proyecto: 160314 - Apoyo integral a víctimas y/o testigos de delitos de alto impacto social****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 49% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 500

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS14AA Segui proc penales garan atenci oportuna	Porcentaje	100	100	100%
IS14AD Repre judivicti/testi del alto impac soc	Porcentaje	100	100	100%
IS14AE Encuent intersec mesa prevencion recluta	Número	10	2	20%
Observación B / S: El 30 de mayo se realizó 1 encuentro en la Secretaría de Seguridad y el otro se llevó a cabo en el mes de junio en la CL 50D # 62 95				
IS14AF Plan mpal prevenc contravioneacias de nna	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se inició el 21-03-2017 contrato interadministrativo No. 4600069603, para el desarrollo del proyecto y a la fecha se han desarrollado actividades de planeación e inducción y se están realizado acciones en la construcción de este producto.				
IS14AG Atenc inme prev reclu ilíc uso utili nna	Porcentaje	100	100	100%
IS14DG Brigadas promo prevenc y/o atención ddhh	Número	6	3	50%
Observación B / S: En el mes de mayo se realizó una brigada en la Cárcel Bellavista y en el mes de junio se realizaron 2 brigadas en las comunas 9 y 7				
IS14DH Foro de derechos de los nna	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se inició el 21-03-2017 contrato interadministrativo No. 4600069603, para el desarrollo del proyecto y a la fecha se han desarrollado actividades de planeación e inducción y se están realizado acciones en la construcción de este producto.				
IS14DI Forta mesas colectivo poblac vulner smdh	Número	21	4	19%
Observación B / S: Se realizaron 4 fortalecimientos a mesas de las comunas 5, 6, 7 y 11, jornadas desarrolladas en la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.				

Proyecto PD: 2.3.1.5 Reconocimiento y dignificación humana en el Cementerio Jardín Universal y otros sitios de la ciudad

Proyecto: 160315 - Identificación y dignificación humana en el cementerio universal y otros sitios de la ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 567 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 557

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS15AL Jorn inter victi toma registr denunci adn	Número	2	2	100%
Observación B / S: La jornada se llevó a cabo en el Museo Casa de la Memoria				
IS15AM Briga busque entie clandes mpio medellin	Número	1	1	100%
IS15AN Publicaciones de la revista rastros	Número	2	0	0%
Observación B / S: Se inició el 21-03-2017 contrato interadministrativo No. 4600069603, para el desarrollo del proyecto y a la fecha se han desarrollado actividades de planeación e inducción y se están realizado acciones en la construcción de este producto.				
IS15AO Identifica dignificacion restos humanos	Número	120	27	23%
Observación B / S: Se está adelantando el proceso de identificación de las víctimas(restos humanos), dependemos del apoyo técnico y pericial de la fiscalía para la identificación de Iso restos.				
IS15CI Flías acompaña digno entrega rtos identi	Número	20	5	25%
Observación B / S: Hasta tanto no haya identificación de los restos humanos por parte de la Fiscalía , no se podrán ubicar y acompañar dignamente a las familias.				

Proyecto PD: 2.3.1.6 Orientación y atención a personas en ejercicio y condición de riesgo de prostitución

Proyecto: 160320 - Fortalecimiento de capacidades a personas en ejercicio y condición de riesgo de prostitución

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 750 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 750 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 721

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS20AH Pers vinculadas al proyecto con seguimi	Número	600	0	0%
IS20AI Pers en ejerc de prosti con aten psicoso	Número	1.000	0	0%
IS20AJ Per. contex/ejerc prost orien juri-labo	Número	100	0	0%
IS20AK Per. conte/ejercicio prostitucion sensi	Número	2.000	0	0%

Observación Proyecto: Este proyecto está en etapa contactual, se espera iniciar actividades la primera semana de Julio.

Programa: 2.3.2 - Postacuerdo y garantías de no repetición

Proyecto PD: 2.3.2.1 Gestión de la estrategia de garantías de no repetición y cultura de paz

Proyecto: 160327 - Administración de la estrategia de garantías de no repetición y cultura de paz

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 371 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 371 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 371

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS27AC Gest implem estrat pedag fort instituc	Porcentaje	100	100	100%

Observación B / S: El 100% equivale al desarrollo de 13 acciones específicas y fundamentadas en la implementación de módulos de formación "educando en paz", pedagogía en GNR mediante el fortalecimiento de organizaciones de víctimas y la implementación de procesos cartográficos comunas 2,3,4,7,8,16,60 y 80.

Programa: 2.3.5 - Atención a víctimas del conflicto armado

Proyecto PD: 2.3.5.1 Restablecimiento y reparación a víctimas del conflicto armado

Proyecto: 160331 - Reparación y restablecimiento a víctimas del conflicto armado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.783 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.266

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS31AJ Flias recib prot de derec la subsi míni	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: Este 100% equivalente a 3.039 familias				
IS31AK Flias con medidas rehabilit y satisfac	Número	1.000	445	45%
IS31AL Flias desplaz benef med gener ingresos	Número	850	270	32%
Observación B / S: De las 270 familias, 158 fueron intervenidas mediante el fortalecimiento de unidades productivas y 112 mediante procesos de empleabilidad. El resto de familias se encuentran en fase de acompañamiento y formación.				
IS31AM Familias victim derechos restablecidos	Número	650	158	24%
Observación B / S: El porcentaje y nivel de avance, corresponde al número de familias reportadas y con cierre efectivo de procesos de restablecimiento de derechos. A la fecha el número de familias intervenidas y acompañadas es superior al reportado, sin embargo no se reportan hasta tanto no culminen o cumplan con el 100% de criterios establecidos para denominarse como familias con derechos restablecidos.				
IS31AN Acomp instit fam victim med rest tierra	Porcentaje	100	0	0%

Observación B / S: Para el mes de Junio no se ha iniciado ningun proceso de restitución de tierras ya que está en desarrollo el proceso de microfocalización del municipio de Medellín

Proyecto PD: 2.3.5.2 Prevención de riesgos en el marco de la atención a víctimas del conflicto armado

Proyecto: 160334 - Prevención de riesgos en el marco de la atención a víctimas del conflicto armado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 500

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS34AD Casos marco preven riesg identif atendid	Porcentaje	100	100	100%

Observación B / S: El 100% equivalente a 6 casos reportados y con acompañamiento en las comunas 5,7,9,12 y 70

Proyecto PD: 2.3.5.4 Acompañamiento a retornos y reubicaciones de víctimas de desplazamiento forzado - Medellín le apuesta al retorno

Proyecto: 160337 - Apoyo a retornos y reubicación de victimas de desplazamiento forzado -medellín le apuesta al retorno

Síntesis Proyecto: Eficacia : 32% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.000

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS37AE Flias desplazad retornados o reubicados	Número	217	44	20%

Observación B / S: Para el mes de Junio se acompañaron 28 familias, con proceso de reubicación 12 y 16 con proceso de retornos a diferentes municipios y departamentos del territorio colombiano

IS37AF Alcaldías fortalec marco proces retornos	Número	3	2	67%
---	--------	---	---	-----

Observación B / S: En el mes de Junio se fortalecieron 2 alcaldías (Jardín y San Pedro) en capacitaciones para el manejo del sistema de información SITAV, apoyo en la primera jornada de caracterización a víctimas del conflicto armado

IS37DI Flias retorn benefic medi gener ingresos	Número	210	44	21%
---	--------	-----	----	-----

Observación B / S: El % de avance, corresponde al # de familias reportadas con cierre efectivo de procesos de retornos y beneficiadas con medida de generación de ingresos. A la fecha el # de familias intervenidas y acompañadas es superior al reportado, sin embargo por tratarse de un proceso de acompañamiento y asesoría no se reportan hasta tanto no cumplan con el cierre efectivo del proceso de retorno o reubicación.

IS37DJ Familias retorn victim derecho restablec	Número	217	44	20%
---	--------	-----	----	-----

Observación B / S: El porcentaje y nivel de avance, corresponde al número de familias retornadas o reubicadas y con cierre efectivo de procesos de restablecimiento de derechos. A la fecha el número de familias acompañadas es superior al reportado, sin embargo hasta tanto no se haga efectivo tanto el proceso de retorno como de restablecimiento de derechos, no se ha de alimentar el valor estadístico.

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 - Medellín Digna

Programa: 3.2.1 - Medellín para la niñez y la adolescencia

Proyecto PD: 3.2.1.1 Atención de niños y niñas en situación de vulneración de derechos

Proyecto: 160177 - Asistencia de niños y niñas en situación de vulneración de derechos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 79%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 24.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 30.103 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23.659

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS77CF Nna der ino am y/o vul ate for tran e in	Número	2.800	1.354	48%
Observación B / S: Aumentó el número de ingresos al Centro de Diagnóstico y Derivación dadas las dinámicas de violencia en los barrios de la ciudad				
IS77CG Nna con derch restablec con aten especia	Número	1.000	810	81%
IS77CH Aten psicosocial a nna en explotación se	Número	200	127	64%
IS77CI Ate psic flias con nna en sit d rie vuln	Número	1.745	1.359	78%
Observación B / S: Se avanza en el fortalecimiento de los factores de generatividad en las familias atendidas				
IS77CJ Sgto ofer flias nna con de in am y/o vul	Porcentaje	100	100	100%
IS77CK Ate ind nna ries d escnna, uso-utili-vin	Número	2.155	1.193	55%
IS77CL Nna w inf call escnna/pobl indí aten sel	Número	600	229	38%
Observación B / S: Se identificó población indígena en sectores de la comuna 14 y 10, evidenciando aumento de la población con necesidades de atención en salud. Por otra parte, bajó la identificación de población en trabajo infantil, pues las acciones del mes de junio se centraron en acciones lúdicas y de movilización ciudadana en el marco del mes de la erradicación del trabajo infantil más que a la identificación de nuevos casos				
IS77CM Arti interi pa fort y sgto d ruta escnna	Porcentaje	100	100	100%

Proyecto PD: 3.2.1.2 Implementación y seguimiento de la Política Pública de Infancia y Adolescencia

Proyecto: 160197 - Implementación y seguimiento de la política pública de infancia y adolescencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 72%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.505 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.505 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.082

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS97BF Nna partic en consej d infan y adolescen	Número	440	391	89%
IS97BG Esp interi d inciden y sgto a la pol púb	Número	55	55	100%
IS97BH Esp inter q inc en plan w tem d inf y ad	Porcentaje	95	84	88%

Proyecto PD: 3.2.1.6 Promoción de derechos y prevención de su vulneración para niños, niñas y adolescentes

Proyecto: 160201 - Prevención de la vulneración y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 69%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.201 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.000

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS01CF Nna atend en procesos de promoc y preven	Número	6.200	3.528	57%
Observación B / S: El mes de junio fue un periodo en el cual los niños, niñas y adolescentes se encontraban en vacaciones académicas, los niños, niñas y adolescentes salen de paseo con sus familias y retoman los encuentros cuando regresan, por lo cual bajó la permanencia dado que hubo además cierre de algunas instituciones educativas donde se desarrollan los encuentros; por tal motivo se debió suspender de manera provisional las acciones.				
IS01CG Actores correspons form en protec de nna	Número	4.000	2.296	57%

Observación B / S: Durante el mes de junio se vincularon a los procesos formativos adultos representantes de familias tanto de los NNA que participan en los encuentros vivenciales como cuidadores y adultos corresponsables. Entre estos adultos corresponsables se cuenta a taxistas, comerciantes, hoteleros, docentes, entre otros.

Programa: 3.2.10 - Familia Medellín
Proyecto PD: 3.2.10.1 Centros Integrales de Familia

Proyecto: 160300 - Desarrollo de la estrategia centros integrales de familia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 79% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.850 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.850 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.850

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

IS00AB Pers atend alrededor d estrate d los cif	Número	9.000	10.011	111%
---	--------	-------	--------	------

Observación B / S: Al mes de junio se han atendido 10.011 personas las cuales se beneficiaron de las oportunidades acercadas a través de los Centros Integrales de Familia, dichas personas además asistieron a encuentros para el Buen Vivir en Familia, Preforos de familia, grupos de apoyo, entre otros.

IS00AC Personas con atención psicosocial	Número	5.310	3.043	57%
--	--------	-------	-------	-----

Observación B / S: Se han acompañado 3.043 personas a nivel psicosocial individual, familiar y grupal, donde se han abordado problemáticas como: consumo de SPA, violencia intrafamiliar, abuso sexual, depresión, problemáticas padres e hijos, comunicación, entre otras.

Proyecto PD: 3.2.10.2 Familia Medellín – Medellín solidaria

Proyecto: 160301 - Fortalecimiento familia medellín - medellín solidaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.189 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.885

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

IS01AA Hog acomp sup de pob ext des medic multi	Número	35.056	20.590	59%
---	--------	--------	--------	-----

Observación B / S: Durante el primer semestre se brindó acompañamiento familiar a 20.590 hogares, dicho acompañamiento permite acercar oportunidades en el marco de las 9 dimensiones del desarrollo humano (ingresos y trabajo, educación, salud, nutrición entre otros) lo anterior, en clave de mejorar las condiciones de vida de los hogares.

IS01AB Pers d ufm q acced a oportun efectiva	Número	120.000	85.012	71%
--	--------	---------	--------	-----

Observación B / S: Durante el primer semestre se acercaron oportunidades a la población de los proyectos de la Unidad Familia Medellín, en el marco de: Afiliación en salud, promoción y prevención en salud, atención jurídica, intermediación y vinculación laboral, educación, formación para el trabajo, entre otras, lo anterior permite el mejoramiento de las condiciones de vida de la población

IS01AC Acc acomp para implementación de la ppf	Número	55	35	64%
--	--------	----	----	-----

Observación B / S: Durante el primer semestre se han generado 35 acciones como: Talleres de socialización de la ruta de articulación para la implementación de la PPF Desarrollo de comités de Familia Asesorías técnicas para actores públicos y privados que participan en la ruta de de articulación. Talleres formativos para el equipo de trabajo de la Unidad Familia Medellín sobre la PPF

Proyecto PD: 3.2.10.3 Volver a casa

Proyecto: 160302 - Desarrollo de la estrategia volver a casa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 69% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 800

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS02AL Pers que generan cto alreled vínculos	Número	1.500	1.078	72%
Observación B / S: Durante el primer semestre se ha posibilitado la generación de conocimiento de vínculos a 1078 personas, tales como: afectivos, jurídicos, económicos, comunitarios, familiares entre otros, dichos espacios permiten la participación activa de la población de la ciudad				
IS02AM Pnas en situa d vulnerab social acompaña	Número	500	335	67%
Observación B / S: Durante el primer semestre se contó con el trabajo articulado con la Unidad Técnica de Niñez, la Unidad de Personas Mayores, el Equipo de Atención y Reparación a Víctimas de la SISFDDHH, y la UPSE, lo que ha permitido el intercambio de población para el proyecto. Adicionalmente, se continúa adelantando acciones de articulación con la Secretaría de Juventud y la Secretaría de Salud.				

Proyecto PD: 3.2.10.4 Mejoramiento institucional y de la infraestructura para la Inclusión Social

Proyecto: 160303 - Mejoramiento institucional y de la infraestructura para la inclusión social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 75%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 154 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 154 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 116

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS03AH Seguimiento y monitoreo obras contratada	Porcentaje	100	52	52%
IS03DA Sedes con diagnóstico gral d mant y adec	Número	60	40	67%
IS03DB Elaboración de presupuestos de obra.	Número	10	6	60%
IS03DC Diagnóstico implementac d requisitos sig	Número	1	1	100%
IS03DD Acompañamiento para mantenimiento de sig	Número	24	0	0%
Observación B / S: Este producto está Planificado para iniciar en el segundo sementre del año.				

Programa: 3.2.2 - Por un envejecimiento y una vejez digna

Proyecto PD: 3.2.2.1 Implementación y seguimiento a la política pública de envejecimiento y vejez

Proyecto: 160214 - Implementación y seguimiento a la política pública de envejecimiento y vejez

Síntesis Proyecto: Eficacia : 31% Ejec. Financiera : 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.486

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS14AH Sesiones articulacion comité tecnico	Número	10	5	50%
Observación B / S: Se llevó a cabo el comité técnico correspondiente al mes de Junio en la sede la Casa del Maestro y en el cual se abordaron las temáticas de Cultura del Envejecimiento del eje 3 en su línea de Educación y Formación.				
IS14AI Seguimiento plan gerontologico	Porcentaje	30	12,8	43%
Observación B / S: Se desarrollaron jornadas de socialización y divulgación del Plan Gerontológico con Secretaria de Educación y Participación y se desarrolló el primer taller formativo con el cabildo mayor				
IS14AJ Accio prom buen trato prev aban	Número	6	0	0%

Observación B / S: Se han venido desarrollando las actividades propias de planeación y gestión logística para llevar a cabo las acciones de buen trato en la última semana del mes de agosto en el marco del mes del adulto mayor, cuyo reporte se verá reflejado en el siguiente trimestre

Proyecto PD: 3.2.2.2 Envejecimiento digno

Proyecto: 120129 - Servicios complementarios al programa colombia mayor

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS29AB Persnas beneficiarias servicio exequial	Número	12.500	12.519	100%

Observación B / S: Este valor estadístico se ejecutó hasta el 09/01/2017 con recursos de reserva 2016

Proyecto: 160217 - Apoyo para el envejecimiento digno

Síntesis Proyecto: Eficacia : 37% Ejec. Financiera : 11%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.563 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.563 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 618

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS17AK Personas mayores beneficiadas días d sol	Número	35.400	0	0%

Observación B / S: A la fecha este valor estadístico no presenta avance, debido a la modificación solicitada por la Secretaria Suministros con respecto a la modalidad de contratación, ya que inicialmente se había considerado la selección abreviada literal H y la cual no fue aprobado y requiere una reasignación de modalidad la cual esta siendo analizada desde el despacho

IS17AL Uniformes para socios club de vida	Número	47.090	0	0%
---	--------	--------	---	----

Observación B / S: En la actualidad se viene realizado el proceso de selección de proveedor mediante la modalidad de selección abreviada, durante el mes de junio se realizo la publicación del proyecto de pliego, cronograma, atención de observaciones del mismo y publicación del pliego definitivo.

IS17AM Pers aten ciudadano amautta	Número	52.000	38.365	74%
------------------------------------	--------	--------	--------	-----

Observación B / S: Durante el presente período se continúa con el proceso de atención y orientación al ciudadano en la sede externa Amautta. Apoyo económico es el tema de mayor consulta y orientación.

IS17AN Apoyo economico	Número	1.150	1.014	88%
------------------------	--------	-------	-------	-----

IS17AO Personas mayores benef servicio exequial	Número	13.000	12.602	97%
---	--------	--------	--------	-----

Observación B / S: Durante el presente periodo se han beneficiado de la afiliación al servicio Exequial 12602 personas mayores, de la cuales 10 fueron afiliadas durante el mes de Junio.

IS17AP Asambleas gerontologicas	Número	4.000	1.032	26%
---------------------------------	--------	-------	-------	-----

Observación B / S: Se llevó a cabo la primera asamblea gerontológica el 6/06/2017 en Teatro Lido con la asistencia de 1.032 personas.

IS17AQ Cuidadores personas mayores capacitados	Número	30	0	0%
--	--------	----	---	----

Observación B / S: Se viene desarrollo la etapa precontractual en cual se atendido los ajustes y observaciones de la secretaria de suministros y servicios. Se tiene planeado dar inicio al contrato en la tercera semana del mes Julio y comenzar con el componente de verificación del requisitos en la ultima semana del mismo mes. Finalmente se viene desarrollando la preselección de los posibles cuidadores para ser capacitados.

IS17CI Personas mayores benef de servic inhuma	Número	39	4	10%
--	--------	----	---	-----

Observación B / S: Durante el presente periodo se dio inicio al contrato en cual se oferta el servicio de inhumación dirigido a personas mayores fallecidas que no cuentan con los recursos para contar con un entierro digno, para el mes de junio se realizaron 4 inhumaciones.

Proyecto PD: 3.2.2.3 Atención y acompañamiento integral para personas mayores

Proyecto: 120127 - Atención diurna en centro vida**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 365 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 365**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS27DE Adecuaciones centros vida	Número	3	2	67%

Proyecto: 120132 - Red de asistencia gerontológica en modelos semi institucionalizados**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 664 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 664**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS32AA Personas institucionalizadas en colonia	Número	250	250	100%
Observación B / S: Este valor estadístico se ejecutó hasta el 09/01/2017 con recursos de reserva 2016				
IS32AC Personas atendidas en dormitorio	Número	250	221	88%
IS32AF Pers may atend en instit larga estancia	Personas	827	834	101%
Observación B / S: Este valor estadístico se ejecutó hasta el 09/01/2017 con recursos de reserva 2016				
IS32DI At int pnas may sit aban-en larg est-viv	Número	30	31	103%
Observación B / S: Este valor estadístico se ejecutó hasta el 09/01/2017 con recursos de reserva 2016, además este servicio se articuló con la red de hogares gerontológicos.				
IS32DJ At int pnas may hab d o en sit call-acar	Número	75	53	71%
Observación B / S: Este valor estadístico se ejecutó con reursos de reserva 2016 hasta el 09/01/2017.				

La meta fue proyecta para ser ejecutada durante el año 2017, por decisiones del despacho los beneficiarios de este valor estadístico fueron incorporados al modelo de atención de dormitorio social, dando por finalizado el servicio el 17/03/2017

Proyecto: 160218 - Apoyo y acompañamiento integral para personas mayores**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 72%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 28.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 39.527 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 28.280**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS18AF Personas mayores atendidos red hogares	Número	1.165	940	81%
Observación B / S: En 857 cupos contratados se han atendido un total de 940 personas mayores de las cuales 9 ingresaron al modelo durante el mes de Junio.				
IS18AG Person mayor atendid colonia belencito	Número	285	262	92%
Observación B / S: En 250 cupos contratados se han atendido un total de 262 personas mayores, durante el mes junio no se presentaron ingreso de nuevos usuarios al modelo de larga estancia en la colonia belencito.				
IS18AH Dormitorio social	Número	490	482	98%
Observación B / S: En 360 cupos contratados se han atendido un total de 482 personas mayores de las cuales 16 ingresaron al modelo durante el mes de Junio.				
IS18AK Perso may atendidas centro vida	Número	2.970	1.948	66%
IS18AL Centro vida funcionando	Número	28	28	100%

Observación B / S: Durante el presente periodo se dio la apertura del centro vida comuna 9.

A la fecha se da cumplimiento a la meta establecida de contar con 28 centros vida funcionando en cada comuna y correjimiento el numero se aumeta ya que en comunas coma la 1, 7, 13 y 60 se cuenta con dos centros vida funcionando y en el caso de la comuna 8 se cuenta con tres sedes satalites.

IS18CN At int pnas may hab d o en sit call-aca Número 75 61 81%

Observación B / S: Este valor estadístico finalizó en el mes de Marzo (16/03/2017), ya que los beneficiarios de este servicio se articularon al modelo nocturno por las características de la población beneficiarias.

No fue posible alcanzar la meta, ya que esta fue proyectada para cumplirse durante el año; con la fución de ambos servicios (Larga estancia y Nocturno) y traslado de los usuarios al modelo nocturno se dió por finalizado el servicio y se reporta el número de personas atendidas de enero a marzo.

Programa: 3.2.5 - Atención e inclusión social para el habitante de calle

Proyecto PD: 3.2.5.1 Política pública social para los habitantes de calle

Proyecto: 160219 - Implementación política pública social para los habitantes de calle

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 150

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS19AE Plan estra política pub formu y aprobado	Porcentaje	100	44,1	44%

Observación B / S: Se presentaron avances en las líneas de acción del Plan Estrategico del Comité Interistitucional de la Política Pública; las Secretarías de Educación, Salud, el INDER. Aún no presenta sus correcciones las Secretarías de Medio Ambiente, Cultura Ciudadana y Secretaría de Seguridad y Convivencia.

Proyecto PD: 3.2.5.2 Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle

Proyecto: 120133 - Sistema de atención al habitante de la calle adulto

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 486 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 486

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS33DL Personas con atención básica	Número	741	741	100%
IS33DN Personas con atención básica en albergue	Número	300	300	100%
IS33DP Personas en proce resocialización granja	Número	47	47	100%

Proyecto: 120134 - Atención integral psicosocial a la poblacion crónica en calle con discapacidad física y/o mental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 229 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 229

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS34DH Hab calle trastorno mental aten integral	Número	266	266	100%

Observación B / S: Este proyecto prestó servicios con recursos de reserva 2016 del 1 al 4 de enero de 2017.

Proyecto: 160220 - Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle

Síntesis Proyecto: Eficacia : 74% Ejec. Financiera : 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 25.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22.158 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21.018

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS20AB Personas con atención básica	Número	6.050	5.097	84%
Observación B / S: El promedio de atenciones diarios en los Centros de Básica es el siguiente: Centro de Básica 1: día: 290 personas, noche: 125 personas Centro de Básica 2: día: 350 personas, noche: 310 personas				
IS20AC Pers con atención básica en albergue	Número	450	399	89%
IS20AD Pers en procesos de resocialización	Número	250	238	95%
IS20AE Pers q superan su situación de calle	Número	120	67	56%
IS20AF Per hab calle con aten básica-inhumación	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: El 100% corresponde a 8 personas inhumadas				
IS20AG Hab calle trastorno mental aten integral	Número	295	278	94%
IS20CI Per ex hab d call cap en hab pa la vida	Número	100	0	0%
Observación B / S: Este valor estadístico responde a una estrategia iniciada en el mes de junio y su avance se reportará en el segundo semestre del año.				

Proyecto PD: 3.2.5.3 Granjas agropecuarias comunitarias para habitantes en situación de calle: la vida desde otro lugar

Proyecto: 160221 - Implementación granjas agropecuarias comunitarias para habitantes en situación de calle: la vida desde otro lugar

Síntesis Proyecto: Eficacia : 51% Ejec. Financiera : 66%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.932 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.273

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS21AC Personas en proce resocialización granja	Número	150	100	67%
IS21AD Personas q superan su situación de calle	Número	95	34	36%

Programa: 3.2.6 - Seguridad alimentaria y nutricional

Proyecto PD: 3.2.6.1 Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Proyecto: 160222 - Implementación política pública de seguridad alimentaria y nutricional

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.344 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.344 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.344

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS22AC Polít púb segd alim nutri monitor evalua	Porcentaje	20	13,3	67%
Observación B / S: Se continúa con las acciones del observatorio de seguridad alimentaria, el sistema de monitoreo y evaluación y el programa de gestión social y participación ciudadana.				

Proyecto PD: 3.2.6.2 Acceso a los alimentos y complementación alimentaria**Proyecto:** 120120 - Nutrición escolar vaso de leche**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.961 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.961**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS20AA Escolares atendidos con complemento alim	Número	80.000	81.258	102%

Observación B / S: Las atenciones con recursos de reserva terminaron en el mes de febrero.

Proyecto: 160223 - Servicio de comedores comunitarios para personas mayores**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 59% Ejec. Financiera : 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.400**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS23AE Hogar víct desp forz compl alimen	Número	1.000	178	18%
IS23CD Comedores comunitarios pa pe may funcion	Número	21	21	100%

Observación B / S: Durante el mes de junio se comenzó con las atenciones a 178 familias pertenecientes a población víctima, con la entrega de paquetes alimentarios.

Observación B / S: Durante el mes de junio se continúa con la atención en los 21 comedores para personas mayores que vienen funcionando.

Proyecto: 160224 - Apoyo alimentario para personas mayores**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 5%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS24AB Adul may atend compl alim educ nutri soc	Número	5.000	0	0%
IS24AC Adul may ate com alimen edu nut soc desp	Porcentaje	100	0	0%

Observación B / S: Aún no empiezan las atenciones para este programa. El contrato se relizará por subasta inversa y se encuentra en la etapa de evaluación de propuestas.

Observación B / S: Aún no empiezan las atenciones para este programa. El contrato se realizará por subasta inversa y se encuentra en la etapa de evaluación de propuestas.

Proyecto: 160225 - Apoyo nutricional en edad escolar**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 89%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 77.951 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 85.445 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 75.725**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS25AD Escol aten compl alim per esc desp	Porcentaje	100	100	100%
IS25AE Escol atend compl alimen fines sem vacac	Número	7.000	4.868	70%

Observación B / S: El 100% corresponde a 6.657 NNA

IS25AF	Escol atendi con complem alim-rest escol	Número	175.000	169.554	97%
IS25AG	Escol atendi con complem alim-vaso d lec	Número	85.000	82.299	97%

Proyecto: 160227 - Apoyo nutricional para familias vulnerables

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.100

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS27AD Pers atend comp alimen educ nutri soc	Número	10.000	9.329	93%

Proyecto: 160235 - Apoyo nutricional para mujeres gestantes y lactantes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.900

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS35AI Muj gest lact aten vigil alim educ nutri	Número	12.000	7.578	63%
IS35AJ Muj gest lac aten vigi alim edu nutr des	Porcentaje	100	100	100%

Proyecto: 160672 - Apoyo nutricional para la primera infancia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 85%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 17.523 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.836 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.203

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS72AF Niñ niñas men 6 años atend comp alim	Número	50.000	43.159	86%
IS72AG Niñ niñ men 6 años aten compl alim despl	Porcentaje	100	100	100%
IS72AH Niñ niñ men 6 años evalu nutri	Número	50.000	39.544	79%

Proyecto PD: 3.2.6.3 Nutrición para la salud

Proyecto: 160237 - Fortalecimiento de la nutrición para la salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 39% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 739 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 739 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 739

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS37AG Pers capac tem alime nutri	Número	50.000	19.455	39%

Proyecto PD: 3.2.6.4 Huertas para el abastecimiento de alimentos

Proyecto: 160238 - Implementación de las huertas como estrategia de seguridad alimentaria y contención del borde**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 340 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 340 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 340**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS38AH Huert autocon comerc estab	Número	550	239	43%

Observación B / S: Se continúa con asistencia técnica e insumos y con la implementación de nuevas huertas.**Programa:** 3.2.7 - Ser Capaz: Inclusión social de las personas con discapacidad**Proyecto PD:** 3.2.7.1 Consolidación de la Política Pública de discapacidad - Ejercicio de derechos**Proyecto: 160240 - Consolidación de la política pública de discapacidad - ejercicio de derechos****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 27% Ejec. Financiera : 68%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 733 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 500**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS40AD Actores participa espacio garantia dchos	Número	1.050	307	29%

Observación B / S: Las acciones de este producto iniciaron en el mes de mayo.

IS40DG Monitoreo de la política pca de discap	Porcentaje	100	25	25%
---	------------	-----	----	-----

Observación B / S: El proyecto inicia la segunda fase de las cuatro que componen la actividad: Acopio de información para el monitoreo de la política pública. Se continúa con el avance de acuerdo al cronograma establecido.**Proyecto PD:** 3.2.7.2 Inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadores**Proyecto: 120147 - Ser capaz una estrategia para la inclusión social****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 212 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 212**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS47DJ Pers atendid con emprendimi a cuidadores	Personas	163	162	99%

Proyecto: 160244 - Fortalecimiento de la inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadores**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 21% Ejec. Financiera : 71%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.947 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.850 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.419**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS44AB Pers con disc en proces de hab y rehab	Número	1.082	579	54%

IS44AC	Pcd capacit en habilidades para la vida	Número	120	0	0%
Observación B / S: El proyecto inició el día 6 de junio, hace parte de la Escuela para la Inclusión, ejecutado mediante convenio interadministrativo con el ITM, en donde hacen parte también la Unidad de Víctimas y UPSE. Para el presente mes no se refleja avance ya que se encuentra en la etapa de aprestamiento.					
IS44AE	Pers con disc benef apoyo económico	Número	1.361	259	19%
Observación B / S: En el mes de junio, se efectuó el primer pago de los 5 programados					
IS44AG	Pers con disc proc forma y dllo de compe	Número	108	0	0%
Observación B / S: Pendiente por iniciar - Se encuentra en etapa preparatoria. Se presentan observaciones a la propuesta de Interactuar por parte de la Secretaría, lo cual lleva a actualizar estudios previos.					
IS44AI	Pers con disc fami y cuid en aten psico	Número	2.250	751	33%

Programa: 3.2.8 - Diversidad sexual e identidades de género

Proyecto PD: 3.2.8.1 Reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género desde una pedagogía de la inclusión

Proyecto: 120212 - Diversidad sexual y de género - en medellín vivo y convivio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 248 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 248

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS12AE Pers sensibilizadas diversidad sexual y	Número	1.778	1.781	100%
Observación B / S: Este proyecto presenta ampliación del contrato 4600066633 del 10 de enero al 31 de marzo de 2017, esta ampliación se da con recursos de reserva 2016.				
IS12CM Per. Igbti orien labor-juríd y/o psicoso	Número	36	36	100%
IS12CO Empresas sensi diver sexual/id género	Número	5	5	100%
IS12CP Ins educat sensi diver sexual/id género	Número	30	30	100%

Proyecto: 160247 - Implementación de una pedagogía para el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 8%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 62

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS47AP Pob Igtbi senti discri iden gen/orie sex	Porcentaje	49,4	0	0%
IS47AQ Pers sensi divers sex y equidad de géne	Número	3.500	0	0%
IS47AR Per. Igbti orien labor-juríd y/o psicoso	Número	300	0	0%
IS47AS Empresas sensi diver sexual/iden género	Número	15	0	0%
IS47AT Ins educat sensi diver sexual/ident gene	Número	50	0	0%

Observación Proyecto: El proyecto se encuentra en etapa precontractual, la carpeta ya fue entregada a la Secretaría de Suministros y Servicios, se espera aprobación para iniciar proceso contractual en el mes de Julio.

Proyecto PD: 3.2.8.2 Implementación y seguimiento de la política pública para el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género

Proyecto: 160249 - Implementación y seguimiento de la política pública para el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de

Síntesis Proyecto: Eficacia : 5% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 64 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 64 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS49AO Reuniones del comité municipal de div sex	Número	4	1	25%
IS49AP Territ grup/colec lgbti forta ejer dere.	Número	15	0	0%
IS49AQ Plan estra de poli pub formul y aprobado	Porcentaje	100	0	0%
IS49AR Plan estrate polit pública implementado	Porcentaje	4	0	0%
IS49AS Monitoreo y evaluación poli pub implemen	Porcentaje	4	0	0%

Observación Proyecto: El proyecto se encuentra en etapa precontractual, la carpeta ya fue entregada a la Secretaría de Suministros y Servicios, se espera aprobación para iniciar proceso contractual en el mes de Julio.

Programa: 3.2.9 - Diversidad étnica

Proyecto PD: 3.2.9.1 Transversalización y educación en asuntos étnicos

Proyecto: 160252 - Implementación estrategia de transversalización y educación en asuntos étnicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 19%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 288 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 288 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 54

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS52AA Implem enfoque etnico depend admón munic	Número	10	0	0%
IS52AB Instit educati sensibi en etnoeducación.	Número	20	0	0%

Observación Proyecto: Las acciones de este proyecto se realizarán a través de un convenio de cooperación internacional el cual se encuentra en etapa precontractual y revisión y aprobación de la Secretaría General y la Secretaría de Suministros y Servicios.

Proyecto PD: 3.2.9.2 Reconocimiento y garantía de derechos de los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros en Medellín

Proyecto: 160256 - Identificación y garantía de derechos de los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros en medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 2% Ejec. Financiera : 26%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.050 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.050 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 278

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS56AI Flías afro desar capac des talen y saber	Número	400	0	0%
IS56AJ Niñ, adol afro des capac,comp tal y sabe	Número	400	0	0%
IS56AK Proces afrou y conm p afirm ident etnica	Número	7	1	14%
Observación B / S: Se ejecuta 1 de los 7 procesos a través de contrato suscrito con Plaza Mayor, mediante el cual se dllan las activ de la Semana de la Afrocolombianidad del 19 al 31 de mayo con activ como: Feria de Emprendedores Afro, Minga Afro, Talleres Etnoeducativos, Preformance inspirado en la obra El Gran Putas, premios changó y Familias y esfuerzos colectivos, impactando alrededor de 2.600 personas.				
IS56AL Actu reg d org de base afro de medellín	Número	1	0	0%

IS56AN	Inic afrou for des lín estra pol púb afr	Número	9	0	0%
IS56AO	Doc dx sociodemo y de ddhh, primera fase	Número	1	0	0%
IS56AQ	Politica pública afrodescen reglamentada	Número	1	0	0%
IS56AR	Form plan municipal afrode-primera fase.	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: Las acciones de este proyecto se realizarán a través de un convenio de cooperación internacional el cual se encuentra en etapa precontractual y revisión y aprobación de la Secretaría General y la Secretaría de Suministros y Servicios.

Proyecto PD: 3.2.9.3 Reconocimiento y garantía de derechos de los pueblos indígenas en Medellín

Proyecto: 160260 - Identificación y garantía de derechos de los pueblos indígenas en medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 66%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 527

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS60AM Form política públi indíge primera fase	Número	1	0	0%
Observación B / S: El proceso mediante el cual se ejecutará esta acción se encuentra en etapa precontractual.				
IS60AN Pers participan concert pol púb indigena	Número	200	0	0%
Observación B / S: El proceso mediante el cual se ejecutará esta acción se encuentra en etapa precontractual.				
IS60AO Docum formulad del plan de aten psicococ	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se avanza en la ejecución del contrato 4600070137 de 2017 suscrito con La Universidad de Antioquia, Parque de la Vida, y consecuente a ello en la revisión documental como elemento fundamental para la construcción del Plan de Atención Psicosocial.				
IS60AP Famil benef con implem plan atenc psicoc	Número	100	0	0%
Observación B / S: Aunque hace parte de los entregables del contrato 4600070137 de 2017, aún no se reporta avance de este valor estadístico dado que esta intervención se realiza en articulación con Familias Medellín y el aplicativo para dar inicio a las intervenciones solo estuvo disponible a partir del 21 de junio y actualmente esta siendo instalado en los equipos portátiles que dispone la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos.				
IS60AR Inicia desar marc comp plan de aten psic	Número	11	0	0%
Observación B / S: Este componente será ejecutado en proximos meses en el contrato 4600070137 de 2017.				
IS60AS Conm celeb indí visib pa afirm iden étni	Número	2	0	0%
Observación B / S: El proceso mediante el cual se ejecutará esta acción se encuentra en etapa precontractual.				

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.3 - Medellín gestiona el riesgo

Programa: 7.3.3 - Manejo eficaz de desastres

Proyecto PD: 7.3.3.2 Atención de emergencias sociales, naturales y antrópicas

Proyecto: 160305 - Asistencia social de emergencias naturales y antrópicas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 82%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.678 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.000

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS05AE Familias con ayuda humanitaria	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: El 100% corresponde a 319 familias beneficiadas con ayuda humanitaria				

IS05AF	Pers beneficiadas en modalidad albergue	Número	350	157	45%
IS05AG	Pers aten telef emergencia social y fami	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: Se han atendido 1.005 personas de manera telefónica por eventos de emergencia. En total se han atendido 6.150 personas en 2017.					
IS05AH	Per beneficiadas del plan retorno	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: El 100% corresponde a 288 Planes Retorno realizados.					
IS05AI	Fam. rie/emerg natur/antrop acomp social	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: El 100% corresponde a 1.054 familias.					

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.3 - Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio

Programa: 2.3.1 - Promoción de los derechos humanos

Proyecto PD: 2.3.1.2 Pedagogía para la cultura de los Derechos Humanos

Proyecto: 160594 - 17pp99-formación, promoción y fortalecimiento en derechos humanos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.495 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.875 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS94AV Observatorio de ddhh con enfoq poblac c2	Número	1	0	0%
IS94AW Forta/mov d tej soc der con red d act c2	Número	1	0	0%
IS94AX Fortalecimiento a la mesa de ddhh de c4	Número	1	0	0%
IS94AY Sens/int en pob ries d vul y tra pnas c4	Número	1	0	0%
IS94AZ Promoción de los ddhh y convivencia c6	Número	1	0	0%
IS94BA Mantenim y renovac d redes eléctricas c6	Número	1	0	0%
IS94BB Mantenimien y renovac d obras civiles c6	Número	1	0	0%
IS94BC Act/imp plan seg y con enf pob y ddhh c8	Número	1	0	0%
IS94BD Sis d conv/com pa pro ddhh, sex y juv c9	Número	1	0	0%
IS94BE Promoción y sensibilización en ddhh c12	Número	1	0	0%
IS94BF Campaña comunicacional c12	Número	1	0	0%
IS94BG Seminario paz territorial c12	Número	1	0	0%
IS94BH Cartografía en ddhh c12	Número	1	0	0%
IS94BI Fortalecimiento a la mesa comuna 5	Número	1	0	0%
IS94BJ Evento semana por los ddhh c12	Número	1	0	0%
IS94BK Fortalecimiento al colectivo de ddhh c12	Número	1	0	0%
IS94BL Couching profesional con enfasi ddhh c12	Número	1	0	0%
IS94BM Jorna sociojuríd con enfasis en ddhh c12	Número	1	0	0%
IS94BN Semilleros en ddhh para niños/niñas c12	Número	1	0	0%
IS94BO Ddhh y convivencia en la c13	Número	1	0	0%
IS94BP Prom/div/prev ddhh pob rie d vul-vic c15	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: Las actividades de este proyecto se realizarán a través de una Licitación Pública la cual se encuentra en proceso de adjudicación

Programa: 2.3.5 - Atención a víctimas del conflicto armado
Proyecto PD: 2.3.5.1 Restablecimiento y reparación a víctimas del conflicto armado
Proyecto: 160595 - 17pp99-apoyo a víctimas del conflicto armado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 120 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 120 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 120

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS95BB Líd y/o org víc 3 em soc y pol-ac pro pa	Número	25	0	0%
IS95BC Estr conme fecha embl mem hist comuna 13	Porcentaje	100	0	0%

Observación Proyecto: Las acciones de este proyecto se encuentran en etapa precontractual y el avance se verá reflejado en el segundo semestre del año.

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social
Reto: 3.2 - Medellín Digna
Programa: 3.2.1 - Medellín para la niñez y la adolescencia
Proyecto PD: 3.2.1.1 Atención de niños y niñas en situación de vulneración de derechos
Proyecto: 160596 - 17pp99-prevención y promoción de los derechos para la niñez y la adolescencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 564 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 564 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 564

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS96AB Acompañamiento familiar en la comuna 7	Número	115	53	46%
Observación B / S: En las familias vinculadas durante el mes de junio, se evidencia motivación e interés por el acompañamiento, contando con la participación activa durante las visitas de acercamiento y diagnóstico sociofamiliar.				
IS96AC Prevención de la escnna en la comuna 7	Número	640	72	11%
Observación B / S: Se logró establecer agenda de trabajo con algunas instituciones educativas de las priorizadas dando inicio a los encuentros formativos y el inicio de murales. Hay que anotar que el paro de docentes afectó el cumplimiento de la agenda prevista				
IS96AD Nna aten en proc d prom y prev-comuna 11	Número	80	19	24%
Observación B / S: Se están intencionando estrategias de convocatoria y fortalecimiento de la cobertura para dar así cumplimiento a la meta propuesta. Así mismo, se están generando estrategias comunitarias para generar ambientes protectores para los NNA				
IS96AE Nna aten en proc d prom y prev-comuna 13	Número	64	64	100%
Observación B / S: Se evidencia como aspecto cualitativo el desarrollo y fortalecimiento de capacidades para afrontar las situaciones difíciles que les permitan alcanzar niveles de bienestar y de cuidado de niños y niñas; esto ha permitido, también, fortalecer prácticas para el autocuidado.				
IS96AF Nna aten en proc d prom y prev-comuna 15	Número	80	62	78%
Observación B / S: Se cuenta con grupos consolidados en los cuales se promueven los derechos de los NNA. Así mismo, se están generando estrategias comunitarias para generar ambientes protectores para los NNA.				
IS96AG Nna aten en proc d prom y prev-comuna 70	Número	80	64	80%

Observación B / S: Se fortalece en los NNA habilidades sociales; asimismo, se están generando estrategias comunitarias de acompañamiento para generar ambientes protectores para los NNA.

Programa: 3.2.10 - Familia Medellín
Proyecto PD: 3.2.10. Centros Integrales de Familia
Proyecto: 160597 - 17pp99-apoyo psicosocial y familiar

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 72%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS97BE Pers con acomp psicosoc grupal psicofor	Número	86	0	0%

Observación B / S: La meta continúa su reporte en cero, pues el proyecto se encuentra en la contratación del personal necesario para su ejecución.

Programa: 3.2.2 - Por un envejecimiento y una vejez digna
Proyecto PD: 3.2.2.2 Envejecimiento digno
Proyecto: 150309 - 16pp10-fortalecimiento integral a grupos poblacionales la candelaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 58 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 58

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS09DD Per may partic en proce forma infor-ingl	Personas	39	39	100%
IS09DE Uniformes entregados a personas mayores.	Número	220	220	100%
IS09DI Fortalecimiento organizaciones afrocolom	Organizaci	5	0	0%

Observación B / S: El equipo de supervisión esta en la revisión del informe definitivo entregado por la OIA anotando que se han hecho requerimientos y solicitado aclaraciones adicionales a la OIA.

Proyecto: 150331 - 16pp4-atención social e integral a la población vulnerable en aranjuez

Síntesis Proyecto: Eficacia : 62% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 94 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 94

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS31DA Procesos de fortalecim a población lgbti	Eventos	6	6	100%
IS31DH Emprendi a ciudadanos de pers con discap	Personas	15	13	87%
IS31DI Enfo etnodes interge y genero afrocolomb	Personas	20	0	0%

Observación B / S: El equipo de supervisión está en la revisión del informe definitivo entregado por la OIA anotando que se han hecho requerimientos y solicitado aclaraciones adicionales a la OIA.

Observación Proyecto: Este proyecto se ejecuto con recursos de reserva y ampliación del contrato N° 4600066633 que se ejecutó del del 10 de enero al 31 de marzo de 2017.

Proyecto: 150332 - 16pp5-atención social a la población vulnerable en castilla**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS32DC Cuida q participan en capa, compen y seg	Personas	26	26	100%
IS32DG Emprendi a ciudadanos de pers con discap	Personas	10	10	100%

Proyecto: 150333 - 16pp6-atención social a la población vulnerable del doce de octubre**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS33DC Per may q par cap a la mesa gerontológic	Personas	40	31	78%

Observación B / S: La aceptación de las personas mayores convocados no fue la esperada, lo cual no permitio dar cumplimiento a la meta programada a pesar que la convocatoria fue permanente tanto por el operador como por parte de la comisión.**Proyecto: 150338 - 16pp9-fortalecimiento integral a grupos poblacionales de buenos aires****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS38DG Ayudas técnicas para pnas en situa d dis	Personas	55	55	100%

Proyecto: 150340 - 16pp11-fortalecimiento integral a grupos poblacionales de laureles-estadio**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 156 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 156**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS40DA Cuida q participan en capa, compen y seg	Personas	71	71	100%
IS40DC Per may partic en proce forma infor-ingl	Personas	65	65	100%
IS40DE Per may q par cap a la mesa gerontológic	Personas	37	34	92%

Observación B / S: La aceptación de las personas mayores convocados no fue la esperada, lo cual no permitio dar cumplimiento a la meta programada a pesar que la convocatoria fue permanente tanto por el operador como por parte de la comisión.**Proyecto: 150341 - 16pp12-fortalecimiento integral a grupos poblacionales de la américa****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 86% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 59 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 59

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS41DC Cuida q participan en capa, compen y seg	Personas	15	15	100%
IS41DD Pers may q part en forta a clubes de vid	Personas	200	117	59%
Observación B / S: La aceptación de las personas mayores convocados no fue la esperada, lo cual no permitio dar cumplimiento a la meta programada a pesar que la convocatoria fue permanente tanto por el operador como por parte de la comisión.				
IS41DF Formación en lengua de señas	Personas	14	14	100%

Proyecto: 150348 - 16pp15-atención a la población en situación de riesgo y vulnerabilidad de guayabal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS48DE Ayudas técnicas para pnsas en situa d dis	Personas	15	15	100%

Proyecto: 150350 - 16pp50-atención social a la población en situación de riesgo y vulnerabilidad de san sebastián de palmitas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS50DD Emprendi a ciudadanos de pers con discap	Personas	10	10	100%

Proyecto: 150353 - 16pp80-atención social a la población en situación de riesgo y vulnerabilidad de san antonio de prado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS53DA Pro sen div sex, iden género y pob lgtbi	Eventos	6	6	100%
Observación B / S: Este proyecto se ejecutó con recursos de reserva y ampliación del contrato N° 4600066633 que se ejecutó del 10 de enero al 31 de marzo de 2017.				
IS53DF Formación en lengua de señas	Personas	20	20	100%

Proyecto: 160599 - 17pp6-adecuación de sedes de clubes de vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 88 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 88 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Observación B / S: La licitación pública se encuentra en etapa de evaluación de propuestas entregadas por los proponentes. La audiencia de adjudicación está programada para el 14 de agosto de 2017.

Proyecto: 160601 - 17pp99-asistencia social para la población adulta mayor

Síntesis Proyecto:

Eficacia : 38%

Ejec. Financiera : 30%

Información Financiera:

Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.030

Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.820

Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.333

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS01CH Apoyo econ a pers mayores de la c 1	Número	165	162	98%
IS01CI Apoyo econ a pers mayores de la c 3	Número	607	591	97%
IS01CJ Apoyo econ a pers mayores de la comuna 4	Número	633	615	97%
IS01CK Apoyo econ a pers mayores de la c 5	Número	416	403	97%
IS01CL Apoyo econ a pers mayores de la c 6	Número	397	388	98%
IS01CM Apoyo econ a pers mayores de la c 7	Número	400	392	98%
IS01CN Apoyo econ a pers mayores de la c 8	Número	235	222	94%
IS01CO Apoyo econ a pers mayores de la c 10	Número	96	94	98%
IS01CP Apoyo econ a pers mayores de la c 11	Número	30	29	97%
IS01CQ Apoyo econ a pers mayores de la c 13	Número	313	304	97%
IS01CR Apoyo econ a pers mayores de la c 14	Número	275	226	82%
IS01CS Apoyo econ a pers mayores de la c 15	Número	431	418	97%
IS01CT Apoyo econ a pers mayores de la c 16	Número	27	24	89%
IS01CU Apoyo econ a pers mayores de la c 50	Número	220	218	99%
IS01CV Apoyo econ a pers mayores de la c 70	Número	195	196	101%
IS01CW Apoyo econ a pers mayores de la c 80	Número	360	356	99%
IS01CX Capacita miembros mesa gerontológica c11	Número	50	29	58%
Observación B / S: Se dió inicio al proceso de capacitación en Políticas Públicas con 29 miembros de las juntas directivas de los clubes de vida de la comuna. Se continuó con el proceso de convocatoria y matrículas para dar cumplimiento a la meta				
IS01CY Fortalecimiento organ clubes vida c13	Número	1	0	0%
Observación B / S: En el mes de junio se realizó el proceso de concertación y estructuración del componente académico. Se tiene programado realizar el evento en el mes de agosto.				
IS01CZ Formación cuidadores per mayor de la c2	Número	20	0	0%
Observación B / S: Se continua con la etapa precontractual con la secretaria de suministros y servicios, de acuerdo a la directriz dada por suministros se vio la necesidad de modificar la modalidad de contratación de selección abreviada literal H por Menor cuantía, lo cual retrasa la planeación inicial Se tiene programado publicar en el proceso para la selección del proveedor en la primera semana del julio				
IS01DA Formación cuidadores per mayor de la c3	Número	25	0	0%
Observación B / S: Se continua con la etapa precontractual con la secretaria de suministros y servicios, de acuerdo a la directriz dada por suministros se vio la necesidad de modificar la modalidad de contratación de selección abreviada literal H por Menor cuantía, lo cual retrasa la planeación inicial Se tiene programado publicar en el proceso para la selección del proveedor en la primera semana del julio				
IS01DB Formación cuidadores per mayor de la c5	Número	15	0	0%
Observación B / S: Se continua con la etapa precontractual con la secretaria de suministros y servicios, de acuerdo a la directriz dada por suministros se vio la necesidad de modificar la modalidad de contratación de selección abreviada literal H por Menor cuantía, lo cual retrasa la planeación inicial Se tiene programado publicar en el proceso para la selección del proveedor en la primera semana del julio				
IS01DC Formación cuidadores per mayor de la c7	Número	12	0	0%

	Observación B / S: Se continua con la etapa precontractual con la secretaria de suministros y servicios, de acuerdo a la directriz dada por suministros se vio la necesidad de modificar la modalidad de contratación de selección abreviada literal H por Menor cuantía, lo cual retrasa la planeación inicial Se tiene programado publicar en el proceso para la selección del proveedor en la primera semana del julio			
IS01DD	Formación cuidadores per mayor de la c8	Número	10	0 0%
	Observación B / S: Se continua con la etapa precontractual con la secretaria de suministros y servicios, de acuerdo a la directriz dada por suministros se vio la necesidad de modificar la modalidad de contratación de selección abreviada literal H por Menor cuantía, lo cual retrasa la planeación inicial Se tiene programado publicar en el proceso para la selección del proveedor en la primera semana del julio			
IS01DE	Formación cuidadores per mayo de la c10	Número	5	0 0%
	Observación B / S: Se continua con la etapa precontractual con la secretaria de suministros y servicios, de acuerdo a la directriz dada por suministros se vio la necesidad de modificar la modalidad de contratación de selección abreviada literal H por Menor cuantía, lo cual retrasa la planeación inicial Se tiene programado publicar en el proceso para la selección del proveedor en la primera semana del julio			
IS01DF	Formación cuidadores per mayo de la c11	Número	15	0 0%
	Observación B / S: Se continua con la etapa precontractual con la secretaria de suministros y servicios, de acuerdo a la directriz dada por suministros se vio la necesidad de modificar la modalidad de contratación de selección abreviada literal H por Menor cuantía, lo cual retrasa la planeación inicial Se tiene programado publicar en el proceso para la selección del proveedor en la primera semana del julio			
IS01DG	Formación cuidadores per mayo de la c13	Número	40	0 0%
	Observación B / S: Se continua con la etapa precontractual con la secretaria de suministros y servicios, de acuerdo a la directriz dada por suministros se vio la necesidad de modificar la modalidad de contratación de selección abreviada literal H por Menor cuantía, lo cual retrasa la planeación inicial Se tiene programado publicar en el proceso para la selección del proveedor en la primera semana del julio			
IS01DH	Capacita manualidades per mayo de la c6	Número	661	0 0%
	Observación B / S: Se continua con la etapa precontractual con la secretaria de suministros y servicios, de acuerdo a la directriz dada por suministros se vio la necesidad de modificar la modalidad de contratación de selección abreviada literal H por Menor cuantía, lo cual retrasa la planeación inicial Se tiene programado publicar en el proceso para la selección del proveedor en la primera semana del julio			
IS01DI	Capacita manualidades per mayode la c50	Número	34	0 0%
	Observación B / S: Se continua con la etapa precontractual con la secretaria de suministros y servicios, de acuerdo a la directriz dada por suministros se vio la necesidad de modificar la modalidad de contratación de selección abreviada literal H por Menor cuantía, lo cual retrasa la planeación inicial Se tiene programado publicar en el proceso para la selección del proveedor en la primera semana del julio			
IS01DJ	Capa manu per may no soci club d vida c7	Número	82	0 0%
	Observación B / S: Se continua con la etapa precontractual con la secretaria de suministros y servicios, de acuerdo a la directriz dada por suministros se vio la necesidad de modificar la modalidad de contratación de selección abreviada literal H por Menor cuantía, lo cual retrasa la planeación inicial Se tiene programado publicar en el proceso para la selección del proveedor en la primera semana del julio			
IS01DK	Capa man per may no soci club vida c10	Número	50	0 0%
	Observación B / S: Se continua con la etapa precontractual con la secretaria de suministros y servicios, de acuerdo a la directriz dada por suministros se vio la necesidad de modificar la modalidad de contratación de selección abreviada literal H por Menor cuantía, lo cual retrasa la planeación inicial Se tiene programado publicar en el proceso para la selección del proveedor en la primera semana del julio			
IS01DL	Capa man per may no soci club vida c2	Número	100	0 0%
	Observación B / S: Se continua con la etapa precontractual con la secretaria de suministros y servicios, de acuerdo a la directriz dada por suministros se vio la necesidad de modificar la modalidad de contratación de selección abreviada literal H por Menor cuantía, lo cual retrasa la planeación inicial Se tiene programado publicar en el proceso para la selección del proveedor en la primera semana del julio			
IS01DM	Capa manua per mayo soci club d vida c2	Número	246	0 0%
	Observación B / S: Se continua con la etapa precontractual con la secretaria de suministros y servicios, de acuerdo a la directriz dada por suministros se vio la necesidad de modificar la modalidad de contratación de selección abreviada literal H por Menor cuantía, lo cual retrasa la planeación inicial Se tiene programado publicar en el proceso para la selección del proveedor en la primera semana del julio			
IS01DN	Capa manua per mayo soci club d vida c5	Número	89	0 0%
	Observación B / S: Se continua con la etapa precontractual con la secretaria de suministros y servicios, de acuerdo a la directriz dada por suministros se vio la necesidad de modificar la modalidad de contratación de selección abreviada literal H por Menor cuantía, lo cual retrasa la planeación inicial Se tiene programado publicar en el proceso para la selección del proveedor en la primera semana del julio			
IS01DO	Capa manua per mayo soci club d vida c7	Número	85	0 0%
	Observación B / S: Se continua con la etapa precontractual con la secretaria de suministros y servicios, de acuerdo a la directriz dada por suministros se vio la necesidad de modificar la modalidad de contratación de selección abreviada literal H por Menor cuantía, lo cual retrasa la planeación inicial Se tiene programado publicar en el proceso para la selección del proveedor en la primera semana del julio			

IS01DP	Capa manua per may soci club d vida c10	Número	150	0	0%
Observación B / S: Se continua con la etapa precontractual con la secretaria de suministros y servicios, de acuerdo a la directriz dada por suministros se vio la necesidad de modificar la modalidad de contratación de selección abreviada literal H por Menor cuantía, lo cual retrasa la planeación inicial Se tiene programado publicar en el proceso para la selección del proveedor en la primera semana del julio					
IS01DQ	Capa manua per may soci club d vida c70	Número	129	0	0%
Observación B / S: Se continua con la etapa precontractual con la secretaria de suministros y servicios, de acuerdo a la directriz dada por suministros se vio la necesidad de modificar la modalidad de contratación de selección abreviada literal H por Menor cuantía, lo cual retrasa la planeación inicial Se tiene programado publicar en el proceso para la selección del proveedor en la primera semana del julio					
IS01DR	Capa manu per mayo soci y no soci c14	Número	600	0	0%
Observación B / S: Se continua con la etapa precontractual con la secretaria de suministros y servicios, de acuerdo a la directriz dada por suministros se vio la necesidad de modificar la modalidad de contratación de selección abreviada literal H por Menor cuantía, lo cual retrasa la planeación inicial Se tiene programado publicar en el proceso para la selección del proveedor en la primera semana del julio					
IS01DS	Capa manu per mayo soci y no soci c15	Número	590	0	0%
Observación B / S: Se continua con la etapa precontractual con la secretaria de suministros y servicios, de acuerdo a la directriz dada por suministros se vio la necesidad de modificar la modalidad de contratación de selección abreviada literal H por Menor cuantía, lo cual retrasa la planeación inicial Se tiene programado publicar en el proceso para la selección del proveedor en la primera semana del julio					
IS01DT	Mejoramiento centro vida c9	Número	1	1	100%
Observación B / S: En el presente periodo se tomo en arriendo el lugar en el cual funciona el Centro Vida, se realizo la adquisición e instalación de la dotación y adecuaciones físicas necesarias para la puesta en marcha y funcionamiento.					
IS01DU	Per may part enc interg prom buen tra c7	Número	247	0	0%
Observación B / S: Se realizó el proceso concertación en cual se estableció lugar, fecha y hora para el encuentro que se llevará a cabo el próximo domingo 16 de Julio en la IE Mariscal Robledo sede Conrado Gonzalez de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.					
IS01DV	Per may part enc inter prom buen tra c14	Número	218	0	0%
Observación B / S: Se realizó el proceso de concertación. El operador realizó la presentación de la propuesta metodológica, la cual fue aprobada por la comisión y el encuentrese llevará a cabo en el mes de septiembre.					
IS01DW	Capa manu per mayo soci y no soci c 11	Número	600	0	0%
Observación B / S: Se continua con la etapa precontractual con la secretaria de suministros y servicios, de acuerdo a la directriz dada por suministros se vio la necesidad de modificar la modalidad de contratación de selección abreviada literal H por Menor cuantía, lo cual retrasa la planeación inicial Se tiene programado publicar en el proceso para la selección del proveedor en la primera semana del julio					
IS01DX	Mantenimiento centro vida comuna 9	Porcentaje	100	25	25%
Observación B / S: Se han desarrollado las diferentes adecuaciones físicas a las instalaciones y se continúa con mejoramiento de la estructura para la prestación del servicio de alimentación.					
IS01DY	Personas mayores aten centro vida c9	Número	200	172	86%
Observación B / S: Se dió inicio a la atención de los usuarios en la primera semana del mes de junio y se continúa con las inscripciones y matrículas hasta completar la cobertura					
IS01DZ	Apoyo econ a pers mayores de la c 12	Número	646	0	0%
Observación B / S: Se desarrolló el procedimiento de generación de nómina y la gestión para los pagos correspondientes a mayo - junio en el mes de Julio					
IS01EA	Apoyo econ a pers mayores de la c 60	Número	149	0	0%
Observación B / S: Se desarrolló el procedimiento de generación de nómina y la gestión para los pagos correspondientes a mayo - junio en el mes de Julio					
IS01EB	Formación cuidadores per mayor d la c12	Número	14	0	0%
Observación B / S: Se continúa con la etapa precontractual con la Secretaria de Suministros y Servicios, de acuerdo a la directriz dada por Suministros se vió la necesidad de modificar la modalidad de contratación de selección abreviada literal H por menor cuantía, lo cual retrasa la planeación inicial Se tiene programado publicar en el proceso para la selección del proveedor en la primera semana del julio					

Proyecto PD: 3.2.2.3 Atención y acompañamiento integral para personas mayores

Proyecto: 150347 - 16pp14-atención social a la población en situación de riesgo y vulnerabilidad del poblado

Síntesis Proyecto:

Eficacia : 83%

Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 92 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 92

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS47DD Per may con aten instit diur en hog geri	Personas	64	64	100%
IS47DE Edu div sex y d gén org soc, col púb- pr	Eventos	4	2	50%
Observación B / S: Ante la dificultad de programar los eventos en esta comuna se informó a la comisión sobre este inconveniente y se hizo rendición de cuentas. El contrato por el cual se ejecutó los recursos de Reserva terminó el 31 de marzo.				
IS47DH For act vid dia pa nna co dis int-esc pú	Encuentros	1	1	100%

Programa: 3.2.6 - Seguridad alimentaria y nutricional
Proyecto PD: 3.2.6.2 Acceso a los alimentos y complementación alimentaria
Proyecto: 150327 - 16pp1-atención social e integral a la población vulnerable en popular

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 56 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 56

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS27DA Cuida q participan en capa, compen y seg	Personas	47	47	100%

Proyecto: 150328 - 16pp2-atención social e integral a la población vulnerable en santa cruz

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 45 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 45

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS28DA Cuida q participan en capa, compen y seg	Personas	39	39	100%

Proyecto: 150329 - 16pp3-atención social e integral a la población vulnerable en manrique

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS29DB Cuida q participan en capa, compen y seg	Personas	11	11	100%
IS29DH Formación en lengua de señas	Personas	36	36	100%

Proyecto: 160603 - 17pp99 - implementación de estrategias en seguridad alimentaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 7% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.595 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.595 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.595

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS03AI Fami vuln atend bono alim com 1	Número	292	0	0%
IS03AJ Fami vuln atend bono alim com 2	Número	762	0	0%
IS03AK Fami vuln atend bono alime com 3	Número	440	0	0%
IS03AL Perso situa discap compl alimen com 3	Número	27	0	0%
IS03AM Famil vuln atend bono alime com 4	Número	279	0	0%
IS03AN Famil vuln atend bono alim com 5	Número	146	0	0%
IS03AO Famil vuln atend bono alim com 7	Número	777	0	0%
IS03AP Famil vuln atend bono alim com 8	Número	190	0	0%
IS03AQ Famil vuln atend bono alim com 10	Número	539	0	0%
IS03AR Famil vuln atend bono alim com 11	Número	50	0	0%
IS03AS Famil vuln atend bono alim com 13	Número	110	0	0%
IS03AT Famil vuln atend compl alim com 16	Número	67	68	101%
Observación B / S: En el mes de junio se comienzan las atenciones de la comuna 16 con la entrega de 68 paquetes alimentarios				
IS03AU Famil vuln atend bono alim com 70	Número	158	0	0%
IS03AV Famil vuln atend bono alim com 80	Número	50	0	0%

Observación Proyecto: Aún no empiezan las atenciones para este programa. Se encuentra en el proceso de convocatorias y visitas domiciliarias para la focalización y selección de las familias beneficiarias.

Programa: 3.2.7 - Ser Capaz: Inclusión social de las personas con discapacidad

Proyecto PD: 3.2.7.2 Inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadores

Proyecto: 150334 - 16pp7-atención social a la población vulnerable de robledo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 147 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 147

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS34DB Cuida q participan en capa, compen y seg	Personas	12	12	100%
IS34DF Emprendi a ciudadanos de pers con discap	Personas	43	43	100%
IS34DG Fortalec familias y organi afrocolombian	Personas	190	0	0%

Observación B / S: El equipo de supervisión esta en la revisión del informe definitivo entregado por la OIA anotando que se han hecho requerimientos y solicitado aclaraciones adicionales a la OIA.

Proyecto: 150337 - 16pp8-atención social a población en situación de riesgo y vulnerabilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 28 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 28

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS37DB Cuida q participan en capa, compen y seg	Personas	10	10	100%

IS37DC	Encu realiz pa fortaleci a mesa gerontol	Encuentros	10	10	100%
IS37DG	Ayudas técnicas para pnas en situa d dis	Personas	20	20	100%

Proyecto: 150342 - 16pp13-fortalecimiento integral a grupos poblacionales de san javier

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 72 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 72

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS42DE Emprendi a ciudadanos de pers con discap	Personas	30	29	97%
IS42DF Ayudas técnicas para pnas en situa d dis	Personas	21	21	100%

Proyecto: 150479 - 16pp2-lengua de señas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS79DA Formación en lengua de señas	Personas	44	44	100%

Proyecto: 160604 - 17pp99-asistencia social para la población con discapacidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 61%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.487 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.771 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.288

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS04DA Pers con disc benef apoyo económico c1	Número	250	204	82%
IS04DB Pers con disc benef apoyo económico c3	Número	166	133	80%
IS04DC Per con disc en pro hab y reh ser ca c3	Número	27	27	100%
IS04DD Pers con disc benef apoyo económico c4	Número	334	264	79%
IS04DE Per con disc en pro hab y reh ser ca c4	Número	47	47	100%
IS04DF Per con disc proc hab-reh ayu tec c4	Número	41	0	0%
IS04DG Pers con disc benef apoyo económico c5	Número	401	347	87%
IS04DH Per con disc en pro hab y reh ser ca c6	Número	48	48	100%
IS04DI Pers con disc bene apoy eco ser cap c6	Número	48	31	65%
IS04DJ Pers con disc benef apoyo económico c6	Número	447	378	85%
IS04DK Per con disc en pro hab y reh ser ca c7	Número	80	80	100%
IS04DL Pers con disc bene apoy eco ser cap c7	Número	41	31	76%
IS04DM Pers con disc benef apoyo económico c7	Número	264	207	78%
IS04DN Per con disc proc hab-reh ayu tec c7	Número	15	0	0%
IS04DP Per con disc proc hab-reha funcional c7	Número	11	0	0%

IS04DQ	Nna con disc intelec-centro integrado c7	Número	7	7	100%
IS04DR	Pers con disc proc forma y dllo c7	Número	9	0	0%
IS04DS	Pers atend por inclusión sociolaboral c7	Número	26	0	0%
IS04DT	Pers con disc benef apoyo económico c8	Número	354	283	80%
IS04DU	Per con disc en pro hab y reh ser ca c8	Número	33	33	100%
IS04DV	Per con disc proc hab-reh ayu tec c8	Número	25	0	0%
IS04DW	Per con disc en pro hab y reh ser ca c10	Número	15	15	100%
IS04DX	Pers con disc benef apoyo económico c10	Número	122	83	68%
IS04DY	Per con disc en pro hab y reh ser ca c11	Número	12	10	83%
IS04DZ	Pers con disc benef apoyo económico c11	Número	30	17	57%
IS04EA	Per con disc proc hab-reh ayu tec c11	Número	15	0	0%
IS04EB	Per con disc en pro hab y reh ser ca c13	Número	48	48	100%
IS04EC	Pers con disc benef apoyo económico c13	Número	405	348	86%
IS04ED	Per con disc proc hab-reh ayu tec c14	Número	9	0	0%
IS04EE	Pers con disc benef apoyo económico c14	Número	50	36	72%
IS04EF	Per con disc en pro hab y reh ser ca c14	Número	5	5	100%
IS04EG	Forma acti d vida diar nna disc int c14	Número	1	0	0%
IS04EH	Per con disc proc hab-reha funcional c14	Número	25	0	0%
IS04EI	Pers con disc benef apoyo económico c15	Número	236	175	74%
IS04EJ	Per con disc proc hab-reh ayu tec c15	Número	20	0	0%
IS04EK	Per con disc proc hab-reha funcional c15	Número	25	0	0%
IS04EL	Per con disc en pro hab y reh ser ca c15	Número	25	25	100%
IS04EM	Pers con disc benef apoyo económico c16	Número	43	29	67%
IS04EN	Per con disc en pro hab y reh ser ca c50	Número	11	11	100%
IS04EO	Pers con disc benef apoyo económico c50	Número	80	47	59%
IS04EP	Pers con disc benef apoyo económico c70	Número	119	101	85%
IS04EQ	Per con disc en pro hab y reh ser ca c70	Número	15	15	100%
IS04ER	Per con disc en pro hab y reh ser ca c80	Número	40	40	100%
IS04ES	Pers con disc benef apoyo económico c80	Número	250	219	88%
IS04EX	Pers con disc benef apoyo economico c12	Número	150	0	0%
IS04EY	Pers con disc benef apoyo economico c60	Número	293	0	0%
IS04EZ	Per con disc en pro hab y reh ser ca c60	Número	9	9	100%

Observación Proyecto: Se da inicio al contrato, el cual se encuentra en la etapa de aprestamiento. El avance se verá reflejado en el mes de julio.

Programa: 3.2.8 - Diversidad sexual e identidades de género

Proyecto PD: 3.2.8.1 Reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género desde una pedagogía de la inclusión

Proyecto: 150336 - 16pp8-fortalecimiento a procesos de poblaciones vulnerables: Igtbi, clubes de vida y población indígena

Síntesis Proyecto:

Eficacia : 32%

Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera:

Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0

Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 77

Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 77

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS36DB Per may q par forta proc orga club vida	Personas	126	80	63%
Observación B / S: Este valor estadístico finalizo en el mes marzo				
IS36DC Fortal proces indig y conocimi ancestral	Personas	120	0	0%
Observación B / S: El equipo de supervisión esta en la revisión del informe definitivo entregado por la OIA anotando que se han hecho requerimientos y solicitado aclaraciones adicionales a la OIA.				

Proyecto: 150339 - 16pp9-observatorio permanente de las violaciones de los derechos humanos, la diversidad sexual e identidad de gé

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 32 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 32

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS39DA Per par tall acerc a pob lgbti, org soc,	Personas	60	62	103%
Observación B / S: Este proyecto se ejecutó con recursos de reserva y ampliación del contrato N° 4600066633 que se ejecutó del 10 de enero al 31 de marzo de 2017.				
IS39DB Obs viol dere hum énfás diver sex-id gén	Eventos	1	1	100%
Observación B / S: Este proyecto se ejecutó con recursos de reserva y ampliación del contrato N° 4600066633 que se ejecutó del 10 de enero al 31 de marzo de 2017.				

Proyecto: 160605 - 17pp99-fortalecimiento para la población lgtbi

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 225 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 225 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS05AJ Eventos info pers div sex/iden gen-com 7	Número	7	0	0%
IS05AK Pers sensi diver sex/ident gen-com 8	Número	200	0	0%
IS05AL Eve sen div/rec/ana info pob lgbti-com 9	Número	1	0	0%
IS05AM Sist info segui vuln der pob lgbti-com 9	Porcentaje	100	0	0%
IS05AN Proc organ pob lgbti fortalecidos-com 9	Número	1	0	0%
IS05AO Even fort col y mes div acci afir-com 13	Número	12	0	0%

Observación Proyecto: El proyecto se encuentra en etapa precontractual, la carpeta ya fue entregada a la Secretaría de Suministros y Servicios, se espera aprobación para iniciar proceso contractual en el mes de Julio.

Programa: 3.2.9 - Diversidad étnica

Proyecto PD: 3.2.9.2 Reconocimiento y garantía de derechos de los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros en Medellín

Proyecto: 150345 - 16pp13-afrodescendentes e indígenas unidos por una mejor calidad de vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 130 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 130

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS45DA Transv de inicia de poblac afro e indig	Personas	6	0	0%
Observación B / S: El equipo de supervisión esta en la revisión del informe definitivo entregado por la OIA anotando que se han hecho requerimientos y solicitado aclaraciones adicionales a la OIA.				
IS45DB Creac forta empr a empren red afros unid	Número	1	0	0%
Observación B / S: El equipo de supervisión esta en la revisión del informe definitivo entregado por la OIA anotando que se han hecho requerimientos y solicitado aclaraciones adicionales a la OIA.				
IS45DC Fortal organi mesas articulad afrocolomb	Organizaci	2	0	0%
Observación B / S: El equipo de supervisión esta en la revisión del informe definitivo entregado por la OIA anotando que se han hecho requerimientos y solicitado aclaraciones adicionales a la OIA.				
IS45DE Fortal proces indig y conocimi ancestral	Personas	60	0	0%
Observación B / S: El equipo de supervisión esta en la revisión del informe definitivo entregado por la OIA anotando que se han hecho requerimientos y solicitado aclaraciones adicionales a la OIA.				
IS45DI Festival afrocolombiano afrofest	Número	250	0	0%
Observación B / S: El equipo de supervisión esta en la revisión del informe definitivo entregado por la OIA anotando que se han hecho requerimientos y solicitado aclaraciones adicionales a la OIA.				

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Dimensión:	Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
Dimensión: 3	- Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social		
Reto: 3.2	- Medellín Digna		
Programa: 3.2.1	- Medellín para la niñez y la adolescencia		
Proyecto PD: 3.2.1.1	Atención de niños y niñas en situación de vulneración de derechos		
	971410 Guardería Del Barrio Niquita	\$ 14,26209	\$ 0,0
Programa: 3.2.5	- Atención e inclusión social para el habitante de calle		
Proyecto PD: 3.2.5.2	Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle		
	960113 Habitantes de la Calle	\$ 0,16022	\$ 0,0
	970467 Programa Revivir (Convenios	\$ 0,08017	\$ 0,0
Programa: 3.2.6	- Seguridad alimentaria y nutricional		
Proyecto PD: 3.2.6.2	Acceso a los alimentos y complementación alimentaria		
	030278 Restaurantes Escolares	\$ 1,15697	\$ 0,0
	070022 Complementacion Alimentaria Primera Infancia	\$ 137,63418	\$ 0,0
	080056 Restaurantes Escolares Para la Infancia y la Adolescencia	\$ 52,48135	\$ 0,0
Programa: 3.2.9	- Diversidad étnica		

Proyecto PD: 3.2.9.2 Reconocimiento y garantía de derechos de los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros en Medellín
 120209 Fortalecimiento y Sostenimiento Política \$ 76,78239 \$ 76,8
 Pública Afrodescendiente

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto PD: 2.3.1.3 Gestión territorial y fortalecimiento de actores sociales para el ejercicio de los Derechos Humanos

Proyecto: 120266 - Fortalecimiento institucional para la promoción, prevención y protección de los derechos humanos y de derecho int

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 208 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 208

Proyecto PD: 2.3.2.2 Reintegración sostenible para un territorio en paz

Proyecto: 120280 - Reintegración social y promoción de la paz

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13

Proyecto PD: 3.2.1.1 Atención de niños y niñas en situación de vulneración de derechos

Proyecto: 120143 - Crecer con dignidad - protección

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.450 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.450

Proyecto PD: 3.2.1.6 Promoción de derechos y prevención de su vulneración para niños, niñas y adolescentes

Proyecto: 120142 - Construyendo ambientes protectores

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 162 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 162

Proyecto PD: 3.2.10.1 Centros Integrales de Familia

Proyecto: 120137 - Centro de bienestar a la comunidad cbc

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 31 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 31

Proyecto: 120146 - Buen vivir en familia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9

Proyecto PD: 3.2.10.2 Familia Medellín – Medellín solidaria

Proyecto: 120286 - Programa medellín solidaria: familia medellín

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 115 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 115



Proyecto PD: 3.2.6.2 Acceso a los alimentos y complementación alimentaria

Proyecto: 120118 - Nutrición para la primera infancia



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 823 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 808

Proyecto: 120119 - Nutrición escolar restaurantes escolares

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19

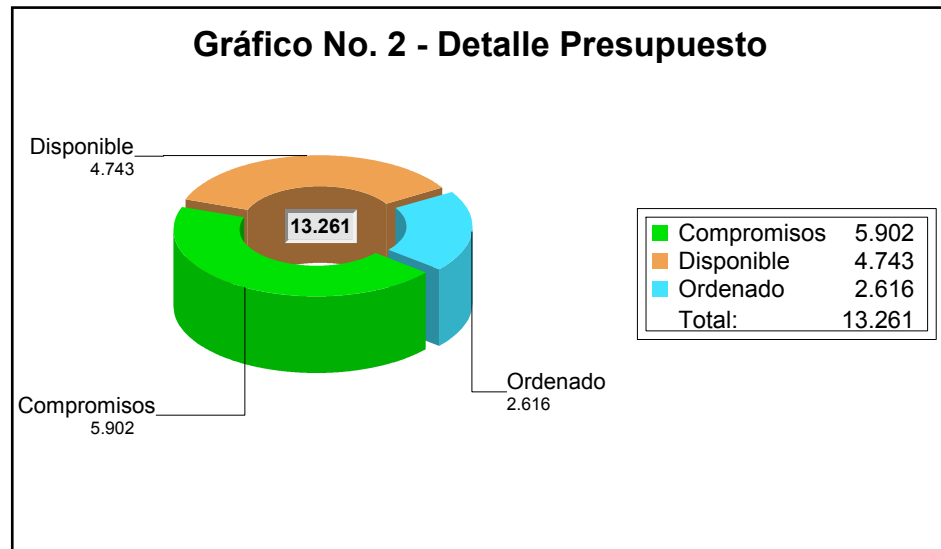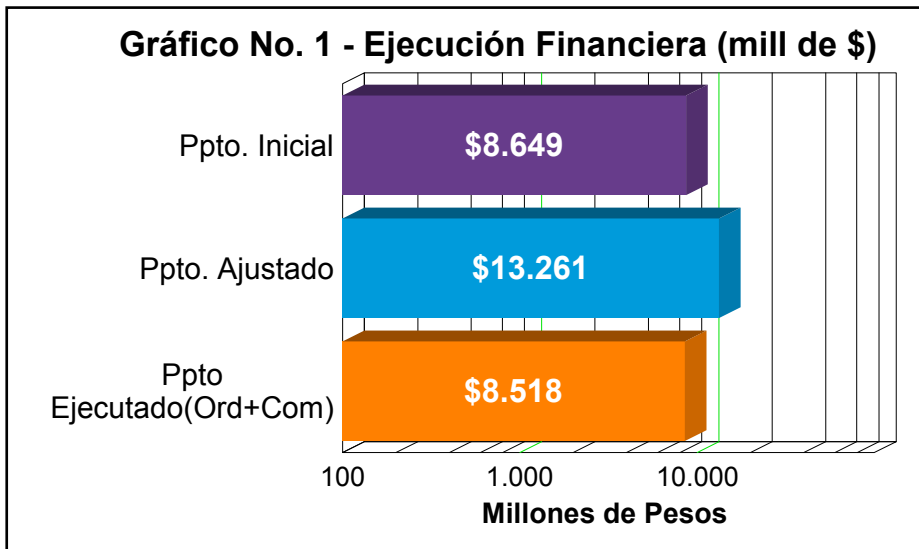

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

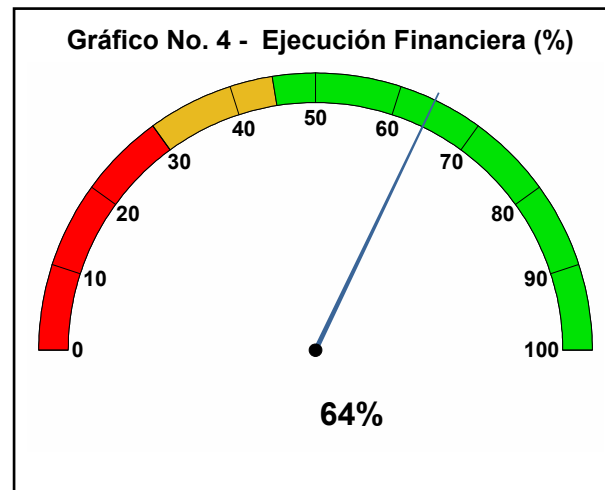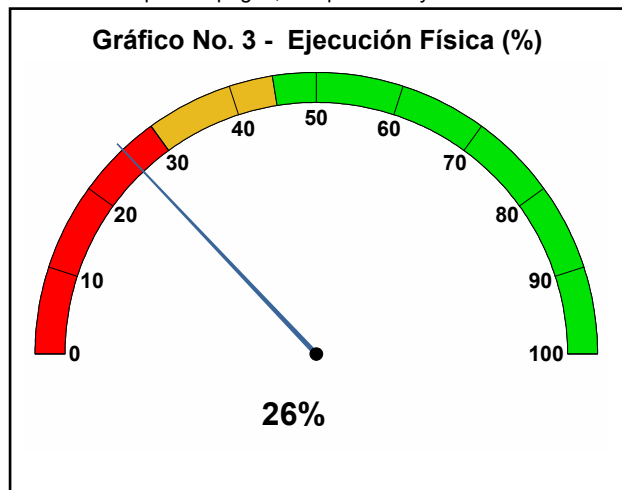

La ejecución financiera comprende pagos, facturas y los compromisos a la fecha de corte. Para el caso de los establecimientos públicos, la Ejecución Financiera se compone de dos cifras: una información obtenida del sistema, que corresponde únicamente a la cifra del presupuesto transferido desde el Municipio al estapúblico, y otra información suministrada por cada entidad que corresponde a los recursos propios invertidos por proyecto.

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.1 - Medellín segura

Programa: 2.1.4 - Medellín segura para las mujeres y las niñas

Proyecto PD: 2.1.4.1 Territorios seguros para las mujeres y las niñas

Proyecto: 160419 - Implementación de acciones para promover territorios seguros para las mujeres y las niñas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 235 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 235 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 234

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU19AD Camp comun cero tolerancias a las vbg	Número	1	0	0%
Observación B / S: El contrato se firmo para ejecucion de acciones a partir de Julio de 2017				
MU19AF Sensibilización a conductores y comercia	Número	1	0	0%
Observación B / S: El contrato se firmo para ejecucion de acciones a partir de Julio de 2017				
MU19AG Form en prevenci en vbg a maestros homb	Número	1	0	0%
Observación B / S: El contrato se firmo para ejecucion de acciones a partir de Julio de 2017				
MU19AH Capa fuer pub preve y aten las vbg	Número	1	0	0%
Observación B / S: El contrato se firmo para ejecucion de acciones a partir de Julio de 2017				
MU19AJ Gestió interin del conoc para territ seg	Número	1	0	0%
Observación B / S: El contrato se firmo para ejecucion de acciones a partir de Julio de 2017				

Proyecto PD: 2.1.4.2 Prevención y atención de las violencias basadas en género

Proyecto: 160420 - Prevención y atención de las violencias basadas en género

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.422

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU20AA Eventos de mujeres vdbg atendidas 123muj	Número	3.500	1.614	46%
MU20AB Hombres agresores que reciben atención p	Número	188	91	48%
MU20AC Muj protegidas en hogares de acogida y g	Número	90	50	56%
MU20AD Muj en hogar acogida benef en gest jurid	Número	90	42	47%
MU20AE Muj en hog acogida benefi atenc psicol	Número	90	45	50%
MU20AF Atenc y acompaÑ psic-jurÍ en territori	Número	8.160	4.309	53%

Proyecto PD: 2.1.4.3 Comunicación pública para el empoderamiento favorable a los derechos de las mujeres

Proyecto: 160421 - Implementación de estrategias de comunicación pública para el empoderamiento favorable de los derechos de las m

Síntesis Proyecto: Eficacia : 10% Ejec. Financiera : 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.098 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.098 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.087

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU21AA Evento de reconoc talento de muj jóvenes Observación B / S: El contrato se firmo para ejecucion de los eventos a partir del 1o de Julio de 2017	Número	1	0	0%
MU21AC Evento reconoc med mérito femen Observación B / S: El contrato se firmo para ejecucion de los eventos a partir del 1o de Julio de 2017	Número	1	0	0%
MU21AE Implementación plan de comunicaciones	Número	1	1	100%
MU21AF Celebración del día de la niña Observación B / S: El contrato se firmo para ejecucion de los eventos a partir del 1o de Julio de 2017	Número	1	0	0%
MU21AG Conmemoración del 25 de noviembre Observación B / S: El contrato se firmo para ejecucion de los eventos a partir del 1o de Julio de 2017	Número	1	0	0%
MU21AH Semana mujeres seguras Observación B / S: El contrato se firmo para ejecucion de los eventos a partir del 1o de Julio de 2017	Número	1	0	0%
MU21AI Encuentro zonal sobre equidad de género Observación B / S: El contrato se firmo para ejecucion de los eventos a partir del 1o de Julio de 2017	Número	1	0	0%
MU21AJ Jornada en equi gen con jóvenes talento Observación B / S: El contrato se firmo para ejecucion de los eventos a partir del 1o de Julio de 2017	Número	1	0	0%
MU21AK Formación a muj en género arte y pedagog Observación B / S: El contrato se firmo para ejecucion de los eventos a partir del 1o de Julio de 2017	Número	1	0	0%
MU21AL Ferias en territ para la moviliza social Observación B / S: El contrato se firmo para ejecucion de los eventos a partir del 1o de Julio de 2017	Número	1	0	0%

Reto: 2.3 - Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio

Programa: 2.3.4 - Ciudadanía activa por la paz

Proyecto PD: 2.3.4.5 Mujeres memorias de la guerra, protagonistas de la paz

Proyecto: 160422 - Implementación estrategia mujeres memorias de la guerra, protagonistas de la paz

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 178 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 178 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 178

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU22AA Mujeres participan en pedagogía de paz Observación B / S: El proceso se encuentra en etapa de legalización contractual	Número	200	0	0%

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 - Medellín Digna

Programa: 3.2.3 - Empoderamiento y transversalización de la equidad de género

Proyecto PD: 3.2.3.1 Promoción de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas

Proyecto: 120101 - Promoción de la participación social y política**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU01AF Mujeres sectores para incid	Número	5	5	100%

Proyecto: 160423 - Formación para la promoción de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 79%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 388 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 388 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 308**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU23AA Muj jov y niñas forma sensi prese/virtua	Número	300	0	0%
Observación B / S: El contrato inició el 21 de junio, en este momento se encuentra en fase de planeación, razón por la cual no se han iniciado los procesos formativos.				
MU23AB Mujeres en red por sus derechos	Número	250	0	0%
Observación B / S: El proceso se encuentra en etapa pre contractual				
MU23AC Pnas formada en eg y/o trabajando en red	Número	150	0	0%
Observación B / S: Este valor estadístico es nuevo y esta en proceso de aprobación por planeación.				

Proyecto PD: 3.2.3.2 Red de Centros de Equidad de Género**Proyecto: 140095 - Fortalecimiento centros equidad género****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 60%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 575 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 343**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU95DK Mod inter niña, jóv y muj no hegem d med	Número	1	0	0%
Observación B / S: Contrato en ejecución				
MU95DMRutas de atención a mujeres documentadas	Número	1	0	0%
Observación B / S: En etapa contractual				
MU95DN Evaluación del proyecto ceg realizada	Número	1	0	0%
Observación B / S: En etapa contractual				
MU95DO Diseño software de recepción de los ceg	Número	1	0	0%
Observación B / S: En etapa contractual				
MU95DP Implemen de estrat de comuni de los ceg.	Número	1	0	0%
Observación B / S: Contrato en ejecución				
MU95DQ Evaluación de la cooperación téc del bid	Número	1	0	0%
Observación B / S: En etapa contractual				

Proyecto: 160424 - Fortalecimiento de los centros de equidad de género**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 431 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 431 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 431**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU24AA Pers sensibilizadas en equidad de género Observación B / S: Contrato en ejecución	Número	1.500	443	30%
MU24AB Articulaciones de servicios en los ceg	Número	5	3	60%
MU24AD Ceg móvil operando	Número	1	1	100%
MU24AF Muje asesorad en los ceg Observación B / S: Contrato en ejecución	Número	1.000	227	23%
MU24AG Jornadas de difusión de servicios Observación B / S: Contrato en ejecución	Número	60	24	40%

Proyecto PD: 3.2.3.3 Transversalización de la equidad de género**Proyecto: 160425 - Fortalecimiento de procesos para la transversalización de la equidad de género****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 98%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 361 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 349 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 344**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU25AA Serv cap como enlace de g al int de adm	Número	30	23	77%
MU25AB Const mode pedago para form en géna serv	Número	1	1	100%
MU25AC Línea para nuevo arti de polít públi muj Observación B / S: Lineamientos básicos están siendo construidos	Número	1	0	0%
MU25AD Expo motiv nuevo acuerdo pol publ muj	Número	1	1	100%
MU25AE Muj consultadas probl pol púb mujeres	Número	20	20	100%
MU25AG Servidores cons probl pol púb mujeres	Número	10	10	100%
MU25AH Programa y/o proyect incorp el enfoq gén	Número	2	2	100%

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos**Reto:** 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa**Programa:** 4.1.1 - Educación inicial, preescolar, básica y media**Proyecto PD:** 4.1.1.6 Acciones afirmativas en el sistema educativo para las mujeres y las niñas**Proyecto: 160426 - Implementación de acciones afirmativas en el sistema educativo para las mujeres y las niñas****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 27%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 297 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 297 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 80

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU26AA Acc afir entrega a muj su perman escol	Número	538	0	0%
Observación B / S: El proceso se encuentra en etapa pre contractual, aún no se ha adjudicado				

Reto: 4.4 - Medellín con acceso al empleo

Programa: 4.4.3 - Generación de empleo

Proyecto PD: 4.4.3.2 Promoción de la autonomía económica para las mujeres

Proyecto: 160427 - Fortalecimiento para la promoción de la autonomía económica para las mujeres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 22% Ejec. Financiera : 27%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.230 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.209 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.141

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU27AA 2da fase mode autonomía econo para mujer	Documento	1	0	0%
Observación B / S: El proceso se encuentra en etapa pre contractual				
MU27AB Mujeres asesoradas para su autonomía eco	Número	1.600	0	0%
Observación B / S: El proceso se encuentra en etapa pre contractual				
MU27AD Muj reciben acción prom dchos	Número	200	0	0%
Observación B / S: El proceso se encuentra en etapa pre contractual				
MU27AE Madre com fam sust benef reco estim econ	Número	3.000	2.685	90%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.1 - Medellín segura

Programa: 2.1.4 - Medellín segura para las mujeres y las niñas

Proyecto PD: 2.1.4.2 Prevención y atención de las violencias basadas en género

Proyecto: 150391 - 16pp3- realización de acciones de prevención y atención de las violencias contra las mujeres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU91DB Masculinidades genero sensibles	Número	43	43	100%

Proyecto: 150401 - 16pp11-grupo terapéutico para el colectivo de mujeres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU01DA Muj. reciben atención terapéutica grupal	Número	20	20	100%

Proyecto: 160637 - 17pp8-prevención y atención de las violencias basadas en género

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 10%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 60 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 60 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU37AA Muj víct confl arm con meca preven riesg	Número	60	0	0%

Observación B / S: El proceso se encuentra en etapa pre contractual, no se ha adjudicado

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social
Reto: 3.2 - Medellín Digna
Programa: 3.2.3 - Empoderamiento y transversalización de la equidad de género
Proyecto PD: 3.2.3.1 Promoción de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas

Proyecto: 150356 - 16pp2-participación social y política de las mujeres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 89 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 89

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU56DA Mujeres incidiendo en el plan d	Número	150	153	102%

Proyecto: 150388 - 16pp4-diplomado en entrenamiento social y político

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU88DA Muj conoce der y proc escenario de parti	Número	25	25	100%

Proyecto: 150396 - 16pp7-generación de conocimiento a través de investigación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU96DA Acciones para particip y el empodera muj	Número	50	50	100%

Proyecto: 150400 - 16pp15-masculinidades género sensible**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU00DA Hombres partic en masculidades g. sensib	Número	25	26	104%

Proyecto: 150402 - 16pp12-entrenamiento social y político para las mujeres**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU02DA Muj participan entrenam syp	Número	22	22	100%

Proyecto: 150403 - 16pp13-fortalecimiento del colectivo de mujeres**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU03DA Muj conoce der y proc escenario de parti	Número	25	27	108%
MU03DD Drp elaborado y socializado	Documento	1	1	100%

Proyecto: 150404 - 16pp15-fortalecimiento del colectivo de mujeres**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU04DA Muj conoce der y proc escenario de parti	Número	25	25	100%

Proyecto: 150405 - 16pp16-fortalecimiento para el colectivo de mujeres**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU05DB Drp entregado	Documento	1	1	100%

Proyecto: 150406 - 16pp50-fortalecimiento del colectivo de mujeres**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU06DA Muj conoce der y proc escenario de parti	Número	15	16	107%

Proyecto: 150411 - 16pp90-fortalecimiento del colectivo de mujeres**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU11DA Mujeres trabajan en grupo	Número	20	22	110%
MU11DB Dpr formulado	Documento	1	1	100%

Proyecto: 150413 - 16pp80-intervención psicosocial a mujeres afectadas por la violencia**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU13DA Muj conoce der y proc escenario de parti	Número	25	25	100%

Proyecto: 150415 - 16pp8- formación y transformación de los patrones culturales machistas**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 59 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 59**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU15DB Muj formada en derechos laborales con eg	Número	35	35	100%
MU15DC Mujeres formadas para preven vbg cisar	Número	20	20	100%

Proyecto: 150416 - 16pp60-fortalecimiento y ampliación de la base social del colectivo de mujeres**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 30 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 30

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU16DA Mujeres trabajan en grupo	Número	40	45	113%

Proyecto: 160641 - 17pp13-fortalecimiento de los derechos de las mujeres como mentoras para la salud mental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 10%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 420 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 420 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 42

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU41AA Muj recon afec s mental aporta paz/eqc13	Número	560	0	0%
Observación B / S: El proceso se encuentra en etapa pre contractual, no se ha adjudicado				
MU41AB Muj reciben atención terapéutica vbg	Número	45	0	0%
Observación B / S: El proceso se encuentra en etapa pre contractual, no se ha adjudicado				

Proyecto: 160642 - 17pp2-fortalecimiento de la participación ciudadana de las mujeres y las organizaciones sociales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 10%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 40 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 40 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU42AA Muj favore relaciona para incidencia c2	Número	40	0	0%
Observación B / S: El proceso se encuentra en etapa pre contractual, no se ha adjudicado				
MU42AC Organizacion de mujeres fortalecidas c2	Número	4	0	0%
Observación B / S: El proceso se encuentra en etapa pre contractual, no se ha adjudicado				
MU42AD Mujeres sensibilizadas en género c 11	Número	150	0	0%
Observación B / S: El proceso se encuentra en etapa pre contractual, no se ha adjudicado				

Proyecto: 160643 - 17pp50-fortalecimiento a los colectivos de mujeres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 10%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 31 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 31 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU43AA Muj promueven la equidad de género c50	Número	20	0	0%
Observación B / S: El proceso se encuentra en etapa pre contractual, no se ha adjudicado				
MU43AB Pnas sensibilizad en equid de géner c 50	Número	50	0	0%
Observación B / S: El proceso se encuentra en etapa pre contractual, no se ha adjudicado				

Proyecto: 160644 - 17pp99-fortalecimiento de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.013 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.013 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 968

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU44AA Hombres resignifican sus masculinidades	Número	115	0	0%
Observación B / S: El contrato inició el 21 de junio, en este momento se encuentra en fase de planeación, razón por la cual no se han iniciado los procesos formativos.				
MU44AB Muj forma y/o sensi para empoderamiento	Número	353	0	0%
Observación B / S: El contrato inició el 21 de junio, en este momento se encuentra en fase de planeación, razón por la cual no se han iniciado los procesos formativos.				
MU44AC Muj genera capacida para acceso a derecho	Número	600	0	0%
Observación B / S: Este valor estadístico es nuevo y El proceso se encuentra en etapa pre contractual.				

Proyecto PD: 3.2.3.3 Transversalización de la equidad de género

Proyecto: 150392 - 16pp1-gestión de equidad de género "ruta m"

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 166 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 166

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU92DA Mujeres particip ruta m	Número	466	493	106%
MU92DB Proyecto implementado c1	Documento	1	1	100%

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa

Programa: 4.1.1 - Educación inicial, preescolar, básica y media

Proyecto PD: 4.1.1.6 Acciones afirmativas en el sistema educativo para las mujeres y las niñas

Proyecto: 160645 - 17pp99-implementación de acciones afirmativas en el sistema educativo para las mujeres y las niñas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 6%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 328 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 508 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 33

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU45AA Acc afir entreg a muj su perman escolc8	Número	163	0	0%
Observación B / S: El proceso se encuentra en etapa pre contractual, no se ha adjudicado				
MU45AB Acc afir entreg a muj su perman escolc10	Número	55	0	0%
Observación B / S: El proceso se encuentra en etapa pre contractual, no se ha adjudicado				
MU45AC Acc afir entreg a muj su perman escolc16	Número	314	0	0%
Observación B / S: El proceso se encuentra en etapa pre contractual, no se ha adjudicado				
MU45AD Acc afir entreg a muj su perma escol c70	Número	162	0	0%
Observación B / S: El proceso se encuentra en etapa pre contractual, no se ha adjudicado				

Observación B / S: Este valor estadístico es nuevo y El proceso se encuentra en etapa pre contractual.

Reto: 4.4 - Medellín con acceso al empleo
Programa: 4.4.3 - Generación de empleo
Proyecto PD: 4.4.3.2 Promoción de la autonomía económica para las mujeres
Proyecto: 160646 - 17pp15-fortalecimiento de la autonomía económica para las mujeres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 10%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 40 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 40 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU46AA Mujeres asesoradas para su autonomía eco	Número	40	0	0%

Observación B / S: El proceso se encuentra en etapa pre contractual

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto PD: 2.1.4.1 Territorios seguros para las mujeres y las niñas

Proyecto: 120094 - Promoción de la equidad de género en el territorio

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17

Proyecto PD: 2.1.4.2 Prevención y atención de las violencias basadas en género

Proyecto: 120093 - Seguridad pública para las mujeres

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 241 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 241

Proyecto PD: 2.1.4.3 Comunicación pública para el empoderamiento favorable a los derechos de las mujeres

Proyecto: 120096 - Reconocimiento y potenciación de las mujeres

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8

Proyecto PD: 3.2.3.3 Transversalización de la equidad de género

Proyecto: 120099 - Transversalización de la equidad de género al interior de la administración

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14

Proyecto: 120100 - Gestion de equidad de género para la vida

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6



Proyecto PD: 4.4.3.2 Promoción de la autonomía económica para las mujeres

Proyecto: 120095 - Promoción de la autonomía económica



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 62 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 62

Proyecto: 120098 - Promocion de fomento a la población rural

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14

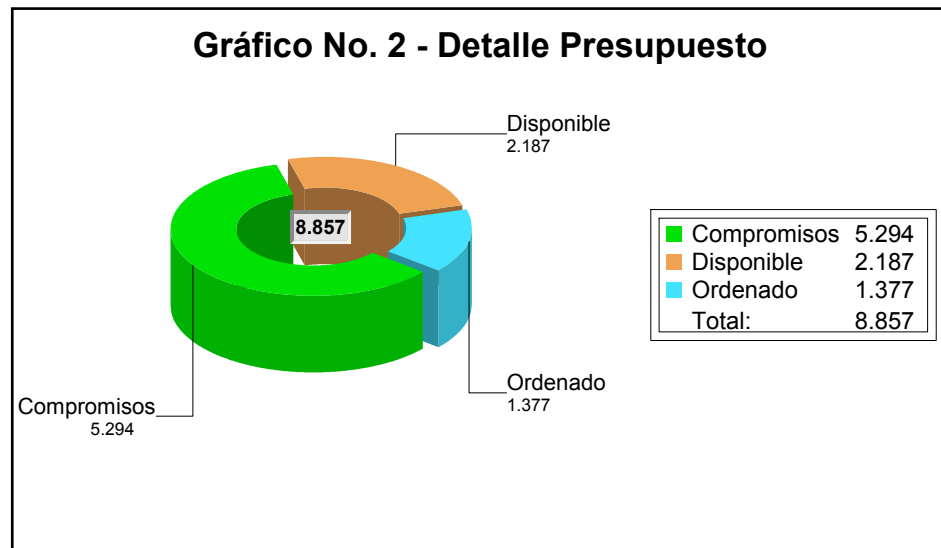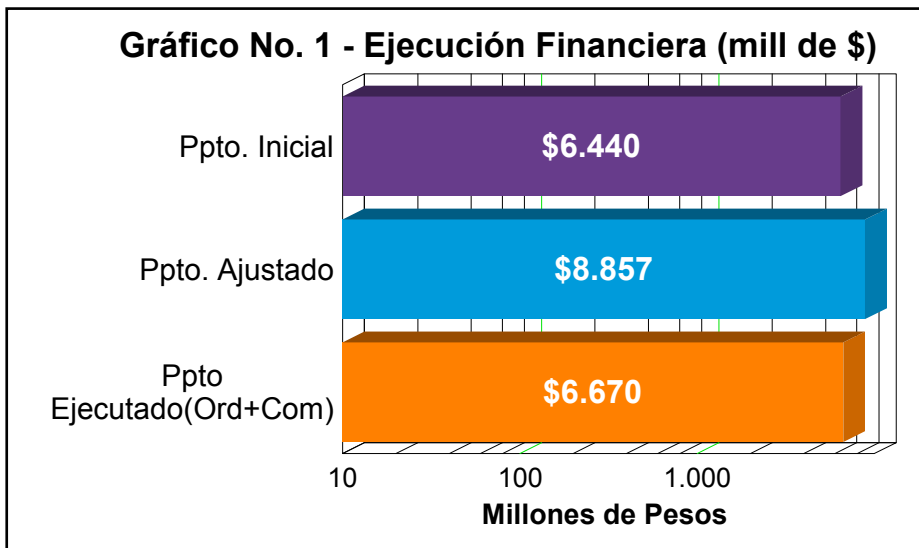

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

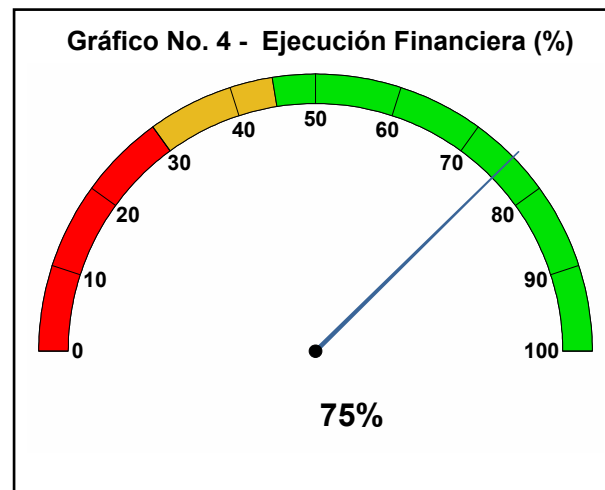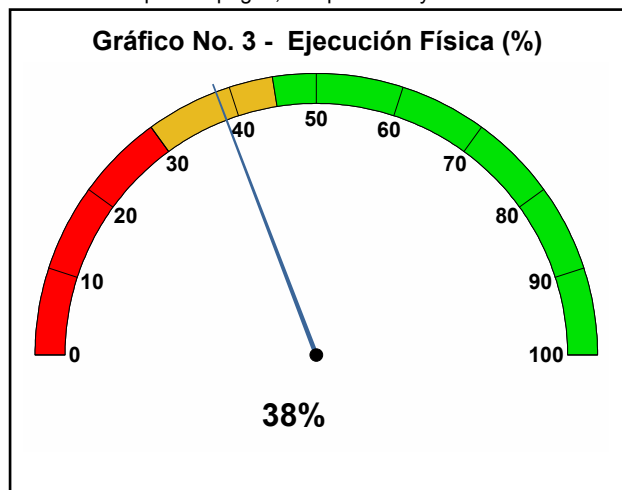

La ejecución financiera comprende pagos, facturas y los compromisos a la fecha de corte. Para el caso de los establecimientos públicos, la Ejecución Financiera se compone de dos cifras: una información obtenida del sistema, que corresponde únicamente a la cifra del presupuesto transferido desde el Municipio al estapúblico, y otra información suministrada por cada entidad que corresponde a los recursos propios invertidos por proyecto.

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.3 - Medellín cuenta con todos
Proyecto PD: 1.1.3.1 Fortalecer el voluntariado ciudadano
Proyecto: 160356 - Difusión voluntariado joven

Síntesis Proyecto: Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 162 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 162 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 162

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU56AA Estrategia de comunicación diseñada	Número	1	1	100%
JU56AB Jóvenes realizando acciones voluntarias	Número	150	0	0%
Observación B / S: las acciones voluntarias están programadas para ser ejecutadas en los meses de agosto y diciembre				
JU56AC Voluntarios formados enfoque juveil	Número	90	35	39%

Programa: 1.1.4 - Formación para la transformación de la cultura ciudadana
Proyecto PD: 1.1.4.3 Convivencia y cultura ciudadana juvenil
Proyecto: 160357 - Desarrollo agenda joven

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 44%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 282 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 930 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 412

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU57AA Agendas juveniles de ciudad realizadas	Número	8	2	25%
Observación B / S: Las agendas juveniles seguirán su ejecución a partir del mes de julio. Además por ley Estatutaria 1622 de 2013 la Semana de la Juventud se celebra en el mes de agosto				
JU57AC Incidencia y comunicación agendas juvent	Porcentaje	100	100	100%

Proyecto: 160358 - Desarrollo y asesoría de la estrategia sello joven

Síntesis Proyecto: Eficacia : 6% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 143 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 143 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 143

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU58AA Modelo de medición a la incidencia dllo	Porcentaje	100	19	19%
Observación B / S: El modelo se encuentra en ejecución a la fecha y avanza acorde a lo planeado				
JU58AB Estrategia de incidencia en juv diseñad	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Se firmó acta de inicio en el mes de junio, por lo cual se ejecutará la estrategia a partir del mes de julio.				

JU58AC Estrategia de visibilización desarrolld Porcentaje 100 0 0%
Observación B / S: Se firmó acta de inicio en el mes de junio, por lo cual se ejecutará la estrategia a partir del mes de julio.

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

Proyecto PD: 1.1.5.5 Cultura del fútbol

Proyecto: 160359 - Formación y fortalecimiento de la convivencia juvenil

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 93%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 352 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 352 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 328

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU59AA Joven acompañado en liderazgos positivos	Número	80	80	100%
JU59AB Acción territoriales convivencia fútbol	Número	29	0	0%
Observación B / S: actualmente se trabaja con los jóvenes en las propuestas que permitirán en el mes de septiembre comenzar con las acciones en territorio				
JU59AC Documento de sistematización realizado	Número	1	0	0%
Observación B / S: El documento se encuentra en construcción desde el momento del inicio del proyecto. El producto terminado se entregará en diciembre.				

Reto: 1.2 - Medellín participativa

Programa: 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación

Proyecto PD: 1.2.1.8 Fortalecimiento a la participación para la juventud

Proyecto: 160360 - Fortalecimiento de la participación para la juventud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 173 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 291 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 289

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU60AA Subsistema de la juventud operando	Porcentaje	50	38	76%
JU60AB Procesos de acompañamiento territorial	Número	21	12	57%

Proyecto: 160361 - Fortalecimiento y apoyo a los procesos y clubes juveniles

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 330 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 542 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 542

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU61AA Jóvenes participan en grupos juveniles	Número	2.600	0	0%
Observación B / S: se recibieron recursos de superavit la primera semana del mes de junio. Se realizará ejecución en el segundo semestre del año				
JU61AB Incentivos a grupos juveniles entregados	Número	12	0	0%
Observación B / S: se recibieron recursos de superavit la primera semana del mes de junio. Se realizará ejecución en el segundo semestre del año				
JU61AC Estrategia visibilización implementada	Porcentaje	100	0	0%

Observación B / S: se recibieron recursos de superavit la primera semana del mes de junio. Se realizará ejecución en el segundo semestre del año

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana
Reto: 2.3 - Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio
Programa: 2.3.4 - Ciudadanía activa por la paz
Proyecto PD: 2.3.4.4 Jóvenes que ayudan a reconstruir la paz
Proyecto: 160362 - Fortalecimiento para jóvenes en situación vulnerabilidad social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 6% Ejec. Financiera : 5%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.115 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.357 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 63

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU62AA Jóvenes que acceden a oportunidades	Número	1.000	0	0%
Observación B / S: se recibieron recursos de superavit la primera semana del mes de junio. Se realizará ejecución en el segundo semestre del año				
JU62AB Metodología intervenir violencia aplicada	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: se recibieron recursos de superavit la primera semana del mes de junio. Se realizará ejecución en el segundo semestre del año				
JU62AC Estrategia de articulación implementada	Porcentaje	100	18	18%
Observación B / S: Se realizaron actividades pero la ejecución de la estrategia dependía de los recursos de superavit para la ejecución del proyecto en su totalidad				

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social
Reto: 3.2 - Medellín Digna
Programa: 3.2.4 - Promoción del desarrollo humano integral de la juventud
Proyecto PD: 3.2.4.1 Planeación del territorio joven
Proyecto: 160363 - Desarrollo del territorio joven

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.197 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.813 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.813

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU63AA Mapa relacionamiento territorial	Número	21	21	100%
Observación B / S: el indicador se cumplió en el primer trimestre				
JU63AB Observatorio juventud en operación	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: el indicador se cumplió en el primer trimestre				
JU63AC Persona formada contexto y enfoque joven	Número	200	67	34%
JU63AD Acciones transversalización implementada	Número	100	105	105%

Proyecto PD: 3.2.4.2 Jóvenes conectados con las oportunidades

Proyecto: 160364 - Fortalecimiento medellín joven

Síntesis Proyecto: Eficacia : 68% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 169 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 263 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 263

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU64AA Orientaciones para acceso a la oferta	Número	700.000	409.631	59%
JU64AB Canales presenciales y digitales operando	Porcentaje	100	100	100%
JU64AC Persona formada como mediador de oferta	Número	200	89	45%

Proyecto: 160365 - Fortalecimiento de la movilización juvenil

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 277 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 277 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 277

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU65AA Jóvenes que acceden a rutas ciudad	Número	450	0	0%
Observación B / S: actualmente las rutas de ciudad se encuentran en diseño por lo cual no se han realizado desde el proyecto rutas con los jóvenes. Se ejecutará en el segundo semestre del año				
JU65AB Multiplicadores formados rutas ciudad	Número	150	0	0%
Observación B / S: actualmente las rutas de ciudad se encuentran en diseño por lo cual no se han realizado desde el proyecto formaciones a multiplicadores. Se ejecutará en el segundo semestre del año				
JU65AC Aliados identificad para consolidar ruta	Número	27	27	100%

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.4 - Medellín con acceso al empleo

Programa: 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral

Proyecto PD: 4.4.2.1 Talento joven, promoción del empleo juvenil

Proyecto: 160366 - Asesoría y fortalecimiento para promoción del empleo juvenil

Síntesis Proyecto: Eficacia : 7% Ejec. Financiera : 16%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 48

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU66BA Espacio incidencia generado con empresas	Número	7	2	29%
Observación B / S: Se avanza en la ejecución de los espacios de incidencia. Se ejecutará en el segundo semestre de la mano con las demás actividades que comienzan en el mes de julio.				
JU66BB Mapeo de actores y acciones estratégicas	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se realizarán las acciones en el segundo semestre. El proceso contractual espera se termine la segunda semana de julio				
JU66BC Estrategia difusión emprendimiento joven	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Se realizarán las acciones en el segundo semestre. El proceso contractual espera se termine la segunda semana de julio				
JU66BD Modelo de empleo y emprendimiento joven	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Se realizarán las acciones en el segundo semestre. El proceso contractual espera se termine la segunda semana de julio				

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.2 - Medellín participativa
Programa: 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación
Proyecto PD: 1.2.1.8 Fortalecimiento a la participación para la juventud
Proyecto: 150228 - 16pp14- promoción, reconocimiento y participación juvenil

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU28AA Proceso de formación participa realizado	Número	10	10	100%
JU28AB Jóvenes participantes proceso formación	Número	50	50	100%

Proyecto: 150231 - 16pp14-modelo joven de participación política

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 24 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 24

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU31AA Jóvenes participantes en intercambio	Número	30	30	100%
JU31AB Planes de trabajo formulados y ejecutado	Número	1	1	100%

Proyecto: 160622 - 17pp99-fortalecimiento y acompañamiento a las organizaciones, redes y colectivos juveniles

Síntesis Proyecto: Eficacia : 15% Ejec. Financiera : 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 676 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 676 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 655

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU22AO Jóvenes organizados formados comuna 15	Número	180	0	0%
Observación B / S: desde la planeación del proyecto está proyectado su ejecución en mes diciembre debido a que es un proceso de formación				
JU22AP Caracteriz y mapeo de org juv realizado	Número	2	0	0%
Observación B / S: desde la planeación del proyecto está proyectado su ejecución en mes de julio				
JU22AQ Grupos juveniles acompañados	Número	121	0	0%
Observación B / S: desde la planeación del proyecto está proyectado su ejecución en mes agosto				
JU22AR Escenario articulación juvenil acompañad	Número	6	1	17%
Observación B / S: Se avanza en la ejecución según lo planeado. Se espera ejecutar en su totalidad para el mes de septiembre				
JU22AS Plan de comunicaciones diseñado	Número	7	4	57%

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana
Reto: 2.3 - Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio
Programa: 2.3.4 - Ciudadanía activa por la paz
Proyecto PD: 2.3.4.4 Jóvenes que ayudan a reconstruir la paz
Proyecto: 160623 - 17pp16-prevención a jóvenes en riesgo de vulnerabilidad social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 64 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 64 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 61

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU23BA Jóvenes con acompañamiento psicosocial	Número	24	0	0%
Observación B / S: desde la planeación del proyecto está proyectado su ejecución en mes julio				
JU23BC Proyectos de vida de jóvenes apoyados	Número	24	0	0%
Observación B / S: desde la planeación del proyecto está proyectado su ejecución en mes diciembre debido a que es un proceso de formación				

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social
Reto: 3.2 - Medellín Digna
Programa: 3.2.4 - Promoción del desarrollo humano integral de la juventud
Proyecto PD: 3.2.4.1 Planeación del territorio joven
Proyecto: 160624 - 17pp99-formación para jóvenes en investigación social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 77 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 77 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 73

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU24CA Joven formados competen investigat com 8	Número	20	0	0%
Observación B / S: desde la planeación del proyecto está proyectado su ejecución en mes de septiembre				
JU24CB Joven formado competen investigat com 14	Número	30	0	0%
Observación B / S: desde la planeación del proyecto está proyectado su ejecución en mes de septiembre				

Proyecto PD: 3.2.4.2 Jóvenes conectados con las oportunidades

Proyecto: 160625 - 17pp99-formación y promoción para el liderazgo y la incidencia territorial juvenil

Síntesis Proyecto: Eficacia : 20% Ejec. Financiera : 94%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.124 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.124 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.054

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU25BA Jóvenes formados para el liderazgo	Número	269	0	0%
Observación B / S: desde la planeación del proyecto está proyectado su ejecución en mes de diciembre				

JU25BJ	Activ talento e intercam juven realizado	Número	17	0	0%
Observación B / S: desde la planeación del proyecto está proyectado su ejecución entre los meses de agosto y diciembre					
JU25BP	Recorrido o activación territ realizado	Número	30	0	0%
Observación B / S: desde la planeación del proyecto está proyectado su ejecución entre los meses de julio y diciembre					
JU25BU	Jóvenes formados en emprendimiento	Número	35	0	0%
Observación B / S: desde la planeación del proyecto está proyectado su ejecución el mes de septiembre					
JU25BW	Proceso de acompañamiento a jóvenes	Número	7	7	100%

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto PD: 1.1.4.3 Convivencia y cultura ciudadana juvenil

Proyecto: 120346 - Integración, proyección y promoción de la juventud y semana de la juventud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 150235 - 16pp70-fortalecimiento de las dinámicas juveniles en los diferentes espacios de participación

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 28 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 28

Proyecto PD: 1.2.1.8 Fortalecimiento a la participación para la juventud

Proyecto: 150213 - 16pp3-tejiendo sueños colectivos con enfoque intergeneracional

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 43 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 43

Proyecto: 150216 - 16pp5-proyección y fortalecimiento de las dinámicas juveniles

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 45 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 45

Proyecto: 150217 - 16pp6- fortalecimiento a las dinámicas juveniles

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 38 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 38

Proyecto: 150218 - 16pp7-fortalecimiento social y organizacional de los jóvenes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21

Proyecto: 150219 - 16pp8-fortalecimiento de las organizaciones y procesos juveniles

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19

Proyecto: 150224 - 16pp11-fortalecimiento de las acciones juveniles



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14

Proyecto: 150225 - 16pp12-promoción y fortalecimiento de las organizaciones juveniles



Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13
Proyecto:	150226 - 16pp13-proyección y fortalecimiento de las dinámicas juveniles		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 45	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 45
Proyecto:	150227 - 16pp16-apoyo al plan de trabajo de grupos juveniles y de la red juvenil		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22
Proyecto:	150232 - 16pp15-proyecto integral para la promoción, reconocimiento y el respeto de la condición juvenil		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19
Proyecto:	150236 - 16pp80-proyección y fortalecimiento de las dinámicas juveniles		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5
Proyecto PD:	2.3.4.4 Jóvenes que ayudan a reconstruir la paz		
Proyecto:	120285 - Icaro -jóvenes por la vida		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 31	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 31
Proyecto PD:	3.2.4.1 Planeación del territorio joven		
Proyecto:	120344 - Gestión de la política pública		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25
Proyecto PD:	3.2.4.2 Jóvenes conectados con las oportunidades		
Proyecto:	120345 - Información y conocimiento juvenil		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50
Proyecto:	150234 - 16pp50-activación y articulación de las dinámicas juveniles		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0
Proyecto:	150238 - 16pp90-proceso de formación y fortalecimiento de las prácticas juveniles		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26

Secretaría de Seguridad y Convivencia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2017

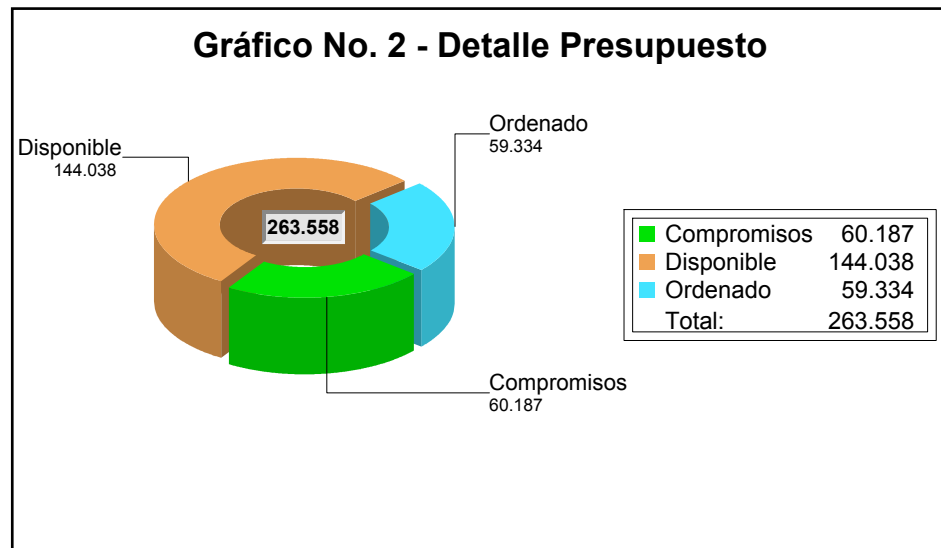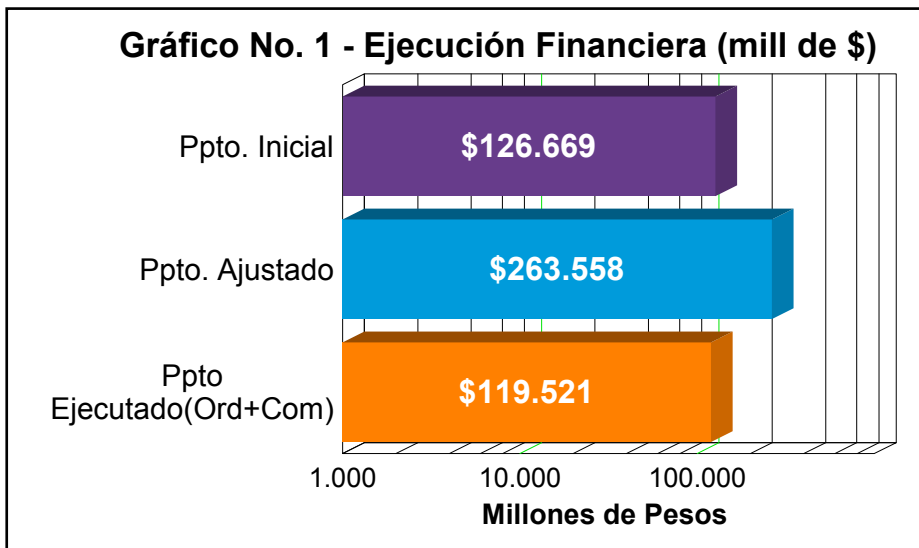

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

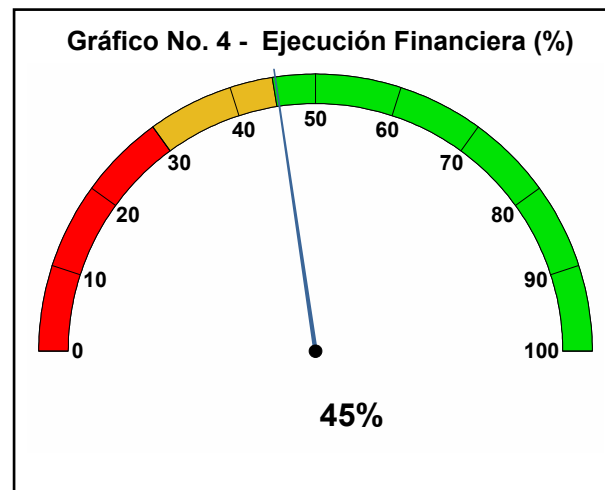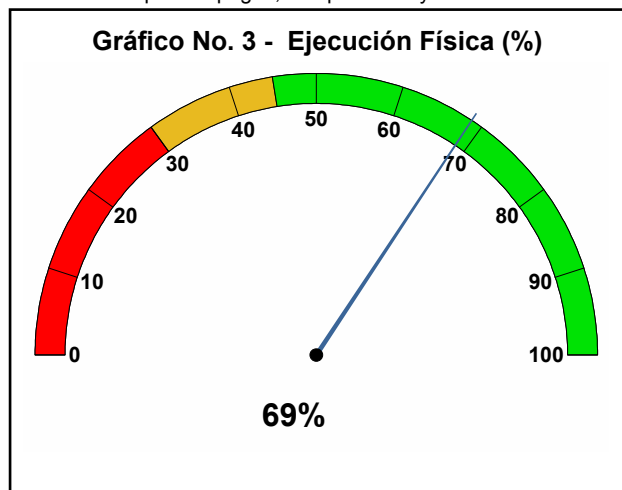

La ejecución financiera comprende pagos, facturas y los compromisos a la fecha de corte. Para el caso de los establecimientos públicos, la Ejecución Financiera se compone de dos cifras: una información obtenida del sistema, que corresponde únicamente a la cifra del presupuesto transferido desde el Municipio al estapúblico, y otra información suministrada por cada entidad que corresponde a los recursos propios invertidos por proyecto.

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.2 - Creemos confianza
Proyecto PD: 1.1.2.2 Fortalecimiento del gobierno local y recuperación de confianza en la institucionalidad
Proyecto: 160170 - Fortalecimiento del gobierno local y recuperación de confianza en la institucionalidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 49% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.302 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.302 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.302

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE70BC Consejos de convivencia realizados	Número	264	133	50%
SE70BD Comités locales de gobierno realizados	Número	264	127	48%

Proyecto PD: 1.1.2.3 Gestión y articulación de gobierno

Proyecto: 160176 - Fortalecimiento de la gestión y articulación de gobierno

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 499 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 499 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 499

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE76CA Peticiones de la comunidad atendidas	Porcentaje	60	26,53	44%

Observación B / S: El porcentaje de ejecución sólo empieza a medirse a partir de este año, por lo tanto apenas se están diseñando y evaluando estrategias para alcanzar la meta propuesta. Desde el mes de febrero se han recibido por parte de los Promotores Locales de Gobierno 245 PETICIONES, de las cuales 65 han sido atendidas satisfactoriamente.

Programa: 1.1.4 - Formación para la transformación de la cultura ciudadana

Proyecto PD: 1.1.4.1 La familia educa

Proyecto: 160236 - Prevención de la violencia intrafamiliar

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 5%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE36AA Nna formados en protección de derechos	Número	750	0	0%

Observación B / S: Nos encontramos realizando una alianza con el Despacho de la Primera Dama a fin de ejecutar el proyecto de Prevención de violencia intrafamiliar

SE36AB Agresores formados alternativas dif vi	Número	750	0	0%
---	--------	-----	---	----

Observación B / S: Nos encontramos realizando una alianza con el Despacho de la Primera Dama a fin de ejecutar el proyecto de Prevención de violencia intrafamiliar

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana
Reto: 2.1 - Medellín segura
Programa: 2.1.1 - Planeación para la seguridad integral
Proyecto PD: 2.1.1.1 Transversalización de la Política Pública de Seguridad y Convivencia
Proyecto: 160189 - Implementación de la política pública de seguridad y convivencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 776 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 346 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE89AA Modelo seguimiento escenarios ppsyc form	Porcentaje	100	25	25%
Observación B / S: Se tiene el documento de concepción y señalamiento de los elementos principales que debe garantizar el Modelo de PP y un avance del 10% del segundo producto, resultado de reuniones y revisión documental de actas. 25% Documento de concepción de modelo 25% Diagnóstico del funcionamiento actual de los escenarios 25% Diseño y elaboración de una herramienta 25% Prueba piloto de la herramienta				
SE89AB Proyectos lin. estratégicos ppsc implem.	Porcentaje	100	56	56%
Observación B / S: Se tiene elaborado la Documentación de la labor del actual Comité de Construcción de Paz – y el 6% corresponde a las reuniones y acciones que se vienen articulando en 2017. 50% Documentación del trabajo del comité de construcción de paz 50% Sistematización de resultados de articulación y gestión del Comité 2016-2017				
SE89AC Estrategia de comunicaciones syc implem.	Porcentaje	100	47	47%
Observación B / S: Se realizan campañas a demanda según el contexto de seguridad en la ciudad, para prevención y atención de delitos. Para el primer semestre se realizaron sobre hurtos a celulares, hurtos a motos y extorsión. Se calcula con ejecución financiera, pues al ser por demanda no se tienen cantidades exactas establecidas para 2017. Valor recurso ejecutado 2017/ valor recurso asignado 2017				
SE89BA Acci.inciden.pública ppsc realizadas	Porcentaje	100	50	50%
Observación B / S: Se realizó en el mes de mayo el Medellín-Lab, como escenario de incidencia y difusión del modelo integral de gestión de la Política Pública. Para el mes de septiembre se tiene contemplada la ejecución de otra actividad en el marco de éstas acciones. Acciones de incidencia implementadas(1)/acciones de incidencia planeadas(2)				

Proyecto PD: 2.1.1.2 Formulación e implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia – PISC

Proyecto: 160192 - Formulación e implementación del plan integral de seguridad y convivencia – pisc

Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 93%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.645 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.261 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.777

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE92AA Protocolo atención requerimien diseñado	Número	1	1	100%
Observación B / S: El protocolo para atención de requerimiento se encuentra diseñado				
SE92AB Implem protocol fonset	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: El protocolo se implementa al 100% ante los requerimientos de los organismos de seguridad y justicia y la secretaría de seguridad y Convivencia.				
SE92AC Seguimiento y evaluación oferta pisc imp	Porcentaje	100	33	33%
Observación B / S: El seguimiento y evaluación se desarrolla cada dos meses. A la fecha se han realizado 2 mesas.				
SE92AD Estrategia de comunicación pública pisc	Número	1	0	0%

Proyecto: 160195 - Fortalecimiento a organismos de seguridad y justicia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 38%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 32.740 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 98.045 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 37.094

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE95CA Organi seguridad y justicia fortalecidos	Número	9	9	100%

Proyecto PD: 2.1.1.3 Fortalecimiento y posicionamiento del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia - SISC

Proyecto: 160200 - Fortalecimiento y posicionamiento del sistema de información para la seguridad y la convivencia - sisc

Síntesis Proyecto: Eficacia : 35% Ejec. Financiera : 86%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.492 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.698 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.458

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE00AB Investigaciones en seguridad realizadas	Número	3	0	0%
Observación B / S: Las investigaciones académicas están planeadas para ser terminadas a final del año 2017. Las tres investigaciones ya están en ejecución, aunque ninguna está culminada.				
SE00AC Reportes de bi elaborados	Número	1.800	535	30%
Observación B / S: Los problemas de contratación a principio de año llevaron a una disminución del volumen de producción de reportes de BI, de igual forma las labores de migración, actualización y mantenimiento de la plataforma han traído una disminución de la producción debido a la no disponibilidad de la metadata				
SE00AD Reportes geográficos elaborados	Número	666	348	52%
Observación B / S: La incorporación de un profesional GIS a la unidad trajo consigo un aumento en el nivel de producción				
SE00AE Documentos diagnóstico elaborados	Número	300	181	60%
Observación B / S: Durante el primer y segundo trimestre ha aumentado la demanda de este tipo de información por encima del nivel que se había presupuestado. Cabe resaltar que el SISC ha dado cumplimiento a esta demanda de información.				
SE00AG Particip proyec invest plane proc realiz	Número	3	0	0%
Observación B / S: Las investigaciones académicas están planeadas para ser terminadas a final del año 2017. Las tres investigaciones ya están en ejecución, aunque ninguna está culminada.				
SE00AH Repor inform retroalim informa real	Número	1.625	813	50%
Observación B / S: Se ha realizado suministro de información y retroalimentación conforme a lo planeado				
SE00AJ Inform est, integ conf y oport procesad	Días	365	181	50%
Observación B / S: Se ha venido entregando sin novedad alguna la información diaria sobre seguridad, convivencia y derechos humanos				

Proyecto PD: 2.1.1.4 Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - Planes especiales y Plan del Centro

Proyecto: 160203 - Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - planes especiales y plan del centro

Síntesis Proyecto: Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 80%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.968 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.090 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.263

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE03AA Planes de acción territorial formulados	Número	24	24	100%
Observación B / S: Al 30 de junio de 2017 se formularon los Planes de Acción Territorial -PAT- de las 16 comunas, 5 corregimientos y ciudadela Nuevo Horizonte; para un total de 22 PAT. Adicionalmente se diseñaron e implementaron dos planes especiales: el Plan Castilla y el Plan Centro. La formulación y ejecución de los PAT se actualiza anualmente.				
SE03AB Plan desarme formulado e implementado	Número	1	1	100%
Observación B / S: Al 30 de junio de 2017 se diseñó el cronograma para elaboración de un protocolo del Plan Desarme, y se avanzó en las acciones programadas en relación con la fundamentación e investigación normativa.				
SE03AC Plan acción ci2 formulado e implementado	Número	1	1	100%
Observación B / S: Está en ejecución				
SE03AD Operativos ejecutados de segur/conviv	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: A demanda. Equivale a 59 operativos realizados				
SE03AE Planes acción territorial ejecutados	Porcentaje	100	8,33	8%
Observación B / S: Ejecutados dos: Plan Castillas y Plan Centro. Los Planes de Acción Territorial de 2017 de cada comuna y corregimiento y de la Ciudadela Nuevo Occidente se formularon durante el primer semestre y se ejecutarán durante el segundo semestre de 2017. La formulación y ejecución de los PAT se actualiza anualmente.				

Proyecto PD: 2.1.1.5 Articulación y cooperación metropolitana, regional, nacional e internacional en materia de seguridad integral

Proyecto: 160239 - Diseño e implementación de una estrategia de articulación y cooperación metropolitana, regional, nacional e interna

Síntesis Proyecto: Eficacia : 8% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 103 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 103 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE39CA Conse metropols de seg, conv y paz reali	Número	6	1	17%
Observación B / S: Debido a dificultades en los tiempos de la agendas políticas, no se realizaron Consejos Metropolitanos en el trimestre (en los cuales hacen presencia los 10 Alcaldes de Valle de Aburrá y el director del Área Metropolitana). Es de señalar que este espacio solo se cita con la aprobación del despacho del Alcalde de Medellín.				
SE39CB Estrategia para la gest de proy de coop	Número	1	0	0%
Observación B / S: El recurso asignado a esta actividad para el año 2017 fue redireccionado. Por lo tanto, dicha meta no se cumplirá este año.				

Programa: 2.1.2 - Infraestructura y tecnología para la seguridad y la convivencia

Proyecto PD: 2.1.2.1 Formulación e implementación de un Plan Maestro de infraestructura física y tecnología para la seguridad y la convivencia

Proyecto: 160241 - Formulación e implementación de un plan maestro de infraestructura para la seguridad y la convivencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 6%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 21.068 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23.473 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.438

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE41BA Lotes adquiridos	Número	1	1	100%
SE41BB Sedes entregadas a organismos de seguir	Número	1	0	0%
Observación B / S: La entrega de la estación de policía de San Antonio esta programada para el 18 de julio dde 2017				
SE41BC Sedes construidas	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se adjudica los estudios y diseño para la estación de policía del Poblado

Proyecto: 160242 - Mantenimiento y adecuación de infraestructura de seguridad existente

Síntesis Proyecto: Eficacia : 3% Ejec. Financiera : 44%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.338 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.838 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.547

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE42BD Sedes intervenidas	Número	33	1	3%

Observación B / S: Hasta la fecha sean intervenido el 65% de las sedes presupuestadas, pero las entregas definitivas comienzan a partir del mes de julio

Proyecto: 160243 - Diagnóstico de las necesidades actuales de infraestructura para la seguridad y la convivencia de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 510 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 510 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 500

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE43BB Diagnóstico infraestructura reali	Número	52	52	100%

Observación B / S: se completan los diagnostico de la infraestructura de las sedes externas de la secretaria

Proyecto PD: 2.1.2.2 Fortalecimiento del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Medellín - SIES-M

Proyecto: 160245 - Fortalecimiento del sistema integrado de emergencias y seguridad de medellín - sies-m.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 59% Ejec. Financiera : 87%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.411 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.873 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.880

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE45AB Componentes sies-m definido/diagnostico	Porcentaje	100	100	100%

Observación B / S: Documento con diagnóstico de los componentes del SIES-M

SE45AC Plan de sostenimiento de sies-m formulad	Porcentaje	100	50	50%
---	------------	-----	----	-----

Observación B / S: Documento de formulación del plan de sostenimiento del SIES en construcción

SE45AD Plan de sostenimiento sies-m implementad	Porcentaje	100	28	28%
---	------------	-----	----	-----

Observación B / S: Se calcula de acuerdo a la ejecución presupuestal vs indicador para la fase de implementación

Proyecto: 160246 - Formulación e implementación de un plan maestro de tecnología para la seguridad y la convivencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 59% Ejec. Financiera : 17%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 45.548 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.778

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE46AB Plan maestro de tic diagnosticado	Porcentaje	100	100	100%

Observación B / S: Documento con diagnóstico del plan maestro de tecnología para la seguridad				
SE46AC Plan maestro de tic formulado	Porcentaje	100	50	50%
Observación B / S: Documento de formulación del plan maestro de tecnología en construcción				
SE46AD Plan maestro de tic implementado	Porcentaje	100	28	28%
Observación B / S: Se calcula de acuerdo a la ejecución presupuestal vs indicador para la fase de implementación				

Programa: 2.1.3 - Justicia y política criminal
Proyecto PD: 2.1.3.1 Direccionamiento de la política criminal

Proyecto: 160248 - Desarrollo de la política criminal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 90%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 719 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 719 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 644

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE48AB Planes de mejoramiento diseñados	Número	7	4	57%
Observación B / S: Se realizaron los planes de mejoramiento de los delitos de extorsión, hurtos, lavado de activos y explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes				

Proyecto PD: 2.1.3.2 Fortalecimiento y/o creación de grupos especiales por delito

Proyecto: 160250 - Fortalecimiento y/o conformación de grupos especiales por delito

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 16%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 78

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE50AA Grupos especiales creados o fortalecidos	Número	3	3	100%
Observación B / S: Se fortalecieron los grupo de homicidio, hurtos y extorsión				

Proyecto PD: 2.1.3.3 Descentralización de los mecanismos de acceso a la justicia

Proyecto: 160251 - Ampliación de los mecanismos de acceso a la justicia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE51EA Puntos recepción de denuncias instalado	Número	2	0	0%
Observación B / S: Esta en etapa precontractual				

Proyecto PD: 2.1.3.4 Fortalecimiento del Sistema Penal de Responsabilidad para adolescentes

Proyecto: 160253 - Fortalecimiento del sistema penal de responsabilidad para adolescentes**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 26% Ejec. Financiera : 82%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.632 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.632 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.969**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE53DA Atención adolesce que ingresan srpa	Número	935	480	51%
SE53DB Habilit sede para atender las mujer srpa	Número	1	0	0%

Observación B / S: Programada para el segundo semestre.

Proyecto PD: 2.1.3.5 Atención integral a las problemáticas de la población carcelaria**Proyecto: 160255 - Apoyo integral a las problemáticas de la población carcelaria****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.744 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.744 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.744**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE55EA Familiares de internos e internas, atend	Número	2.400	964	40%
Observación B / S: Se hace una convocatoria por semestre. La proxima es en julio				
SE55EB Intern@s atend. consult. jurid (a dem)	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: 902 internos atendidos en consultorio jurídico corresponden al 100%				
SE55EC Pospensados atendidos	Número	150	221	147%
Observación B / S: se ha incrementado la cantidad de pospensados participantes debido al inicio de actividades en Bellavista				
SE55ED Internos e internas capacitados en artes	Número	500	547	109%
Observación B / S: Se hizo efícienta la destinación de recursos pues algunos cursos no requerían de materiales y se logró crear un grupo mas de formación				
SE55EE Internos e internas atendidos	Número	1.200	1.156	96%
Observación B / S: se ha incrementado la cantidad de internos participantes debido al inicio de actividades en Bellavista.				
SE55EF Familiares de pospensados atendidos	Número	150	294	196%
Observación B / S: se ha incrementado la cantidad de familiares de pospensados atendidos debido al inicio de actividades en Bellavista				

Proyecto PD: 2.1.3.6 Seguimiento y acompañamiento a la problemática del sistema penitenciario y carcelario**Proyecto: 160258 - Apoyo, seguimiento y acompañamiento a la problemática del sistema penitenciario y carcelario****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 756 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 756 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 743**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE58BA Conceptos psicológicos emitidos (a dem)	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: 2203 conceptos emitidos equivalen al 100%				
SE58BB Intern@s atend. consult. jurid (a dem)	Porcentaje	100	100	100%

Observación B / S: 797 internos atendidos corresponden al 100%

SE58BC Sustanciaciones realizadas (a dem)	Porcentaje	100	100	100%
---	------------	-----	-----	------

Observación B / S: 1216 sustanciaciones realizadas corresponden al 100%

SE58BD Solicit beneficios tramitadas (a dem)	Porcentaje	100	100	100%
--	------------	-----	-----	------

Observación B / S: 1648 solicitudes corresponden al 100%

SE58CA Beneficios tramit para internos carc med	Porcentaje	100	100	100%
---	------------	-----	-----	------

Observación B / S: 1924 beneficios tramitados corresponden al 100%

Reto: 2.2 - En Medellín convive toda la ciudadanía

Programa: 2.2.1 - Justicia cercana al ciudadano

Proyecto PD: 2.2.1.1 Fortalecimiento y ajustes del sistema de justicia cercana a la ciudadanía

Proyecto: 160262 - Fortalecimiento de las comisarías de familia en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.584 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.584 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.568

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

SE62DA Familias atendidas por comisarías de fam	Número	20.000	10.170	51%
---	--------	--------	--------	-----

SE62DB Comisarías intervenidas integralmente	Número	9	7	78%
--	--------	---	---	-----

Observación B / S: Se fortalecieron en los tres meses 2 comisarías a través de capacitación.

SE62DE Servid capac human pro atenc comis flia	Número	110	66	60%
--	--------	-----	----	-----

Observación B / S: Hasta el 30 de junio llevamos realizadas 3 capacitaciones donde han participado 66 servidores.

Proyecto: 160264 - Fortalecimiento de las casas de justicia en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano

Síntesis Proyecto: Eficacia : 49% Ejec. Financiera : 94%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 924 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 924 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 866

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

SE64AC Usuarios atendidos desde casas justicia	Número	120.000	59.419	50%
--	--------	---------	--------	-----

Observación B / S: Los planes de acción de las Casas de Justicia se han desarrollado de forma efectiva, que se evidencia en el porcentaje de cumplimiento reportado.

SE64AE Casas justicia fortalecidas integral	Porcentaje	35	17	49%
---	------------	----	----	-----

Observación B / S: Se han realizado diferentes acciones en las cinco Casas de Justicia, de mejoramiento del clima organizacional, mantenimiento y sostenimiento de la infraestructura, que contribuyen al fortalecimiento de las Casas de Justicia.

Proyecto: 160271 - Fortalecimiento de las inspecciones de policía en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano

Síntesis Proyecto: Eficacia : 35% Ejec. Financiera : 63%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.608 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.608 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.383

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

SE71AB Casos atendidos en despachos	Número	20.000	8.356	42%
Observación B / S: Al sumar los casos atendidos durante el primero y segundo trimestre de 2017, se observa un porcentaje de cumplimiento del 41%, es decir se está 9% por debajo de lo esperado; se proyecta superar esta situación cuando inicie la implementación del Código Nacional de Policía y Convivencia, lo cual se dará a partir del mes de agosto de 2017.				
SE71AC Servidores de unidad formados	Número	200	56	28%
Observación B / S: Para el segundo trimestre de 2017 se inició el Diplomado dirigido a 56 servidores				

Programa: 2.2.2 - Promoción de la convivencia
Proyecto PD: 2.2.2.1 Promoción y formación para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas para la convivencia
Proyecto: 160273 - Fortalecimiento del capital social y las competencias ciudadanas para la convivencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.517 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.517 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.517

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE73DA Grupos formados en convivencia	Número	27	26	96%
SE73DB Estrat diseñ e implem prom conv ciudad	Número	12	3	25%
Observación B / S: Para el próximo semestre se inicia con la implementación de otras estrategias diseñadas en el primero, lo que permitirá avanzar y dar cumplimiento a la meta.				
SE73DC Camp edu que prom la convi en el deporte	Número	1	0	0%
Observación B / S: Este indicador empezó a ser responsabilidad de la Secretaría de Seguridad y Convivencia a partir de este segundo semestre 2017. Por lo tanto se espera el respectivo traslado presupuestal por parte de la Secretaría de Hacienda.				

Programa: 2.2.3 - Todos convivimos en el espacio público
Proyecto PD: 2.2.3.1 Regulación, control y recuperación del espacio público
Proyecto: 160277 - Control, recuperación y regulación del espacio público

Síntesis Proyecto: Eficacia : 53% Ejec. Financiera : 47%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.646 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.159 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.759

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE77BC Intervenci. realizadas control del e.p.	Número	3.750	2.635	70%
Observación B / S: Porcentaje acumulado del 70% , se sustenta un incremento en el indicador por ajuste normativo, el cual supone un aumento de las actividades propias de apoyo en conjunto con las actividades de la Policía Nacional, externas a la Subsecretaría de Espacio Público				
SE77BF Sensibilización realizada a comerc infor	Número	17.000	6.168	36%
Observación B / S: Porcentaje acumulado del 36% hubo una disminución del indicador por falta de continuidad y/o cobertura de las actividades de apoyo a la sensibilización , por déficit en el recurso. Para los dos próximos trimestres se proyecta una estrategia de plan de choque para el cumplimiento del mismo.				
SE77CA Artic.oferta instit. comer.infor. realiz	Número	625	294	47%
SE77CB Control realizado de la pev	Número	5.500	3.133	57%
Observación B / S: Porcentaje acumulado del 57%, ya que se realizó un plan de contingencia frente a los trámites administrativos inconclusos, retardados, represados y carentes de gestión por parte del equipo de publicidad exterior visual.				

Proyecto PD: 2.2.3.2 Espacio público para el disfrute la ciudadanía

Proyecto: 160283 - Recuperación del espacio público para el disfrute de la ciudadanía**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 41% Ejec. Financiera : 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.016 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.016 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.010**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE83AF Estudios socioeconomicos realizados	Número	1.250	707	57%
SE83BA Visita de control realizada comer. reg.	Número	5.000	2.295	46%
SE83BB Autor.o cancel. ocup.temp.comer.info	Número	1.250	241	19%

Observación B / S: Porcentaje acumulado del 19.3% Suspendidas las autorizaciones de los permisos temporales y transitorios por derogación de la norma (Ordenanza 018 de 2002) que sustenta este, y por ajuste normativo del proceso (Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia), el cual se encuentra en revisión final por parte de la Secretaria General de la Alcaldía de Medellín.

Programa: 2.2.4 - Prevención de las violencias**Proyecto PD:** 2.2.4.1 Entornos protectores para niños, niñas, adolescentes y jóvenes**Proyecto: 160285 - Consolidación de entornos protectores para niños, niñas, adolescentes y jóvenes****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 23% Ejec. Financiera : 87%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 188 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 188 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 164**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE85AA Proyectos apoyados entornos protectores	Porcentaje	100	45	45%

Observación B / S: Se aunaron esfuerzos con la Secretaría de Inclusión Social, facilitando la adición de recursos (CDP) de la Secretaría de Seguridad en el marco de uno de sus contratos en la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas, para el desarrollo de acciones conjuntas en el marco de prevención de reclutamiento de NNAYJ. Se contemplan ejecutar los apoyos a proyectos para mediados del segundo semestre del año.

SE85AB Material pedagógico de rutas elaborado	Número	2	0	0%
---	--------	---	---	----

Observación B / S: Se esta revisando y ajustando material para su elaboración.

Proyecto PD: 2.2.4.2 Implementación y promoción de acciones institucionales para la prevención social del delito**Proyecto: 160289 - Implementación de acciones institucionales para la prevención social del delito****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.176 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.176 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.176**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE89AD Jóvenes particip en semilleros de conviv	Número	1.250	805	64%

Observación B / S: La participación de los jóvenes está sujeta al calendario escolar. Se trata de atender a la mayor cantidad en los tres primeros trimestres del año

SE89AE Adolesc y jóvenes sensibilizados en cpnv	Número	30.000	15.091	50%
---	--------	--------	--------	-----

SE89AF Docentes-padres y/o cuidadores atendidos	Número	2.000	1.196	60%
---	--------	-------	-------	-----

Observación B / S: La participación de los docentes está sujeta al calendario escolar. La participación de los padres es voluntaria y en horarios adiciopnes a la jornada laboral y escolar, por estas razones se trata de atender a la mayor cantidad en los tres primeros trimestres del año

Reto: 6.4 - Medellín vuelve a su Centro
Programa: 6.4.4 - Presencia institucional y gobernabilidad
Proyecto PD: 6.4.4.1 Fortalecimiento de la seguridad y la gobernabilidad en el Centro
Proyecto: 160293 - Fortalecimiento de la seguridad y la gobernabilidad en el centro

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 256 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 256 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 241

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE93AM Intervenc para fortalece centro realizad	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: Se realizaron 19 operativos				

Reto: 6.6 - Medellín reconoce la importancia de su territorio rural
Programa: 6.6.2 - Desarrollo integral de los territorios rurales
Proyecto PD: 6.6.2.5 Fortalecer la presencia institucional en seguridad en los territorios rurales
Proyecto: 160294 - Adquisición cámaras de seguridad en territorios rurales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 254 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 254 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 254

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE94AN Cámaras de seguridad instaladas	Número	3	0	0%
Observación B / S: Instalación prevista para el mes de septiembre de 2017				

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana
Reto: 2.1 - Medellín segura
Programa: 2.1.1 - Planeación para la seguridad integral
Proyecto PD: 2.1.1.4 Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - Planes especiales y Plan del Centro
Proyecto: 160566 - 17pp99-fortalecimiento de herramientas y capacidades comunitarias para la seguridad y la convivencia en las comur

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 6%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.244 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.699 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 172

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE66CA Act prom seguridad y convivencia com 1	Número	231	0	0%
Observación B / S: Etapa preconcontractual esta publicado en SECOP dos procesos Licitación Pública # 0070006211 y Subasta Inversa # 009012010				
SE66CB Capacitación cívica juvenil com 2	Número	1	0	0%

Observación B / S: Etapa precontractual esta publicado en SECOP dos procesos Licitación Pública # 0070006211 y Subasta Inversa # 009012010				
SE66CD Act prom seguridad y convivencia com 4	Número	10	0	0%
Observación B / S: Etapa precontractual esta publicado en SECOP dos procesos Licitación Pública # 0070006211 y Subasta Inversa # 009012010				
SE66CE Act prom seguridad y convivencia com 5	Número	54	0	0%
Observación B / S: Etapa precontractual 3 procesos: Esta publicado en SECOP dos procesos Licitación Pública # 0070006211 y Subasta Inversa # 009012010. Se realizara Contratación directa con el ITM. Pendiente firma del contrato # 4600070933 2017				
SE66CF Act prom seguridad y convivencia com 8	Número	38	0	0%
Observación B / S: Etapa precontractual esta publicado en SECOP dos procesos Licitación Pública # 0070006211 y Subasta Inversa # 009012010				
SE66CG Act prom seguridad y convivencia com 9	Número	2	0	0%
Observación B / S: Etapa precontractual esta publicado en SECOP dos procesos Licitación Pública # 0070006211 y Subasta Inversa # 009012010				
SE66CH Act prom seguridad y convivencia com 10	Número	63	0	0%
Observación B / S: Etapa precontractual esta publicado en SECOP dos procesos Licitación Pública # 0070006211 y Subasta Inversa # 009012010				
SE66CI Act prom seguridad y convivencia com 11	Número	68	0	0%
Observación B / S: Etapa precontractual esta publicado en SECOP dos procesos Licitación Pública # 0070006211 y Subasta Inversa # 009012010				
SE66CJ Act prom seguridad y convivencia com 13	Número	14	0	0%
Observación B / S: Etapa precontractual esta publicado en SECOP dos procesos Licitación Pública # 0070006211 y Subasta Inversa # 009012010				
SE66CK Act prom seguridad y convivencia com 15	Número	16	0	0%
Observación B / S: Etapa precontractual esta publicado en SECOP dos procesos Licitación Pública # 0070006211 y Subasta Inversa # 009012010				
SE66CL Act prom seguridad y convivencia com 70	Número	6	0	0%
Observación B / S: Etapa precontractual esta publicado en SECOP dos procesos Licitación Pública # 0070006211 y Subasta Inversa # 009012010				
SE66CM Act prom seguridad y convivencia com 80	Número	23	0	0%
Observación B / S: Etapa precontractual esta publicado en SECOP dos procesos Licitación Pública # 0070006211 y Subasta Inversa # 009012010				
SE66DA Capacit civica juvenil padres com 3	Número	2	0	0%
Observación B / S: Etapa precontractual esta publicado en SECOP dos procesos Licitación Pública # 0070006211 y Subasta Inversa # 009012010				
SE66DB Act prom seguridad y convivencia com 12	Número	83	0	0%
Observación B / S: Etapa precontractual esta publicado en SECOP dos procesos Licitación Pública # 0070006211 y Subasta Inversa # 009012010				
SE66DC Act prom seguridad y convivencia com 60	Número	1	0	0%
Observación B / S: Etapa precontractual esta publicado en SECOP dos procesos Licitación Pública # 0070006211 y Subasta Inversa # 009012010				

Programa: 2.1.2 - Infraestructura y tecnología para la seguridad y la convivencia

Proyecto PD: 2.1.2.1 Formulación e implementación de un Plan Maestro de infraestructura física y tecnología para la seguridad y la convivencia

Proyecto: 160567 - 17pp11-adquisición e implementación de tecnología para la seguridad y la convivencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 433 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 433 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 433

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE67AB Camaras de seguridad instaladas	Número	6	0	0%
Observación B / S: Se firmo contrato con la ESU # 4600070083 mayo 2017				

Reto: 2.2 - En Medellín convive toda la ciudadanía

Programa: 2.2.2 - Promoción de la convivencia

Proyecto PD: 2.2.2.1 Promoción y formación para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas para la convivencia

Proyecto: 150151 - 16pp2-tejiendo nuestros derechos construimos convivencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE51BD Actos academicos y ludico pedagogicos	Personas	336	336	100%

Proyecto: 150152 - 16pp3-promoción de la convivencia ciudadana y los derechos humanos para la paz y la reconciliación en manrique

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 40 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 40

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE52CA Pactos convivencia ciudadana	Personas	107	102	95%
Observación B / S: pese a la modalidad para la convocatoria no se logro cumplir la meta				
SE52CB Dinamizacion espacio publico conviv	Personas	180	311	173%
Observación B / S: por ser una actividad en espacio publico las personas que pasaban alrededor de la actividad se acercaban y se optimizaron recursos logrando superar la meta.				

Proyecto: 150155 - 16pp7-promoción y difusión de la convivencia y los derechos humanos con enfoque diferencial a la población víctin

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 39 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 39

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE55AA Conveonversatorio para padres de familia	Personas	132	193	146%
Observación B / S: se logro optimizar los recursos, por esta razon se supero la meta.				
SE55AE Formación cuidadores de niños	Personas	279	280	100%
SE55AG Conversatorio adolescentes mujeres	Personas	167	214	128%
Observación B / S: se logro optimizar los recursos, por esta razon se supero la meta.				
SE55AH Conversatorio adolescentes hombres	Personas	75	178	237%
Observación B / S: se logro optimizar los recursos, por esta razon se supero la meta.				

Proyecto: 150158 - 16pp10-promover la convivencia y reconstrucción del tejido familiar

Síntesis Proyecto: Eficacia : 69% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 82 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 82

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE58AB Descubriendo rutas de atención	Personas	144	148	103%

SE58AK	Semilleros estencil para adolcesce	Personas	36	20	56%
Observación B / S: pese a la modalidad para la convocatoria no se logro cumplir la meta					
SE58AL	Practica de estencil de semilleros	Personas	36	19	53%
Observación B / S: pese a la modalidad para la convocatoria no se logro cumplir la meta					

Proyecto: 150160 - 16pp12-promoción de la convivencia y fortalecimiento de los derechos humanos para atacar las indisciplinas sociale

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 37 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 37

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE60AB Dinamizaciones en espacio publico	Personas	960	1.186	124%
Observación B / S: por ser una actividad en espacio publico las personas que pasaban alrededor de la actividad se acercaban y se optimizaron recursos logrando superar la meta.				

Proyecto: 150188 - 16pp16-promoción y fortalecimiento a la convivencia en belén

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 33 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 33

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE88AB Ferias por la convivencia	Personas	62	211	340%
Observación B / S: por ser una actividad en espacio publico las personas que pasaban alrededor de la actividad se acercaban y se optimizaron recursos logrando superar la meta.				
SE88AC Campañas pedagogicas (escombros)	Personas	97	257	265%
Observación B / S: por ser una actividad en espacio publico las personas que pasaban alrededor de la actividad se acercaban y se optimizaron recursos logrando superar la meta.				
SE88AD Campañas pedagogicas (mascotas)	Personas	78	339	435%
Observación B / S: por ser una actividad en espacio publico las personas que pasaban alrededor de la actividad se acercaban y se optimizaron recursos logrando superar la meta.				
SE88AE Dinamizaciones espacio publico	Personas	146	337	231%
Observación B / S: por ser una actividad en espacio publico las personas que pasaban alrededor de la actividad se acercaban y se optimizaron recursos logrando superar la meta.				

Proyecto: 150222 - 16pp60-promoción y fortalecimiento de la convivencia y los derechos humanos con enfoque de la población víctima

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE22BC Sminarios conciliacion equidad	Personas	168	168	100%

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto PD: 1.1.2.2 Fortalecimiento del gobierno local y recuperación de confianza en la institucionalidad

Proyecto: 120273 - Fortalecimiento de gobierno local y promoción de la convivencia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 37 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 37

Observación Proyecto: Pendiente pago

Proyecto PD: 2.1.1.2 Formulación e implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia – PISC

Proyecto: 120035 - Más seguridad y más vida para medellín

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 89 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 89

Observación Proyecto: Pendiente pago

Proyecto: 120334 - Fortalecimiento institucional de la secretaria de seguridad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 70 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 70

Observación Proyecto: Pendiente pago

Proyecto: 120340 - Denuncias para la vida y seguridad en medellín

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 135 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 135

Observación Proyecto: Pendiente pago

Proyecto PD: 2.1.2.1 Formulación e implementación de un Plan Maestro de infraestructura física y tecnología para la seguridad y la convivencia

Proyecto: 110037 - Mantenimiento adecuación y dotación de sedes externas de la secretaría de gobierno y ddhh

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.710 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.710

Observación Proyecto: Pendiente pago

Proyecto: 120338 - Fortalecimiento organismos de seguridad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.078 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.078

Observación Proyecto: Pendiente pago

Proyecto: 150181 - 16pp11-apoyo tecnológico para la seguridad en laureles

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6

Observación Proyecto: Se libera el recurso

Proyecto PD: 2.1.2.2 Fortalecimiento del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Medellín - SIES-M

Proyecto: 120341 - Sistema sies_m y tic para la seguridad en medellín

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 820 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 820

Observación Proyecto: Pendiente pago

Proyecto PD: 2.2.1.1 Fortalecimiento y ajustes del sistema de justicia cercana a la ciudadanía

Proyecto: 120274 - Sistema municipal de justicia cercana al ciudadano

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 53 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 53

Observación Proyecto: Pendiente pago

Proyecto PD: 2.2.2.1 Promoción y formación para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas para la convivencia

Proyecto: 120270 - Estrategias de divulgación y promoción institucional

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Pendiente pago

Proyecto: 150153 - 16pp5-manual de convivencia y diagnóstico de derechos humanos para aprender a ser, saber tener y vivir en paz coi

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17

Observación Proyecto: Se realizó el pago pendiente

Proyecto: 150159 - 16pp11-escuelas de formación para líderes gestores de convivencia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8

Observación Proyecto: se libera recurso que estaba pendiente

Proyecto: 150161 - 16pp14-promoción de la convivencia y apropiación del espacio público para uso y disfrute de los ciudadanos en el

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1

Observación Proyecto: Se libera el recurso

Proyecto: 150162 - 16pp15-promover y fortalecer la convivencia, los ddhh y la participación en todos los actores sociales, y culturales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19

Observación Proyecto: Se libera el recurso

Proyecto: 150164 - 16pp70-promoción de la convivencia tomando como eje fundamental la familia, fundado en valores y principios tend

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 27 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 27

Observación Proyecto: Se libera el recurso

Proyecto:	150165 - 16pp80-convivamos en grupos de diálogo, para promover la convivencia ciudadana		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17
Observación Proyecto:	Se libera el recurso		
Proyecto:	150166 - 16pp50-promocionar la cultura teleférico en territorio		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25
Observación Proyecto:	Se libera el recurso		
Proyecto:	150170 - 16pp8-control, calidad, equidad, garantía en seguridad en villa hermosa		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0
Observación Proyecto:	Se libera el recurso		
Proyecto:	150177 - 16pp5-apoyo logístico a los programas de participación ciudadana de la policía nacional (cívica infantil y juvenil cara		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0
Observación Proyecto:	Se libera el recurso		
Proyecto:	150178 - 16pp7-fortalecimiento de la seguridad para la prevención del delito en robledo		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0
Observación Proyecto:	Se libera el recurso		
Proyecto:	150183 - 16pp80-san antonio de prado un lugar para la convivencia y la seguridad ciudadana		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0
Observación Proyecto:	Se libera el recurso		
Proyecto:	150184 - 16pp12-la américa: segura y tranquila		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0
Observación Proyecto:	Se libera el recurso		
Proyecto:	150186 - 16pp9-semilleros, talleres, magazin,boletines, carteleras informativas en las escuelas		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14
Observación Proyecto:	Se libera el recurso		
Proyecto:	150474 - 16pp15-promoción de la seguridad en guayabal		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Se libera el recurso

Proyecto: 150475 - 16pp16-fortalecimiento de la seguridad en belén

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Se libera el recurso

Proyecto: 150476 - 16pp50-fortalecimiento de la seguridad ciudadana en san sebastián de palmitas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Se libera el recurso

Proyecto: 150477 - 16pp90-fortalecimiento para la seguridad y la convivencia en santa elena

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Se libera el recurso

Proyecto PD: 2.2.3.1 Regulación, control y recuperación del espacio público

Proyecto: 120278 - Administración del espacio público para la convivencia, la legalidad y la responsabilidad social

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 499 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 499

Observación Proyecto: Pendiente pago

Proyecto PD: 2.2.4.1 Entornos protectores para niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Proyecto: 120275 - Sistema integral de convivencia y protección de infancia y familia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 290 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 290

Observación Proyecto: Pendiente pago

Proyecto: 150180 - 16pp10-capacitación y apoyo logístico a los programas de participación ciudadana de la policía nacional (cívica infan)

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Se libera el recurso

Proyecto PD: 2.2.4.2 Implementación y promoción de acciones institucionales para la prevención social del delito

Proyecto: 120279 - Jóvenes por la vida una estrategia de convivencia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1

Observación Proyecto: Pendiente pago

Proyecto: 150118 - 16pp3-prevención de la delincuencia, el crimen y la ilegalidad con niños, niñas y adolescentes en manrique

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4

Observación Proyecto: Se realizó el pago pendiente

Proyecto: 150182 - 16pp70-seguridad para todos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Se libera el recurso



Proyecto: 150208 - 16pp4-fortalecimiento a la seguridad para la prevención del delito en aranjuez

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1



Observación Proyecto: Se libera el recurso

Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2017

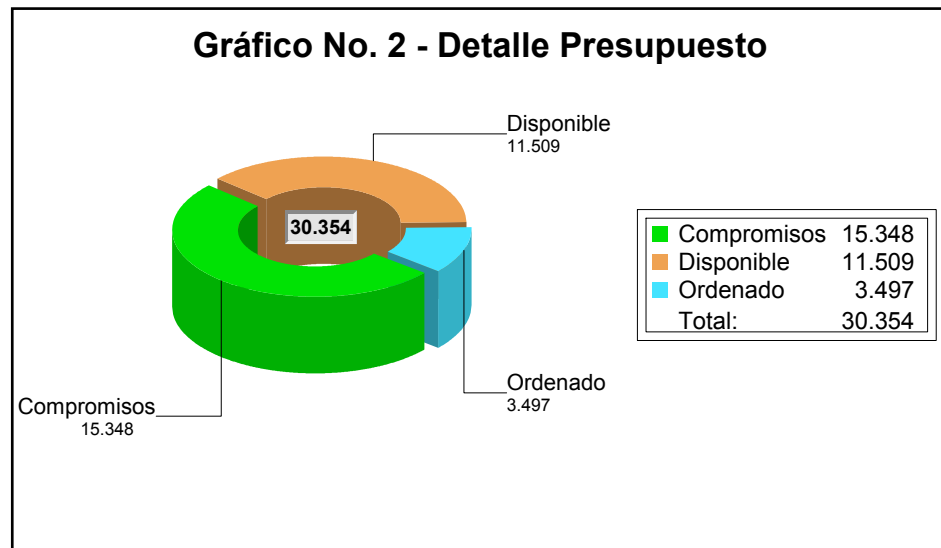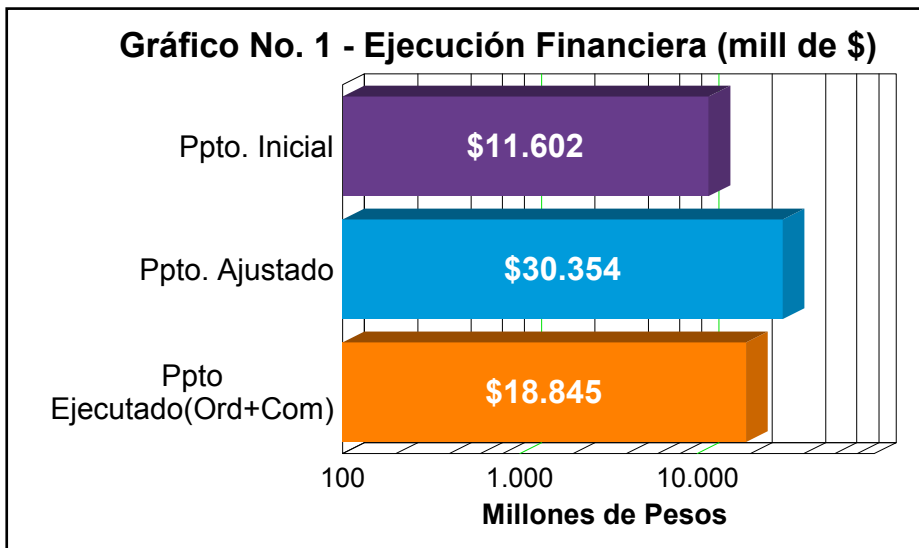

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

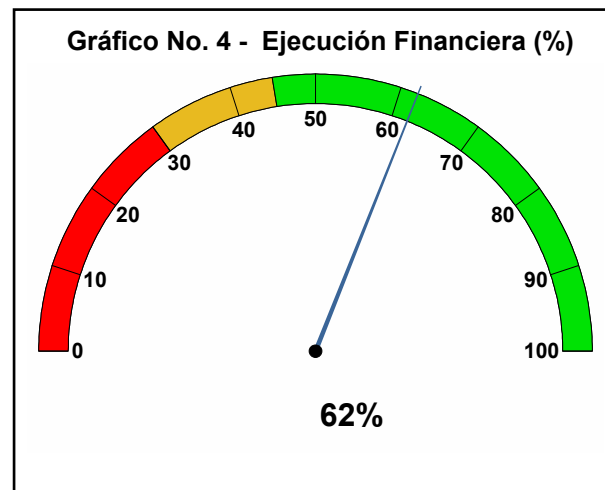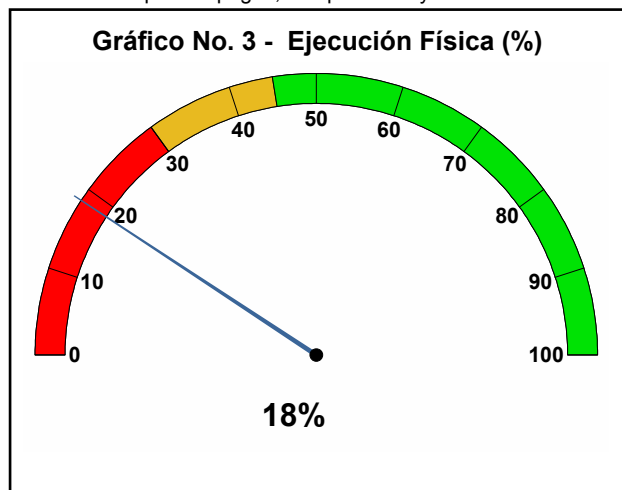

La ejecución financiera comprende pagos, facturas y los compromisos a la fecha de corte. Para el caso de los establecimientos públicos, la Ejecución Financiera se compone de dos cifras: una información obtenida del sistema, que corresponde únicamente a la cifra del presupuesto transferido desde el Municipio al estapúblico, y otra información suministrada por cada entidad que corresponde a los recursos propios invertidos por proyecto.

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente
Reto: 7.3 - Medellín gestiona el riesgo
Programa: 7.3.1 - Conocimiento del riesgo
Proyecto PD: 7.3.1.1 Formación y capacitación en gestión del riesgo
Proyecto: 160388 - Formación y capacitación en gestión del riesgo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 28% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.010 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.010 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.010

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG88AA Perso sist dagrd capacita gestión riesgo	Número	250	70	28%

Observación B / S: Inició ejecución 1 de junio.

Proyecto PD: 7.3.1.2 Fortalecimiento de SIATA e innovación para la gestión del riesgo

Proyecto: 120307 - Fortalecimiento del sistema de información siata

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG07AN Funcion y operaci sist información siata	Número	1	1	100%

Proyecto: 160389 - Fortalecimiento de siata e innovación para la gestión del riesgo.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG89AA Monitoreo de variables meteorológicas	Meses	4	0	0%
Observación B / S: Inicia ejecución segundo semestre.				
DG89AB Predicción hidrometeorológica	Meses	4	0	0%
Observación B / S: Inicia ejecución segundo semestre.				
DG89AC Comunicación a diferentes autoridades	Meses	4	0	0%
Observación B / S: Inicia ejecución segundo semestre.				
DG89AD Difusión de información	Meses	4	0	0%
Observación B / S: Inicia ejecución segundo semestre.				

Proyecto PD: 7.3.1.3 Divulgación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo

Proyecto: 160391 - Divulgación del plan municipal de gestión del riesgo**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 220 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 220 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 220**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG91AA Eventos de socialización del pmgr	Número	10	0	0%
Observación B / S: Eventos a realizar el segundo semestre del año.				

Proyecto PD: 7.3.1.4 Estudios en áreas o zonas con situaciones de riesgo**Proyecto: 120310 - Evaluación y estudios en zonas de riesgo****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 82 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 82**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG10AB Sitios con monitoreo geotécnico	Número	8	8	100%

Proyecto: 160392 - Estudios en áreas o zonas con situación de riesgo**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 27%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.621 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 697**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG92AB Sitios con monitoreo geotécnico	Número	8	0	0%
Observación B / S: En ejecución, producto se entrega en diciembre.				
DG92AC Estudio de detalle	Número	8	4	50%

Programa: 7.3.2 - Reducción y mitigación del riesgo**Proyecto PD: 7.3.2.1 Fortalecimiento de instancias sociales del DAGRD****Proyecto: 160393 - Fortalecimiento de instancias sociales del dagrd****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 500**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG93AJ Cap instancias soci y comuni gral en grd	Unidad	200	119	60%
DG93AK Estrategia dagrd en el territorio	Unidad	5	3	60%
DG93AL Eventos de fortalecimientos a los ccgrd	Unidad	4	0	0%

Observación B / S: Eventos a realizar el segundo semestre del año.

Proyecto PD: 7.3.2.2 Intervención en zonas de riesgo

Proyecto: 160394 - Construcción de obras en zonas de riesgo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 63%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.209 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.958

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG94AD Obras de mitigación	Número	27	0	0%

Observación B / S: En ejecución, producto se entrega en diciembre.

Proyecto PD: 7.3.2.3 Construcción de la política para la gestión del riesgo de desastres

Proyecto: 160395 - Construcción de la política para la gestión del riesgo de desastres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 69 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 69 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 69

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG95BA Plan sensibilización normatividad grd	Número	1	0	0%

Observación B / S: En ejecución, producto se entrega en diciembre.

Proyecto PD: 7.3.2.5 Realización del inventario municipal de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo no mitigable

Proyecto: 160396 - Inventario de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo no mitigable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG96AA Inv mpal asent human zonas alto riesgo	Porcentaje	30	0	0%

Observación B / S: En ejecución, producto se entrega en diciembre.

Programa: 7.3.3 - Manejo eficaz de desastres

Proyecto PD: 7.3.3.1 Gestión integral para el manejo de emergencias sociales y desastres

Proyecto: 120309 - Atención integral de emergencias y desastres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 93 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 93

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG09AN Emergencias atendidas	Porcentaje	100	50	50%

Proyecto: 160397 - Administración integral para el manejo de emergencias y desastres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 69% Ejec. Financiera : 70%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.675 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.881

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG97AA Inspecciones por riesgo	Número	3.500	2.398	69%

Proyecto PD: 7.3.3.3 Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos

Proyecto: 120308 - Renovación y adquisición de nuevas máquinas y herramientas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 47 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 47

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG08BA Equipos de bomberotecnia	Número	10	10	100%

Proyecto: 130464 - Adecuación, mantenimiento y dotación de estaciones de bomberos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 667 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 667

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG64AA Mantenimiento de estaciones	Número	8	8	100%

Proyecto: 160398 - Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 67%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.298 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.801 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.865

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG98BC Estaciones bomberos en óptimas condicio	Número	8	4	50%
DG98BD Mto maquinaria, herramientas y equipos	Porcentaje	100	50	50%
DG98BE Adquisición maquinas, herramienta y equipo	Unidad	50	0	0%

Observación B / S: En ejecución, producto se entrega en septiembre.

DG98BF Inspecciones técnicas prevención seg/hum	Número	2.000	532	27%
Observación B / S: Inspecciones realizadas a demanda, en julio y agosto se incrementan estas solicitudes.				
DG98BG Estrategia comunicación y difusión cobm	Unidad	1	0	0%
Observación B / S: En ejecución, producto se entrega en diciembre.				

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente
Reto: 7.3 - Medellín gestiona el riesgo
Programa: 7.3.2 - Reducción y mitigación del riesgo
Proyecto PD: 7.3.2.2 Intervención en zonas de riesgo
Proyecto: 150432 - 16pp1-obras de mitigación en popular

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 29 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 29

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG32AA Zonas de riesgo intervenidas	Número	1	1	100%

Proyecto: 160528 - 17pp8-construcción de obras de mitigación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 85%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 505 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 505 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 428

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG28AA Obras de mitigación	Número	7	0	0%



Observación B / S: En ejecución, producto se entrega en diciembre.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables



	Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
Dimensión: 7	- Para proteger entre todos el medio ambiente		
Reto: 7.3	- Medellín gestiona el riesgo		
Programa: 7.3.2	- Reducción y mitigación del riesgo		
Proyecto PD: 7.3.2.2	Intervención en zonas de riesgo		
	120306 Intervención en Zonas de Riesgo	\$ 26,51404	\$ 0,0

Secretaría de Infraestructura Física

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2017

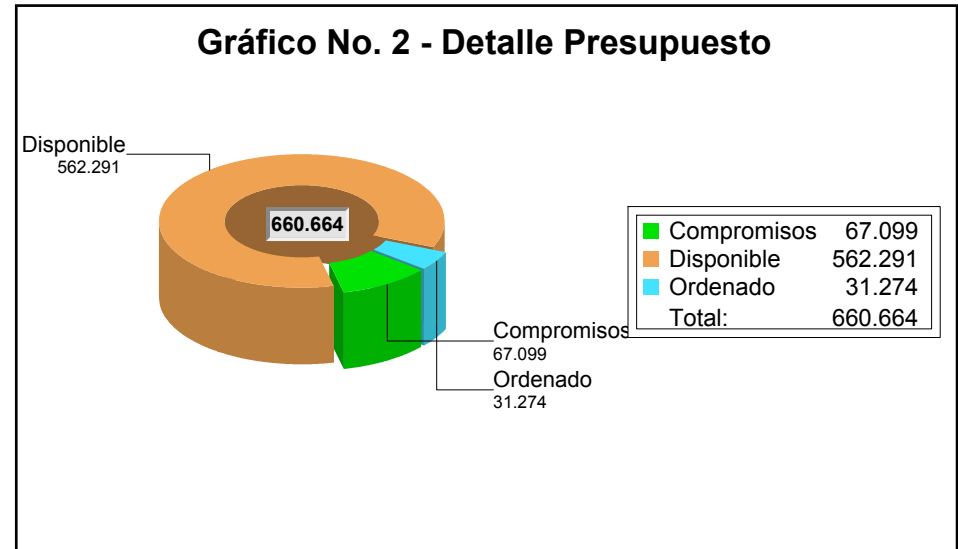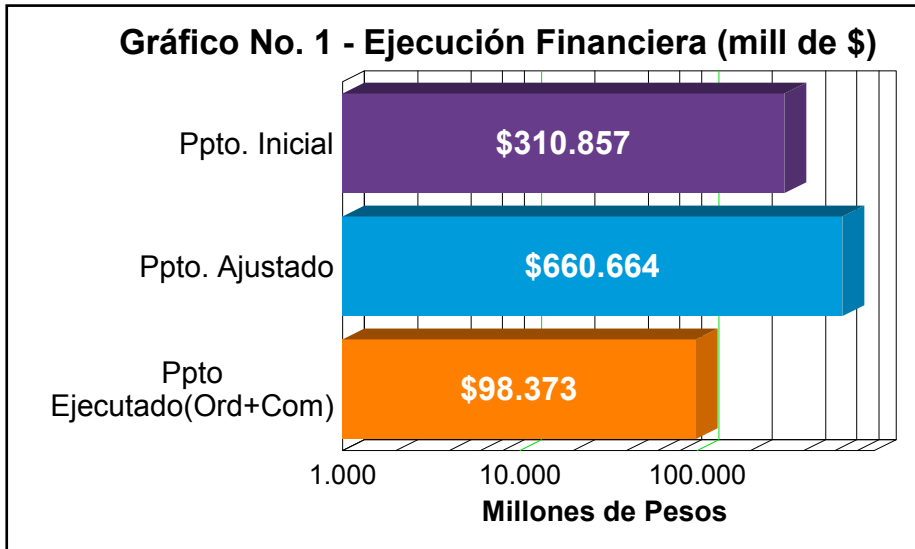

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

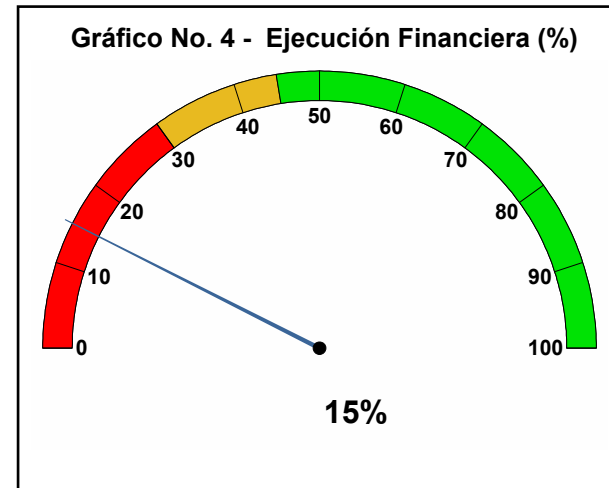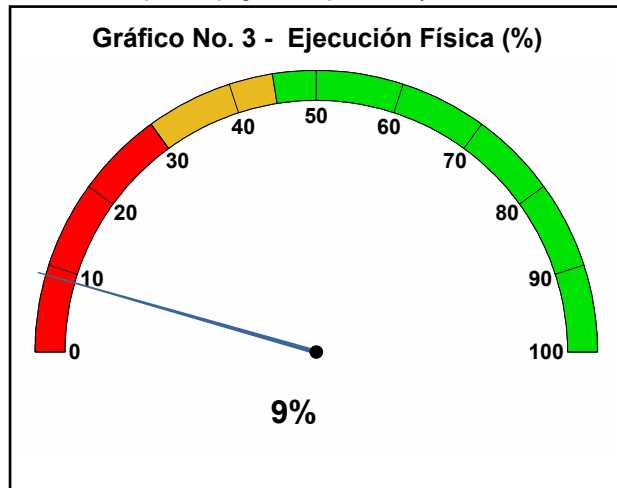

La ejecución financiera comprende pagos, facturas y los compromisos a la fecha de corte. Para el caso de los establecimientos públicos, la Ejecución Financiera se compone de dos cifras: una información obtenida del sistema, que corresponde únicamente a la cifra del presupuesto transferido desde el Municipio al estapúblico, y otra información suministrada por cada entidad que corresponde a los recursos propios invertidos por proyecto.

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos
Reto: 4.3 - Medellín se construye desde el arte y la cultura
Programa: 4.3.1 - Bibliotecas, lectura y patrimonio para contribuir al desarrollo de la ciudadanía
Proyecto PD: 4.3.1.1 Bibliotecas conectando territorios
Proyecto: 140100 - Intervención y reparación parque biblioteca española

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 45%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.020 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.020

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF00AB Avance rehabilitación y repotenciación	Porcentaje	0,6	0,3	50%

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible
Reto: 5.1 - Medellín se integra con la región, el Área Metropolitana y la Nación
Programa: 5.1.1 - Gestión de planes regionales y metropolitanos
Proyecto PD: 5.1.1.1 Cofinanciar Autopistas para la Prosperidad
Proyecto: 130359 - Autopistas para la prosperidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 52.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 52.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF59DA Recursos desembolsados	Pesos	52.000.000.000	0	0%

Observación B / S: Se esta tramitando el desembolso por (\$31,200,000.000), correspondiente al 60% de la vigencia futura del año 2017.

Reto: 5.2 - Medellín por una mejor movilidad
Programa: 5.2.2 - Proyectos de infraestructura para la movilidad de la ciudad
Proyecto PD: 5.2.2.1 Intervenciones puntuales de infraestructura para el mejoramiento de la red de movilidad
Proyecto: 120047 - Construcción de mejoras viales en sitios neurálgicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 75%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.339 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.007

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF47SC Sitios intervenidos	Kilometro Carril	0,82	0,5	61%

Proyecto: 120069 - Estudios y diseños para la infraestructura vial del municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 25%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 244 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 60

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF69AD Estudios y diseños	Número	3	2	67%
Observación B / S: En ejecución				

Proyecto: 150452 - Diseño, construcción y mejoramiento de infraestructura por acciones judiciales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 241 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 241

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF52BA Estudios y diseños	Número	1	0	0%
Observación B / S: En etapa precontractual (sector las hamacas)				

Proyecto: 160140 - Estudios y diseños para infraestructura pública

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 1%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.568 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.077 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 40

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF40BA Estudios y diseños	Número	4	0	0%
Observación B / S: En etapa precontractual (Estudios y diseños)				

Proyecto: 160142 - Estudios, construcción y sostenimiento de infraestructura por acciones judiciales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 5%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 258

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF42BA Construcción de andenes	Metro Cuadrado	805	0	0%
Observación B / S: Conquistadores en ejecución, los demás proyectos en etapas estudios previos.				
IF42BB Construcción de estructuras de contención	Metro Cuadrado	350	0	0%
Observación B / S: En estudios previos				
IF42BC Redes de aguas lluvia	Metro	500	0	0%
Observación B / S: En estudios previos				

Proyecto: 160146 - Construcción y mejoramiento de vías en sitios neurálgicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 77%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.554 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.635 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.780

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF46BA Vías mejoradas	Kilometro	0,4	0	0%

Observación B / S: A la fecha, la minuta del contrato interadministrativo entre la SIF y la EDU, se encuentra en revisión jurídica, para proceder con la suscripción y legalización de dicho contrato.

En etapa de estudios previos

IF46BB Andenes construidos	Metro Cuadrado	250	0	0%
----------------------------	----------------	-----	---	----

Observación B / S: En etapa de estudios previos

Proyecto: 160150 - Adquisición y gestión de bienes inmuebles para proyectos viales nuevos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 53% Ejec. Financiera : 3%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.284 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.284 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 38

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF50CA Adquisición de predios	Metro Cuadrado	650	345,38	53%

Proyecto PD: 5.2.2.10 Construcción y mejoramiento de la vía Altos del Rodeo (Calle 6 sur entre carreras 53 y 89)

Proyecto: 140098 - Construcción y mejoramiento de la vía altos del rodeo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 39%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.096

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF98XF Estudios y diseños	Número	1	0	0%

Observación B / S: El proyecto segunda etapa de la vía Altos del Rodeo se realizará mediante convenio con la EDU, actualmente se estructura los estudios previos para dicho convenio

Proyecto PD: 5.2.2.11 Construcción lateral sur de la quebrada Altavista

Proyecto: 120072 - Construcción de vías laterales quebrada alta vista

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.171 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.171 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.951

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF72AL Estudios y diseños	Número	1	0	0%

Observación B / S: En etapa precontractual

Proyecto PD: 5.2.2.2 Mantenimiento de la infraestructura para el mejoramiento de la movilidad

Proyecto: 120052 - Rehabilitación y sostenimiento de la malla vial e infraestructura asociada del municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 93%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.516 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.974

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF52AF Pavimentos - mto periódico puntual	Kilometro	43,2	55,06	127%
IF52AG Pavimentos - mto periódico masivo	Kilometro	7,1	5,95	84%
IF52AP Pavimentos - rehabilitación	Kilometro	1,4	0,69	49%
IF52AQ Mto construc pasamanos, defensa,baranda	Metro Lineal	2.938	2.783	95%

Proyecto: 150121 - Construcción de obras de estabilización para la movilidad vial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 71%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.211 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.562

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF21AH Construcción muros de contención	Número	1	0	0%

Observación B / S: La obra va en un 70% de ejecución; va adelantada con respecto al cronograma de obra, pero no ha culminado en su totalidad para darle meta cumplida.

Proyecto: 160143 - Mantenimiento y rehabilitación de la malla vial e infraestructura asociada

Síntesis Proyecto: Eficacia : 19% Ejec. Financiera : 10%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 38.413 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 78.185 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.703

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF43BA Vias mejoradas	Kilometro	226	20,03	9%

Observación B / S: El avance se ha dado por adiciones de los contratos existentes en el mantenimiento de la malla vial, los contratos nuevos no han arrancado todavía, estan en proceso licitatorio

IF43BB Andenes mejorados	Metro Cuadrado	7.474	2.137	29%
--------------------------	----------------	-------	-------	-----

Observación B / S: El avance se ha dado por adiciones de los contratos existentes en el mantenimiento de la malla vial, los contratos nuevos no han arrancado todavía, estan en proceso licitatorio

Proyecto: 160144 - Adquisición y mantenimiento de maquinaria y equipo para obras de infraestructura

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 6%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 56

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF44BA Adquisicion de equipos	Número	10	0	0%

Observación B / S: El presupuesto para la adquisición de los equipos se encuentra en trámite de traslado. Se proyecta que el CDP para el proyecto esté disponible en la semana del 17 de Julio.

IF44BB Equipos mantenidos en condiciones adecuada Porcentaje 85 0 0%

Observación B / S: Actualmente se encuentran los procesos para la contratación del mantenimiento de equipos en la etapa precontractual, Se materializó el riesgo demora en el inicio de los procesos de contratación dada la solicitud de inmovilizar los equipos modelo 1982, lo cual afectó el alcance de los procesos, y el presupuesto de los mismos.

Proyecto: 160148 - Construcción de obras de estabilización para la seguridad vial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 4%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.568 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.568 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 275

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF48CA Construcción de obras de contención	Kilometro	1,3	0	0%

Observación B / S: Actualmente las carpetas se encuentran en la etapa precontractual.

Proyecto PD: 5.2.2.3 Mantener los puentes vehiculares y peatonales de la ciudad

Proyecto: 120067 - Construcción, adecuación y sostenimiento de puentes peatonales y vehiculares de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 552 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 540

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF67AE Diseño puentes	Número	1	1	100%
IF67AX Mantenimiento puentes	Número	1	1	100%

Proyecto: 160153 - Construcción, mejoramiento y sostenimiento de puentes peatonales y vehiculares

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.284 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.284 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF53BA Construcción de puentes	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se encuentra en ejecución, sin entregar productos.

IF53BB Puentes reparados y/o mejorados	Número	5	0	0%
--	--------	---	---	----

Observación B / S: Se encuentra en ejecución, sin entregar productos.

Proyecto PD: 5.2.2.5 Terminar el Puente de la Madre Laura y obras complementarias

Proyecto: 120071 - Construcción puente calle 93-94 (aranjuez - castilla)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 58%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.958 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.222

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF71DA Reajustes de obra	Número	1	1	100%

Reto: 5.3 - Medellín gestiona sus sistemas de movilidad

Programa: 5.3.2 - Intervenciones movilidad para transporte público multimodal

Proyecto PD: 5.3.2.1 Revisar y ajustar los diseños y desarrollar la primera fase del corredor de transporte de la 80

Proyecto: 160029 - Estructuración tranvía metro ligero de la avenida 80

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.460 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF29TA Estudios y diseños	Número	4	0	0%

Observación B / S: Se avanza en la Actualización de los estudios y diseños de tránsito y transporte, igual que en la Optimización y actualización de estudios y diseños de ingeniería Fase II.

Proyecto: 170040 - Construcción-corredor vial y de transporte avenida 80 y obras complementarias

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: No esta formulado todavia

Proyecto PD: 5.3.2.2 Plan Integral Tranvía de Ayacucho

Proyecto: 090106 - Obras corredor ayacucho

Síntesis Proyecto: Eficacia : 21% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 59.947 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23.487 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF06BA Corredores intervenidos	Kilometro	6,7	1,4	21%

Observación B / S: 1.4 km del cable línea H y 600 metros desde la estación Alejandro Echavarría a la estación oriente del tranvía de Ayacucho

Proyecto PD: 5.3.2.6 Construir el corredor del sur en jurisdicción de Medellín

Proyecto: 160145 - Construcción obras metroplus

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.645 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.370

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF45BG Estudios y diseños	Porcentaje	80	0	0%

Observación B / S: Se encuentra en proceso de publicación los pliegos de condiciones para la contratación de los estudios y diseños de los corredores definidos en el Plan de Desarrollo 2016-2019 para los cuales se asignó recursos. No se cuenta con ejecución a la fecha, dado que sólo hasta mayo de 2017 el Municipio de Medellín transfirió a Metroplús los recursos de la vigencia 2017 para la ejecución de los proyectos

Programa: 5.3.3 - Gestión integral para la movilidad no motorizada

Proyecto PD: 5.3.3.1 Construcción de cicloinfraestructura

Proyecto: 120076 - Construcción de ciclo rutas en la ciudad de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 493 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 487

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF76AG Construcción de ciclorrutas	Kilometro	1,5	0	0%

Observación B / S: La obra la contrato la EDU en convenio con SIF y Suministros y Servicios, la obra ya tiene los permisos de aprobación del PMT (Plan de Manejo de Tránsito), Esta obra esta lista para empezar ejecución.

Proyecto: 160168 - Construcción y sostenimiento de ciclo rutas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 5%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 573

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF68BA Ciclorutas mejoradas y/o mantenidas	Kilometro	20	0	0%

Observación B / S: Por aprobación en comité de contratación

IF68BB Ciclorutas construidas Kilometro 10 0 0%

Observación B / S: Se esta estructurando contrato interadministrativo con EDU para la construcción de las ciclorrutas diseñadas en el primer contrato

IF68BC Cicloparqueaderos construidos Número 500 0 0%

Observación B / S: Por aprobación en comité de contratación

IF68BD Estudios y diseños Número 4 0 0%

Observación B / S: se esta estructurando un contrato interadmon nuevo con EDU para el diseño de tramos de ciclorruta para la meta PD.

Proyecto PD: 5.3.3.3 Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonal

Proyecto: 120057 - Construcción y mejoramiento de obras para la movilidad peatonal de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.089 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.089

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

IF57NN Construcción de espacio público Metro Cuadrado 388,35 388,35 100%

Proyecto: 160155 - Construcción y mejoramiento de vías peatonales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 8% Ejec. Financiera : 5%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.703 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.703 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 388

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF55BA Construcción y mejoramiento de andenes	Metro Cuadrado	13.447	0	0%
Observación B / S: Se esta estructurando contrato interadministrativo con EDU para diseño y ejecución de movilidad no motorizada				
IF55BB Estudios y diseños	Número	6	1	17%
Observación B / S: En vistos buenos por parte del DAP				

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.2 - Proyectos Integrales para Medellín

Programa: 6.2.2 - Implementación de proyectos estratégicos

Proyecto PD: 6.2.2.1 Estrategia Proyectos Urbanos Integrales

Proyecto: 120078 - Construcción pui la iguaná

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 133 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 133

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF78AG Andenes construidos	Metro Cuadrado	1.335	1.335	100%
IF78AH Zonas verdes	Metro Cuadrado	277	277	100%
IF78AJ Espacio publico	Metro Cuadrado	278	278	100%

Proyecto: 160147 - Construcción obras adicionales pui centro oriental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.952 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.952 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.615

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF47BA Espacio público mejorado	Metro Cuadrado	100	0	0%
Observación B / S: A la fecha, la minuta del contrato interadministrativo entre la SIF y la EDU, se encuentra en revisión jurídica, para proceder con la suscripción y legalización de dicho contrato. Por lo tanto aun no se tiene acta de inicio.				
IF47BC Estudios y diseños	Número	4	0	0%
Observación B / S: A la fecha, la minuta del contrato interadministrativo entre la SIF y la EDU, se encuentra en revisión jurídica, para proceder con la suscripción y legalización de dicho contrato. Por lo tanto aun no se tiene acta de inicio.				

Proyecto: 160149 - Construcción obras adicionales pui noroccidental**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.952 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.952 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF49BA Espacio público construcción	Metro Cuadrado	150	0	0%
Observación B / S: A la fecha, la minuta del contrato interadministrativo entre la SIF y la EDU, se encuentra en revisión jurídica, para proceder con la suscripción y legalización de dicho contrato. Por lo tanto aun no se tiene acta de inicio.				
IF49BB Estudios y diseños	Número	4	0	0%
Observación B / S: A la fecha, la minuta del contrato interadministrativo entre la SIF y la EDU, se encuentra en revisión jurídica, para proceder con la suscripción y legalización de dicho contrato.				

Proyecto: 160152 - Construcción obras adicionales pui comuna 13**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 8%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.952 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.952 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.000**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF52CA Espacio publico construido	Metro Cuadrado	118	0	0%
Observación B / S: A la fecha, la minuta del contrato interadministrativo entre la SIF y la EDU, se encuentra en revisión jurídica, para proceder con la suscripción y legalización de dicho contrato. Por lo tanto aun no se tiene acta de inicio.				
IF52CB Estudios y diseños	Número	4	0	0%
Observación B / S: A la fecha, la minuta del contrato interadministrativo entre la SIF y la EDU, se encuentra en revisión jurídica, para proceder con la suscripción y legalización de dicho contrato. Por lo tanto aun no se tiene acta de inicio.				

Proyecto: 160156 - Construcción obras adicionales pui la iguaná**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 34%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.952 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.952 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.353**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF56BC Obras de mitigación sector la cascada	Metro Lineal	450	0	0%
Observación B / S: A la fecha, la minuta del contrato interadministrativo entre la SIF y la EDU, se encuentra en revisión jurídica, para proceder con la suscripción y legalización de dicho contrato. Por lo tanto aun no se tiene acta de inicio.				
IF56BD Estudios y diseños	Número	2	0	0%
Observación B / S: A la fecha, la minuta del contrato interadministrativo entre la SIF y la EDU, se encuentra en revisión jurídica, para proceder con la suscripción y legalización de dicho contrato. Por lo tanto aun no se tiene acta de inicio.				

Reto: 6.3 - Medellín gestiona su paisaje y patrimonio
Programa: 6.3.1 - Espacio público para la convivencia ciudadana
Proyecto PD: 6.3.1.2 Parques para vos
Proyecto: 120059 - Sostenimiento del espacio público de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.708 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.688

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF59AA Espacio público sostenido	Metro Cuadrado	11.999	11.091	92%

Proyecto: 120060 - Construcción y mejoramiento de espacios públicos de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 80%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.286 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.637

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF60AC Espacio público mejorado	Metro Cuadrado	2.661,72	0	0%

Observación B / S: se encuentra aun en estudios y diseños, la construccion solo se empezara cuando sean suscritas las multiples aprobaciones de otras entidades por las que tiene que pasar este proyecto.

IF60AD Parques urbanos y rurales mejorados	Número	1	1	100%
IF60AF Espacio público construido	Metro Cuadrado	4.300	4.300	100%
IF60AG Parques urbanos y rurales construidos	Número	1	2	200%

Proyecto: 160158 - Construcción y mejoramiento de parques para vos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 3%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 27.154 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 824

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF58BA Parques construidos	Metro Cuadrado	3.077	0	0%

Observación B / S: Sique pendiente 3077 m2, correspondientes a la construcción del parque la Loma. compromiso JVE 2014, para la creación de un parque en la vereda la Loma; esta pendiente trasladar CDP al INDER, para el complemento de placa polideportiva de los mandarinis.

IF58BB Parques mejorados	Metro Cuadrado	1.539,91	1.539,91	100%
IF58BC Estudios y diseños	Número	4	0	0%

Observación B / S: el proyecto se encuentra en la fase de estructuración de expedientes para contratación

Proyecto: 160160 - Mantenimiento y rehabilitación del espacio público

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 31%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.562 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.562 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.436

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF60DA Parques mantenidos	Metro Cuadrado	23.526	0	0%

Observación B / S: no se han sacado contratos se está planteando un nuevo convenio interadministrativo EDU -SIF, para el diseño y construcción.

Programa: 6.3.2 - Recuperemos nuestro patrimonio y paisaje
Proyecto PD: 6.3.2.4 Paisajismo y silvicultura de espacios públicos verdes
Proyecto: 160162 - Adecuación y sostenimiento de espacios públicos verdes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 257 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 257 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 257

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF62AA Tala de arboles	Número	320	374	117%

Proyecto: 160163 - Adecuación y sostenimiento de obras "un jardín para vos"

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 9%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.797 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.656 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.735

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF63CA Mantenimiento de zonas verdes y arboles	Metro Cuadrado	560.000	0	0%

Observación B / S: la ejecución de los recursos inician a partir del mes de julio de la presente vigencia

Reto: 6.4 - Medellín vuelve a su Centro
Programa: 6.4.2 - Conectividad y nueva movilidad
Proyecto PD: 6.4.2.3 Rutas para vos
Proyecto: 160161 - Construcción rutas para vos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 4%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 53.718 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.000

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF61CA Estudios y diseños realizados	Número	6	0	0%
Observación B / S: En etapa precontractual				
IF61CB Espacio publico peatonal recuperado	Metro Cuadrado	10.588	0	0%
Observación B / S: En etapa precontractual				

Reto: 6.6 - Medellín reconoce la importancia de su territorio rural

Programa: 6.6.2 - Desarrollo integral de los territorios rurales
Proyecto PD: 6.6.2.6 Proyectos de infraestructura para la movilidad de los corregimientos
Proyecto: 120053 - Construcción y sostenimiento red vial rural del municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.283 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.283

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF53AG Construcción de muros de contención	Metro Lineal	50	50	100%
IF53AI Construcción de obras de drenaje	Metro Lineal	749	749	100%
IF53AJ Afirmados y repavimentaciones	Metro Cúbico	1.233	1.233	100%
IF53AK Construcción de rieles y pavimentación	Metro Cúbico	725	513	71%
IF53AX Estabilizante de suelos	Metro Cuadrado	2.080	2.080	100%

Proyecto: 160154 - Construcción y mantenimiento de vías rurales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.879 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF54BA Vías mejorados	Kilometro	6,3	0	0%
Observación B / S: En proceso precontractual Estudio previo 33637. Se aspira Iniciar en el mes de Octubre de 2017				
IF54BB Drenajes mejorados	Metro	2.620	0	0%
Observación B / S: En proceso precontractual Estudio previo 33637. Se aspira Iniciar en el mes de Octubre de 2017				
IF54BC Andenes mejorados	Metro Cuadrado	187	0	0%
Observación B / S: En proceso precontractual Estudio previo 33637. Se aspira Iniciar en el mes de Octubre de 2017				
IF54BD Limpieza y rocería mejorados	Kilometro	7,6	0	0%
Observación B / S: En proceso precontractual Estudio previo 33637. Se aspira Iniciar en el mes de Octubre de 2017				

Proyecto: 160157 - Desarrollo de infraestructura para la movilidad de los corregimientos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 879 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: se trasladaron todos los recursos según rad 201720010818 del 10 de marzo de 2017 al proyecto 160154 construcción y mto de vías rurales

Proyecto: 160172 - Mantenimiento y operación cable palmitas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 839 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 839 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF72CA Cable mantenimiento	Kilometro	1,1	0	0%

Observación B / S: Formalización del convenio con Terminales en proceso

Programa: 6.6.3 - Desarrollo empresarial rural

Proyecto PD: 6.6.3.4 Comercio local

Proyecto: 160173 - Construcción nuevas centralidades: placitas de mercado local y centros de acopio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 879 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 879 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF73BA Construcción plaza de mercado	Porcentaje	5	0	0%

Observación B / S: Proyecto no formulado todavía

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible

Reto: 5.3 - Medellín gestiona sus sistemas de movilidad

Programa: 5.3.3 - Gestión integral para la movilidad no motorizada

Proyecto PD: 5.3.3.3 Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonal

Proyecto: 150502 - 16pp9-mejoramiento de la infraestructura vial, peatonal y espacio público en buenos aires

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF02HB Instalacion juegos infantiles	Número	1	1	100%

Proyecto: 150504 - 16pp13-construcción de andenes, cordones, cunetas y obras complementarias en diferentes sitios en san javier

Síntesis Proyecto: Eficacia : 54% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.101 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.101

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF04PA Construcion de andenes	Metro Cuadrado	1.120	600	54%

Proyecto: 160552 - 17pp99-mejoramiento infraestructura para movilidad peatonal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.159 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.909 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF52PA Anden mejorado comuna 1 Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual	Metro Cuadrado	887	0	0%
IF52PB Anden mejorado comuna 2 Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual	Metro Cuadrado	537	0	0%
IF52PC Anden mejorado comuna 3 Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual	Metro Cuadrado	300	0	0%
IF52PD Anden mejorado comuna 4 Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual	Metro Cuadrado	475	0	0%
IF52PE Anden mejorado comuna 6 Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual	Metro Cuadrado	304	0	0%
IF52PF Anden mejorado comuna 8 Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual	Metro Cuadrado	150	0	0%
IF52PG Anden mejorado comuna 9 Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual	Metro Cuadrado	72	0	0%
IF52PH Anden mejorado comuna 13 Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual	Metro Cuadrado	400	0	0%
IF52PI Anden mejorado comuna 15 Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual	Metro Cuadrado	1.273	0	0%
IF52PJ Anden mejorado comuna 16 Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual	Metro Cuadrado	1.800	0	0%
IF52PK Anden mejorado comuna 70 Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual	Metro Cuadrado	700	0	0%
IF52PL Anden mejorado comuna 80 Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual	Metro Cuadrado	727	0	0%
IF52PM Anden mejorado comuna 90 Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual	Metro Cuadrado	300	0	0%
IF52PO Andenes mejorados comuna 12 Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual	Metro Cuadrado	50	0	0%
IF52PP Andenes mejorados comuna 60 Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual	Metro Cuadrado	275	0	0%

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.3 - Medellín gestiona su paisaje y patrimonio

Programa: 6.3.1 - Espacio público para la convivencia ciudadana

Proyecto PD: 6.3.1.2 Parques para vos

Proyecto: 160553 - 17pp99-mejoramiento del espacio público en la ciudad

Síntesis Proyecto:

Eficacia : 0%

Ejec. Financiera : 16%

Información Financiera:

Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.881

Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.881

Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF53PC Espacio publico mejorado comuna 15	Metro Cuadrado	100	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual				
IF53PD Espacio publico mejorado comuna 16	Metro Cuadrado	65	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual				
IF53PE Arboles sembrados	Número	450	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en ejecución, sin entregar productos				
IF53PG Espacio público mejorado comuna 70	Metro Cuadrado	78	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual				

Reto: 6.6 - Medellín reconoce la importancia de su territorio rural
Programa: 6.6.2 - Desarrollo integral de los territorios rurales
Proyecto PD: 6.6.2.6 Proyectos de infraestructura para la movilidad de los corregimientos
Proyecto: 160565 - 17pp99-mejoramiento de vías rurales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 902 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 902 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF65PA Mejoramiento de vía en la comuna 50	Kilometro	0,5	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual				
IF65PB Mejoramiento de vía en la comuna 70	Kilometro	0,1	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual				

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

	Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
Dimensión: 5	- Por una movilidad sostenible		
Reto: 5.3	- Medellín gestiona sus sistemas de movilidad		
Programa: 5.3.3	- Gestión integral para la movilidad no motorizada		
Proyecto PD: 5.3.3.3	Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonal		
	130537 14PP3-Construcción y Mejoramiento de Andenes en la Comuna 3 - Manrique	\$ 1,37629	\$ 0,0

Observación Proyecto: Saldo a favor del mpio contrato liquidado

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios
Reto: 6.3 - Medellín gestiona su paisaje y patrimonio
Programa: 6.3.1 - Espacio público para la convivencia ciudadana
Proyecto PD: 6.3.1.2 Parques para vos

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto PD: 5.2.2.1 Intervenciones puntuales de infraestructura para el mejoramiento de la red de movilidad

Proyecto: 080155 - Adquisición de predios para proyectos viales nuevos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3

Proyecto: 100017 - Mejoramiento movilidad vial avenida 80 - 81

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4

Proyecto: 120070 - Construcción de vías y espacio público plan parcial pajarito

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 98 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: No tiene valor estadístico porque es para el pago de una vigencia expirada del año 2015

Proyecto: 120073 - Construcción puente vehicular (cr 92 con calle 80) sobre quebrada malpaso

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 24 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1

Proyecto PD: 5.2.2.2 Mantenimiento de la infraestructura para el mejoramiento de la movilidad

Proyecto: 070060 - Mantenimiento de maquinaria y equipo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50

Proyecto: 110028 - Mantenimiento malla vial corredor metroplús

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 58 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 58

Proyecto PD: 5.2.2.7 Construir intercambio de la Avenida El Poblado con la calle 4 Sur

Proyecto: 140073 - Construcción intercambio 4 sur con av. poblado y obras complementarias

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 80 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 80

Proyecto PD: 5.2.2.2 Mantenimiento de la infraestructura para el mejoramiento de la movilidad

Proyecto: 130126 - Pp13-construcción y mantenimiento de la malla vial

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Contratos por liquidar

Proyecto: 130566 - 14pp50-recuperación y mantenimineto de vías terciarias y de caminos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 29 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Contratos por liquidar

Proyecto: 130572 - 14pp90-recuperación y mantenimiento de la malla vial vehicular y peatonal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto PD: 5.3.3.3 Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonal

Proyecto: 130111 - Pp13-mejoramiento de calles y recuperacion de andenes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Contratos liquidado

Proyecto: 130548 - 14pp6-construccion y mejoramiento de andenes en la comuna 6

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Contratos por liquidar

Proyecto: 140051 - 14pp1- construcción andenes, cordones y cunetas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Contratos liquidado



Proyecto PD: 6.3.2.4 Paisajismo y silvicultura de espacios públicos verdes

Proyecto: 120063 - Sostenimiento de espacios públicos verdes de medellín



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 144 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 57

Observación Proyecto: Contratos por liquidar

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2017

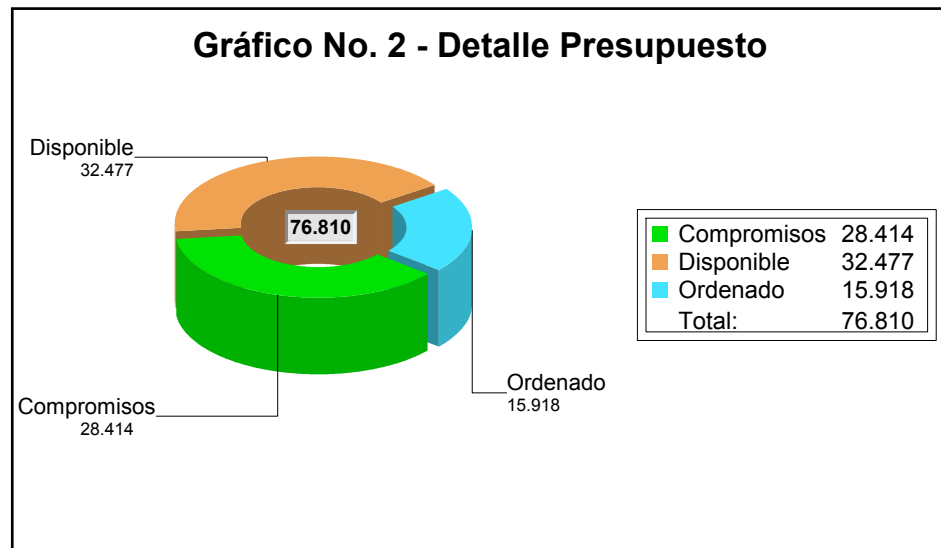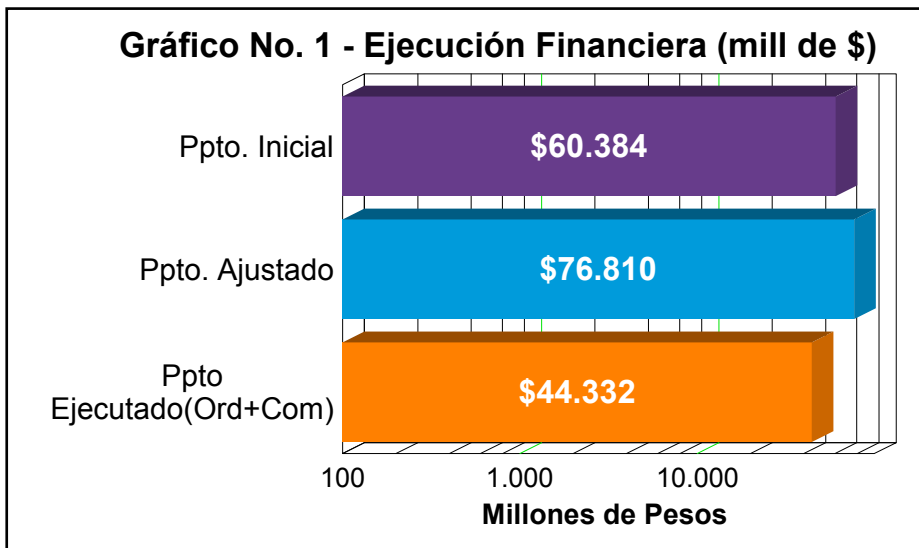

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

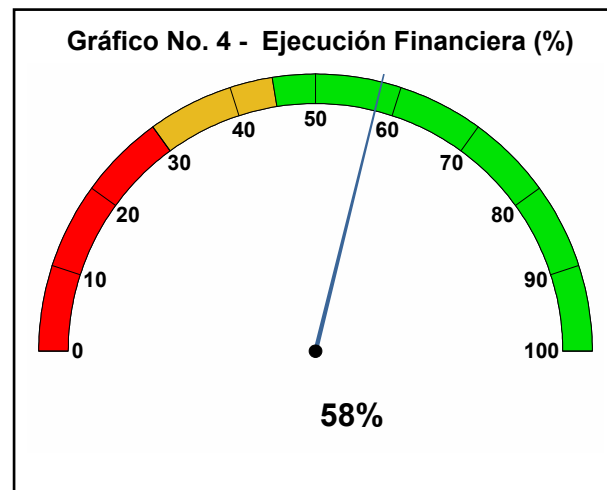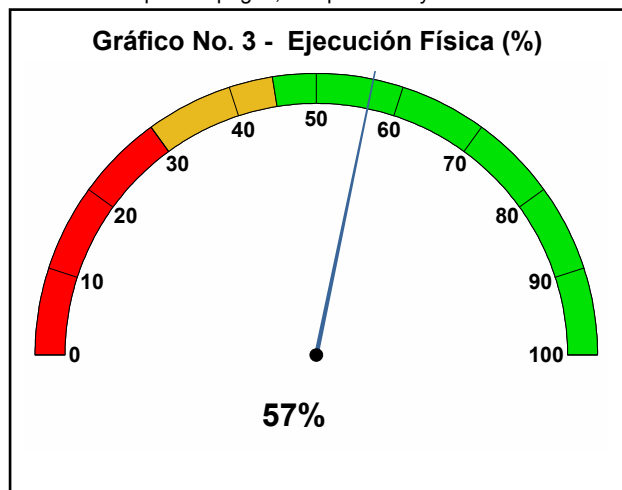

La ejecución financiera comprende pagos, facturas y los compromisos a la fecha de corte. Para el caso de los establecimientos públicos, la Ejecución Financiera se compone de dos cifras: una información obtenida del sistema, que corresponde únicamente a la cifra del presupuesto transferido desde el Municipio al estapúblico, y otra información suministrada por cada entidad que corresponde a los recursos propios invertidos por proyecto.

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes
Proyecto PD: 1.1.5.8 Cultura, educación y promoción del medio ambiente
Proyecto: 120085 - Educación ambiental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 82%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 122 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA85AF Fortalecimiento de aulas ambientales	Número	3	3	100%

Observación B / S: Se fortalecieron las aulas de Provenca, Belén y Coplaza

Proyecto: 160178 - Desarrollo de actividades educativas para el cuidado del medio ambiente

Síntesis Proyecto: Eficacia : 15% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 900

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA78AA Grupos atendidos educac. ambiental	Número	200	30	15%

Observación B / S: Ya inicio la contratación, está en etapa de planeación

Proyecto: 160182 - Desarrollo de acciones socioambientales del comparendo ambiental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA82BA Campañas pedagógicas ambientales	Número	1	0	0%

Observación B / S: No ha iniciado contrato

Proyecto PD: 1.1.5.9 Educación para la prevención del maltrato animal – Gestores(as) infantiles

Proyecto: 160186 - Desarrollo de actividades educativas para la prevención del maltrato animal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 200

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

MA86CA Instituciones educ. capacit.bienest anim	Número	20	0	0%
Observación B / S: El contrato inicio pero no se tienen reportes a la fecha				
MA86CB Personas educadas buen manejo animal	Número	15.000	0	0%
Observación B / S: No ha iniciado la contratación				

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible
Reto: 5.3 - Medellín gestiona sus sistemas de movilidad
Programa: 5.3.5 - Por la calidad del aire que respiramos
Proyecto PD: 5.3.5.2 Estrategias educativas para promover la movilidad sostenible
Proyecto: 160188 - Diseño y ejecución de la campaña educativa para promover la movilidad sostenible

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 127 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 127 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA88BA Campañas informativas en movilidad sost	Número	1	0	0%
Observación B / S: No ha iniciado la contratación				

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios
Reto: 6.6 - Medellín reconoce la importancia de su territorio rural
Programa: 6.6.2 - Desarrollo integral de los territorios rurales
Proyecto PD: 6.6.2.3 Mi corregimiento limpio y sostenible
Proyecto: 160174 - Fortalecimiento de los procesos ambientales en los corregimientos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.314 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.314 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.299

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA74BA Residuos sólidos aprovechados zona rural	ToneladaEU	3.648	4.014	110%
Observación B / S: En esta medición se tiene en cuenta el aprovechamiento de todos los residuos incluyendo orgánicos e inorgánicos. Cuando se planteo la meta en los acopios rurales solo se contemplaban los residuos orgánicos por esto la cifra se incrementa tanto y seguirá con esta tendencia.				

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente
Reto: 7.1 - Medellín ciudad verde y sostenible
Programa: 7.1.1 - Gestión de la Infraestructura Verde: generación y mantenimiento de espacios verdes y conectores ecológicos
Proyecto PD: 7.1.1.1 Ecoparques en quebradas de ciudad
Proyecto: 160110 - Mantenimiento de ecoparques en quebradas de ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 22% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 400

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA10BA Ecoparques de quebradas mantenidos	Número	27	6	22%

Observación B / S: De los 27 parque existentes, se han mantenido 6: La Bermejala, La Frontera, La Presidenta, La Picacha, La Perla y La Batea

Proyecto PD: 7.1.1.2 Conectividad ecológica de corredores verdes

Proyecto: 160121 - Diseño e implementación de conectividad ecológica de corredores verdes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 110 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 110

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA21CA Estrateg implem.para conectiv corred.eco	Porcentaje	30	20	67%

Observación B / S: Inicia la implementación en Julio

Proyecto PD: 7.1.1.3 Planeación y diseño del componente verde de la ciudad

Proyecto: 160122 - Formulación y diseño del componente verde de la ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 54 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 54

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA22BA Estudios valorac,declar y estrat infraes	Porcentaje	35	20	57%

Proyecto PD: 7.1.1.4 Implementación de zonas verdes alternativas

Proyecto: 160123 - Implementación de zonas verdes alternativas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA23CA Zonas verdes alternativas implementadas	Metro Cuadrado	2.000	0	0%

Observación B / S: Ya hay contrato para la ejecución de la actividad; pero aún no se ha iniciado la actividad en campo

Proyecto PD: 7.1.1.5 Estrategia de conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad

Proyecto: 120086 - Medellín, ciudad verde para la vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 65% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 557 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 557

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA86AX Árboles urbanos y rurales sembrados	Número	71.000	86.254	121%
MA86AZ Árboles urbanos sembrados	Número	4.100	1.206	29%

Observación Proyecto: Inicia ejecución del contrato en el mes de Mayo

Proyecto: 160124 - Conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.191

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA24CA Zonas verdes interv retiro quebrad -ecos	Metro Cuadrado	100.000	664.528	665%

Programa: 7.1.2 - Estructura ecológica y sus servicios ecosistémicos

Proyecto PD: 7.1.2.1 Restauración y aumento de la cobertura boscosa en la zona rural de Medellín

Proyecto: 160125 - Restauración y aumento de la cobertura boscosa en la zona rural de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 53% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA25CA Área en proceso de restauración ecológic	Metro Cuadrado	500.000	263.100	53%

Observación B / S: No incluyen Cuenca Verde

Proyecto PD: 7.1.2.2 Gestión para la protección del recurso hídrico

Proyecto: 150063 - Protección de microcuencas estratégicas - ley 99

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 3%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.491 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 353

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA63CA Adquisición de predios	Hectárea	75	0	0%

Observación B / S: Ya hay contrato para la ejecución de la actividad y ya se contrató el personal, pero aún no se ha iniciado la actividad de campo

Proyecto: 160126 - Protección del recurso hídrico - ley 99 de 1993

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 22%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.657 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.656 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.774

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA26CA Ccas abasteced acued internos mples prot	Número	19	18	95%

Proyecto PD: 7.1.2.3 Gestión de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambiental

Proyecto: 160127 - Conservación de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambiental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.732 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.090 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.912

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA27BA Áreas imprt amb con plan manejo	Número	5	5	100%

Proyecto PD: 7.1.2.4 Conocimiento, valoración y gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos

Proyecto: 160128 - Implementación de la política de biodiversidad y los servicios ecosistémicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 220 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 220 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA28AA Investigaciones en biodiversidad realiz	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se redujo el presupuesto. Este año no se cumplirá la meta

Programa: 7.1.3 - Nuestro río y sus quebradas

Proyecto PD: 7.1.3.1 Nuestro Río

Proyecto: 160130 - Fortalecimiento de la gestión de nuestro rio y sus quebradas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 13%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 254

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA30BA Intervencion. realiz recuper. rio y aflu	Número	1	0	0%

Observación B / S: La meta se proyecta cumplir en el último trimestre del año.

Proyecto PD: 7.1.3.2 Intervenciones y mantenimiento de cauces de quebradas

Proyecto: 120080 - Manejo integral del agua**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 92%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.240 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.065**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA80AJ Ejecuc.intervenc.quebr. p'prevenc.mit.ev	Metro	1.620	1.264,9	78%

Proyecto: 160131 - Mantenimiento e intervenciones de cauces de quebradas**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 51%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.553 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.814**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA31AA Intervenciones físicas y mnto pto prior	Metro	1.500	0	0%

Observación B / S: En proceso de contratación y en ejecución

La meta se proyecta cumplir con los contratos de obra y mantenimiento que se perfeccionarán en el segundo semestre de 2017

Proyecto PD: 7.1.3.3 Plan padrino de quebradas y zonas verdes**Proyecto:** 160132 - Diseño e implementación del plan padrino de quebradas y zonas verdes**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 62%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 454 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 280**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA32AA Estrategias plan padrino implementadas	Porcentaje	25	0	0%

Observación B / S: Ya inició el contrato pero aún no han empezado la implementación, está en proceso de planificación de las acciones**Programa:** 7.1.4 - Gestión Integral de Residuos Sólidos**Proyecto PD:** 7.1.4.1 Implementación, seguimiento, revisión y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS- para el cuidado de los recursos naturales**Proyecto:** 160133 - Implementación, seguimiento, revisión y actualización del pgirs**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 65% Ejec. Financiera : 97%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.613 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.226 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.982**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA33AA Residuos sólidos urbanos aprovechados	ToneladaEU	3.775	1.137	30%
MA33AB Puntos críticos de resid sólido recuperad	Número	20	15	75%

Proyecto PD: 7.1.4.3 Optimización de estrategias para la gestión de residuos sólidos

Proyecto: 160134 - Desarrollo de estrategias para la gestión de residuos sólidos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 31%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 325 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 325 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA34AA Personas comprom. con manejo resid sol	Número	7.500	0	0%

Observación B / S: La contratación ya inicio pero no se tiene reporte para este mes

Proyecto PD: 7.1.4.4 Medellín Intercambio Verde

Proyecto: 160135 - Implementación de la estrategia medellín intercambio verde

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 45%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 163 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 363 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 163

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA35AA Familias comprometidas intercambio verde	Número	300	0	0%

Observación B / S: Está para inicio en el mes de agosto mediante una adición de recursos del AMVA

Proyecto PD: 7.1.4.5 Recicladores: empresarios del aprovechamiento del material reciclable

Proyecto: 160136 - Fortalecimiento a recicladores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 400

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA36AA Organizaciones de recicladores fortalec	Número	17	17	100%

Programa: 7.1.5 - Protección animal

Proyecto PD: 7.1.5.1 Fortalecer MICHIP

Proyecto: 160137 - Fortalecimiento de michip

Síntesis Proyecto: Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 424 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 264 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 264

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA37BA Animales identificados con microchi	Número	15.360	8.476	55%
MA37BB Cobertura animales protegidos microchi	Porcentaje	25	21,3	85%

Observación Proyecto: Realmente el avance es 21,3 para un cumplimiento del 85 %

Proyecto PD: 7.1.5.2 Promoción del bienestar animal y puntos para la adopción

Proyecto: 160138 - Fortalecimiento del bienestar animal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 52% Ejec. Financiera : 85%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.850 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.950 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.764

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA38AA Animales entregados en adopción	Número	848	295	35%
MA38AB Animales atendidos programa la perla	Número	2.880	2.001	69%

Proyecto PD: 7.1.5.3 Los animales cuentan con vos

Proyecto: 160139 - Desarrollo de estrategias lúdicas para el bienestar animal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 150

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA39AA Personas educadas manejo animal	Número	21.500	13.814	64%

Programa: 7.1.6 - Sistema de Gestión Ambiental Integral y cambio climático

Proyecto PD: 7.1.6.1 Estructura para la Gestión Ambiental Integral de Medellín

Proyecto: 160164 - Administración del sistema de gestión ambiental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 81% Ejec. Financiera : 61%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.878 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.147

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA64CA Instituciones de coordinación interinsti	Número	16	13	81%

Proyecto PD: 7.1.6.2 Habilitación Ambiental del Morro de Basuras de Moravia

Proyecto: 160166 - Habilitación ambiental del morro de basuras de moravia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 620 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 591 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 591

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA66CA Sostenimiento y nvas adecuacione moravia	Metro Cuadrado	45.200	0	0%

Observación B / S: Inicia en Julio

Proyecto PD: 7.1.6.3 Intervenciones sociales y ambientales integrales

Proyecto: 160169 - Apoyo en las intervenciones ambientales integrales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 498 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 498 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 498

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA69CA Articulaciones interinstit mejoram cond	Número	30	18	60%

Observación Proyecto: No se habia reportado el avance, que es 18 y equivale a un cumplimiento del 60%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 - Cultura Medellín

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

Proyecto PD: 1.1.5.8 Cultura, educación y promoción del medio ambiente

Proyecto: 150252 - 16pp1-mejoramiento de las condiciones ambientales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 81% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 290 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 290

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA52BE Paal creado y en ejecución	Número	1	1	100%
MA52BH Huertas fortalecidas o implementadas -c1	Número	40	25	63%

Proyecto: 150258 - 16pp8-educación y participación ambiental e intervenciones en cuencas hídricas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 73 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 73

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA58AC Talleres manejo adecuado residuos orgán.	Número	12	12	100%
MA58AE Personas sensibiliz. en educación amb-c8	Número	5.000	5.637	113%

Proyecto: 150260 - 16pp10-fortalecimiento de la escuela ambiental para el mejoramiento en el comportamiento ambiental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 40 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 40

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA60BA Huertas acompañadas o fortalecidas - c10	Número	16	9	56%
MA60BB Talleres manejo adecuado residuos orgán.	Número	10	10	100%

Proyecto: 150262 - 16pp12-espacios de conexión vital

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 148 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 148

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA62BA Asesorías in situ manejo resid. sól. org	Número	20	35	175%
MA62BC Eventos manejo de excretas y bienestar a	Número	2	4	200%
MA62BD Montaje campaña bienestar a y res soólid	Número	15	27	180%
MA62BE Personas sensib. e impactadas educ. amb.	Número	1.500	2.673	178%

Proyecto: 150264 - 16pp14-educación ambiental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA64BC Pieza audiovisual para sensibil. ambiental	Número	1	1	100%
MA64BD Montaje piezas publicit.ptos interés amb	Número	14	14	100%

Proyecto: 150268 - 16pp60-fomento a las buenas prácticas ambientales en los recursos agua y suelo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 69% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA68CA Ecohuertas implementadas o fortalecidas	Número	52	47	90%

Observación B / S: No ha terminado el contrato de 2016, por lo cual no ha iniciado el contrato de 2017

MA56BC Árboles urbanos y rurales sembrados - c6	Número	66	0	0%
---	--------	----	---	----

Observación B / S: No ha terminado el contrato de 2016, por lo cual no ha iniciado el contrato de 2017

MA56BD Implementación de huertas - c6	Número	20	14	70%
---------------------------------------	--------	----	----	-----

Proyecto: 150267 - 16pp50-fortalecimiento del hábitat y la educación ambiental de san sebastián de palmitas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA67CD Paal actualizado - c50	Número	1	1	100%

Proyecto: 150270 - 16pp80-medio ambiente y sostenibilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 86% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 151 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 151

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA70BD Microcuenca monitoreada - c80	Número	20	23	115%
MA70BG Personas sensib. en educación ambiental	Número	2.000	1.455	73%

Observación B / S: Se reportan las mismas personas del componente de Educación Ambiental. Los demás componentes no reportaron el indicador debido a sus labores de intervención física.

Proyecto: 160579 - 17pp99-conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 73%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.568 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.948 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.418

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA79AA Zonas verdes interv retiro quebrad -ecos	Hectárea	3,12	10,6	340%

Observación B / S: No se han recibido escrituras a nombre del Municipio de Medellín. aún está vigente el contrato 460006328 de 2015 suscrito con la EDU y se adelanta proceso de compra con presupuesto 2016-2017 directamente desde la Unidad de Adquisición de Bienes de la Secretaría de Suministros y Servicios

Programa: 7.1.2 - Estructura ecológica y sus servicios ecosistémicos

Proyecto PD: 7.1.2.2 Gestión para la protección del recurso hídrico

Proyecto: 160580 - 17pp80-protección y conservación del recurso hídrico

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 131 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 131 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA80BB Áreas de importancia ambiental	Número	1	0	0%

Observación B / S: A la fecha no se tiene contrato, debido a que por disposiciones de Suministros se modificó la modalidad contractual y todavía se encuentra en proceso

Proyecto PD: 7.1.2.4 Conocimiento, valoración y gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos

Proyecto: 160581 - 17pp1-identificación y valoración de la biodiversidad y servicios ecosistémicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA81BA Investigaciones en biodiversidad realiz	Número	1	0	0%

Observación B / S: En contratación. Selección abreviada en proceso
El contrato se encuentra en adjudicación, por lo tanto aún no reporta avances.

Programa: 7.1.3 - Nuestro río y sus quebradas

Proyecto PD: 7.1.3.2 Intervenciones y mantenimiento de cauces de quebradas

Proyecto: 150263 - 16pp13-revisión y actualización del plan de manejo ambiental e intervenciones en puntos críticos de quebradas y res

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 60 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 60

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA63BC Plan ambiental actualizado - c13	Número	1	1	100%

Proyecto: 160582 - 17pp99-mantenimiento e intervención integral de quebradas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 793 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 693 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA82CA Intervenciones físicas y mmto pto prior	Metro	322	0	0%

Observación B / S: Está en etapa precontractual

Programa: 7.1.4 - Gestión Integral de Residuos Sólidos

Proyecto PD: 7.1.4.1 Implementación, seguimiento, revisión y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS- para el cuidado de los recursos naturales

Proyecto: 160583 - 17pp99-fortalecimiento de la gestión integral de los residuos sólidos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.310 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.310 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA83BA Personas comprom. con manejo resid sol Observación B / S: Está en formulación de estudios previos	Número	19.800	0	0%
MA83BB Dotación, mmtto, habilit.,sgto ptos limp Observación B / S: Inicia en Agosto mediante una adición de recursos del AMVA	Número	9	0	0%
MA83BC Tomas pedagógicas y feria ambiental Observación B / S: Está en formulación de estudios previos	Número	12	0	0%
MA83BD Campaña sensibil. en manejo resid. sólíd Observación B / S: Está en formulación de estudios previos	Número	5	0	0%
MA83BE Intervención integral de puntos críticos Observación B / S: Está en formulación de estudios previos	Número	42	0	0%
MA83BF Plan de acción gestión integral res. sól Observación B / S: Está en formulación de estudios previos	Número	1	0	0%

Proyecto PD: 7.1.4.5 Recicladores: empresarios del aprovechamiento del material reciclable

Proyecto: 160584 - 17pp99-fortalecimiento de la labor del reciclador y rutas de recolección

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 715 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 765 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA84BA Organizaciones de recicladores fortalec Observación B / S: Está en formulación de estudios previos	Número	8	0	0%
MA84BB Personas compr.manejo adec.residuos sól. Observación B / S: Está en formulación de estudios previos	Número	16.400	0	0%

Programa: 7.1.5 - Protección animal

Proyecto PD: 7.1.5.3 Los animales cuentan con vos

Proyecto: 160585 - 17pp99-formación y sensibilización en tenencia responsable de animales de compañía

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 299 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 299 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 299

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA85BA Personas educadas manejo animal Observación B / S: Bienestar animal empieza el 7 de julio, por lo tanto aún no reporta actividades y avances.	Número	1.500	0	0%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

		Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
Dimensión:	7	- Para proteger entre todos el medio ambiente		
Reto:	7.1	- Medellín ciudad verde y sostenible		
Programa:	7.1.3	- Nuestro río y sus quebradas		
Proyecto PD:	7.1.3.1	Nuestro Río		
	120089	Recuperacion Apropriacion Del Rio Aburra	\$ 0,00086	\$ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto PD: 1.1.5.8 Cultura, educación y promoción del medio ambiente

Proyecto: 080278 - Educacion y sensibilizacion para las buenas practicas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 120082 - Buenas practicas de produccion y consumo sostenible

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 150259 - 16pp9-mejoramiento del hábitat y de la cultura ambiental en buenos aires

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18

Proyecto: 150265 - 16pp15-buenas prácticas ambientales y educación ambiental

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10

Proyecto PD: 6.3.1.1 Cinturón verde metropolitano

Proyecto: 120084 - Cinturón verde para el equilibrio del territorio

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 35 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 35

Proyecto PD: 7.1.1.1 Ecoparques en quebradas de ciudad

Proyecto: 080251 - Construcción parques lineales pui comuna 8 y 9

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 41 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto PD: 7.1.1.5 Estrategia de conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad



Proyecto: 150253 - 16pp2-cultura ambiental para la protección del medio ambiente

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 34	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 34
Proyecto:	150255 - 16pp5-educación para la cultura ambiental, adecuación y mantenimiento de zonas verdes en retiros de quebrada		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5
Proyecto:	150257 - 16pp7-mejoramiento del hábitat y fortalecimiento a la gestión ambiental en robledo		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18
Proyecto:	150261 - 16pp11-comunidad sostenible ambientalmente		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15
Proyecto PD:	7.1.2.3 Gestión de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambiental		
Proyecto:	120083 - Conservación y administración cerros tutelares		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 40	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 40
Proyecto:	120088 - Parque central de antioquia (sistema central de parques)		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 267	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 267
Proyecto PD:	7.1.3.2 Intervenciones y mantenimiento de cauces de quebradas		
Proyecto:	130683 - Jve-intervencion en quebradas de la comuna 4		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0
Proyecto PD:	7.1.4.1 Implementación, seguimiento, revisión y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS- para el cuidado de los recursos naturales		
Proyecto:	120087 - Gestión integral de residuos sólidos		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 234	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 228
Proyecto PD:	7.1.5.2 Promoción del bienestar animal y puntos para la adopción		
Proyecto:	120081 - Bienestar animal		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 281	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 281
Proyecto PD:	7.1.6.1 Estructura para la Gestión Ambiental Integral de Medellín		
Proyecto:	120090 - Sistema de gestión ambiental		



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0

Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 66

Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 66

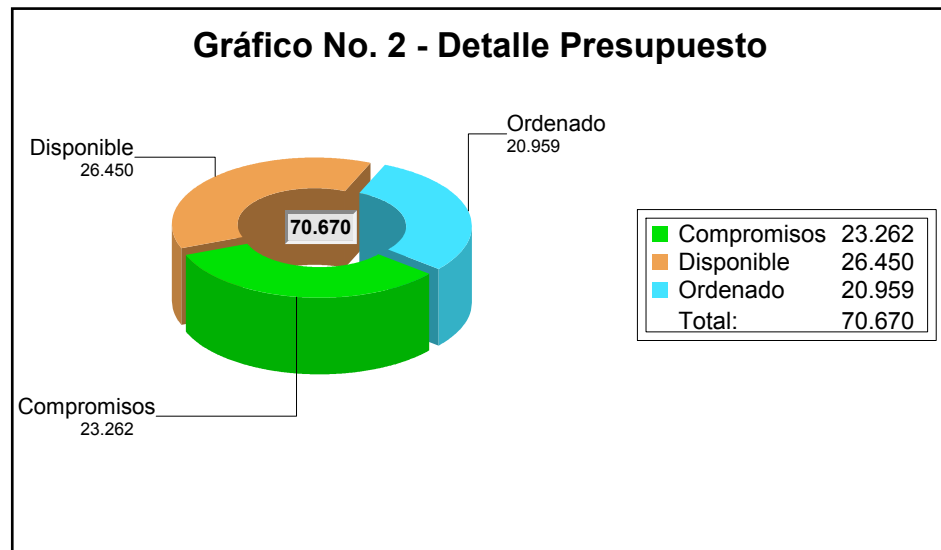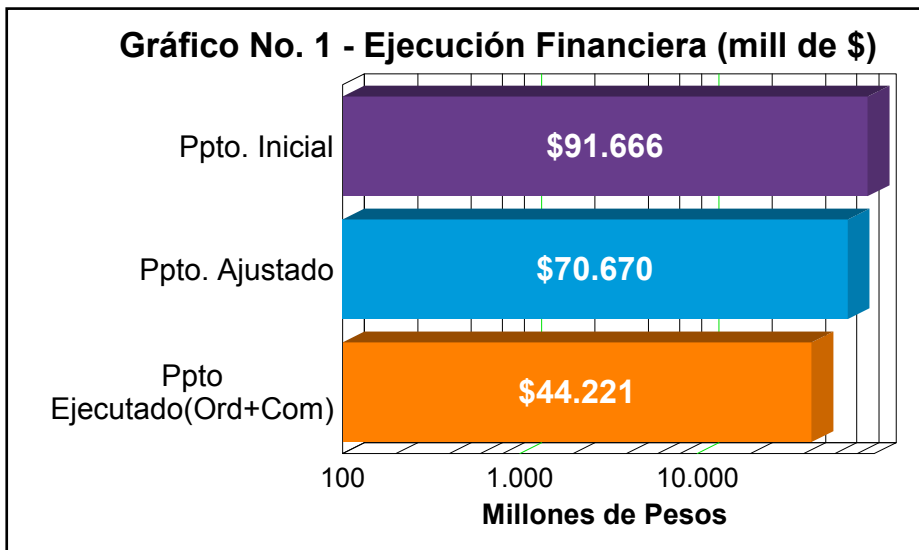

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

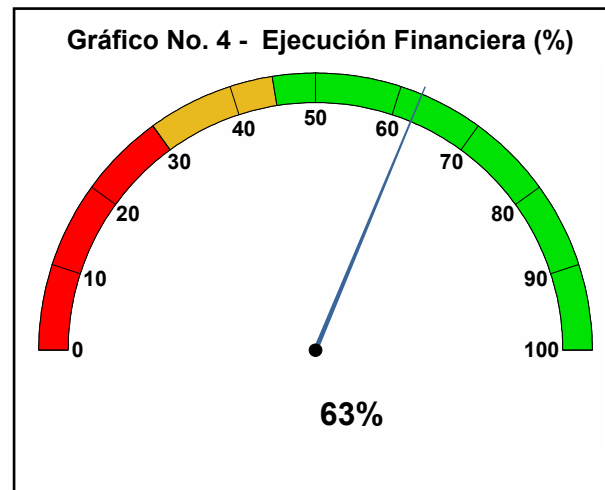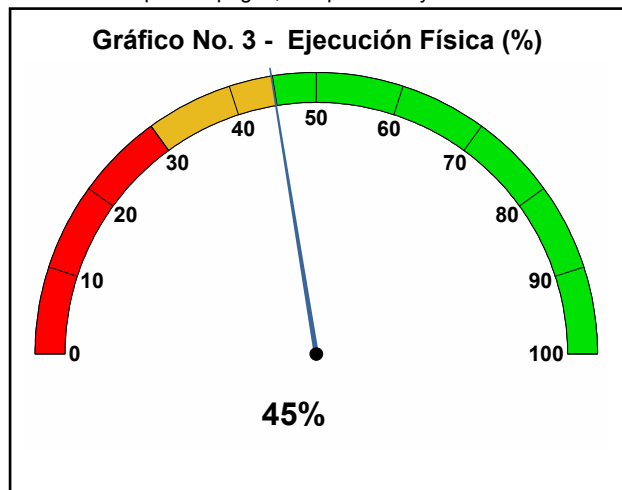

La ejecución financiera comprende pagos, facturas y los compromisos a la fecha de corte. Para el caso de los establecimientos públicos, la Ejecución Financiera se compone de dos cifras: una información obtenida del sistema, que corresponde únicamente a la cifra del presupuesto transferido desde el Municipio al estapúblico, y otra información suministrada por cada entidad que corresponde a los recursos propios invertidos por proyecto.

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes
Proyecto PD: 1.1.5.3 Cultura vial y peatonal en mi barrio para la movilidad segura y ordenada en mi ciudad
Proyecto: 120240 - Educación vial para la movilidad y la vida en medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 116 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 116

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV40AH Infraestructura tecnológica educación vi	Número	12	12	100%

Proyecto: 160175 - Fortalecimiento a la cultura vial para los actores de la movilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 77%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.213

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV75AA Personas intervenidas en cultura vial	Número	150.000	81.628	54%
MV75AB Operación eventos académicos-culturales	Número	8	6	75%
MV75AD Plan de medios para movilidad	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se encuentra en etapa de diseño la fase dos de la campaña

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos
Reto: 4.5 - Medellín innovadora
Programa: 4.5.1 - Ciencia, innovación y tecnología para la sociedad
Proyecto PD: 4.5.1.2 Fortalecer el sistema de movilidad inteligente
Proyecto: 120236 - Interventoría de tramites en concesión y del simm

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 113 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 113

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV36AB Informes interventoria conces une, simm	Número	1	1	100%

Proyecto: 160180 - Administración de trámites en concesión y del simm

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 66%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.979 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.305

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV80AA Interventoría servicios concesionados	Meses	11	5	45%

Proyecto: 160185 - Fortalecimiento tecnológico y gestión de la información para la secretaría de movilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 54%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 439 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 236

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV85AA Actualización página web de movilidad	Porcentaje	100	41,4	41%
MV85AB Actualización software procesos misional	Número	7	5	71%
MV85AC Gestión documental de movilidad	Porcentaje	100	60	60%
MV85AD Infraestructura tecnológica para movilidad	Número	2	0	0%

Observación B / S: La meta se generó en el mes de junio y está en etapa de estudios previos para llevar a cabo el proceso de contratación

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible

Reto: 5.2 - Medellín por una mejor movilidad

Programa: 5.2.1 - Planificación del Sistema de movilidad de la ciudad

Proyecto PD: 5.2.1.1 Formulación del Plan Integral de Movilidad Sostenible

Proyecto: 120155 - Laboratorio de movilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 24%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 488 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 119

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV55AI Infraestructura tecnológica observatorio	Número	20	20	100%

Proyecto: 160190 - Estudios para el mejoramiento de la movilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 43%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.650 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.577 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 678

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV90AA Análisis para medidas gestión de demanda	Número	20	9	45%
MV90AB Planeamientos semafóricos	Número	12	11	92%
MV90AC Operación del observatorio de movilidad	Porcentaje	100	45	45%
MV90AE Estudios de movilidad	Número	2	0	0%

Observación B / S: La meta se formuló en el mes de junio y está en etapa de estudios previos para llevar a cabo el proceso de contratación

Reto: 5.3 - Medellín gestiona sus sistemas de movilidad
Programa: 5.3.1 - Fortalecimiento a la integración multimodal del transporte público
Proyecto PD: 5.3.1.2 Fortalecer la reestructuración del Transporte Público Colectivo de Medellín - TPM
Proyecto: 160194 - Reestructuración del transporte público colectivo de medellín - tpm

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV94AA Esquemas implementación carriles	Número	3	3	100%
MV94AB Auditorías a empresas de tpm	Número	35	0	0%

Observación B / S: En el mes de junio de 2017 se realizó programación de las visitas a las empresas la cual fue socializada con las mismas.

Proyecto PD: 5.3.1.3 Potencializar el sistema de recaudo electrónico para el transporte público

Proyecto: 160199 - Implementación de un sistema de recaudo electrónico para el transporte público

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 17.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV99AA Gestión implementación sistema de re	Porcentaje	100	0	0%

Observación B / S: Se tiene planeado realizar convenio con el Metro en el mes de noviembre de 2017, por lo tanto para 2017 no iniciará la implementación, sino la gestión contractual para la implementación de un sistema de recaudo electrónico

Proyecto PD: 5.3.1.5 Fortalecer el programa de racionalización del transporte público colectivo

Proyecto: 160205 - Fortalecimiento de la racionalización del transporte público colectivo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 35% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.000

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV05AA Estructuración proceso racionalización	Porcentaje	100	35	35%

Proyecto PD: 5.3.1.6 Fortalecer la operación de Metroplús en las cuencas 3 y 6

Proyecto: 160207 - Fortalecimiento a la operación de metroplús

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 57%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 19.647 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 647 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 370

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV07AA Informe técnico legal financiero metropol	Número	10	4	40%

Programa: 5.3.3 - Gestión integral para la movilidad no motorizada

Proyecto PD: 5.3.3.2

Proyecto: 150102 - Implementación de movilidad humana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 657 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 608

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV02AK Infraestructura tecnológica movilidad hu	Número	17	23	135%
MV02AL Mantenimiento de ciclorrutas	Kilometro	8,22	8,22	100%

Proyecto: 160209 - Fortalecimiento de la movilidad humana y sostenible

Síntesis Proyecto: Eficacia : 31% Ejec. Financiera : 77%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.418 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.850

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV09AA Diseño elementos base de movilidad soste	Número	4	1	25%
MV09AB Implementación modelo movilidad sostenib	Número	1	0	0%
MV09AC Eventos de movilidad sostenible	Número	3	2	67%
MV09AD Fortalecimiento gerencia moviilidad huma	Meses	9	3	33%

Proyecto PD: 5.3.3.3 Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonal

Proyecto: 160210 - Administración de las escaleras eléctricas comuna 13

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 963 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 963 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 963

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV10AA Servicio transporte escaleras eléctrica	Porcentaje	100	50	50%

Programa: 5.3.4 - Reconociendo la importancia de la movilidad segura

Proyecto PD: 5.3.4.1 Señalización para la seguridad vial de la ciudadanía

Proyecto: 110034 - Ampliación, operación y sostenimiento de la red semafórica y dispositivo periféricos para el simm

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 378 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 378

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV34AA Mantenimiento de cruces semaforizados.	Número	643	643	100%

Proyecto: 120156 - Señalización vial para la movilidad de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.585 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.585

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV56AA Kilómetros de vía señalizada	Kilometro	300	302,88	101%
MV56AB Instalación señalización convencional	Número	1.000	1.381	138%
MV56AH Infraestructura tecnológica señalización	Número	27	27	100%

Proyecto: 160211 - Mantenimiento y mejoramiento de la señalización vial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 19%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.901

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV11AA Kilómetros de vía señalizada	Kilometro Carril	400	87,94	22%
MV11AD Construcción de resaltos	Número	30	23	77%
MV11AE Señalización vertical	Número	700	0	0%

Observación B / S: La meta se reformuló en el mes de junio y está en etapa de estudios previos para llevar a cabo el proceso de contratación

Proyecto: 160212 - Mantenimiento y mejoramiento de la semaforización vial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 93%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.975 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.266

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV12AA Mantenimiento de cruces semaforizados.	Número	643	643	100%
MV12AB Funcionamiento nuevos cruces semaforizad	Número	4	0	0%
MV12AC Complementos peatonales	Número	3	0	0%

Observación B / S: Se encuentra en etapa de diagnóstico y planeación de los puntos a implementar los nuevos cruces semaforicos

Observación B / S: Se encuentra en etapa de diagnóstico y planeación de los puntos a implementar los nuevos complementos peatonales

Proyecto PD: 5.3.4.2 Vigilancia y control de la movilidad segura

Proyecto: 120238 - Gestión administrativa y financiera de zonas zer - avi

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 113 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 113

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV38AB Informes operación y recaudo de zer-avi	Número	1	1	100%

Proyecto: 160141 - Administración zonas estacionamiento regulado (zer), arrastre y custodia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 81% Ejec. Financiera : 91%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.687 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.887 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.687

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV41BA Celdas de estacionamiento regulado	Número	2.377	2.377	100%
MV41BB Operación parqueo para custodia	Número	4	5	125%
MV41BC Operación arrastre de vehículos inmovili	Número	9	4	44%

Proyecto: 160151 - Fortalecimiento laboratorio de toxicología

Síntesis Proyecto: Eficacia : 11% Ejec. Financiera : 84%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 211

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV51AA Aseguramiento metrológico de los equipos	Porcentaje	100	1,86	2%
MV51AB Servicios e insumos pruebas embriaguez	Porcentaje	100	19,67	20%

Proyecto: 160159 - Suministro y logística para el control de la movilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 42% Ejec. Financiera : 12%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 950 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 859 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 99

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV59AA Elementos logísticos control movilidad	Porcentaje	100	0	0%

Observación B / S: Se tiene avance en la realización de los estudios previos para iniciar la etapa precontractual

Por este ítem se compran los insumos que se va agotando para los operativos de control de la movilidad como: cámaras, conos, barreras de contención, resaltos, señales, entre otros.

MV59AB Mantenimiento logística control movillida	Porcentaje	100	100	100%
MV59AC Sistema comunicación control movillidad	Porcentaje	100	66	66%
MV59AD Parque automotor control de movilidad	Número	14	0	0%

Observación B / S: la meta se reformuló en el mes de junio y está en etapa de estudios previos para la contratación de las motos

Proyecto: 160165 - Fortalecimiento a cobro coactivo de movilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 55%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.819 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.652

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV65AA Mandamientos de pago	Número	110.000	24.435,08	22%
MV65AB Personas notificadas en cobro coactivo	Número	250.000	178.696	71%
MV65AC Medidas cautelares de embargos, sentenci	Número	100.000	70.733	71%
MV65AD Investigación de bienes	Número	200.000	118.010	59%
MV65AE Usuarios atendidos en cobro coactivo	Número	60.000	33.179	55%

Proyecto: 160167 - Fortalecimiento organizacional y operativo de la secretaria de movilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 133 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 131

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV67AA Servidores participando en estrategias	Número	698	698	100%
MV67AB Jornadas de capacitación con servidores	Número	6	0	0%
MV67AC Campañas de comunicación interna	Número	1	0	0%
MV67AD Solicitudes del ciudadano atendidas	Porcentaje	100	0	0%

Observación B / S: La meta se formuló en el mes de junio y está en etapa de estudios previos para llevar a cabo el proceso de contratación

Proyecto: 160171 - Mantenimiento de las instalaciones de la secretaria de movilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 57%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 669 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 526 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV71AA Sistemas básicos funcionando adecuadamen	Número	6	6	100%
MV71AB Áreas físicas mejoradas	Metro Cuadrado	400	300	75%

Programa: 5.3.5 - Por la calidad del aire que respiramos

Proyecto PD: 5.3.5.1 Impulsar la movilidad amigable con el medio ambiente

Proyecto: 160213 - Fortalecimiento estratégico para la movilidad amigable con el medio ambiente

Síntesis Proyecto: Eficacia : 20% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV13AA Gestión operación tecnologías limpias	Porcentaje	100	20	20%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Dimensión:	Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
Dimensión: 1	- Creemos en la confianza ciudadana		
Reto: 1.1	- Cultura Medellín		
Programa: 1.1.5	- Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes		
Proyecto PD: 1.1.5.3	Cultura vial y peatonal en mi barrio para la movilidad segura y ordenada en mi ciudad		
	150064 Reducción de la Mortalidad Por Accidentes de Tránsito en Un 3,5%, en Los 10 Tramos de Mayor Accidentalidad Medellín	\$ 1,02424	\$ 0,0
Dimensión: 5	- Por una movilidad sostenible		
Reto: 5.3	- Medellín gestiona sus sistemas de movilidad		
Programa: 5.3.1	- Fortalecimiento a la integración multimodal del transporte público		
Proyecto PD: 5.3.1.5	Fortalecer el programa de racionalización del transporte público colectivo		
	080428 Construcción y Adec de Depos	\$ 2,49417	\$ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto PD: 4.5.1.2 Fortalecer el sistema de movilidad inteligente
Proyecto: 120157 - Implementación de tecnología de punta para la secretaria de movilidad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7

Proyecto PD: 5.3.1.2 Fortalecer la reestructuración del Transporte Público Colectivo de Medellín - TPM
Proyecto: 150221 - Gestión tpm - transporte público de medellín

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15

Proyecto PD: 5.3.3.3 Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonal
Proyecto: 110149 - Mantenimiento y operación de las escaleras eléctricas de la comuna 13

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8

Proyecto PD: 5.3.4.2 Vigilancia y control de la movilidad segura

Proyecto: 120158 - Mejoramiento del clima organizacional en la secretaría de movilidad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17

Proyecto: 120237 - Renovación, dotación y mantenimiento de equipos logísticos para la movilidad



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 504 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 84

Proyecto: 120239 - Gestión del debido cobrar de multas para inversión en movilidad



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 35 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 35

Proyecto: 150123 - Adecuación y mejoramiento de las instalaciones de la secretaría de movilidad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 60 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 60

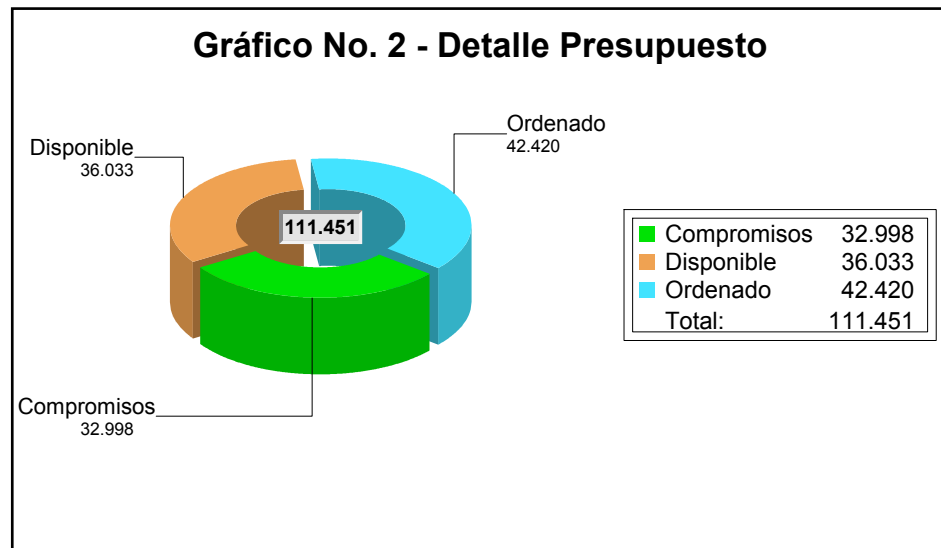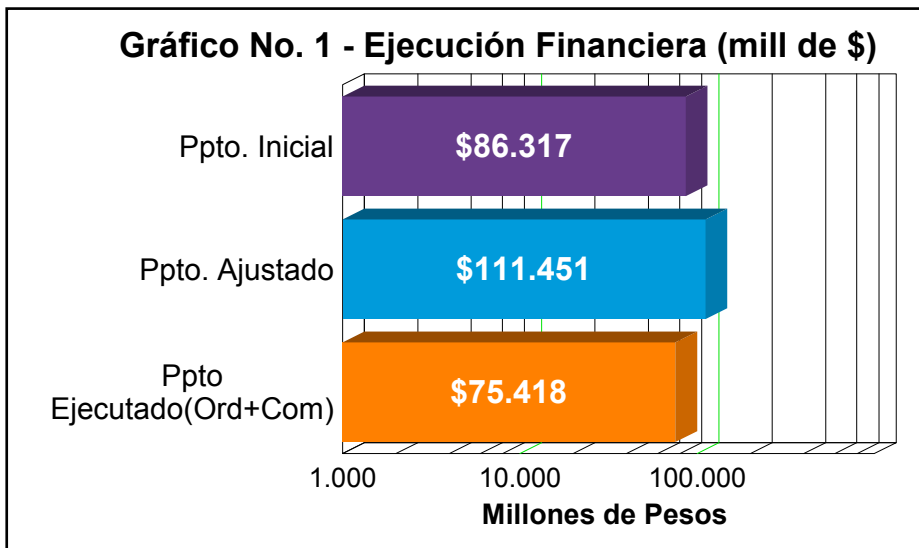

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

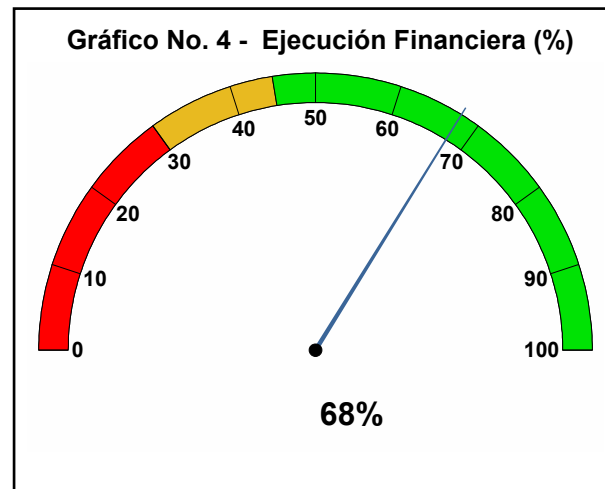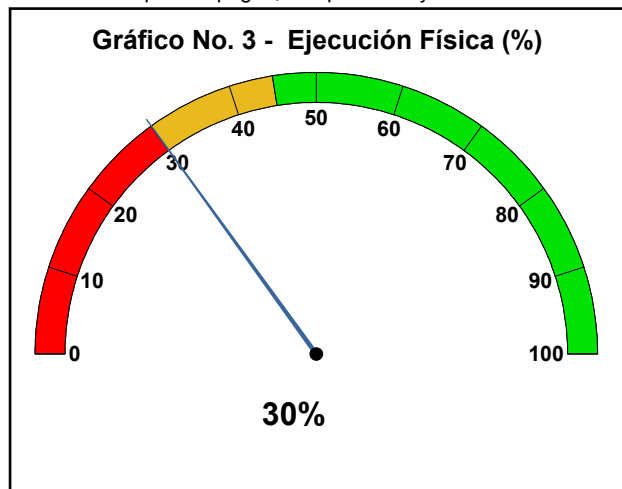

La ejecución financiera comprende pagos, facturas y los compromisos a la fecha de corte. Para el caso de los establecimientos públicos, la Ejecución Financiera se compone de dos cifras: una información obtenida del sistema, que corresponde únicamente a la cifra del presupuesto transferido desde el Municipio al estapúblico, y otra información suministrada por cada entidad que corresponde a los recursos propios invertidos por proyecto.

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes
Proyecto PD: 1.1.5.1 Difundir la cultura de la legalidad en todos los entornos
Proyecto: 160454 - Difusión de la cultura de legalidad en el ambiente empresarial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 2% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.820 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.547 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.547

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE54AI Eventos enfocados a la formalización	Número	2	0	0%
Observación B / S: Su cumplimiento se tiene programado para el segundo semestre				
DE54AJ Empresas sensibilizadas en formalización	Número	6.000	515	9%
Observación B / S: Se le dará cumplimiento para el segundo semestre del año.				
DE54AK Talleres realiz con empresarios informal	Número	1.362	0	0%
Observación B / S: Se le dará cumplimiento para el segundo semestre del año.				
DE54AL Alianzas estableci con instit participan	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se le dará cumplimiento para el segundo semestre del año.				

Reto: 1.3 - Medellín bien administrado
Programa: 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno
Proyecto PD: 1.3.5.1 Medellín digital
Proyecto: 160468 - Desarrollo de medellín digital

Síntesis Proyecto: Eficacia : 32% Ejec. Financiera : 39%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.299 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.697 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.203

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE68AA Medición y caracterización de usuarios	Número	12	6	50%
DE68AB Participantes en estrategias apropiación	Número	10.000	806	8%
Observación B / S: Se le dará cumplimiento para el segundo semestre del año.				
DE68AC Nuevos espacios públicos con conexión	Número	30	4	13%
Observación B / S: Se le dará cumplimiento para el segundo semestre del año.				
DE68AD Estructuración e implem. sostenibilidad	Porcentaje	100	50	50%
Observación B / S: Su cumplimiento se tiene programado para el segundo semestre				
DE68AE Programas y/o proyectos acompañados	Número	3	3	100%
Observación B / S: Su cumplimiento se tiene programado para el segundo semestre				
DE68AF Diseño y dlo de herramientas-servicios	Número	4	0	0%
Observación B / S: Su cumplimiento se tiene programado para el segundo semestre				

DE68AG Consult,dlo implemen de platafor mipyme Porcentaje 100 0 0%
Observación B / S: Se le dará cumplimiento para el segundo semestre del año.

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos
Reto: 4.3 - Medellín se construye desde el arte y la cultura
Programa: 4.3.3 - Creación, Formación, Fomento y Circulación artística y cultural
Proyecto PD: 4.3.3.5 Apoyar la producción audiovisual y cinematográfica en Medellín
Proyecto: 160619 - Apoyo a la industria audiovisual y comisión filmica

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 269 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 269

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE19AD Competitividad de industria cinema gesti	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Se le dará cumplimiento para el segundo semestre del año.				
DE19AE Permisos ventanilla única gestionados	Número	30	0	0%
Observación B / S: Se le dará cumplimiento para el segundo semestre del año.				

Reto: 4.4 - Medellín con acceso al empleo
Programa: 4.4.1 - Especialización Inteligente
Proyecto PD: 4.4.1.1 Medellín, ciudad clúster y de servicios
Proyecto: 160450 - Consolidación de medellín, ciudad clúster y de servicios

Síntesis Proyecto: Eficacia : 9% Ejec. Financiera : 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.966 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.770

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE50AF Empresas en fortalecimiento empresarial	Número	200	123	62%
DE50AG Empresas participantes de relacionamient	Número	450	0	0%
Observación B / S: Su cumplimiento se tiene programado para el segundo semestre				
DE50AH Eventos especializados	Número	5	0	0%
Observación B / S: Su cumplimiento se tiene programado para el segundo semestre				
DE50AI Desarrollo de proyectos intercluster	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Su cumplimiento se tiene programado para el segundo semestre				
DE50AJ Ruedas de negocio realizadas	Número	4	0	0%
Observación B / S: Su cumplimiento se tiene programado para el segundo semestre				
DE50AK Estrategias y proyec en especiali inteli	Número	172	0	0%
Observación B / S: Se le dará cumplimiento en el segundo semestre del año.				
DE50AL Empresas sensibilizadas en proye clúster	Número	218	0	0%
Observación B / S: Se le dará cumplimiento para el segundo semestre del año.				

Proyecto PD: 4.4.1.2 Atracción de inversión nacional y extranjera directa para el desarrollo y la competitividad

Proyecto: 160445 - Fortalecimiento de la atracción de inversión nacional y extranjera

Síntesis Proyecto: Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 64%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 995 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.563 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 995

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE45AA Pptas de valor para atracción compañías	Número	24	10	42%
DE45AH Gestión para desarrollo de la inversión	Porcentaje	100	52,19	52%

Proyecto PD: 4.4.1.3 Acceso a mercados

Proyecto: 160478 - Desarrollo de la estrategia acceso a mercados

Síntesis Proyecto: Eficacia : 11% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.018 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.581 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.574

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE78AC Desarrollo de proveedores en proceso	Porcentaje	100	43	43%
DE78AD Eventos de sensibilización y capacitación	Número	20	0	0%
Observación B / S: Se espera que tome mayor fuerza la estrategia y se de cumplimiento a la meta del año				
DE78AE Proved acompañ bajo modelo encadena prod	Número	40	0	0%
Observación B / S: Se le dará cumplimiento para el segundo semestre del año.				
DE78AF Proveed en proces acompañam con enfoque	Número	60	0	0%
Observación B / S: Se le dará cumplimiento para el segundo semestre del año.				

Proyecto PD: 4.4.1.4 Fortalecer el Pacto por la Innovación

Proyecto: 160469 - Fortalecimiento del pacto por la innovación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE69AA Empresas firmantes del pacto	Número	800	0	0%
Observación B / S: Su cumplimiento se tiene programado para el segundo semestre				
DE69AB Eventos de transferencia de conocimiento	Número	4	7	175%
Observación B / S: Su cumplimiento se tiene programado para el segundo semestre				
DE69AC Empresas acompañadas por plan padrino	Número	40	0	0%
Observación B / S: La corporación Ruta N esta recopilando evidencias para realizar el reporte de avance				

Proyecto PD: 4.4.1.5 Medellín creativa

Proyecto: 160446 - Apoyo al fomento de la economía creativa en medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 178 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 178 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE46AK Caracterización sector economía creativa Observación B / S: Se encuentra en proceso de contratación	Porcentaje	100	0	0%
DE46AM Mesas de trabajo (focus group) Observación B / S: Se encuentra en proceso de contratación	Número	25	0	0%
DE46AN Triadas etnográficas realizadas Observación B / S: Se encuentra en proceso de contratación	Número	30	0	0%

Programa: 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral

Proyecto PD: 4.4.2.2 Formar y educar en competencias de acuerdo a la demanda y necesidades del mercado laboral

Proyecto: 160461 - Formación en competencias laborales pertinentes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 20% Ejec. Financiera : 23%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.565 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.348 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.204

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE61AN Certificados en competencias laborales Observación B / S: la certificación se tiene programada para los programas informales en operarios de confección para el mes de diciembre y para los programas técnicos laborales para la vigencia 2018, esto debido a que los contratos se adjudicaron en el mes de Mayo.	Número	3.150	0	0%
DE61AS Matriculados en competencias laborales Observación B / S: Se encuentra en planeación de proceso de convocatoria e inscripción, se espera que para el mes de Agosto se pueda realizar la matrícula.	Número	3.940	0	0%
DE61AU Eventos para la promoción de formación	Número	5	3	60%

Proyecto PD: 4.4.2.3 Fomentar la inserción formal laboral

Proyecto: 160451 - Fortalecimiento y fomento de la inserción formal laboral

Síntesis Proyecto: Eficacia : 19% Ejec. Financiera : 12%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 606 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.506 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 299

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE51AF Gestión alianzas estratégicas de inserción	Porcentaje	100	40	40%
DE51AH Implementación del sistema de información Observación B / S: Se encuentra en contratación.	Porcentaje	100	0	0%

DE51AQ Certificados vinculados laboralmente	Número	200	74	37%
DE51AR Certificad postulada a procesos de selecc	Porcentaje	50	0	0%

Observación B / S: Se le dará cumplimiento para el segundo semestre del año.

Proyecto PD: 4.4.2.7 Escuela de artes y oficios

Proyecto: 160452 - Fortalecimiento a la escuela de artes y oficios

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 19%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 76

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE52AC Arterasanos formados y cualificados	Número	70	0	0%

Observación B / S: La ejecución iniciará a partir del mes de agosto de 2017.

Programa: 4.4.3 - Generación de empleo

Proyecto PD: 4.4.3.1 Estrategias para el trabajo decente

Proyecto: 160460 - Desarrollo de estrategias para el trabajo decente

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 134 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 134 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 134

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE60AI Diagnostico para formulación del plan	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Su cumplimiento se tiene programado para el segundo semestre				
DE60AJ Definición de estrategias	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Su cumplimiento se tiene programado para el segundo semestre				
DE60AK Adopción del plan	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: De acuerdo al cronograma, Se programó para el mes de septiembre la adopción del plan				
DE60AL Implementación del plan	Porcentaje	10	0	0%
Observación B / S: De acuerdo al plan de trabajo, se definió para el mes de diciembre la implementación del plan				

Proyecto PD: 4.4.3.3 Crear una gran base empresarial de oferta y demanda de empleo

Proyecto: 160455 - Fortalecimiento de una gran base empresarial de oferta y demanda de empleo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 53% Ejec. Financiera : 46%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.459

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE55AG Vinculados por intermediación laboral	Número	700	530	76%

DE55AH Nuevas empresas registradas	Número	2.792	765	27%
Observación B / S: Se incrementó la meta debido al ingreso de recursos por superavit				
DE55AI Ferias y eventos de empleo	Número	8	6	75%
DE55AJ Pers mov reducida vinculadas lab por ope	Número	8	5	63%
DE55AK Población vulnera vinculadas lab por ope	Número	40	34	85%
DE55AL Jóvenes sin exp vinculadas lab por ope	Número	475	218	46%
DE55AM Ciudadanos atendi por orientaci ocupacio	Número	1.860	0	0%
Observación B / S: Se le dará cumplimiento para el segundo semestre con recursos de superavit				

Programa: 4.4.4 - Creación y fortalecimiento empresarial

Proyecto PD: 4.4.4.1 Fortalecer el ecosistema de emprendimiento

Proyecto: 160480 - Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento

Síntesis Proyecto: Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 91%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.825 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.749 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.985

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE80AB Empresas en acompañamiento de incubacion	Número	50	10	20%
Observación B / S: El reporte de las empresas restante se realizará en el segundo semestre				
DE80AC Acompañamiento de capital semilla	Porcentaje	100	53	53%
DE80AD Personas capacitadas en modelo de negoci	Número	700	700	100%
DE80AE Empresas acompañadas en aceleración	Número	47	47	100%
DE80AF Empresas en direccionamiento estrategico	Número	19	19	100%
DE80AH Desarrollo de medellin emprendedora	Porcentaje	100	55	55%
DE80AI Acompañamiento emprendimi sector textil	Porcentaje	100	50	50%
DE80AJ Eventos de relacionamiento realizados	Número	4	1	25%
Observación B / S: Los eventos restantes se realizaran en el segundo semestre				
DE80AK Ruedas de negocios realizadas	Número	7	0	0%
Observación B / S: Se le dará cumplimiento para el segundo semestre del año.				
DE80AL Crédito otorg para mejorar sostenib ambie	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Se le dará cumplimiento para el segundo semestre del año.				
DE80AM Empresas acompañadas en etapa comerciali	Número	25	0	0%
Observación B / S: Se le dará cumplimiento para el segundo semestre del año.				

Proyecto PD: 4.4.4.2 Fortalecer los CEDEZO

Proyecto: 160459 - Fortalecimiento de los cedezo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 93%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.701

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE59AI Participación en eventos comerciales	Número	150	58	39%
DE59AJ Empresas fortalecidas a través de cedezo	Empresas	1.500	1.420	95%
DE59AK Emprendedores empresarios fortalecidos	Número	2.825	2.295	81%
DE59AM Evento de cierre programa cedezo	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se le dará cumplimiento para el segundo semestre del año.				
DE59AN Empresarios fortale en etapa de incubaci	Número	100	0	0%
Observación B / S: Se le dará cumplimiento para el segundo semestre del año.				

Proyecto PD: 4.4.4.4 Promoción y fomento de la Economía Social y Solidaria

Proyecto: 160472 - Apoyo a la promoción y fomento de la economía social y solidaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 68%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.640 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.304 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 888

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE72AC Participantes en capacitación de ecosol	Número	525	0	0%
Observación B / S: Su cumplimiento se tiene programado para el segundo semestre				
DE72AH Eventos para implement decenal de ecosol	Número	3	0	0%
Observación B / S: Se le dará cumplimiento para el segundo semestre del año.				
DE72AI Visitas de seguimiento a comodatos	Número	215	111	52%

Proyecto PD: 4.4.4.5 Fortalecimiento del Banco de las Oportunidades y acceso a recursos

Proyecto: 160466 - Fortalecimiento del banco de las oportunidades y acceso a recursos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 76% Ejec. Financiera : 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.699 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.520

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE66AE Créditos otorgados a microempresarios	Número	20.000	15.725	79%
DE66AF Personas capacitadas precrédito	Número	18.000	15.230	85%
DE66AG Solicitudes recibidas para crédito	Número	21.000	16.161	77%
DE66AH Estrategia comercial,divulgación y prom	Porcentaje	100	63	63%

Proyecto PD: 4.4.4.7 Plataforma de Economía Colaborativa (PEC)

Proyecto: 160474 - Implementación de la plataforma de economía colaborativa (pec)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 15%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 450 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 66

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE74AD Beneficiarios de los pec	Número	4.000	0	0%
Observación B / S: La ejecución iniciará a partir del mes de agosto de 2017.				
DE74AE Redes pec que operan en la ciudad	Número	50	0	0%
Observación B / S: La ejecución iniciará a partir del mes de agosto de 2017.				

Proyecto PD: 4.4.4.8 Distrito de Innovación y Emprendimiento

Proyecto: 160448 - Desarrollo del distrito de la innovación y emprendimiento

Síntesis Proyecto: Eficacia : 41% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.793 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 600

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE48AG Empresas e instituciones enfocadas ct+i	Número	63	11	17%
Observación B / S: La corporación Ruta N esta recopilando evidencias para realizar el reporte de avance				
DE48AH Empleos generados enfocados a ct+i	Número	545	347	64%
Observación B / S: Su cumplimiento se tiene programado para el segundo semestre				

Reto: 4.5 - Medellín innovadora

Programa: 4.5.1 - Ciencia, innovación y tecnología para la sociedad

Proyecto PD: 4.5.1.1 Plan CT + I Medellín

Proyecto: 160453 - Desarrollo del plan ct + i medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 1% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.207 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.970 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.970

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE53AC Proyectos inscritos cofinanciación (i+d)	Número	100	0	0%
Observación B / S: Su cumplimiento se tiene programado para el segundo semestre				
DE53AD Proyectos apoyados cofinanciación (i+d)	Número	10	0	0%
Observación B / S: Su cumplimiento se tiene programado para el segundo semestre				
DE53AE Estudios de prefactibilidad desarrollado	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Su cumplimiento se tiene programado para el segundo semestre				
DE53AF Proyectos inscritos cofinanc(mn kapital)	Número	100	0	0%
Observación B / S: La corporación Ruta N esta recopilando evidencias para realizar el reporte de avance				
DE53AG Proyectos apoyados cofinanc (rn kapital)	Número	14	0	0%
Observación B / S: La corporación Ruta N esta recopilando evidencias para realizar el reporte de avance				
DE53AH Eventos para promover inversión en acti	Número	10	1	10%

Observación B / S: Su cumplimiento se tiene programado para el segundo semestre				
DE53AI Proyectos apoyados por el plan ct+i	Número	3	0	0%
Observación B / S: Su cumplimiento se tiene programado para el segundo semestre				
DE53AJ Proy cofinanc para protecci y/o alistam	Número	20	0	0%
Observación B / S: La corporación Ruta N esta recopilando evidencias para realizar el reporte de avance				

Proyecto PD: 4.5.1.6 Laboratorios de creación para la innovación social

Proyecto: 160449 - Desarrollo de laboratorios de creación para la innovación social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 700

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE49BA Laboratorios de creacion en desarrollo	Número	2	0	0%
Observación B / S: Su cumplimiento se tiene programado para el segundo semestre				
DE49BB Participantes formaci prototipado rápido	Número	1.000	0	0%
Observación B / S: Su cumplimiento se tiene programado para el segundo semestre				
DE49BC Productos en desarrollo o mejora	Número	400	0	0%
Observación B / S: Su cumplimiento se tiene programado para el segundo semestre				

Programa: 4.5.2 - Turismo

Proyecto PD: 4.5.2.1 Implementar la política pública de turismo

Proyecto: 160463 - Implementación de la política pública de turismo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 3% Ejec. Financiera : 38%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 751

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE63AJ Sensibilizar prest serv turistic tur res	Porcentaje	100	10	10%
Observación B / S: Se le dará cumplimiento para el segundo semestre del año.				
DE63AK Sensibilizar actores turisticos 2o idioma	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Su cumplimiento se tiene programado para el segundo semestre				
DE63AL Desarrollo de productos turisticos	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Su cumplimiento se tiene programado para el segundo semestre				
DE63AM Sensibilizar instituciones en turismo	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Su cumplimiento se tiene programado para el segundo semestre				

Proyecto PD: 4.5.2.2 Fortalecimiento del tejido empresarial e institucional turístico

Proyecto: 160465 - Fortalecimiento del tejido empresarial e institucional turístico

Síntesis Proyecto: Eficacia : 8% Ejec. Financiera : 52%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.050 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.050 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 550

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE65AC Sensibilizar empresas turismo asociativo	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Su cumplimiento se tiene programado para el segundo semestre				
DE65AD Sens. empresas turismo calidad y rh	Porcentaje	100	15	15%
Observación B / S: Se le dará cumplimiento para el segundo semestre del año.				

Proyecto PD: 4.5.2.3 Enlaces competitivos para el turismo

Proyecto: 160444 - Fortalecimiento de enlaces competitivos para el turismo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.310 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.281

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE44AO Sensibilizar empresas en situar	Número	90	111	123%
DE44AP Estrategia de comunicaciones implementad	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Su cumplimiento se tiene programado para el segundo semestre				
DE44AQ Estrategia de funcionamiento de pits imp	Número	25	0	0%
Observación B / S: se viene ejecutando de acuerdo a lo programado				

Proyecto PD: 4.5.2.4 Constituir cerro Nutibara parque turístico

Proyecto: 160457 - Diseño del cerro nutibara como atractivo turístico

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.000

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE57AL Estudios elaborados en el cerro	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Su cumplimiento se tiene programado para el segundo semestre				
DE57AM Diseño del cerro nutibara elaborado	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Su cumplimiento se tiene programado para el segundo semestre				

Proyecto PD: 4.5.2.5 Constituir cerro el volador parque turístico

Proyecto: 160458 - Diseño del cerro volador como atractivo turístico

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.200

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE58AH Estudios elaborados en el cerro	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Su cumplimiento se tiene programado para el segundo semestre				
DE58AI Diseño del cerro el volador elaborado	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Su cumplimiento se tiene programado para el segundo semestre				

Programa: 4.5.3 - Internacionalización
Proyecto PD: 4.5.3.1 Construir y desarrollar la marca de ciudad
Proyecto: 160456 - Diseño y desarrollo de la marca de ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE56AH Convocatoria desarrollada	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Su cumplimiento se tiene programado para el segundo semestre				
DE56AI Marca de ciudad desarrollada	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Su cumplimiento se tiene programado para el segundo semestre				

Proyecto PD: 4.5.3.2 Impulsar la promoción y mercadeo de la ciudad como destino turístico
Proyecto: 160462 - Fortalecimiento de la promoción y mercadeo de la ciudad como destino turístico

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.403 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.304

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE62AG Material- turist-entregado	Número	50.000	48.918	98%
DE62AH Estrategia medellin 360° implementada	Porcentaje	100	30	30%
Observación B / S: La Estrategia se encuentra en marcha, los avances se esperan efectuar para el segundo semestre				
DE62AI Estrategia de mercados loc implementada	Porcentaje	100	30	30%
Observación B / S: La Estrategia se encuentra en marcha, los avances se esperan efectuar para el segundo semestre				
DE62AJ Estrategia gestión interna implementada	Porcentaje	100	30	30%
Observación B / S: La Estrategia se encuentra en marcha, los avances se esperan efectuar para el segundo semestre				
DE62AK Estrategia de prom y crea de pdto implem	Porcentaje	100	30	30%
Observación B / S: La Estrategia se encuentra en marcha, los avances se esperan efectuar para el segundo semestre				

Proyecto PD: 4.5.3.3 Medellín ciudad de grandes eventos, convenciones y ferias

Proyecto: 160447 - Fortalecimiento de medellín ciudad de grandes eventos, convenciones y ferias**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 37%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.777 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.000**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE47AH Ferias y eventos realizados	Número	30	15	50%
DE47AM Desarrollo de evento wobly	Porcentaje	100	100	100%

Observación B / S: La Estrategia se encuentra en marcha, los avances se esperan efectuar para el segundo semestre**Proyecto PD: 4.5.3.4 Promoción de la ciudad como destino de inversión****Proyecto: 160473 - Apoyo a la promoción de la ciudad como destino de inversión****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 64%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 977 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.533 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 977**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE73AC Ferias internacionales de negocios	Número	2	1	50%

Proyecto PD: 4.5.3.5 Alianzas de cooperación internacional**Proyecto: 160477 - Fortalecimiento de alianzas de cooperación internacional****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 74% Ejec. Financiera : 64%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 995 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.563 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 995**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE77AF Alianzas de cooperacion gestionadas	Número	9	4	44%
DE77AG Nuevos cooperantes vinculados	Número	6	5	83%
DE77AH Eventos internales con particip alcalde	Número	15	14	93%

Proyecto PD: 4.5.3.6 Medellín, laboratorio de prácticas vivas**Proyecto: 160470 - Consolidación de medellín como laboratorio de prácticas vivas****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 68%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 805 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.188 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 805**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE70AA Periodistas internacionales atendidos	Número	250	153	61%

Proyecto PD: 4.5.3.8 Fortalecimiento de la Red de Antioqueños en el exterior (SosPaisa)

Proyecto: 160467 - Fortalecimiento de la red de antioqueños en el exterior (sospaisa)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 19% Ejec. Financiera : 38%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 76 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 202 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 76

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE67AB Campañas durante el año	Número	8	1	13%
Observación B / S: Se le dará cumplimiento para el segundo semestre del año.				
DE67AC Encuentros con paisas en el exterior	Número	8	2	25%
Observación B / S: Se le dará cumplimiento para el segundo semestre del año.				

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.4 - Medellín vuelve a su Centro

Programa: 6.4.4 - Presencia institucional y gobernabilidad

Proyecto PD: 6.4.4.5 Unidades productivas para los comerciantes informales

Proyecto: 160471 - Desarrollo de unidades productivas para los comerciantes informales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.848 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 768 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 742

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE71AA Comerciantes informales intervenidos	Número	300	0	0%
Observación B / S: La ejecución iniciará a partir del mes de agosto de 2017.				

Reto: 6.6 - Medellín reconoce la importancia de su territorio rural

Programa: 6.6.3 - Desarrollo empresarial rural

Proyecto PD: 6.6.3.1 Implementar la Política Pública de Desarrollo Rural

Proyecto: 160464 - Implementación de la política pública de desarrollo rural

Síntesis Proyecto: Eficacia : 27% Ejec. Financiera : 24%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.819 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.391 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.029

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE64AI Asistencia técnica a productores	Número	1.300	438	34%
Observación B / S: Se le dará cumplimiento para el segundo semestre del año.				

DE64AJ Peq y med productores sensibilizados Número 200 40 20%

Observación B / S: Su cumplimiento se tiene programado para el segundo semestre

Proyecto PD: 6.6.3.2 Fortalecer y realizar los mercados campesinos

Proyecto: 120259 - Parque ecológico y campesino

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE59AL Pasajeros del cable aéreo de san sebasti	Número	12.000	13.280	111%

Proyecto: 160476 - Fortalecimiento de los mercados campesinos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.500

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE76AA Informes de seguimiento al dllo de mcm	Número	40	24	60%

Proyecto PD: 6.6.3.3 Creación y fomento de empresas rurales

Proyecto: 160475 - Conformación y fomento de empresas rurales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 37% Ejec. Financiera : 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 756

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE75AI Acompañamiento técnico a productores	Número	150	110	73%
DE75AJ Emprendimientos rurales asesorados	Número	30	0	0%

Observación B / S: Este valor estadístico es de resultado por lo cual se reporta en el mes de diciembre una vez finalice la intervención de las unidades productivas acompañadas.

Proyecto PD: 6.6.3.4 Comercio local

Proyecto: 160482 - Desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 64%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 704

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE82AI Estudio de sist. agroalimentarios de pro	Porcentaje	100	0	0%

Observación B / S: Su cumplimiento se tiene programado para el segundo semestre

Proyecto PD: 6.6.3.5 Turismo rural comunitario

Proyecto: 160479 - Desarrollo del turismo rural comunitario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 119 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 119 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 116

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE79AD Consol. información atractivos	Porcentaje	100	0	0%

Observación B / S: Su cumplimiento se tiene programado para el segundo semestre

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.2 - Medellín, camino a la excelencia y la calidad

Programa: 4.2.1 - Gestión escolar para el mejoramiento de la calidad

Proyecto PD: 4.2.1.3 Incentivos para la calidad

Proyecto: 160586 - 17pp10-desarrollo de estrategias de comercialización comunitaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 203 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 203 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 203

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE86AI Comercialización comunitaria c10 en dllo	Porcentaje	100	0	0%

Observación B / S: De acuerdo a las etapas de comercialización comunitaria en la comuna 10, se consolidará en el mes de diciembre su última etapa.

Reto: 4.4 - Medellín con acceso al empleo

Programa: 4.4.1 - Especialización Inteligente

Proyecto PD: 4.4.1.3 Acceso a mercados

Proyecto: 160587 - 17pp16-desarrollo de diagnóstico de vocaciones empresariales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 10%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 58 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 58 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE87AU Diagnóstico de vocaciones empresariales	Porcentaje	100	0	0%

Observación B / S: De acuerdo al cronograma, el diagnóstico de vocaciones empresariales se reportará en el mes de diciembre

Programa: 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral

Proyecto PD: 4.4.2.2 Formar y educar en competencias de acuerdo a la demanda y necesidades del mercado laboral

Proyecto: 150237 - 16pp1-formación para el trabajo y habilitación laboral

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 44 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 44

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE37AA Certificados en competencias laborales	Número	29	0	0%

Observación B / S: Se encuentran en proceso de Formación, la Certificación está proyectada para el mes de Septiembre.

Proyecto: 150239 - 16pp2- formación para el trabajo y habilitación laboral

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 53 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 53

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE39AB Certificados en competencias laborales	Número	60	60	100%

Proyecto: 150240 - 16pp3-formación para el trabajo y habilitación laboral

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 27 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 27

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE40AC Certificados en competencias laborales	Número	18	0	0%

Observación B / S: Se encuentran en proceso de Formación, la Certificación está proyectada para el mes de Septiembre.

Proyecto: 150241 - 16pp5-formación para el trabajo y habilitación laboral

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE41AA Certificados en competencias laborales	Número	10	5	50%

Observación B / S: Se logro la certificación de 5 personas de la comuna 5, se proyecta para el mes de septiembre el cumplimiento de la meta.

Proyecto: 150242 - 16pp6-formación para el trabajo y habilitación laboral

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 32 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 32

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE42AE Certificados en competencias laborales	Número	17	0	0%

Observación B / S: Se encuentran en proceso de Formación, la Certificación está proyectada para el mes de Septiembre.

Proyecto: 150243 - 16pp7-formación para el trabajo y habilitación laboral

Síntesis Proyecto: Eficacia : 52% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 28 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 28

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE43AJ Certificados en competencias laborales	Número	27	14	52%

Proyecto: 150244 - 16pp8-formación para el trabajo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE44AA Certificados en competencias laborales	Número	15	15	100%

Observación B / S: Se logro la Certificación de 15 personas de la comuna 8, debido a que las demas proyectadas, desertaron del proceso formativo.

Proyecto: 150245 - 16pp11-formación para el trabajo y habilitación laboral

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE45AG Certificados en competencias laborales	Número	12	13	108%

Proyecto: 150246 - 16pp14-formación para el trabajo y habilitación laboral

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE46AL Matriculados en competencias laborales	Número	12	0	0%

Observación B / S: Se encuentran en proceso de Formación, la Certificación está proyectada para el mes de Julio.

Proyecto: 150247 - 16pp15-formación para el trabajo y habilitación laboral

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 30 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 30

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE47AI Certificados en competencias laborales	Número	14	14	100%

Proyecto: 150312 - 16pp2-formación para el empleo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE12AH Certificados en competencias laborales	Número	15	15	100%

Proyecto: 160588 - 17pp99-formación en técnicas laborales para el empleo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 69%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.793 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.793 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.240

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE88AG Matriculados en formación	Número	590	0	0%

Observación B / S: Los procesos de contratación están en desarrollo del cronograma de mínima cuantía y se espera adjudicación para el mes de Septiembre.

DE88AH Participantes en proceso de formación	Número	250	0	0%
--	--------	-----	---	----

Observación B / S: La certificación se tiene programada para los programas Académicos e informales para más tardar el mes de diciembre y para los programas técnicos laborales para la vigencia 2018, esto debido a que los procesos aun están en etapa pre-contractual

Programa: 4.4.4 - Creación y fortalecimiento empresarial

Proyecto PD: 4.4.4.4 Promoción y fomento de la Economía Social y Solidaria

Proyecto: 160589 - 17pp16-capacitación en economía solidaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 10%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 36 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 36 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE89AA Participantes cursos básicos y diplomado	Número	25	0	0%

Observación B / S: Los cursos básicos y diplomados se reportarán el mes de diciembre una vez finalizados

Proyecto: 160590 - 17pp3-conformación de una red estratégica con los pequeños comerciantes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 10% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 74 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 74 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 74

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE90AB Creación red de pequeños comerciantes	Porcentaje	100	10	10%

Observación B / S: Se está llevando a cabo de acuerdo a lo programado

Proyecto: 160591 - 17pp6-conformación y fortalecimiento de redes comerciales de unidades productivas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 10% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 126 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 126 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 126

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE91AB Creación red estratégica peq comerciante	Porcentaje	100	10	10%

Observación B / S: Se está llevando a cabo de acuerdo a lo programado

Proyecto: 160592 - 17pp99-fortalecimiento y consolidación de unidades productivas asociativas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.107 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.107 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.107

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE92AD Empresas intervenidas en fortalecimiento	Número	16	0	0%
Observación B / S: De acuerdo al proceso de las empresas intervenidas, a través de su fortalecimiento el consolidado se reportará en el mes de diciembre				
DE92AE Empresas intervenidas en consolidación	Número	6	0	0%
Observación B / S: De acuerdo al proceso de las empresas intervenidas, a través de su consolidación se reportará en el mes de diciembre				

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.6 - Medellín reconoce la importancia de su territorio rural

Programa: 6.6.3 - Desarrollo empresarial rural

Proyecto PD: 6.6.3.1 Implementar la Política Pública de Desarrollo Rural

Proyecto: 150229 - 16pp60-suministro y apoyo a la producción agropecuaria y la agroindustria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 200

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE29AC Beneficiarios de insumos agropecuarios	Número	1.380	0	0%

Observación B / S: se reportará una vez se consoliden las evidencias en el mes de diciembre

Proyecto: 150313 - 16pp50-fomento a la producción agropecuaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 185 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 185

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE13AC Beneficiarios de mejoramientos genético	Número	50	0	0%
Observación B / S: se reportará una vez se consoliden las evidencias en el mes de diciembre				
DE13AD Beneficiarios de insumos agrícolas	Número	400	0	0%
Observación B / S: se reportará una vez se consoliden las evidencias en el mes de diciembre				

Proyecto: 150314 - 16pp70-asistencia técnica para el mejoramiento de la producción y la cadena productiva

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 70 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 70

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE14AD Beneficiarios de insumos agrícolas	Número	28	0	0%
Observación B / S: se reportará una vez se consoliden las evidencias en el mes de diciembre				

Proyecto: 150315 - 16pp80-asistencia técnica para el mejoramiento productivo de las unidades agrícolas familiares

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 473 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 473

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE15AB Beneficiarios de insumos agropecuarios	Número	181	0	0%
Observación B / S: se reportará una vez se consoliden las evidencias en el mes de diciembre				

Proyecto: 150316 - 16pp90-fomento a la producción agropecuaria y de flores a las unidades agrícolas familiares

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 185 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 185

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE16AH Beneficiarios de insumos agropecuarios	Número	16	0	0%
Observación B / S: se reportará una vez se consoliden las evidencias en el mes de diciembre				

Proyecto: 160593 - 17pp99-fortalecimiento integral a los procesos agrícolas, pecuarios y agroindustriales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.202 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.702 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE93AA Entrega de insumos para produccion	Número	1.000	0	0%
Observación B / S: se tiene programado empezar en el mes de septiembre hacer la entrega en tres meses, por lo cual el reporte se hará una vez se consoliden las evidencias en el mes de diciembre				

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

	Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
Dimensión:	2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana		
Reto:	2.3 - Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio		
Programa:	2.3.4 - Ciudadanía activa por la paz		
Proyecto PD:	2.3.4.3 Oportunidades productivas para la paz		
	040493 Apoyo A Proyectos Productivos Poblacion Desplazada	\$ 72,26307	\$ 0,0
Dimensión:	4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos		
Reto:	4.5 - Medellín innovadora		
Programa:	4.5.3 - Internacionalización		
Proyecto PD:	4.5.3.4 Promoción de la ciudad como destino de inversión		
	080258 Prom la Ciud Ante Actores Na	\$ 0,00000	\$ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto PD: 1.3.5.1 Medellín digital
Proyecto: 120294 - Medellín digital para el desarrollo económico

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 31 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 31

Proyecto PD: 2.3.4.3 Oportunidades productivas para la paz
Proyecto: 150230 - 16pp13-desarrollo económico para víctimas del conflicto

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15

Proyecto PD: 4.4.2.2 Formar y educar en competencias de acuerdo a la demanda y necesidades del mercado laboral
Proyecto: 120244 - Jóvenes por la vida, una estrategia de habilitación e inserción laboral

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20

Proyecto: 120245 - Formación de adultos, habilitados para la vida y el trabajo decente

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

Proyecto PD: 4.4.3.3 Crear una gran base empresarial de oferta y demanda de empleo

Proyecto: 120246 - Operatividad del sistema de información y orientación laboral a través de los pil

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 51 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 51

Proyecto PD: 4.4.4.1 Fortalecer el ecosistema de emprendimiento

Proyecto: 120249 - Inversión en ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento de alto potencial

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 46 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 46

Proyecto PD: 4.4.4.2 Fortalecer los CEDEZO

Proyecto: 120242 - Cedezo para asistencia empresarial a redes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 63 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 63

Proyecto PD: 4.4.4.4 Promoción y fomento de la Economía Social y Solidaria

Proyecto: 120243 - Apoyo a unidades productivas para fortalecimiento empresarial asociativo en comunas y corregimientos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 47 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 47

Proyecto: 150175 - 16pp3-desarrollo empresarial solidario

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19

Proyecto: 150190 - 16pp6-desarrollo empresarial solidario

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 30 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 30

Proyecto: 150191 - 16pp5-desarrollo empresarial solidario

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 28 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 28

Proyecto: 150192 - 16pp8-desarrollo empresarial solidario

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16

Proyecto: 150193 - 16pp9-desarrollo empresarial solidario

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25

Proyecto:	150194 - 16pp10-desarrollo empresarial solidario		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 51	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 51
Proyecto:	150195 - 16pp11-desarrollo empresarial solidario		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 36	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 36
Proyecto:	150196 - 16pp13-desarrollo empresarial solidario		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18
Proyecto:	150197 - 16pp14-desarrollo empresarial solidario		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18
Proyecto:	150198 - 16pp15-desarrollo empresarial solidario		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 44	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 44
Proyecto:	150199 - 16pp16-desarrollo empresarial solidario		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 37	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 37
Proyecto:	150200 - 16pp60-desarrollo empresarial solidario		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19
Proyecto PD:	4.4.4.5 Fortalecimiento del Banco de las Oportunidades y acceso a recursos		
Proyecto:	120235 - Banco de los pobres - banco de las oportunidades		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 85	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 85
Proyecto PD:	4.5.3.2 Impulsar la promoción y mercadeo de la ciudad como destino turístico		
Proyecto:	120256 - Promoción de ciudad para el mercado local, nacional e internacional		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 51	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 51
Proyecto PD:	6.6.3.1 Implementar la Política Pública de Desarrollo Rural		
Proyecto:	130439 - Reconocimiento de la población campesina		
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 72	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 72
Proyecto:	150201 - 16pp70-desarrollo empresarial		

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5

Proyecto: 150250 - 16pp80-desarrollo empresarial

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21



Proyecto PD: 6.6.3.3 Creación y fomento de empresas rurales

Proyecto: 120261 - Fortalecimiento de empresas rurales



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 355 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 355

Departamento Administrativo de Planeación Municipal

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2017

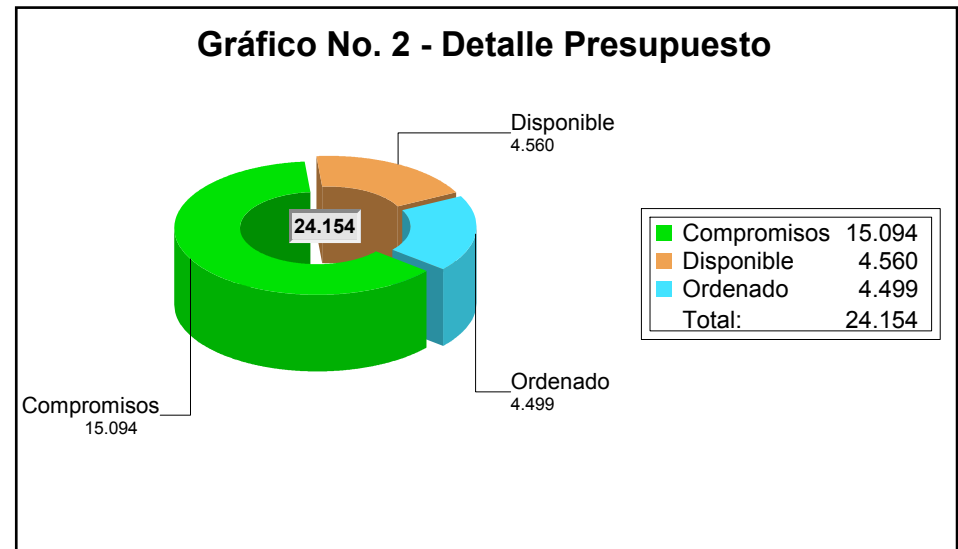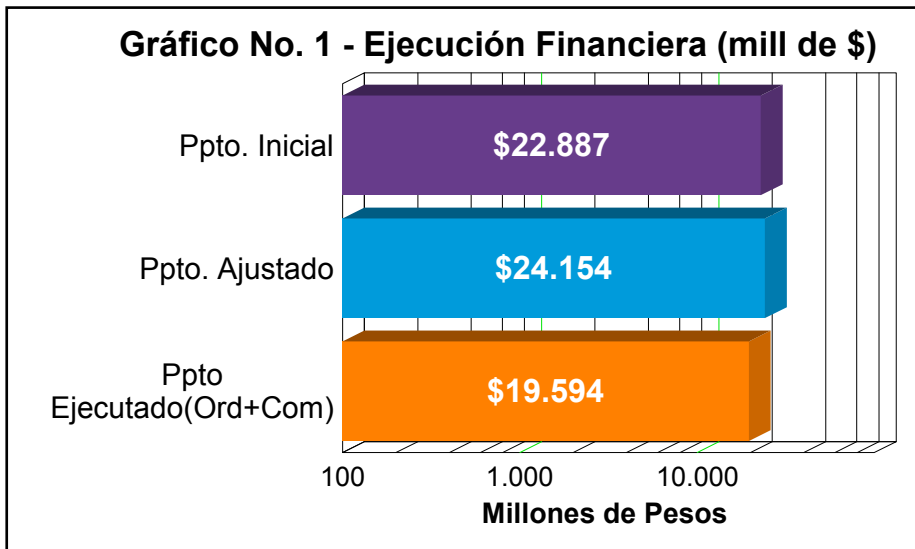

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

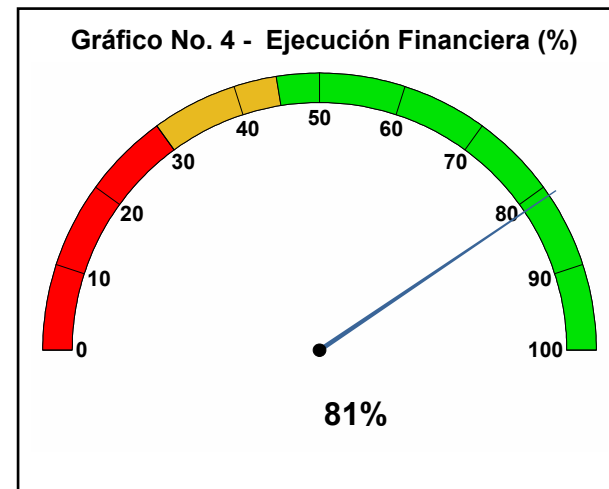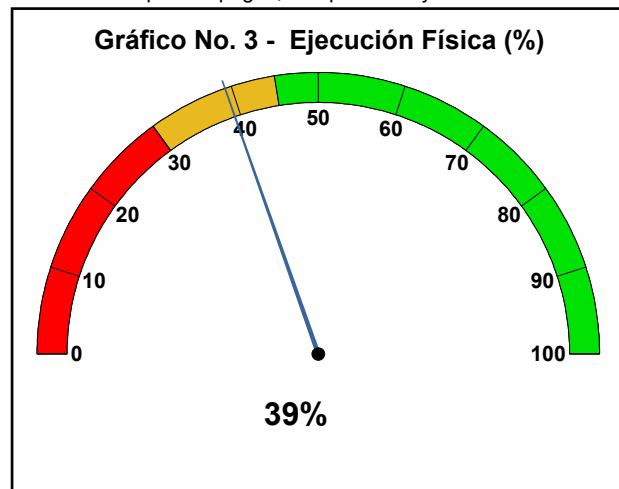

La ejecución financiera comprende pagos, facturas y los compromisos a la fecha de corte. Para el caso de los establecimientos públicos, la Ejecución Financiera se compone de dos cifras: una información obtenida del sistema, que corresponde únicamente a la cifra del presupuesto transferido desde el Municipio al estapúblico, y otra información suministrada por cada entidad que corresponde a los recursos propios invertidos por proyecto.

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.2 - Medellín participativa
Programa: 1.2.3 - Fortalecimiento estratégico de la planeación social y económica
Proyecto PD: 1.2.3.1 Sistema Municipal de Planeación para el desarrollo sostenible, integral, planeado y participativo
Proyecto: 160436 - Actualización del sistema municipal de planeación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 23% Ejec. Financiera : 93%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 910 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 907 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 847

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL36AA Capacitaciones realizadas marco del smp	Número	3	0	0%
Observación B / S: Actualmente esta en proceso de planeación de la estrategia, para dar inicio y cumplir con el producto en el ultimo trimestre del año				
PL36AB Dcto tecnico protocolo sobre el smp	Número	1	0	0%
Observación B / S: Con un 30% de avance el documeto se encuentra en construcción y el total del producto se entrega en el ultimo trimestre del año				
PL36AC Fortalecimiento del ctp	Porcentaje	100	30	30%
Observación B / S: Informes de supervision, contratacion de personal, apoyo logistico				
PL36AD Doc tecnico protc instrumentos planeacio	Número	2	1	50%
Observación B / S: Documentos tecnicos metodologico y conceptual del compes				
PL36AE Normatividad actualizada	Número	1	1	100%
Observación B / S: Acuerdo 28/2017				
PL36AF Encue escenarios participacion pol publi	Número	2	0	0%
Observación B / S: Aun se encuentra en la etapa de construcción y el producto total se entrega en el ultimo trimestre del año				
PL36AG Cartilla divulgación en el marco del smp	Número	1	0	0%
Observación B / S: Aun se encuentra en la etapa de construcción y el producto total se entrega en el ultimo trimestre del año				
PL36AH Revista de politicas publicas	Número	1	0	0%
Observación B / S: Aun se encuentra en la etapa de construcción y el producto total se entrega en el ultimo trimestre del año, Se envio invtacion para publicar articulos se cuenta con comité editorial				

Proyecto PD: 1.2.3.2 Planeación participativa del desarrollo

Proyecto: 160437 - Fortalecimiento en la planeación participativa del desarrollo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 30% Ejec. Financiera : 94%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 429 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 406 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 382

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL37AA Herramientas metodológicas construidas	Número	1	0	0%
Observación B / S: se dará cumplimiento en el ultimo trimestre del año				
PL37AB Jal/act dilo aprop herr/orient téc proc	Número	21	21	100%
PL37AC Planes d desarrollo local complementados	Número	21	0	0%

Observación B / S: Está en proceso la entrega de las evidencias que serían las resoluciones de las Jal ya se realizó el proceso en las comunas				
PL37AE Proc direc estrat pdl articu secret y ed	Número	20	10	50%
Observación B / S: Se cuenta con actas y listados de asistencias				
PL37AF Estrat gestión del k dllo local implemen	Porcentaje	50	15	30%
Observación B / S: Es un documento que va en un avance del 15% la unidad de medida debe ser en porcentaje				
PL37AG Ficha proced direccion estratégi formula	Número	1	0	0%

Proyecto PD: 1.2.3.3 Políticas sociales y económicas e instrumentos de gestión para el desarrollo

Proyecto: 160438 - Consolidación de las políticas sociales y económicas e instrumentos de gestión para el desarrollo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 80%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 607 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 522 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 420

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL38AD Capacitaciones realizadas	Número	234	152	65%
PL38AE Rutas metodológicas políticas públicas	Porcentaje	100	70	70%
Observación B / S: Docuemto de polioticas publicas en isolucion				
PL38AF Instrumentos de gestión ajustados	Porcentaje	100	40	40%
Observación B / S: Avance deL instrumento de gestion del gruo poblacional lgtbi				
PL38AG Protocolo de lineamientos elaborados	Porcentaje	100	90	90%
Observación B / S: Formulacion de planes sectoriales y documentos compes en isolucion como procedimiento				
PL38AH Articulación/formulación planes sectoria	Porcentaje	100	40	40%
Observación B / S: se han realizado labores de apoyo en las mesas de formulación del Plan LOCAL de EMPLEO que debe estar construido antes de terminar el año 2017, la labor de acompañamiento nuestro ha avanzado un 40%				
PL38AI Componente económico pot articulado	Porcentaje	100	30	30%
Observación B / S: Para el componente económico del POT se ha participado en las MESAS de diseño de indicadores de seguimiento a la implementación del POT en el Objetivo 10 que establece el diseño de la Plataforma Territorial para apoyar la competitividad de la ciudad. la l				
PL38AJ Fuentes de financiación identificadas	Porcentaje	100	50	50%
Observación B / S: Para la identificación de fuentes de financiación alternativas de financiación se participa activamente con la Secretaría de Hacienda la identificación y gestión del Manual de Oferta Institucional, calidad de supervisión técnica del contrato. , la labor d				

Proyecto PD: 1.2.3.4 Revisión y actualización de la división político - administrativa del Municipio de Medellín

Proyecto: 160626 - Actualización de la división político - administrativa del municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 16% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 550 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 550

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL26AA Documento tecnico info caracter historico	Porcentaje	100	30	30%
Observación B / S: Corresponde al levantamiento de la información secundaria.				
PL26AB Estrategias pedagogica y comunicacional	Porcentaje	100	50	50%
Observación B / S: Corresponde al diseño de la estrategia sin implementar.				

PL26AC	Acto administrativo	Porcentaje	50	0	0%
Observación B / S: Sin iniciar					
PL26AD	Soporte de la division politica admon	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Sin iniciar					
PL26AE	Informe tecnico detallando cambio comuna	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Sin iniciar					

Reto: 1.3 - Medellín bien administrado
Programa: 1.3.1 - Gobierno visible
Proyecto PD: 1.3.1.2 Realización periódica de rendiciones de cuentas públicas integrales y específicas de seguridad e infancia
Proyecto: 160414 - Implementación periódica de rendiciones de cuentas públicas integrales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 352 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 326 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 319

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL14AA Campañas difundidas en medios de comunic	Número	1	1	100%
PL14AB Documentos informes gestión y segui pot	Número	4	2	50%
PL14AC Audiencias de rendicion de cuentas real.	Número	2	1	50%
PL14AF Doc estrategia rendición de cuentas	Número	1	0	0%

Observación B / S: programado para entregar en el último trimestre

Programa: 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno
Proyecto PD: 1.3.5.2 Open Data Medellín
Proyecto: 160409 - Implementación open data medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 19% Ejec. Financiera : 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 423 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 358 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 352

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL09AA Portal open data implementado	Número	1	0	0%
Observación B / S: Programado para el segundo semestre del año				
PL09AB Dependencias con datos publicados	Número	1	0	0%
Observación B / S: Programado para el segundo semestre del año				
PL09AC Estrategias de apropiación/uso de datos	Número	4	1	25%
PL09AD Pilotos con datos públicos desarrollados	Número	2	1	50%

Proyecto PD: 1.3.5.3 Transversalización de la innovación al interior de la administración
Proyecto: 160600 - Estudios para la transversalización de la innovación al interior de la administración

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 80 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 80 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 80

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL00AA Instituc portafolio innovación definidos	Número	2	0	0%

Observación B / S: El proyecto no ha empezado a ejecutar recursos

Proyecto PD: 1.3.5.5 Implementar la metodología de Gestión por Resultados

Proyecto: 160410 - Implementación de la metodología de gestión por resultados

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 18%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 70 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 70 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL10AC Documentos con exploracion documental	Número	1	0	0%
PL10AE Pilares con avance de desarrollo	Número	2	0	0%

Observación Proyecto: Programado para el segundo semestre del año

Proyecto PD: 1.3.5.6 Red de observatorios para la trazabilidad del impacto social

Proyecto: 160411 - Consolidación del observatorio de políticas públicas del municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 21% Ejec. Financiera : 69%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.851 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.033 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.410

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL11AA Encuesta integrada de hogares realizada	Número	1	0	0%
Observación B / S: Programado para el segundo semestre del año				
PL11AB Bateria indicadores ciudad actualizados	Número	1	0	0%
Observación B / S: Programado para el segundo semestre del año				
PL11AC Artículos publicados	Número	1	1	100%
PL11AD Encuesta de calidad de vida realizada	Número	1	0	0%
Observación B / S: Programado para el segundo semestre del año				
PL11AE Encuentros red observatorios realizados	Número	4	1	25%
PL11AF Servicio de gestión documental	Porcentaje	100	0	0%

Proyecto PD: 1.3.5.7 Cities for life

Proyecto: 160602 - Implementación, cities for life

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 132 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 132 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 132

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL02AA Plataf cocrea ciud impul datos implement	Número	1	0	0%
PL02AB Red ciu/ciudadanos cities for life forta	Porcentaje	20	0	0%
PL02AC Encuen apropiación/co-creación ciudadana	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: El proyecto no ha empezado a ejecutar recursos

Proyecto PD: 1.3.5.8 Implementar el sistema de información territorial para la medición de impactos basados en la transversalización de las acciones

Proyecto: 160412 - Fortalecimiento del sistema de información sisben

Síntesis Proyecto: Eficacia : 41% Ejec. Financiera : 79%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.696 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.930

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL12AA Atención de solicitudes del ciudadano	Porcentaje	100	63	63%
PL12AB Participación jornadas institucionales	Porcentaje	100	25	25%
PL12AC Base de datos certificada	Número	12	9	75%
PL12AD Comunas y corregimientos atendidos	Número	21	0	0%

Proyecto: 160413 - Implementación del sistema de información territorial para la medición de impactos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 10% Ejec. Financiera : 64%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 446 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 446 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 287

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL13AB Etl implementado	Número	3	0	0%
Observación B / S: Programado para el segundo semestre del año				
PL13AC Modelos analíticos	Número	5	1	20%
PL13AD Repositorio de datos consolidado	Número	1	0	0%
Observación B / S: Programado para el segundo semestre del año				
PL13AE Geodatabase con información estratégica	Número	1	0	0%
Observación B / S: Programado para el segundo semestre del año				
PL13AF Bases de datos integradas	Número	1	0	0%
Observación B / S: Programado para el segundo semestre del año				
PL13AG Reportes y tableros de control	Número	5	2	40%

Proyecto PD: 1.3.5.9 Gestión estratégica de la información - Fábrica de pensamiento

Proyecto: 160439 - Desarrollo de conocimiento estratégico de la ciudad - fábrica de pensamiento

Síntesis Proyecto: Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 388

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL39AA Docs elaborados y difundidos de sgto inversio	Número	10	4	40%
Observación B / S: De cada mesa estratégica sale un documento, se tiene el documento de mayo y junio, por lo tanto en el año el avance es del 40%				
PL39AB Dcto elaborado y difundido eval inversio	Número	4	2	50%
Observación B / S: Se tienen dos documentos ya difundidos de la evaluación de la inversión estamos en un avance del 50%				
PL39AC Estudio elaborado difundido o divulgado	Número	1	0	0%
PL39AD Convenios suscritos de asistencia técnica	Número	1	1	100%
Observación B / S: Convenio firmado con Comfama				
PL39AE Plan operativo anual de invers formulado	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se realiza en el último trimestre del año				

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible

Reto: 5.2 - Medellín por una mejor movilidad

Programa: 5.2.1 - Planificación del Sistema de movilidad de la ciudad

Proyecto PD: 5.2.1.1 Formulación del Plan Integral de Movilidad Sostenible

Proyecto: 160373 - Formulación plan integral de movilidad sostenible

Síntesis Proyecto: Eficacia : 36% Ejec. Financiera : 87%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.673 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.673 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.336

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL73AA Mapa de actores de articulación	Porcentaje	100	10	10%
Observación B / S: Depende de la formulación doc. Diag. Del plan de movilidad				
PL73AB Formulación de políticas de transporte	Porcentaje	10	3	30%
Observación B / S: Depende de la formulación doc. Diag. Del plan de movilidad				
PL73AC Doc d diagnóstico del plan de movilidad	Porcentaje	100	30	30%
PL73AD Documento con definición de indicadores	Porcentaje	100	10	10%
Observación B / S: Depende de la formulación doc. Diag. Del plan de movilidad				
PL73AE Plano de proyectos viales actualizados	Porcentaje	10	10	100%

Proyecto PD: 5.2.1.2 Formulación del Plan Integral de intervenciones sobre los corredores de transporte y su área de influencia de los existentes y futuros

Proyecto: 160381 - Formulación del plan integral de intervenciones sobre los corredores de transporte y su área de influencia.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 528 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 528 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 521

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL81AB Documentos metodológico	Porcentaje	50	20,5	41%
PL81AC Aprobaciones viales y de espacio público	Porcentaje	100	39	39%

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.1 - Medellín planifica y gestiona su territorio

Programa: 6.1.1 - Planificación del Ordenamiento Territorial

Proyecto PD: 6.1.1.1 Formulación e Implementación de los Protocolos Ambientales y Urbanísticos – PAU

Proyecto: 160383 - Formulación e implementación de los protocolos ambientales y urbanísticos – pau

Síntesis Proyecto: Eficacia : 4% Ejec. Financiera : 1%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 560 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 560 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL83AA Protocolo ambientales urban formulados	Porcentaje	70	5	7%

Observación B / S: corresponde a la elaboración de los documentos que soportan el Concurso abierto de méritos que fue declarado desierto y del nuevo proceso que se encuentra en etapa de publicación de proyecto de pliegos. Proceso 0020003992. Los documentos son: Analisis del sector económico, estudios previos, Matriz de riesgos, Definición de PAUS por grupos de actividades económicas

PL83AB Protocolo ambientales urban implementado	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

Observación B / S: No se reporta avance porque la implementación del PAU depende de la formulación de los mismos.

Proyecto PD: 6.1.1.2 Desarrollo y actualización de normas y estudios complementarios al POT

Proyecto: 160374 - Desarrollo y actualización de normas y estudios complementarios al pot

Síntesis Proyecto: Eficacia : 35% Ejec. Financiera : 78%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.164 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.853 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.439

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL74AA Estudios tecnicos para la aplicacion	Porcentaje	100	45	45%
PL74AB Dos unidades de planificacion rural form	Porcentaje	100	20	20%
Observación B / S: 25% de avance la UPR del llano esta en proceso contractual del concurso de meritos, mazo y arvi estan en ejecucion, en convenio con la universidad nacional.				
PL74AC Guía para el dllo del subsistema equipami	Porcentaje	100	40	40%
PL74AD Manual de construccion sostenible elabor	Porcentaje	100	90	90%
Observación B / S: Se refiere a avances de la segunda fase				
PL74AE Planes especiales de manejo formulados	Porcentaje	100	55	55%
PL74AI Estudios complementarios de los macropro	Porcentaje	100	0	0%

Observación B / S: El contrato tiene acta de inicio del 6 de junio.
A la espera del primer producto, equivalente al 20% de la meta

PL74AJ	Estudio revision lim de la reserva nare	Porcentaje	70	5	7%
PL74AK	Estudio tecnico definicion componentes	Porcentaje	100	45	45%
PL74AM	Estudios de riesdos evaluados y validos	Porcentaje	100	40	40%
PL74AO	Doc manejo de áreas de aprovisionamiento	Porcentaje	100	20	20%
PL74AP	Doc. anali indic de evaluacion/segu. pot	Porcentaje	100	40	40%
PL74AQ	Estudios complementarios de los macropro	Porcentaje	100	20	20%

Observación B / S: El contrato tiene acta de inicio del 6 de junio.
El primer producto equivalente al 20% de la meta

Programa: 6.1.2 - Implementación del sistema institucional y gestión del POT

Proyecto PD: 6.1.2.1 Formulación y adopción de los Macroproyectos de transversalidades y de borde urbano rural

Proyecto: 160377 - Formulación y adopción de los macroproyectos de transversalidades y borde urbano rural

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 48

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL77AA Documento formulación transversalidades	Porcentaje	100	5	5%
PL77AD Diagnostico aie de transversalidades	Porcentaje	100	30	30%
PL77AG Propuesta formulacion macro transversali	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: Corresponde a la Propuesta metodologica para la formulacion del componente urbanistico del macroproyecto				
PL77AJ Propuesta sistema gestion macro transver	Porcentaje	100	40	40%
Observación B / S: Corresponde al diseño de metodología del componente participativo y comunicacional				

Proyecto PD: 6.1.2.2 Formulación y adopción de instrumentos de planificación complementaria

Proyecto: 160378 - Formulación y adopción de instrumentos de planificación complementaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.814 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.814 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.814

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL78AA Planes parciales	Porcentaje	10	5	50%
Observación B / S: Avance referido a la fase de diagnóstico de los planes parciales en el marco de la transversalidad santa elena				
PL78AB Distrito rural campesino	Porcentaje	40	15	38%
Observación B / S: Hace referencia al avance del contrato con la UNAL que estableció el diseño metodológico, la conformación del equipo de trabajo y el cronograma, así como los acercamientos y talleres desarrollados con la UPRA del Ministerio de Agricultura.				
PL78AC Planes de legalizacion plru	Porcentaje	50	20	40%
Observación B / S: Correspondiente al avance de los diagnósticos de los PLRU en el marco de la transversalidad Santa Elena				
PL78AD Planes maestros	Porcentaje	100	50	50%

Observación B / S: Corresponde al acompañamiento de los Planes maestros de Universidad de Medellín y Hospital Pablo Tobón Uribe

PL78AG Acompañamiento gestion planes parciales	Porcentaje	100	50	50%
--	------------	-----	----	-----

Observación B / S: Corresponde a la gestión y acompañamiento a los planes parciales adoptados a través de la oficina de gestión urbana y la unidad de instrumentos

Proyecto PD: 6.1.2.3 Instrumentos de financiación e intervención del suelo para el desarrollo físico espacial

Proyecto: 160380 - Diseño de instrumentos de financiación e intervención del suelo para el desarrollo físico espacial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 856 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 856 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 856

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL80AA Documento tecnico proyecto decreto	Porcentaje	100	58	58%
Observación B / S: Hace alusión a la finalización del Decreto de relojes digitales y a los ajustes realizados a los documentos de los proyectos de decreto de Avisos publicitarios y Tranferencia de derechos de contrucción y desarrollo patrimonial y ambiental.				
PL80AB Documento tecnico de soporte	Porcentaje	100	58	58%
Observación B / S: Se refiere al DTS de relojes digitales y a los ajustes al DTS de Tranferencia de derechos de contrucción y desarrollo patrimonial y ambiental.				
PL80AC Informe tecnico	Porcentaje	100	50	50%
Observación B / S: Considera los avances relacionados con los informes técnicos en relación a distancias y tamaños de los relojes y las experiencias en otras ciudades y a los estudios e informes financieros y las proyecciones de recaudo de los instrumentos y para la actualización del				

Programa: 6.1.3 - Gestión de la información urbanística y catastral

Proyecto PD: 6.1.3.1 Metodología para el seguimiento de las transformaciones territoriales

Proyecto: 160382 - Implementación de la metodología para el seguimiento de las transformaciones territoriales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 62%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.219 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.870 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.773

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL82AA Informes viabilización proyectos urbanos	Porcentaje	100	50	50%
Observación B / S: La viabilización y revisión normativa es constante, se considera que el avance corresponde al 100% del tiempo.				
PL82AB Plataforma acompañami implementación pot	Porcentaje	100	55	55%
Observación B / S: El acompañamiento es constante especialmente en la formulacion de indicadores, formulacion de instrumentos y reglamentaciones, y revisión POT.				
PL82AC Modelacion urbana del pot	Porcentaje	40	20	50%
Observación B / S: Corresponde a la elaboración de los estudios previos				
PL82AD Implementación oficina gestión urbana	Porcentaje	100	100	100%
PL82AE Acompañamiento a la gestión de proyectos	Número	30	100	333%
Observación B / S: Corresponde a la gestion de 39 iniciativas publicas y privadas en la Oficina de Gestión Urbana a través de: Direccionamiento Estratégico Estructuración del Proyecto Revisión Técnica y jurídica				

Programa: 6.1.4 - Fortalecimiento estratégico para el desarrollo regional

Proyecto PD: 6.1.4.1 Definición de instrumentos para la gestión articulada del territorio

Proyecto: 160415 - Desarrollo de instrumentos para la gestión articulada del territorio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 44%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 301 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 131

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL15BA Mesas regionales planificación y estudio	Número	1	1	100%

Observación B / S: Ya se cumplió con la meta del 2017

Proyecto PD: 6.1.4.2 Desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional regional

Proyecto: 160416 - Desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional regional

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 68%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 142 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 142 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 97

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL16BA Acciones regionales planifica y estudio	Número	3	3	100%

Reto: 6.2 - Proyectos Integrales para Medellín

Programa: 6.2.1 - Gestión de los instrumentos de planificación, adoptados de segundo y tercer nivel del POT

Proyecto PD: 6.2.1.1 Gestión y acompañamiento de operaciones urbanas en Macroproyectos

Proyecto: 160384 - Administración y acompañamiento de operaciones urbanas en macroproyectos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 165 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 165 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 165

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL84AA Documento tecnico con lineamientos	Porcentaje	100	30	30%
Observación B / S: Se esta construyendo el proyecto de decreto en el que se ha avanzado sobre los lineamientos tecnicos.				
PL84AC Documento tecnico con piezas graficas	Porcentaje	100	50	50%
PL84AD Reglamentación de los operadores urbanos	Porcentaje	100	95	95%

Observación B / S: El proyecto de decreto se ha a socializado con los gremios, faltan los ultimos ajustes y pen diente del visto bueno de secretaria general.

Proyecto PD: 6.2.1.2 Protección a moradores y actividades económicas y productivas

Proyecto: 160385 - Protección a moradores, actividades económicas y productivas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 165 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 165 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 165

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL85AA Diagnostico socioe/co de las zonas inter	Porcentaje	50	50	100%
Observación B / S: Se reportó a marzo 31 de 2017 el 50%				
PL85AB Política publica de proteccion a morador	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: Se alcanza con este avance el 100% de la meta				
PL85AC Estrategias pedagogica y comunicacional	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: Se reportó a marzo 31 de 2017 el 100%				
PL85AD Protocolo unificado de reasentamiento	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: Se alcanza con este avance el 100% de la meta				
PL85AE Simulacion o estudio de caso	Porcentaje	100	20	20%

Programa: 6.2.2 - Implementación de proyectos estratégicos

Proyecto PD: 6.2.2.1 Estrategia Proyectos Urbanos Integrales

Proyecto: 160386 - Análisis, viabilización y/o aprobación de los proyectos urbanos integrales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 85%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 127

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL86AA Formulacion de los proyectos urbanos	Porcentaje	100	50	50%
Observación B / S: La asesoría es constante, se considera que el avance corresponde al 100% del tiempo.				
PL86AB Aplicacion de la norma proyectos territo	Porcentaje	100	50	50%
Observación B / S: La verificación y revisión normativa es constante, se considera que el avance corresponde al 100% del tiempo.				

Proyecto PD: 6.2.2.4 Plan parcial de Moravia

Proyecto: 160379 - Implementación del plan parcial de moravia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 970 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 949 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 929

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL79AA Estudios hidrologicos e hidraulicos	Porcentaje	80	15	19%
Observación B / S: Hace referencia al avance del contrato con la UNAL que estableció el diseño metodológico, la conformación del equipo de trabajo y el cronograma				
PL79AC Estudio con relacion asfaltadora colombi	Porcentaje	90	15	17%
Observación B / S: Hace referencia al avance del contrato con la UNAL que estableció el diseño metodológico, la conformación del equipo de trabajo y el cronograma				
PL79AD Estudios ambtales zona apta con restrinc	Porcentaje	80	15	19%
Observación B / S: Hace referencia al avance del contrato con la UNAL que estableció el diseño metodológico, la conformación del equipo de trabajo y el cronograma				
PL79AH Tejido social fortalecido	Porcentaje	100	15	15%

Observación B / S: Hace referencia al avance del contrato con la UNAL que estableció el diseño metodológico, la conformación del equipo de trabajo y el cronograma

Reto: 6.3 - Medellín gestiona su paisaje y patrimonio
Programa: 6.3.2 - Recuperemos nuestro patrimonio y paisaje
Proyecto PD: 6.3.2.2 Revitalización estratégica y económica de corredores y patrimonio
Proyecto: 160404 - Revitalización estratégica y económica de corredores y patrimonio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 49% Ejec. Financiera : 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 179 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 179 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 176

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL04AA Bienes declarados y valorados	Porcentaje	22	20	91%
Observación B / S: Estamos pendiente de la respuesta del Consejo Departamental de Patrimonio				
PL04AB Gestion y form.de los instrumentos plani	Porcentaje	80	25	31%
Observación B / S: Se avanza en el ajuste de los PEMP formulados según observaciones Mincultura.				
PL04AD Mesas de trabajo para mejorar los recurs	Porcentaje	100	35	35%
Observación B / S: Se ha participado en diversos espacios para tratar temas relacionados con PC.				
PL04AE Apoyo formulación instrumentos financi	Porcentaje	100	50	50%
Observación B / S: Se adelanta el acompañamiento tecnico desde el equipo de patrimonio al de instrumentos de DAP para sacar adelante la reglamentacion correspondiente.				
PL04AF Estudios de proyectos de intervencion	Porcentaje	100	40	40%
Observación B / S: Se han atendido las diversas solicitudes de la ciudadanía frente a este tema de intervención.				

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto PD: 1.2.3.2 Planeación participativa del desarrollo

Proyecto: 120219 - Direccionamiento de la planeación participativa

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 138 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 138

Proyecto PD: 1.2.3.3 Políticas sociales y económicas e instrumentos de gestión para el desarrollo

Proyecto: 120218 - Fortalecimiento estratégico de la planeación social y económica

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 87 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20

Proyecto PD: 1.3.5.6 Red de observatorios para la trazabilidad del impacto social

Proyecto: 120222 - Observatorio de políticas públicas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 33 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 33

Proyecto PD: 1.3.5.8 Implementar el sistema de información territorial para la medición de impactos basados en la transversalización de las acciones

Proyecto: 030442 - Fortalecimiento del sistema de información sisben

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 345 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 345

Proyecto PD: 6.1.2.1 Formulación y adopción de los Macroproyectos de transversalidades y de borde urbano rural

Proyecto: 120167 - Planificación de los proyectos estrategicos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 273 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 273

Proyecto PD: 6.1.2.2 Formulación y adopción de instrumentos de planificación complementaria

Proyecto: 120162 - Planificación de ordenamiento territorial

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13

Proyecto PD: 6.1.2.3 Instrumentos de financiación e intervención del suelo para el desarrollo físico espacial

Proyecto: 120164 - Gestión del suelo para el hábitat

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50



Proyecto PD: 6.1.4.1 Definición de instrumentos para la gestión articulada del territorio

Proyecto: 120220 - Gestion articulada de los territorios camino al desarrollo regional



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 36 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 30

Gestión y Control Territorial

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2017

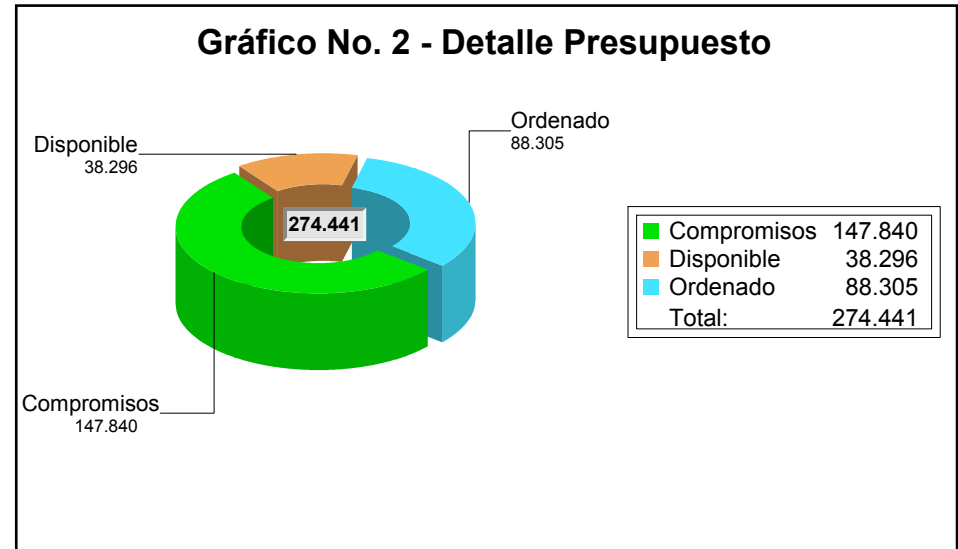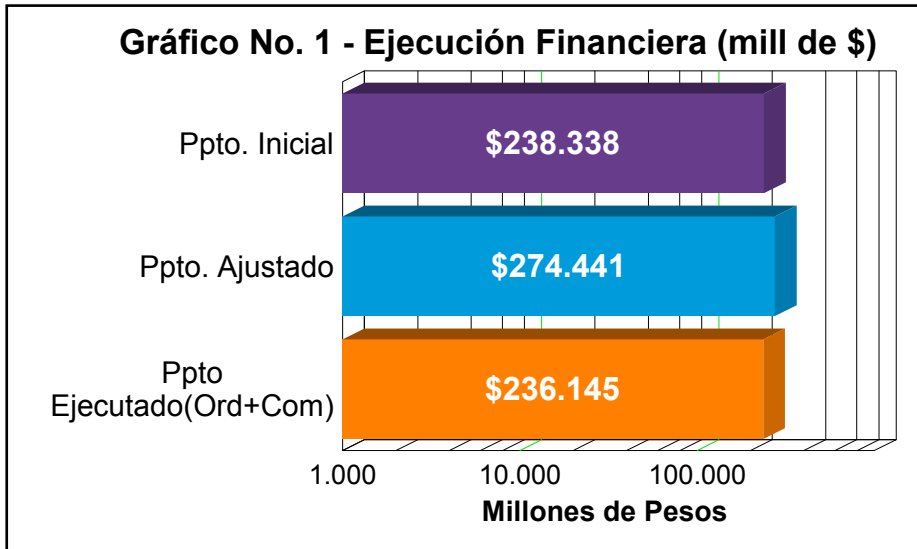

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

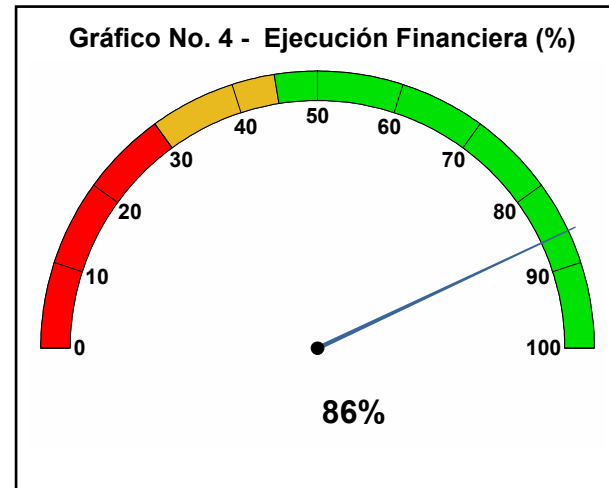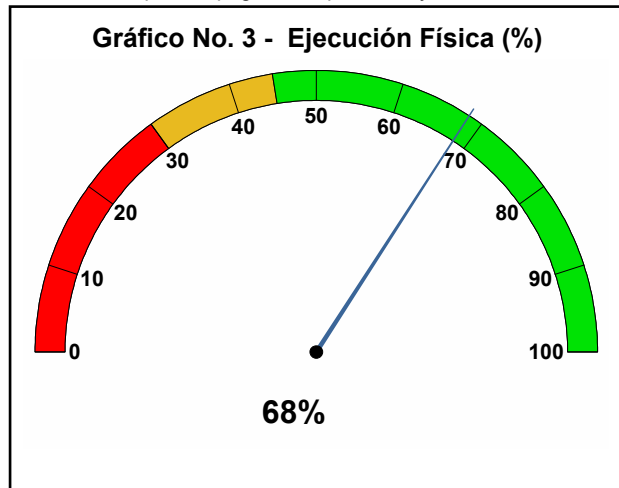

La ejecución financiera comprende pagos, facturas y los compromisos a la fecha de corte. Para el caso de los establecimientos públicos, la Ejecución Financiera se compone de dos cifras: una información obtenida del sistema, que corresponde únicamente a la cifra del presupuesto transferido desde el Municipio al estapúblico, y otra información suministrada por cada entidad que corresponde a los recursos propios invertidos por proyecto.

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.1 - Medellín planifica y gestiona su territorio

Programa: 6.1.3 - Gestión de la información urbanística y catastral

Proyecto PD: 6.1.3.2 Gestión para la Información catastral

Proyecto: 130606 - Mantenimiento estratificación socioeconomica

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.180 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Según decreto No 531 para el mes de Julio se tiene proyectada la reducción de recursos por valor de \$1.179.689.530

Proyecto: 160311 - Actualización censo catastral

Síntesis Proyecto: Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 79%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.766 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.719 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.743

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT11BB Matriculas precenso	Número	37.000	37.126	100%
GT11BC Matric analizadas elem fis, jur y/o ecco	Número	15.000	4.633	31%
GT11BD Inconsistencias en bd catastral depurada	Número	5.000	1.641	33%
GT11BE Interrelac bd catastro - registro.	Número	1.375	389	28%
Observación B / S: Los resultados de este indicador estan por debajo del resultado esperado ya que no se cuenta con los accesos que se tenian de la ventanilla unica de registro, pues se paso de 64 accesos a 5 accesos mientras se logra materializar el nuevo convenio con la Superintendencia de Notariado y Registro por parte de la Secretaria de Hacienda. Se espera cumplir con la meta para el 31 de diciembre.				
GT11BF Asesorías de la ciudadanía atendidas	Número	7.000	3.154	45%

Proyecto: 160317 - Mantenimiento de la estratificación socioeconomica

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 47%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.724 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 814

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT17BA Cbml de estratos asignado y/o revisado	Número	7.000	0	0%
Observación B / S: El contrato tiene acta de inicio del 05 de junio de 2017 y que por esta razón no se reportan cantidades al corte de junio 30				

Proyecto: 160318 - Conservación catastral

Síntesis Proyecto: Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.104 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.104 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.071

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

GT18BA Trámites conser elem fis, jurí y/o ecco.	Número	10.600	3.772	36%
GT18BB Cppc elaborados	Número	1.400	658	47%
GT18BC Información geográfica digitalizada	Número	160.000	81.897	51%
GT18BD Nomenclat asignad, corregid y/o certific	Número	80.000	34.805	44%
GT18BE Invest cam/ofici realiz observ inmobilia	Número	7.500	3.544	47%
GT18BF Ptos de ctrl actualizados para mapa zhg	Número	2.400	1.019	42%
GT18BG Investi físicas/jurídicas predios realiz	Número	9.000	4.677	52%

Proyecto: 160319 - Apoyo para la homologación bases de datos prestadores servicios públicos domiciliarios- catastro

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 250

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT19BA Bd prestadores de serv homologada	Número	1	0	0%

Observación B / S: Aún no se ha firmado el convenio y por esta razón no se reporta ejecución

Proyecto PD: 6.1.3.3 Gestión para el control urbanístico

Proyecto: 160321 - Control urbanístico

Síntesis Proyecto: Eficacia : 52% Ejec. Financiera : 69%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.297 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.481 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.183

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT21BA Obligaciones urbanísticas gestionadas	Número	3.000	595	20%
Observación B / S: Durante el periodo evaluado se gestionaron 595 para un promedio de cumplimiento del 20%, es importante aclarar que a partir del 26 de marzo inicio el contrato con el ITM, el personal de apoyo para esta tarea se asignó a la actividad de revisión de los parqueaderos de la comuna 10.				
GT21BB Solicitudes de licencia urbanística revi	Número	2.000	826	41%
Observación B / S: Durante el periodo evaluado se analizaron 826, para un promedio de cumplimiento del 41% acumulado (los dos primeros trimestre)				
GT21BC Proyectos licenciados visitados	Número	2.000	1.027	51%
Observación B / S: Durante el periodo evaluado se analizaron 1.027 para un promedio de cumplimiento del 51%. acumulado (los dos primeros trimestre)				
GT21BD Seguimiento a curadurías urbanas	Número	4	4	100%
Observación B / S: Durante el periodo se realizaron los seguimientos planeados para las 4 Curadurías, para un cumplimiento del 100% de lo programado				
GT21BE Infracciones urbaníticas intervenidas en	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: Durante el periodo evaluado se intervinieron 918 infracciones urbanísticas, para un total de 918.				
GT21BF Solicitudes de radicados de venta atendi	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: Durante el periodo evaluado se respondieron junio 30, en marzo 20, para un total de 50.				
GT21BG Asentamientos y construcciones evitadas	Porcentaje	70	0	0%
Observación B / S: No se presenta avance dado que los recursos fueron incorporados en el mes de Junio por superávit y se encuentran en proceso contractual, se espera que este adjudicado para el mes de Julio.				
GT21BH Gobernabilidad fortalecida	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: No se presenta avance dado que los recursos fueron incorporados en el mes de Junio por superávit y se encuentran en proceso contractual, se espera que este adjudicado para el mes de Julio.				

Proyecto: 160323 - Desarrollo de estrategias para el territorio en cumplimiento del pot

Síntesis Proyecto: Eficacia : 39% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 514 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 514 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 514

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT23BG Acci rea senb, gest y prev ocup del terr	Número	266	117	44%
GT23BH Recor de identif, prev y control ot	Número	286	126	44%
GT23BI Jornadas de atención para acercar al ciu	Número	10	3	30%

Reto: 6.5 - Hábitat adecuado para Medellín

Programa: 6.5.4 - Mejoramiento integral de barrios

Proyecto PD: 6.5.4.6 Abastecimiento comunitario de agua

Proyecto: 160324 - Desarrollo del programa mínimo vital de agua potable en abastecimientos comunitarios

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 642 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 642 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT24BB Hogares motivados uso racional del agua	Número	100	0	0%

Observación B / S: Se está a la espera de los lineamientos desde el Gobierno Nacional sobre los abastecimientos comunitarios

Reto: 6.6 - Medellín reconoce la importancia de su territorio rural

Programa: 6.6.2 - Desarrollo integral de los territorios rurales

Proyecto PD: 6.6.2.2 Saneamiento básico y agua potable en los corregimientos

Proyecto: 160326 - Desarrollo de estrategias para saneamiento básico y agua potable en los corregimientos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 1%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.172 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.518 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 116

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT26BC Acueductos mejorados y optimizados	Número	2	0	0%

Observación B / S: Están en etapa de prepliegos del proceso de contratación para la ejecución de obra de Ampliación y optimización de los acueductos de El Hato (San Cristobal) y San Pedro (Santa Elena).

GT26BE Empresas prestadoras fortalecidas Número 22 0 0%

Observación B / S: Se continua con las diferentes activiades de apoyo de fortalecimiento a los acueductos veredales en las áreas Administrativa, jurídica, contable y técnica.

Proyecto PD: 6.6.2.4 Asignación y revisión de la nomenclatura en los corregimientos

Proyecto: 160328 - Implementación de la asignación y revisión de nomenclatura en los corregimientos**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 19% Ejec. Financiera : 53%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 317**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT28BA Base de datos depurada y registrada	Número	29.850	5.660	19%
Observación B / S: En el momento en el que fueron definidos los productos del Plan de Acción se preveía que la ejecución física iniciaría la primer semana de febrero; situación que no sucedió por diversos temas administrativos, inicia el 22 de marzo de 2017, por lo que se modificó el cronograma de ejecución de productos ajustándolo a lo propuesto por el contratista. La meta se cumple para diciembre de 2017.				
GT28BB Nomenclatura domiciliaria asignada	Número	9.507	3.157	33%
GT28BC Nomenclatura vial asignada	Número	330	74	22%
Observación B / S: En el momento en el que fueron definidos los productos del Plan de Acción se preveía que la ejecución física iniciaría la primer semana de febrero; situación que no sucedió por diversos temas administrativos, inicia el 22 de marzo de 2017, por lo que se modificó el cronograma de ejecución de productos ajustándolo a lo propuesto por el contratista. La meta se cumple para diciembre de 2017.				
GT28BE Nomenclat asignada corregimientos materi	Número	14.154	0	0%
Observación B / S: El proceso de contratación de quien realizará las Placas no se ha firmado, por lo anterior no se reportan productos para este corte.				

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente**Reto:** 7.1 - Medellín ciudad verde y sostenible**Programa:** 7.1.4 - Gestión Integral de Residuos Sólidos**Proyecto PD:** 7.1.4.1 Implementación, seguimiento, revisión y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS- para el cuidado de los recursos naturales**Proyecto: 160329 - Administración de residuos sólidos y aseo****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 9% Ejec. Financiera : 39%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 448 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 448 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 174**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT29BA Estudio alternativ zonas difícil acceso	Número	1	0	0%
Observación B / S: El estudio se encuentra en etapa de planificación				
GT29BB Esp asesoradas en pmirs	Número	17	6	35%
Observación B / S: Se realizaron visitas al acueducto Manantial, sorbetana, montañita y media luna para verificar el manejo de residuos sólidos y al acueducto El Vergel y la China para verificar el avance del prestador, en la formulación del plan de manejo integral de residuos sólidos				
GT29BC Seguimiento pgirs	Número	1	0	0%
Observación B / S: El seguimiento del PGIRS se realizará en el mes de julio de 2017 (con corte a junio). Este seguimiento será la base para la rendición de cuentas, en cumplimiento de la Resolución 754 de 2014"				
GT29BD Revisión pmirs	Número	1	0	0%
Observación B / S: Este es un documento que se entrega a final del año con el avance de implementación de los PMIRS de los acueductos de los pequeños prestadores.				

Proyecto PD: 7.1.4.2 Ubicación de sitios para la gestión integral de los residuos sólidos**Proyecto: 160332 - Estudios de ubicación de sitios para la gestión integral de residuos sólidos**

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT32BA Estudios sobre gestión residuos sólidos	Número	1	0	0%

Observación B / S: Este es un documento que se entrega a final del año con el avance de implementación de los PMIRS de los acueductos de los pequeños prestadores.

Reto: 7.2 - Medellín con acceso de calidad a los Servicios Públicos

Programa: 7.2.1 - Acceso de calidad al acueducto y al alcantarillado

Proyecto PD: 7.2.1.1 Mínimo vital de agua potable

Proyecto: 160335 - Desarrollo del programa mínimo vital de agua potable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.937 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.937 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.930

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT35BA Hogares con auspicio del mvap	Número	44.000	44.272	101%
Observación B / S: En el mes de junio se auspiciaron efectivamente 44.272 hogares, correspondientes a 230.970 personas.				
GT35BB Hogares motivados uso racional del agua	Número	65.000	32.444	50%
Observación B / S: En el mes de junio se realizaron 10.178 visitas de acompañamiento familiar y sensibilización en el uso racional y eficiente de los servicios públicos.				

Proyecto PD: 7.2.1.2 Fondo de solidaridad y redistribución de Ingresos

Proyecto: 120288 - Fsri acueducto y alcantarillado urbano

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.345 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Según decreto No 531 para el mes de Julio se tiene proyectada la reducción de recursos por valor de \$3.310.991.900, el saldo restante para pago vía liquidación de contrato.

Proyecto: 120289 - Fsri aseo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.037 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Recursos para pago vía liquidación de contrato.

Proyecto: 120290 - Fsri acueducto y alcantarillado pequeños prestadores

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Según decreto No 531 para el mes de Julio se tiene proyectada la reducción de recursos por valor de \$9.810

Proyecto: 160338 - Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos acueducto y alcantarillado urbano

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 89.983 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 92.131 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 87.728

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT38BA Prom subsidios mes acto y acldo epm	Número	521.237	502.167	96%
Observación B / S: Se inicio la normalización del proceso de pago de los subsidios correspondientes a la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado por parte del prestador EPM.				

Proyecto: 160340 - Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos aseo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 32.651 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 33.211 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 33.211

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT40BA Subsidios mes a aseo gran prestador	Número	530.974	535.589	101%
Observación B / S: Se inicio la normalización del proceso de pago de los subsidios correspondientes a la prestación del servicio de aseo por parte del prestador Empresas Varias de Medellín - EMVARIAS				

Proyecto: 160341 - Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos acueducto y alcantarillado pequeños prestadores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 498 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.193 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.158

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT41BA Subsidios mes acto y acldo peq prestad	Número	16.987	17.245	102%
Observación B / S: Se inicio la normalización del proceso de pago de los subsidios correspondientes a la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado por parte de los pequeños prestadores del área rural y suburbana .				

Proyecto PD: 7.2.1.3 Agua potable y saneamiento básico (subsanción de déficit)

Proyecto: 160344 - Desarrollo de estrategias para agua potable y saneamiento básico

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 66%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.932 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.932 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.939

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT44BA Empresas prestadoras fortalecidas	Número	22	22	100%
Observación B / S: Se continua con las diferentes activiades de apoyo de fortalecimiento a los acueductos veredales en las áreas Administrativa, jurídica, contable y técnica.				
GT44BB Diseños de soluciones de acto y acllado	Número	7	0	0%
Observación B / S: Se firmó contrato para la realización de estudios y diseños con la firma Sanear s.a.				
GT44BC Puntos de baños públicos atendidos	Número	21	21	100%
Observación B / S: Se continua con el contrato de suministro y operación de baños públicos.				

Programa: 7.2.2 - Gestión integral de los servicios públicos
Proyecto PD: 7.2.2.1 Pedagogía ciudadana en servicios públicos

Proyecto: 160346 - Implementación de pedagogía ciudadana en servicios públicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 8% Ejec. Financiera : 34%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 271 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 271 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 93

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT46BA Eventos capacitac. y orientac. en spdn Observación B / S: Se realizó la jornada pedagógica , donde se sensibilizó sobre el quehacer de la dependencia, y la responsabilidad en el uso racional y eficiente de los servicios públicos, a fin de contar con efecto multiplicador en los ciudadanos con los que se tiene contacto en las labores diarias. Los demás eventos están programados para el segundo semestre de 2017.	Número	5	1	20%
GT46BB Personas asesoradas en tics Observación B / S: Entres los meses de mayo y junio se atendieron 30 personas en las taquillas de atención al ciudadano. Se intensificarán las campañas de difusión del servicio y la presencia de la oficina en las jornadas ciudadanas que se desarrollan en todo el territorio.	Número	300	30	10%
GT46BC Campaña diseñ ahorro y uso efic de spdn Observación B / S: Los procesos contractuales dan inicio en los meses de julio y agosto de 2017	Número	1	0	0%
GT46BF Comunidad org fortal. y asesor. en spdn Observación B / S: Los procesos contractuales dan inicio en los meses de julio y agosto de 2017	Número	150	0	0%

Proyecto PD: 7.2.2.2 Formulación e implementación de políticas para los servicios públicos

Proyecto: 160348 - Formulación e implementación de políticas para los servicios públicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 128 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 128 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT48BA Polít locales de mínim vital form y gest Observación B / S: Los procesos contractuales dan inicio en los meses de julio y agosto de 2017	Número	1	0	0%
GT48BC Polít locales de sspp domici form y gest Observación B / S: Se dio inicio al análisis de los posibles escenarios del programa mínimo vital de energía; así como del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos, para comenzar a construir los proyectos de acuerdo.	Número	1	0	0%
GT48BD Polít local de sspp no domic form y gest Observación B / S: Se dio inicio al análisis de los posibles escenarios del programa mínimo vital de energía; así como del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos, para comenzar a construir los proyectos de acuerdo.	Número	1	0	0%
GT48BE Estrat autom. de proc. sspp form y gest Observación B / S: Los procesos contractuales dan inicio en los meses de julio y agosto de 2017	Número	1	0	0%

Proyecto PD: 7.2.2.4 Alumbrado público e iluminación para la seguridad y el disfrute de los espacios públicos

Proyecto: 160349 - Servicio de alumbrado público e iluminaciones especiales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 65.610 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 76.442 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 75.125

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT49BA Número de luminarias nuevas	Número	5.621	4.621	82%
GT49BB Equivalentes de mantenimiento alum públ	Número	15.000	4.741	32%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.6 - Medellín reconoce la importancia de su territorio rural

Programa: 6.6.2 - Desarrollo integral de los territorios rurales

Proyecto PD: 6.6.2.2 Saneamiento básico y agua potable en los corregimientos

Proyecto: 160609 - 17pp50-ampliación de cobertura de agua potable en el corregimiento.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT09BA Nuevos suscriptores con agua potable	Número	275	0	0%

Observación B / S: Para la ejecución de esta obra se requiere rediseñar las redes de distribución, por motivo de estar diseñada la red principal por la vía al Mar después del Tunel de Occidente, pero esta vía será intervenida para doble calzada. El alcance de este rediseño de la Ampliación del Acueducto la China está como uno de los componentes de contrato de estudios y diseños suscrito con Sanear.

GT09BC Acueducto mejorado y optimizado	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	----

Observación B / S: Para la ejecución de esta obra se requiere rediseñar las redes de distribución, por motivo de estar diseñada la red principal por la vía al Mar después del Tunel de Occidente, pero esta vía será intervenida para doble calzada. El alcance de este rediseño de la Ampliación del Acueducto la China está como uno de los componentes de contrato de estudios y diseños suscrito con Sanear.

Proyecto: 160610 - 17pp90-construcción de pozos sépticos en las veredas del corregimiento de santa elena.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 552 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 552 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT10BA Vivienda servicio pozos séptico instalad	Número	100	0	0%

Observación B / S: Está en proceso de selección contractual en la etapa de evaluación de propuestas.

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.2 - Medellín con acceso de calidad a los Servicios Públicos

Programa: 7.2.1 - Acceso de calidad al acueducto y al alcantarillado

Proyecto PD: 7.2.1.3 Agua potable y saneamiento básico (subsanción de déficit)

Proyecto: 160611 - 17pp1-estudios y diseños de acueducto y alcantarillados

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 233 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 233 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT11BA Sistema de alcantarillado construido	Número	1	0	0%
Observación B / S: Está en etapa de reformulación del proyecto, debido al cambio de alcance y de nombre del Proyecto, para pasar de ser Estudios y diseños a Ejecución de Alcantarillado, propuesto por la comunidad.				

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Dimensión:	Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
6	- Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios		
Reto: 6.1	- Medellín planifica y gestiona su territorio		
Programa: 6.1.3	- Gestión de la información urbanística y catastral		
Proyecto PD: 6.1.3.2	Gestión para la Información catastral		
	980531 Estratificación Socioeconómica de Las Viviendas Rurales Urbanas Del Municipio	\$ 0,16690	\$ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto PD: 6.1.3.2 Gestión para la Información catastral

Proyecto: 120117 - Gestión para el proceso de la conservación catastral

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 47 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 47

Proyecto PD: 6.1.3.3 Gestión para el control urbanístico

Proyecto: 150061 - Gestión gerencias territoriales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 208 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 198

Proyecto: 150062 - Control urbanístico - centro inteligente de alertas tempranas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto PD: 7.2.1.1 Mínimo vital de agua potable

Proyecto: 120136 - Auspicio mínimo vital de agua potable

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 135 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 135

Proyecto PD: 7.2.1.3 Agua potable y saneamiento básico (subsanción de déficit)

Proyecto: 120287 - Diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas residuales domésticas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 120 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 119



Proyecto PD: 7.2.2.4 Alumbrado público e iluminación para la seguridad y el disfrute de los espacios públicos

Proyecto: 040408 - Alumbrado público



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.280 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.280

Colegio Mayor de Antioquia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2017

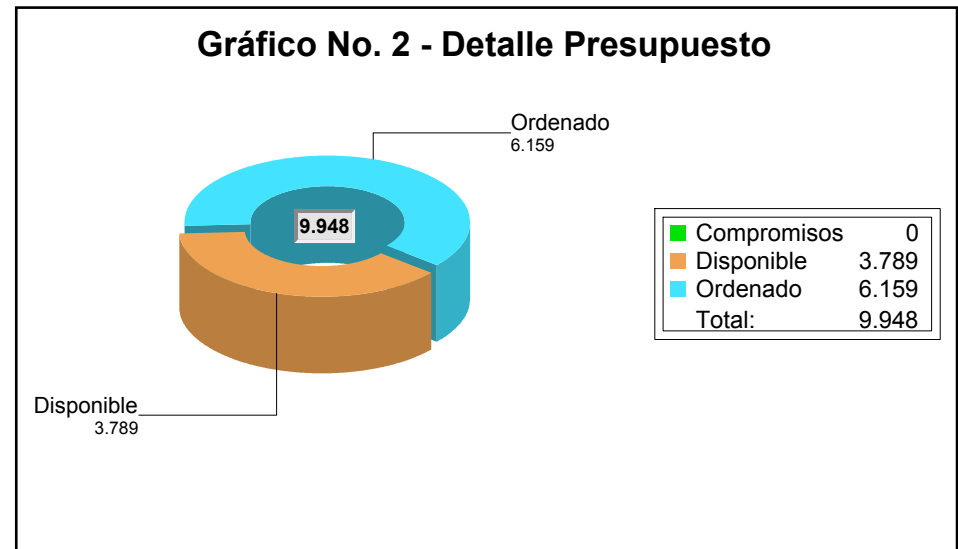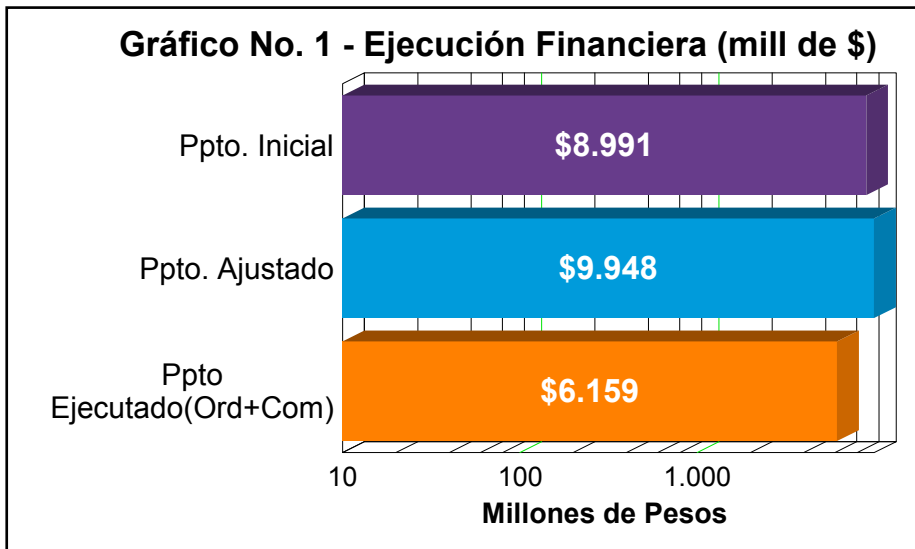

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

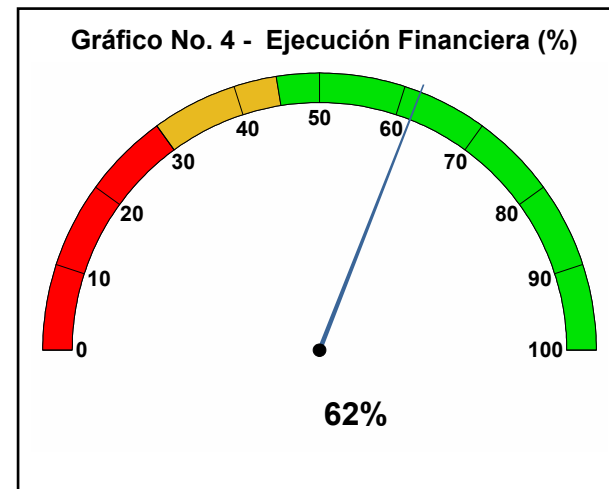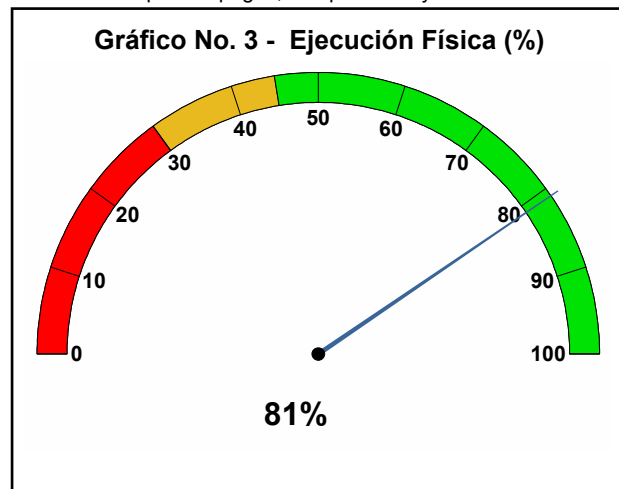

La ejecución financiera comprende pagos, facturas y los compromisos a la fecha de corte. Para el caso de los establecimientos públicos, la Ejecución Financiera se compone de dos cifras: una información obtenida del sistema, que corresponde únicamente a la cifra del presupuesto transferido desde el Municipio al estapúblico, y otra información suministrada por cada entidad que corresponde a los recursos propios invertidos por proyecto.

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

Proyecto PD: 4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superior

Proyecto: 160547 - Ampliación y sostenimiento de cobertura en educación superior - colegio mayor de antioquia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 65% Ejec. Financiera : 68%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.322 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.702 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.180

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 4.322 \$ 4.702 \$ 3.180

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM47BA Mejoram y actual libros,revist,colecc	Número	2	1	50%
CM47BB Est benef prog seguridad alimentaria	Personas	250	250	100%
CM47BC Event para promoc la inclusión social	Número	2	1	50%
CM47BD Segui y eval plan,prog y proy instituc	Porcentaje	100	50	50%
CM47BE Sistem de inf estad y de autoevaluación	Número	1	1	100%
CM47BF Fort de plataf y sistem de inf inst	Número	2	2	100%
CM47BG Estrat didacticas para la enseñanza	Número	10	11	110%
CM47BH Programas de extensión y proyección soci	Número	12	6	50%
CM47BI Prog acad con metod virtual @medellin	Número	3	3	100%
CM47BJ Oferta de nuevos prog fac administración	Número	1	0	0%
CM47BK Oferta de nuevos prog fac arquitectura	Número	5	4	80%
CM47BL Oferta de nuevos prog fac salud	Número	1	0	0%

Proyecto PD: 4.1.2.2 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superior

Proyecto: 160544 - Mejoramiento de la calidad de la educación superior pública-colegio mayor de antioquia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 49%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 349 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 349 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 170

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 349 \$ 349 \$ 170

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

CM44AA Prog de la oferta inst acreditados	Número	4	2	50%
CM44AB Graduados partic en activ de formación	Personas	40	0	0%
CM44AC Movil academ estudiantes y docentes	Número	74	26	35%
CM44AD Participación en redes de investigación	Número	8	10	125%
CM44AE Artículos publicados en revis indexadas	Número	15	5	33%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

Proyecto PD: 4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superior

Proyecto: 160575 - 17pp99-formación camino hacia la educación superior – colegio mayor

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 56%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.148 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.725 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.637

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 4.148 \$ 4.725 \$ 2.637

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM75CA Matriculas estudiantes c1	Personas	206	206	100%
CM75CB Maticulas estudiantes c2	Personas	49	49	100%
CM75CC Matriculas estudiantes c3	Personas	180	180	100%
CM75CD Matriculas estudiantes c4	Personas	206	206	100%
CM75CE Matriculas estudiantes c5	Personas	85	85	100%
CM75CF Matriculas estudiantes c6	Personas	145	145	100%
CM75CG Matriculas estudiantes c7	Personas	264	264	100%
CM75CH Matriculas estudiantes c9	Personas	200	200	100%
CM75CI Matriculas estudiantes c11	Personas	37	37	100%
CM75CJ Matriculas estudiantes c13	Personas	94	94	100%
CM75CK Matriculas estudiantes c16	Personas	117	117	100%
CM75CL Matriculas estudiantes c90	Personas	17	17	100%
CM75CM Sosténimiento estudiantes c16	Personas	55	55	100%
CM75CO Matricula estudiantes c 12	Personas	120	120	100%
CM75CP Matricula estudiantes c 60	Personas	171	171	100%

Proyecto: 160576 - 17pp1-control y seguimiento de la educación superior – colegio mayor



Síntesis Proyecto: Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 100%

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 172	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 172	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 172
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0
Información Financiera Total:	\$ 172	\$ 172	\$ 172



Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM76CN Seguimiento a estudiantes c1	Personas	208	150	72%
CM76CÑ Evaluación a estudiantes c1	Personas	208	150	72%

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2017

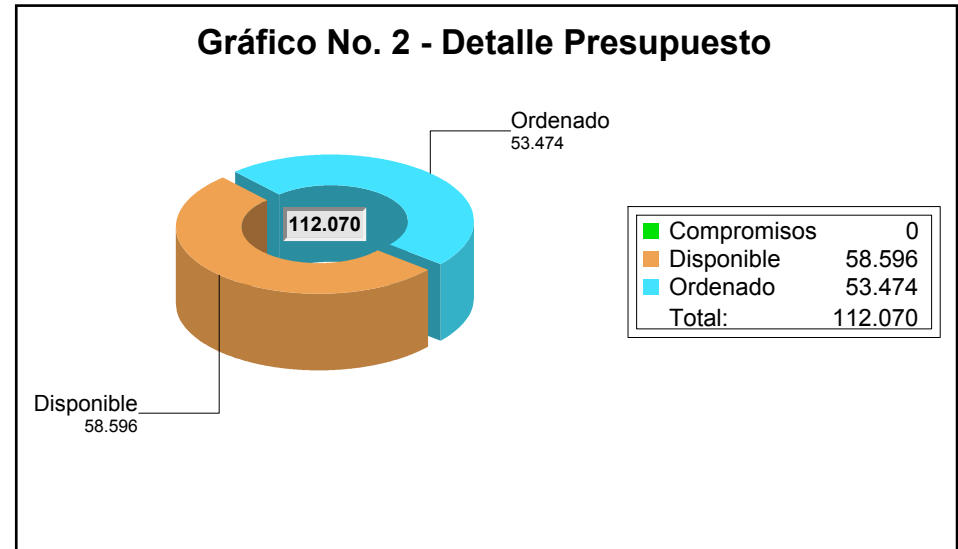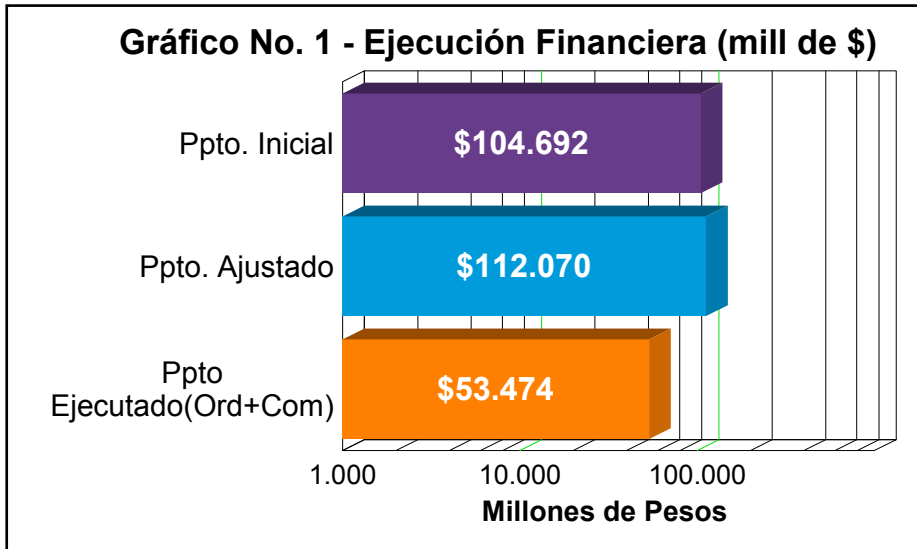

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

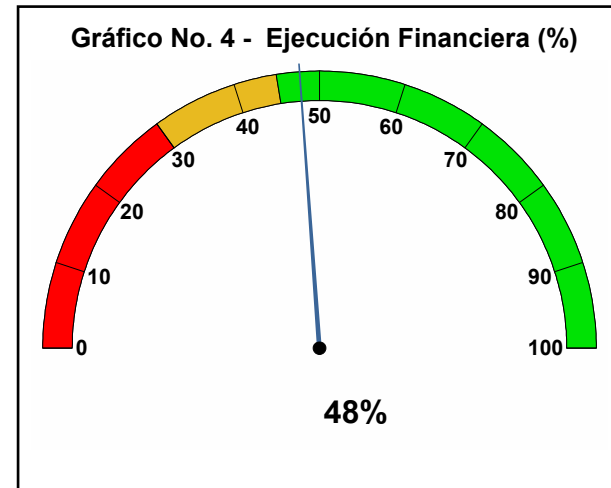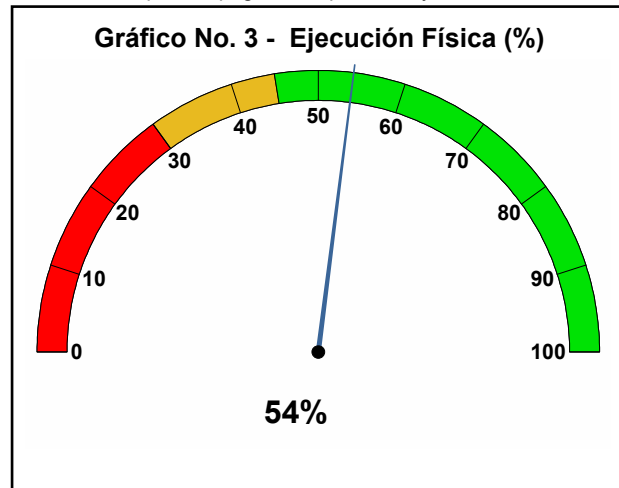

La ejecución financiera comprende pagos, facturas y los compromisos a la fecha de corte. Para el caso de los establecimientos públicos, la Ejecución Financiera se compone de dos cifras: una información obtenida del sistema, que corresponde únicamente a la cifra del presupuesto transferido desde el Municipio al estapúblico, y otra información suministrada por cada entidad que corresponde a los recursos propios invertidos por proyecto.

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes
Proyecto PD: 1.1.5.4 Fortalecimiento de la actividad física saludable

Proyecto: 160484 - Aprovechamiento de las vías activas y saludables y otros espacios de ciudad para la realización de prácticas deportivas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 42%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.602 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.602 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.496

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 3.602 \$ 3.602 \$ 1.496

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN84AB Personas beneficiadas con af en los cps	Personas	3.405	3.514	103%
Observación B / S: La meta es de mantenimiento con periodicidad mensual, el dato corresponde al número de personas atendidas en los diferentes CPS durante el mes de corte del reporte.				
IN84AD Personas que participan en las caminadas	Personas	5.250	4.709	90%
Observación B / S: La ejecución que se reporta corresponde al dato acumulado de las personas participantes en las caminadas durante el primer semestre de 2017.				
IN84AE Vías habilitadas para las prácticas draf	Kilometro	59	59	100%
Observación B / S: La meta es de mantenimiento con periodicidad mensual, el dato corresponde al número de kilómetros habilitados mensualmente para el desarrollo de la estrategia				

Proyecto: 160545 - Fortalecimiento de la participación de la población adulta en programas inder de deporte, recreación y actividad física

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 72%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.943 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.355 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.156

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 2.943 \$ 4.355 \$ 3.156

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN45AB Person atendidas estrateg canas al aire	Personas	30.800	29.715	96%
Observación B / S: Esta meta es de mantenimiento y periodicidad mensual, el dato corresponde al número de usuarios atendidos con la estrategia Canas al Aire en el mes de junio				
IN45AC Personas atendidas estrateg pto activos	Personas	7.040	7.000	99%
Observación B / S: Esta meta es de mantenimiento y periodicidad mensual, el dato corresponde al número de usuarios atendidos con la estrategia Puntos Activos en el mes de junio				
IN45AD Pers atend con formación deport adultos	Personas	3.500	4.229	121%
Observación B / S: Esta meta es de mantenimiento y periodicidad mensual, el dato corresponde al número de usuarios atendidos con la estrategia Formación Deportiva para Adultos. La meta se incrementó debido a adiciones presupuestales				

Proyecto PD: 1.1.5.5 Cultura del fútbol

Proyecto: 160506 - Implementación de estrategias pedagógicas para la promoción de la cultura del futbol en la ciudad de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 38%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 404 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 404 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 152

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 404 \$ 404 \$ 152

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN06AA Pers benef con mecanismos de formación	Personas	4.000	12	0%
Observación B / S: La ejecución de los procesos de formación comenzará en el segundo semestre del año				
IN06AB Campaña educativa en el contexto deport	Número	1	0	0%
Observación B / S: La campaña educativa, se realizará en el segundo semestre del año.				
IN06AF Cartilla virtual construida	Número	1	0	0%
Observación B / S: La ejecución de la meta se llevará a cabo en el segundo semestre del año				

Proyecto PD: 1.1.5.6 Cultura D

Proyecto: 160507 - Desarrollo de habilidades y capacidades físicas mediante actividades en deporte, recreación y actividad física para l

Síntesis Proyecto: Eficacia : 79% Ejec. Financiera : 45%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.003 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.096 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.061

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 9.003 \$ 9.096 \$ 4.061

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN07AA Personas atend a través de las ludotecas	Personas	40.000	32.950	82%
Observación B / S: Esta meta es de mantenimiento y periodicidad mensual, indica el número de usuarios que visitan las diferentes Ludotecas de la ciudad en el mes de corte del reporte				
IN07AC Personas atendidas con inderescolares	Personas	19.924	10.816	54%
Observación B / S: Esta meta es de mantenimiento y periodicidad mensual. La ejecución de la meta corresponde a: Intervención con 1844 niños atendidos y 8972 niños participando en eventos. Los niños que participan en estas estrategias hacen procesos de entrenamiento y competición.				
IN07AD Niños y niñas atendid iniciación deport	Personas	14.000	14.317	102%
Observación B / S: Esta es una meta de mantenimiento y periodicidad mensual, mide el número de niños y niñas que participan en procesos de iniciación deportiva.				

Proyecto: 160509 - Fortalecimiento organizacional del deporte, la recreación y la actividad física en medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 69%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 776 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 776 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 534

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0
Información Financiera Total: \$ 776 \$ 776 \$ 534

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN09AB Organizaciones sector asociado apoyadas	Número	120	0	0%

Observación B / S: Se proyecta que a finales de julio se tengan las primeras organizaciones deportivas apoyadas y durante el segundo semestre se cumpla la meta en un 100%

Proyecto: 160510 - Fortalecimiento de las estrategias deportivas, recreativas y de actividad física para la participación de los jóvenes de

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 45%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.484 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.915 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.778

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 3.484 \$ 3.915 \$ 1.778

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN10AA Personas atendidas con indercolegiados	Personas	28.000	11.110	40%
Observación B / S: En junio se atendieron 686 usuarios con procesos de formación deportiva y 10.424 con festivales y juegos deportivos. El paro del magisterio incidió en la cancelación de algunos festivales deportivos y en la disminución en la cobertura de los procesos de formación deportiva				
IN10AB Personas atendidas con juegos universit	Personas	2.238	1.920	86%
Observación B / S: En los Juegos Universitarios han participado 23 universidades , en 4 deportes de conjunto; fútbol, futbol sala, voleibol y baloncesto.				
IN10AF Pers atend formac deport jóvenes y adult	Personas	10.000	10.945	109%
Observación B / S: La meta es de mantenimiento y periodicidad mensual. En el segundo semestre se incrementa la meta debido a adiciones presupuestales con las cuales se aumentó la cantidad de grupos.				

Proyecto: 160511 - Construcción de la cultura d mediante el deporte, la recreación y la actividad física

Síntesis Proyecto: Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 42%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.153 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.153 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.386

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 8.153 \$ 8.153 \$ 3.386

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN11AB Documento metodológico adoptado e implem	Unidad	1	1	100%
IN11AC Sist monitoreo indicador impacto implem	Unidad	1	1	100%
IN11AD Plan de manejo ambiental instituc implem	Unidad	1	1	100%
IN11AE Plan interven territorial adopt e implem	Unidad	1	1	100%
IN11AG Doc de seguimi a los proyectos de inv	Número	2	1	50%
IN11AH Plan de mejoram inst - actualiz sig	Número	1	0	0%

Observación B / S: La elaboración y sistematización de los procesos del SIG comenzará a partir del segundo semestre

IN11AI Doc de seguimiento a la contratación	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

Observación B / S: La ejecución de la meta se llevará a cabo durante el segundo semestre

Proyecto: 160512 - Desarrollo del sistema municipal del deporte, la recreación y la actividad física

Síntesis Proyecto: Eficacia : 68% Ejec. Financiera : 44%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.607 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.607 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.905

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 6.607 \$ 6.607 \$ 2.905

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN12AA Plan mejoramient instit adoptad e implem	Unidad	1	1	100%
IN12AB Investigaciones y monitoreos realizados	Número	2	1	50%
IN12AC Plan de gobierno en linea adopt e implem	Unidad	1	1	100%
IN12AD Plan comunicac instituc adopt e implem	Unidad	1	1	100%
IN12AE Plan maestro de escenarios actualizado	Unidad	1	0	0%

Observación B / S: El Plan Maestro de Escenarios se encuentra en proceso de construcción, actualmente se adelanta el diagnóstico del estado de los escenarios existentes en cada comuna de la ciudad.

IN12AF Docum mecanismos prioriz inversión adopt	Unidad	1	1	100%
IN12AG Personas que mejoran las competencias	Personas	370	126	34%
IN12AH Docs actual pol pública elaborado fase 1	Unidad	1	0	0%

Observación B / S: En el primer semestre se tiene un avance significativo en la construcción del documento base, el cual tiene 6 de los 9 capítulos ya desarrollados. Este documento base servirá para el desarrollo de la fase participada con los actores del sector, que se llevará a cabo en el segundo semestre.

IN12AI Actualización del sim - fase i	Unidad	1	1	100%
IN12AJ Plan de capacitaciones y prácticas	Unidad	1	1	100%

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.2 - En Medellín convive toda la ciudadanía

Programa: 2.2.2 - Promoción de la convivencia

Proyecto PD: 2.2.2.2 Adrenalina

Proyecto: 160513 - Desarrollo y potencialización de las nuevas tendencias deportivas en la ciudad de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 51%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 695 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 695 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 357

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 695 \$ 695 \$ 357

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN13AA Personas atendidas escuelas adrenalina	Personas	1.120	917	82%
Observación B / S: La meta es de mantenimiento y su periodicidad es mensual. La ejecución reportada corresponde a las personas atendidas por la estrategia en el mes de corte del reporte.				
IN13AC Ptos de atención con tendencias interact	Número	4	4	100%

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social**Reto:** 3.2 - Medellín Digna**Programa:** 3.2.1 - Medellín para la niñez y la adolescencia**Proyecto PD:** 3.2.1.4 Recreando nuestros barrios y corregimientos**Proyecto:** 160514 - Implementación estrategia recreando nuestros barrios y corregimientos**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 44%**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.994 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.166 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 950**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0**Información Financiera Total:** \$ 1.994 \$ 2.166 \$ 950**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN14AA Ptos en parques funcion activid recreat	Número	20	18	90%
Observación B / S: Esta meta es de mantenimiento y su periodicidad es mensual, el dato corresponde al número de parques funcionando en el mes de corte del presente reporte				
IN14AB Ptos barriales funcion activid recreat	Número	272	231	85%
Observación B / S: La meta es de mantenimiento con periodicidad mensual. La información corresponde al número de recreandos voluntarios funcionando en el mes de corte del presente reporte				
IN14AC Ptos con activ interactivas poblac jóven	Número	5	4	80%
Observación B / S: La meta es de mantenimiento y su periodicidad es mensual. Se tienen cuatro puntos de atención fija y un carro interactivo que presta el servicio en todas las comunas y corregimientos. El dato corresponde al número de puntos con actividades interactivas funcionando en el mes de junio				
IN14AD Pers jóvenes atendidas activ recreativas	Personas	3.000	2.922	97%
Observación B / S: Esta meta es de mantenimiento y su periodicidad es mensual.				
IN14AF Prs atendidas en cuadras recreativa	Personas	73	34	47%
Observación B / S: La meta es de mantenimiento y su periodicidad es mensual. El dato corresponde a las personas atendidas en cuadras en el mes de corte del reporte				

Proyecto PD: 3.2.1.5 Centros lúdicos formativos para la población**Proyecto:** 160515 - Implementación de estrategias en deporte, recreación y actividad física para la atención de la primera infancia y las r**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 86% Ejec. Financiera : 46%**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.276 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.276 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.042**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total:

\$ 2.276

\$ 2.276

\$ 1.042

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN15AB Madres gestantes atendidas activ física	Personas	1.568	900	57%
Observación B / S: La periodicidad de la meta es trimestral, el dato corresponde a las madres gestantes atendidas de abril a junio. La meta tiene esta periodicidad ya que el ejercicio técnico muestra que es el tiempo promedio que permanece una madre gestante en la estrategia.				
IN15AC Pers atendid gestan, lactant, segund año	Personas	14.000	16.991	121%
Observación B / S: La meta es de mantenimiento y periodicidad mensual para que la intervención cumpla con los lineamientos exigidos por Buen Comienzo. La ejecución supera el 100% debido a que la estrategia está cubriendo 49 grupos que pertenecen a la estrategia entorno familiar de Buen Comienzo de la Secretaría de Educación				
IN15AE Niños atendidos estrat iniciacion mvto	Personas	1.456	1.705	117%
Observación B / S: Esta meta es de mantenimiento y su periodicidad mensual, mide los niños y niñas atendidos en la estrategia mensualmente. Es una meta de mantenimiento ya que se trabaja en jardines infantiles donde la población es siempre la misma. La ejecución supera el 100% debido a que hay 28 grupos más de los proyectados inicialmente ya que ingresaron recursos de adiciones presupuestales				

Programa: 3.2.5 - Atención e inclusión social para el habitante de calle
Proyecto PD: 3.2.5.4 Intervención deportiva, recreativa y de actividad física para la población en riesgo social
Proyecto: 160517 - Formación deporte, convivencia y paz

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 45%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 650 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 650 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 295

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 650 \$ 650 \$ 295

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN17AA Actividades de sensibilización realizad	Número	519	171	33%

Proyecto: 160525 - Fortalecimiento de las estrategias de intervención deportiva, recreativa y de actividad física para la población en ries

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 38%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.368 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.368 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 523

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 1.368 \$ 1.368 \$ 523

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN25AK Ptos funcion poblac de y en situac calle	Número	26	31	119%
Observación B / S: La meta es de mantenimiento con periodicidad mensual. La demanda que tiene el contexto de ciudad en puntos de atención es más alta que la oferta planteada al comienzo del año, por lo cual se han aumentado la atención en los puntos				
IN25AL Ptos funcion para la población víctima	Número	20	24	120%

Observación B / S: La campaña comunicacional se desarrollará en el segundo semestre del año

Programa: 4.5.3 - Internacionalización

Proyecto PD: 4.5.3.7 Regionalización e internacionalización del deporte

Proyecto: 160522 - Implementación de estrategias para la regionalización e internacionalización del deporte

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 77%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.572 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.234 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.256

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 3.572 \$ 4.234 \$ 3.256

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN22AA Pers beneficiadas estrat dlo de deportivo	Personas	2.840	2.659	94%
Observación B / S: La meta es de mantenimiento y su periodicidad es mensual.				
IN22AB Pers particip en eventos apoyad en draf	Personas	26.261	12.512	48%
IN22AC Plan de eventos draf adopat e implement	Unidad	1	1	100%
IN22AD Prs particip en juegos ciudad de med	Personas	10.000	0	0%
Observación B / S: Los Juegos Ciudad de Medellín inician el 29 de julio de 2017, se reportará el cumplimiento en el próximo avance				

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.3 - Medellín gestiona su paisaje y patrimonio

Programa: 6.3.1 - Espacio público para la convivencia ciudadana

Proyecto PD: 6.3.1.3 Construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos

Proyecto: 160523 - Administración de escenarios deportivos y recreativos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 40%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 23.504 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23.504 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.446

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 23.504 \$ 23.504 \$ 9.446

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN23AB Escenarios deport y recreat administrad	Número	866	866	100%
Observación B / S: La meta es de mantenimiento con periodicidad mensual. Corresponde a la administración mensual de los 866 escenarios deportivos y recreativos que se encuentran a cargo del Inder.				
IN23AC Mekan de asig de espac depo y rec opt	Número	1	1	100%
IN23AD Estrat de socializy difusión en func	Número	1	1	100%

IN23AE	Mecam control del uso de la infra	Número	5	0	0%
Observación B / S: Se adelanta el proceso de revisión de los mecanismos de control de uso de los escenarios existentes, para el mejoramiento y actualización de los mismos.					
IN23AF	Estrat de sostenib para la infraest	Número	1	1	100%

Proyecto: 160524 - Construcción y adecuación de escenarios deportivos y recreativos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 43%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.735 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.687 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.474

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 9.835 \$ 12.787 \$ 5.474

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN24AB Escenarios deport y recreativ adecuados	Número	85	0	0%
Observación B / S: Actualmente se encuentra en proceso de licitación la ejecución de las obras de adecuación y mantenimiento de escenarios.				
IN24AC Nuevos escenarios deportivos y recreat	Número	4	0	0%
Observación B / S: Actualmente se encuentra en proceso de licitación la ejecución de las obras de construcción de escenarios.				
IN24AD Manual de funcionam técnico actualiz	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se adelanta el proceso de revisión de los manuales técnicos existentes, para la actualización y consolidación de un sólo manual.				
IN24AF Estrategia de equidad territorial	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en proceso la elaboración el modelo de priorización de inversión para escenarios deportivos y recreativos				

Proyecto PD: 6.3.1.4 Distrito D

Proyecto: 160543 - Construcción del corredor urbano recreo deportivo - distrito d

Síntesis Proyecto: Eficacia : 13% Ejec. Financiera : 32%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.218 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.218 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.037

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 3.218 \$ 3.218 \$ 1.037

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN43AD Espacios públicos intervenidos	Número	10	0	0%
Observación B / S: Actualmente se encuentra en proceso de licitación la ejecución de las obras del proyecto.				
IN43AE Espacios públicos recuperados	Número	5	0	0%
Observación B / S: Actualmente se encuentra en proceso de licitación la ejecución de las obras del proyecto.				
IN43AF Espacios adecuad y dotados nuevas tenden	Número	5	0	0%
Observación B / S: Actualmente se encuentra en proceso de licitación la ejecución de las obras del proyecto, las cuales contemplan la dotación de los espacios de Distrito D.				
IN43AI Acciones público privadas integradas	Número	1	0,5	50%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes
Proyecto PD: 1.1.5.4 Fortalecimiento de la actividad física saludable

Proyecto: 160640 - 17pp15-aprovechamiento de los espacios de la ciudad para el deporte, la recreación y la actividad física

Síntesis Proyecto: Eficacia : 20% Ejec. Financiera : 65%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 36 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 36 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 36 \$ 36 \$ 23

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN40AD Caminatas realizadas	Número	5	1	20%

Observación B / S: La ejecución del resto de la meta esta programada para el segundo semestre

Proyecto: 160653 - 17pp99-fortalecimiento de la participación de la población adulta en programas inder de deporte, recreación y activic

Síntesis Proyecto: Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 55%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.201 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.251 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 683

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 1.201 \$ 1.251 \$ 683

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN53AB Personas atendidas con actividad física	Personas	9.430	6.610	70%

Observación B / S: Esta meta es de mantenimiento y periodicidad mensual, el dato corresponde al número de usuarios atendidos con las estrategias Canas al Aire y Puntos Activos en el mes de junio.
 Esta meta ha estado afectada por problemas de orden público, en Belén Buena Vista, Sede social Buena Vista, en dirección CRA 88 N 18A - 08 y en el barrio Aguas Frías, en la dirección CLL 31 AA 106 116.

Proyecto PD: 1.1.5.6 Cultura D

Proyecto: 160649 - 17pp99-desarrollo del sistema municipal del deporte, la recreación y la actividad física

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 69%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 30 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 30 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0
Información Financiera Total: \$ 30 \$ 30 \$ 21

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN49AB Número de sermario-taller realizados	Número	1	0	0%

Observación B / S: La ejecución de la meta esta programada para el segundo semestre.

Proyecto: 160654 - 17pp99-fortalecimiento de las estrategias deportivas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 64%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.403 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.423 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 914

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 1.403 \$ 1.423 \$ 914

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN54AB Pers benef con procesos deportivos	Personas	4.555	4.610	101%

Observación B / S: Esta meta es de mantenimiento y periodicidad mensual, el dato corresponde al número de usuarios atendidos con las estrategias del área de Deportes en el mes de junio.

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.2 - En Medellín convive toda la ciudadanía

Programa: 2.2.2 - Promoción de la convivencia

Proyecto PD: 2.2.2.2 Adrenalina

Proyecto: 160651 - 17pp99-desarrollo y potencialización de las nuevas tendencias deportivas en la ciudad de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 67%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 89 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 89 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 59

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 89 \$ 89 \$ 59

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN51AB Pers beneficiadas formación adrenalina	Personas	118	94	80%

Observación B / S: Esta meta es de mantenimiento y periodicidad mensual, el dato corresponde al número de usuarios atendidos con la estrategia Adrenalina en el mes de junio.

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 - Medellín Digna

Programa: 3.2.1 - Medellín para la niñez y la adolescencia
Proyecto PD: 3.2.1.4 Recreando nuestros barrios y corregimientos

Proyecto: 160655 - 17pp99-implementación estrategia recreando nuestros barrios y corregimientos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 21% Ejec. Financiera : 49%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.285 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.788 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.295

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 6.285 \$ 6.788 \$ 3.295

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN55CD Pers atendid salida recreativa	Personas	33.463	4.128	12%
Observación B / S: La ejecución de la meta esta programada para el segundo semestre.				
IN55CE Pers atendid cuadras recreativas	Personas	10.916	7.830	72%
Observación B / S: Esta meta es de mantenimiento y periodicidad mensual, el dato corresponde al número de usuarios atendidos con la estrategia Cuadras Recreativas en el mes de junio.				
IN55CF Personas atend con recreocomuna	Personas	65	0	0%
Observación B / S: La ejecución de la meta esta programada para el segundo semestre.				
IN55CG Número de tomas y festivales recreativos	Número	256	0	0%
Observación B / S: La ejecución de la meta esta programada para el segundo semestre.				

Proyecto PD: 3.2.1.5 Centros lúdicos formativos para la población

Proyecto: 160656 - 17pp9-implementación de estrategias en deporte, recreación y actividad física para la atención de la primera infancia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 65%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 20 \$ 20 \$ 13

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN56AB Pers atendid iniciación al mvto	Personas	40	36	90%
Observación B / S: Esta meta es de mantenimiento y periodicidad mensual, el dato corresponde al número de usuarios atendidos con la estrategia Iniciación al Movimiento en el mes de junio.				

Programa: 3.2.7 - Ser Capaz: Inclusión social de las personas con discapacidad

Proyecto PD: 3.2.7.3 Deporte sin límites

Proyecto: 160652 - 17pp99-fortalecimiento de la intervención deportiva, recreativa y de actividad física para la población en situación de

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 64%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 533 **Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 545** **Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 347**

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 **Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0** **Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0**

Información Financiera Total: \$ 533 \$ 545 \$ 347

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN52AB Número de event depo y fest discap	Número	20	0	0%
Observación B / S: La ejecución de la meta esta programada para el segundo semestre.				
IN52AO Salida recreat personas con discapacidad	Número	521	0	0%
Observación B / S: Las salidas recreativas se llevarán a cabo a partir del segundo semestre				
IN52AX Pers atendidas formación discapacidad	Personas	392	388	99%
Observación B / S: Esta meta es de mantenimiento y periodicidad mensual, el dato corresponde al número de usuarios atendidos con la estrategia Deportes Sin Límites en el mes de junio.				

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.5 - Medellín innovadora

Programa: 4.5.3 - Internacionalización

Proyecto PD: 4.5.3.7 Regionalización e internacionalización del deporte

Proyecto: 160648 - 17pp99-desarrollo de eventos deportivos y de actividad física para favorecer la integración comunitaria

Síntesis Proyecto: **Eficacia : 0%** **Ejec. Financiera : 63%**

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.481 **Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.746** **Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.526**

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 **Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0** **Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0**

Información Financiera Total: \$ 8.481 \$ 8.746 \$ 5.526

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN48AE Eventos deportivos y de actividad física	Número	255	0	0%
Observación B / S: La ejecución de la meta esta programada para el segundo semestre.				

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.3 - Medellín gestiona su paisaje y patrimonio

Programa: 6.3.1 - Espacio público para la convivencia ciudadana

Proyecto PD: 6.3.1.3 Construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos

Proyecto: 160647 - 17pp99-construcción y adecuación de escenarios deportivos y recreativos

Síntesis Proyecto: **Eficacia : 0%** **Ejec. Financiera : 47%**



Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.731 **Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.536** **Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.200**

Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0
Información Financiera Total:	\$ 1.731	\$ 2.536	\$ 1.200



Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN47AB Escen deport y recreativ adecuad y mant	Número	16	0	0%
IN47AC Nuevos escenarios deportivos y recreat	Número	16	0	0%

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2017

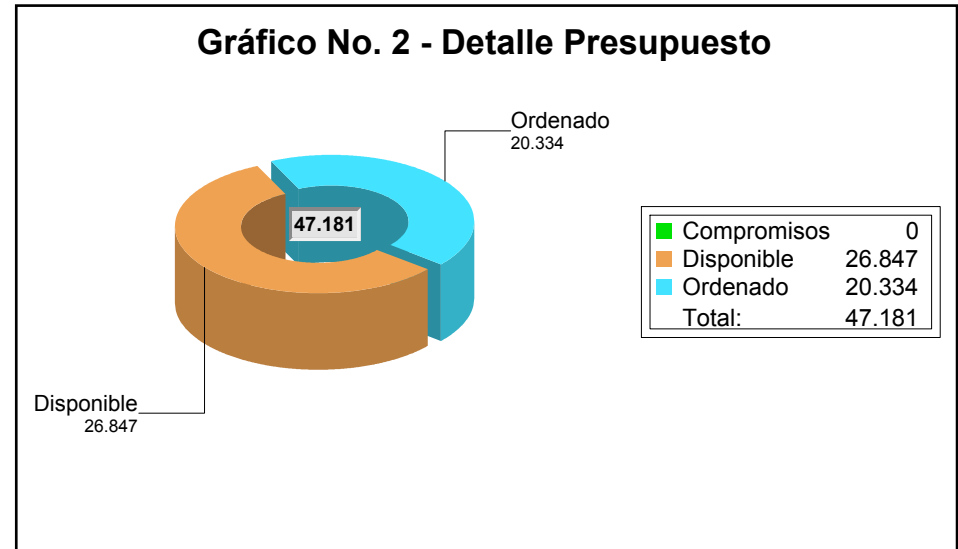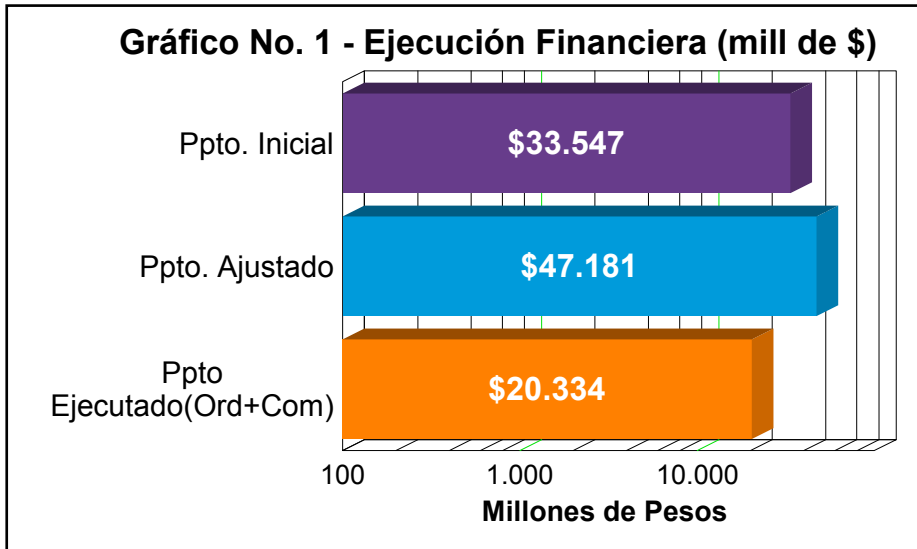

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

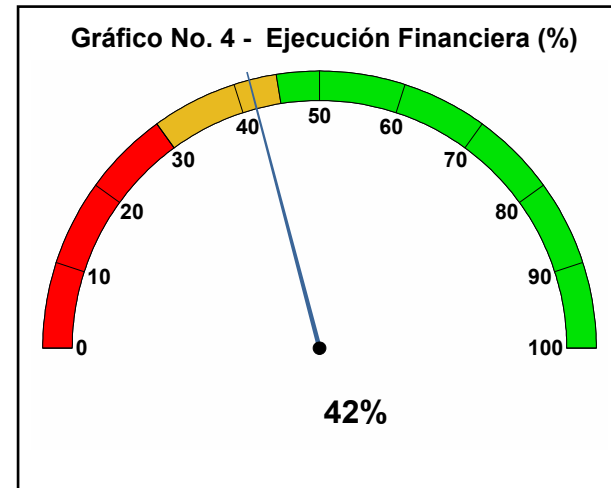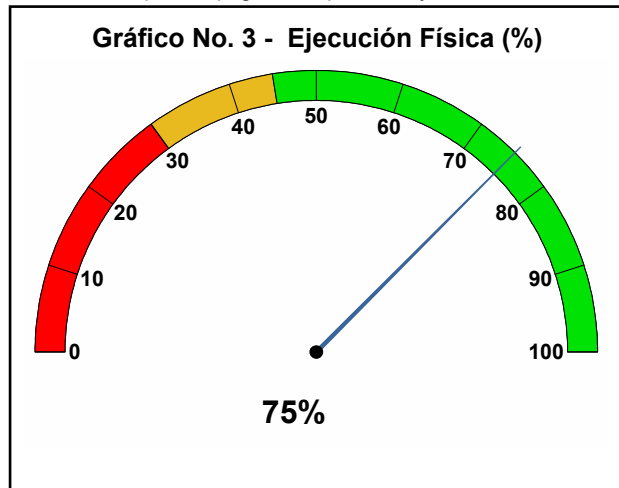

La ejecución financiera comprende pagos, facturas y los compromisos a la fecha de corte. Para el caso de los establecimientos públicos, la Ejecución Financiera se compone de dos cifras: una información obtenida del sistema, que corresponde únicamente a la cifra del presupuesto transferido desde el Municipio al estapúblico, y otra información suministrada por cada entidad que corresponde a los recursos propios invertidos por proyecto.

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

Proyecto PD: 4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superior

Proyecto: 160549 - Ampliación de la oferta académica en atención a los requerimientos sociales y productivos - ITM

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 52%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 26.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 29.100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.222

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 26.600 \$ 29.100 \$ 15.222

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT49AA Estudiantes matriculados	Número	25.433	23.562	93%

Proyecto: 170018 - Mejoramiento infraestructura física para educar

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 1%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 870 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20

Información Financiera Total: \$ 0 \$ 1.870 \$ 20

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT18AB Aula pedagóg campus fraternidad adecuada	Número	1	0	0%

Proyecto PD: 4.1.2.2 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superior

Proyecto: 160550 - Consolidación de un modelo de gestión de calidad para la ciencia la tecnología y la innovación - ITM

Síntesis Proyecto: Eficacia : 54% Ejec. Financiera : 18%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 169 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.669 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 169

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.145 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 505

Información Financiera Total: \$ 369 \$ 3.814 \$ 673

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT50AA Proyectos de investigación financiados	Número	20	20	100%
IT50AB Labs científic bajo estándar requerid	Número	4	2	50%
IT50AC Conve form invest conj univ nales/extran	Número	8	5	63%
IT50AD Convo recep eval prod acade, científ, cul	Número	2	1	50%
IT50AE Artículos publicados en isi scopus	Número	50	19	38%
IT50AF Artículos publicados en publindex	Número	20	5	25%

Observación B / S: Estan programados para el segundo semestre

Proyecto: 160551 - Desarrollo de la infraestructura tecnológica para educar

Síntesis Proyecto: Eficacia : 5% Ejec. Financiera : 13%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 218 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.218 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 218

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 218 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.580 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 515

Información Financiera Total: \$ 437 \$ 5.798 \$ 733

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT51AA Licencias de software renovadas	Número	6.577	318	5%

Observación B / S: Estan programadas para el segundo semestre

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

Proyecto PD: 4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superior

Proyecto: 160620 - 17pp99-formación en educación superior – ITM

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 56%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.811 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.268 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.487

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 5.811 \$ 6.268 \$ 3.487

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT20AB Estudiantes matriculados con pp	Número	4.333	4.030	93%

Reto: 4.4 - Medellín con acceso al empleo
Programa: 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral
Proyecto PD: 4.4.2.2 Formar y educar en competencias de acuerdo a la demanda y necesidades del mercado laboral
Proyecto: 160621 - 17pp5-formación para el trabajo y el desarrollo humano

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 60%



Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 332 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 332 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 199

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0



Información Financiera Total: \$ 332 \$ 332 \$ 199

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT21AB Dotación de espacios académicos	Número	1	1	100%
IT21AC Población atendida en curso laborales	Número	21	0	0%
Observación B / S: En proceso de consolidación de los cursos				
IT21AD Eventos de socialización realizados	Número	1	1	100%

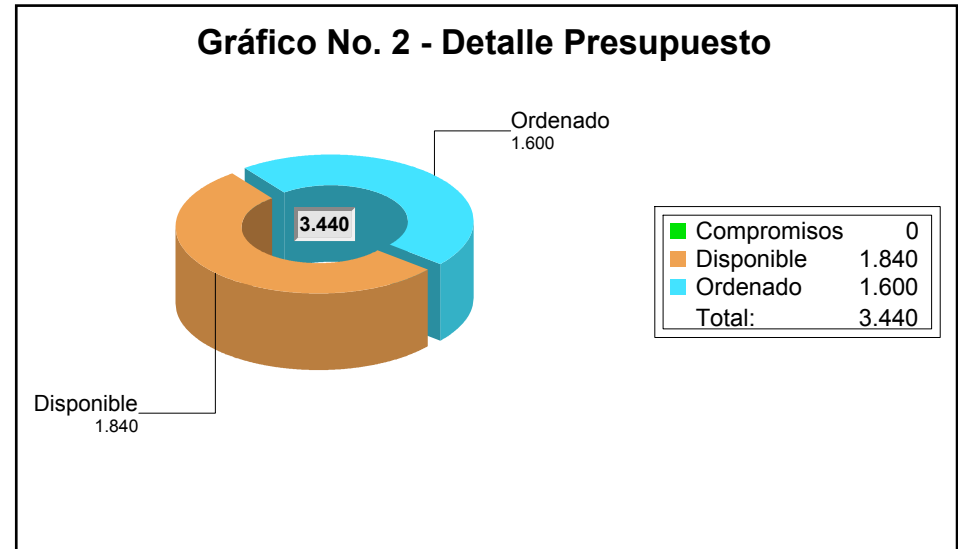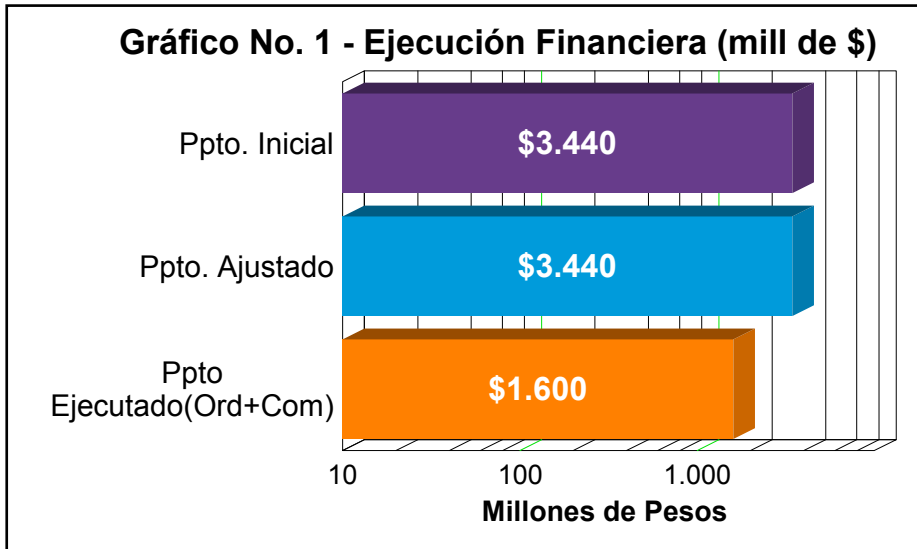

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

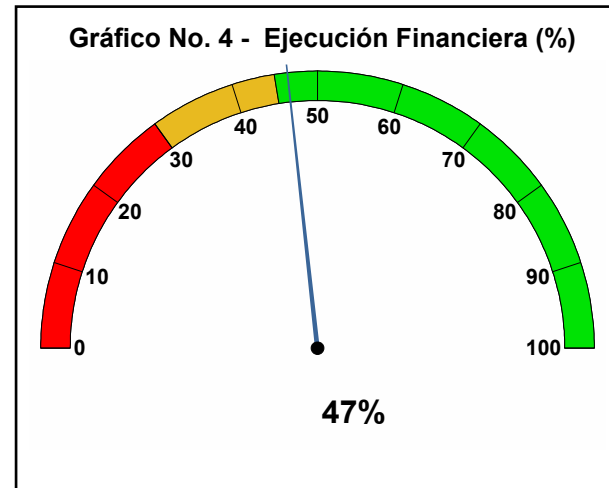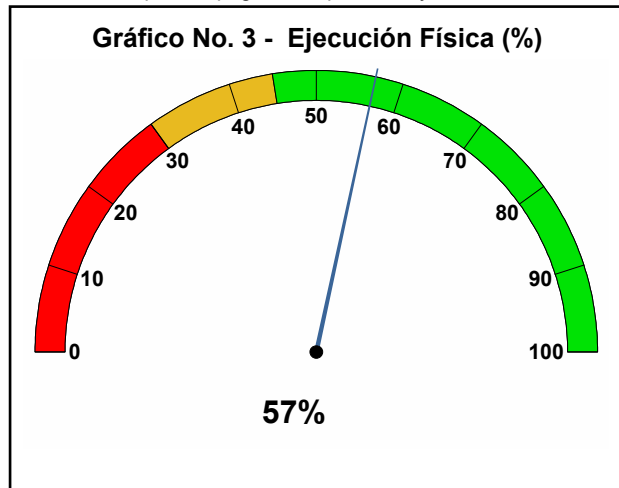

La ejecución financiera comprende pagos, facturas y los compromisos a la fecha de corte. Para el caso de los establecimientos públicos, la Ejecución Financiera se compone de dos cifras: una información obtenida del sistema, que corresponde únicamente a la cifra del presupuesto transferido desde el Municipio al estapúblico, y otra información suministrada por cada entidad que corresponde a los recursos propios invertidos por proyecto.

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 - Medellín bien administrado

Programa: 1.3.1 - Gobierno visible

Proyecto PD: 1.3.1.5 Comunicación informativa, corporativa e institucional dirigida a la ciudadanía y en articulación con el Conglomerado Público Municipio de Medellín

Proyecto: 160375 - Fortalecimiento de teled Medellín a la vanguardia de la televisión ciudadana

Síntesis Proyecto:

Eficacia : 57%

Ejec. Financiera : 47%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.440

Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.440

Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.600

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0

Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0

Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total:

\$ 3.440

\$ 3.440



\$ 1.600

Descripción del Avance:



Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
TM75AA Compra de equipos de cómputo	Unidad	10	5	50%
TM75AB Compra de equipos de tv	Unidad	10	5	50%
TM75AC Programas de comunicación pública	Hora	2.100	741	35%
TM75AD Programas informativos y opinión	Hora	1.400	1.444	103%
TM75AE Programas de entretenimiento	Hora	1.600	2.160	135%
TM75AF Arrendamiento segmento satelital	Meses	12	6	50%
TM75AG Actualización tecnológica	Unidad	1.069	473	44%
TM75AH Alinazas estratégicas con conglomerado	Unidad	16	4	25%

Pascual Bravo

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2017

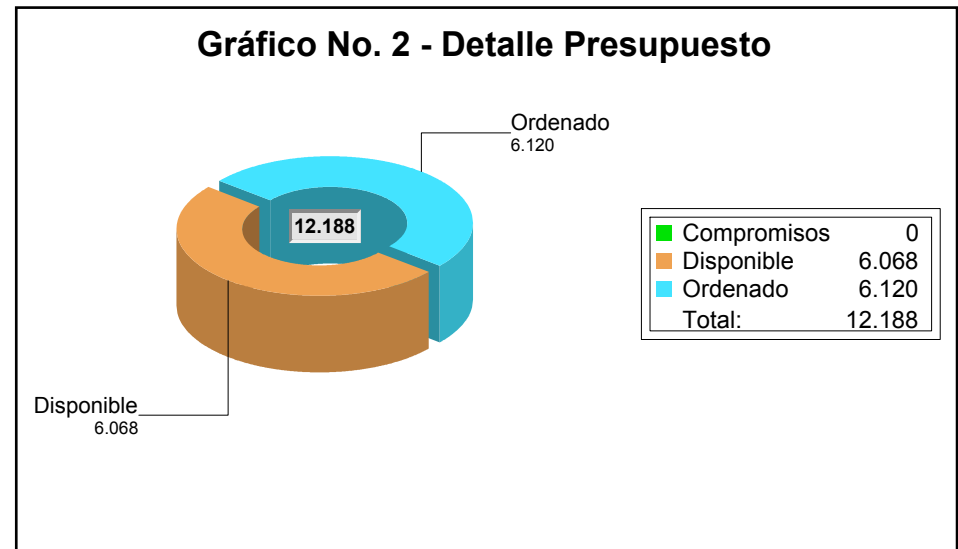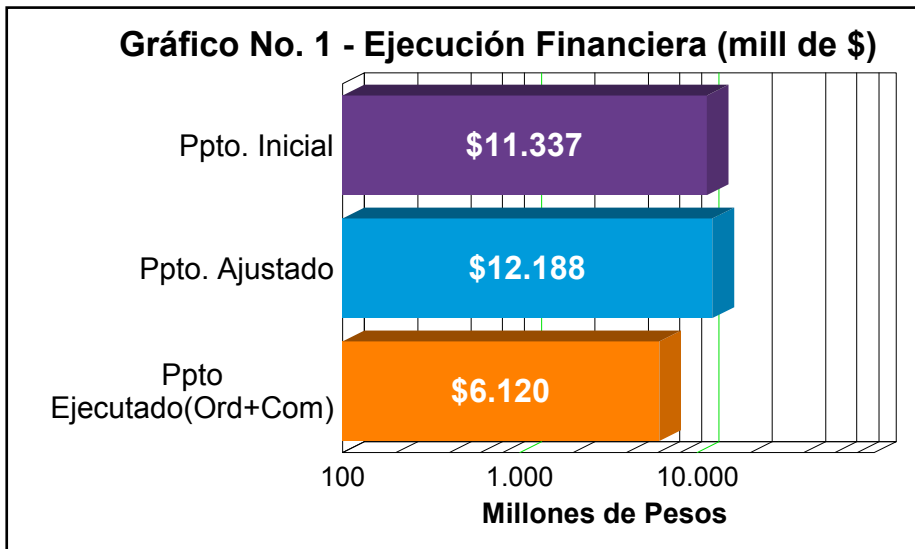

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

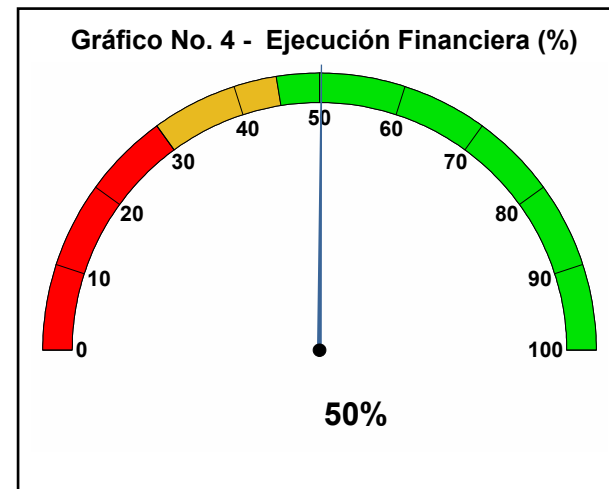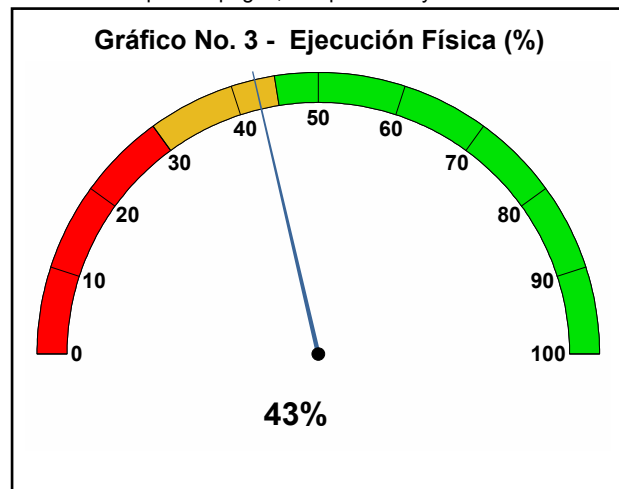

La ejecución financiera comprende pagos, facturas y los compromisos a la fecha de corte. Para el caso de los establecimientos públicos, la Ejecución Financiera se compone de dos cifras: una información obtenida del sistema, que corresponde únicamente a la cifra del presupuesto transferido desde el Municipio al estapúblico, y otra información suministrada por cada entidad que corresponde a los recursos propios invertidos por proyecto.

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos
Reto: 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa
Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior
Proyecto PD: 4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superior
Proyecto: 160529 - Ampliación y sostenimiento de cobertura en educación superior - pascual bravo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 49% Ejec. Financiera : 51%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.336 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.640 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.365

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB29AC Estudiantes nuevos en educación superior	Número	2.000	952	48%
Observación B / S: El avance corresponde al número de estudiantes que ingresaron por primera vez a la institución durante el primer semestre de 2017.				
PB29AD Programas de extensión ejecutados	Número	2	1	50%
Observación B / S: 1. Programa de extensión en las sedes satélites. Los cursos ofrecidos actualmente a través de este programa son: Curso Gestión de Proyectos de Inversión Pública: con 31 inscritos en el corregimiento San Antonio de Prado Curso Diseño de Jardines con 24 inscritos en el Corregimiento San Cristóbal 2. Programa de extensión en técnicos laborales: su iniciación está programada para el mes de juli				

Proyecto PD: 4.1.2.2 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superior
Proyecto: 160530 - Construcción y mejoramiento de la infraestructura física-pascual bravo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 42%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 448 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 448 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 187

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB30AC Espacios construidos y/o readecuados	Metro Cuadrado	2.200	0	0%
Observación B / S: A la fecha se tienen los estudios previos para el proceso contractual que permitirá la readecuación de los espacios				

Proyecto: 160531 - Mejoramiento de la calidad de la educación superior pública-pascual bravo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 53% Ejec. Financiera : 55%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 730 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 730 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 398

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB31AG Convenios para la movilidad suscritos	Número	6	2	33%
Observación B / S: Se suscriben dos convenios nuevos de México: Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad Metropolitana de México - Itzapalapa.				
PB31AH Documentos del archivo central digitaliz	Número	2.436.300	0	0%
Observación B / S: Se ingresaron los estudios previos al comité de contratación con el fin de iniciar el proceso contractual a través del cual se realizará la digitalización del archivo				
PB31AI Productos de investigación desarrollados	Número	20	10	50%

PB27AF	Matrículas con pp comuna 4	Número	287	154	54%
PB27AG	Matrículas con pp comuna 5	Número	185	55	30%
PB27AH	Matrículas con pp comuna 6	Número	511	172	34%
PB27AI	Matrículas con pp comuna 7	Número	671	90	13%
PB27AJ	Matrículas con pp comuna 9	Número	357	157	44%
PB27AK	Matrículas con pp comuna 11	Número	38	23	61%
PB27AL	Matrículas con pp comuna 13	Número	242	107	44%
PB27AM	Matrículas con pp comuna 16	Número	231	97	42%
PB27AN	Matrículas con pp comuna 12	Número	120	52	43%
Observación B / S: Comuna 12: Nuevos 43 Antiguos:9					
PB27AO	Matrículas con pp comuna 60	Número	182	91	50%
Observación B / S: Comuna 60: Nuevos 25 Antiguos:66					

Proyecto: 160628 - 17pp1-control y seguimiento de la educación superior – pascual bravo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 10% Ejec. Financiera : 55%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 55

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB28AB Informes de seguimiento y control	Número	10	1	10%

Observación B / S: A la fecha el proyecto se encuentra en ejecucion con los profesionales que estan realizando la recoleccion de la informacion a traves de encuestas y analisis de la informacion el proyecto va en la etapa de ejecucion del 14 %, a la fecha se ha entregado un informe donde aparece la recoleccion de datos de lel grupo objetivo,se desarrolla metodologia de trabajo,metodologia de comunicacion ,encues

Proyecto: 160639 - 17pp5-capacitación en preuniversitarios

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 55%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 538 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 538 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 293

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB39AB Estudiantes en preuniversitarios comuna	Número	1.100	980	89%

Observación B / S: A la fecha se el proyecto tiene un 89,9 % de eficacia con fecha de inicio del mayo 27 de mayo y de terminacion el 7 de octubre con una participacion de 1032 estudiantes de un total de 1100 al total del proyecto , se ha cumplido con la entrega de todos los componentes participantes asi
905 mayo
980 junio
993 julio

Reto: 4.4 - Medellín con acceso al empleo

Programa: 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral

Proyecto PD: 4.4.2.2 Formar y educar en competencias de acuerdo a la demanda y necesidades del mercado laboral

Proyecto: 160633 - 17pp5-capacitación en artes y oficios

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 55%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 332 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 332 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 181

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB33AA Estudiantes de artes y oficios comuna 5	Número	695	0	0%

Observación B / S: El día 1 de julio fue socializada y definida la propuesta final con la comision de educacion y sus delegados sobre los cursos a ofrecer

Proyecto: 160636 - 17pp5-capacitación en artes y oficios en el área de la salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 55%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 332 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 332 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 181

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB36AA Estudiantes de artes y oficios en salud	Número	60	0	0%



Observación B / S: A la fecha se han realizado las siguientes actividades:

1. Proceso de inscripción y de matriculas de los estudiantes del 22 de mayo al 12 de junio.
2. Selección de los estudiantes 13, 14 Y 15 de junio



La Inducción se tiene programada para los días 10 al 11 de julio.

El Numero de personas inscritas: enfermería 241, Administrativo en salud 182, Adulto mayor 78, servicios farmaceuticos 177

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2017

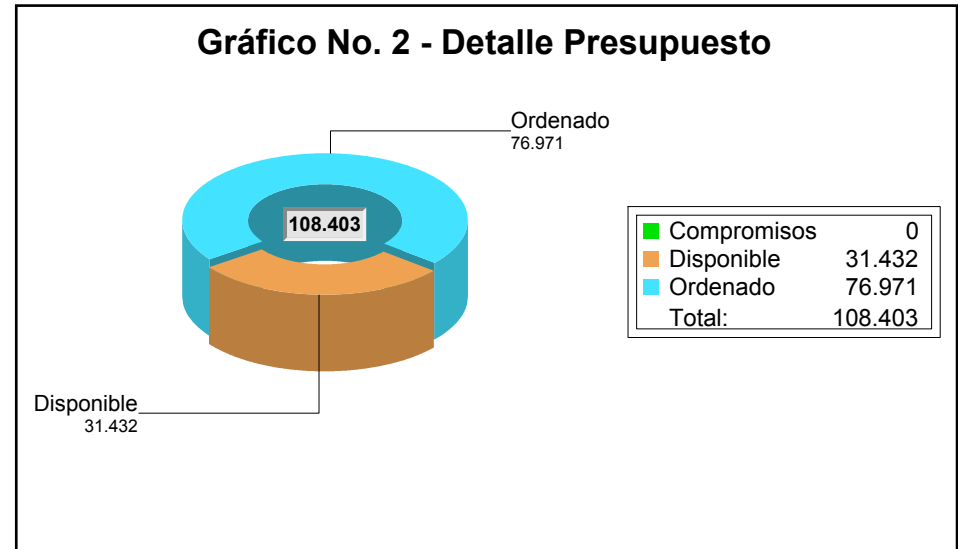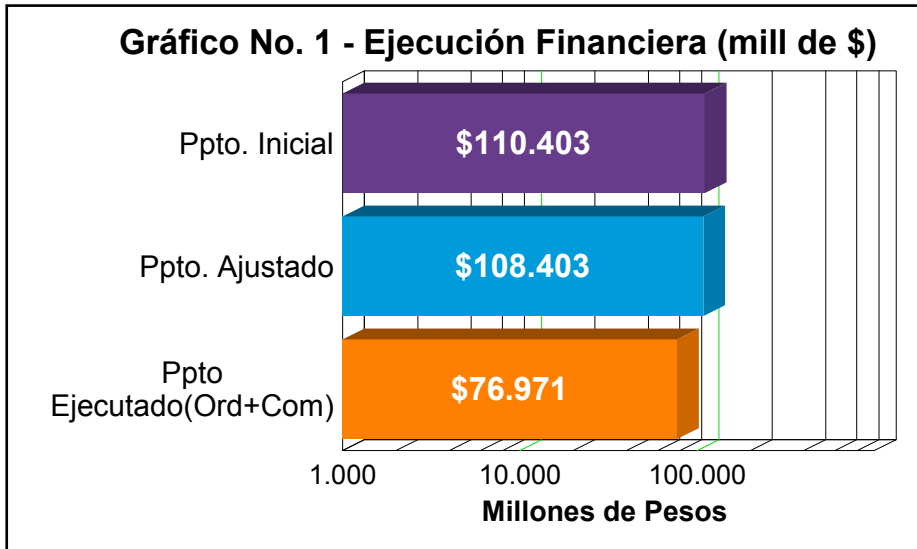

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

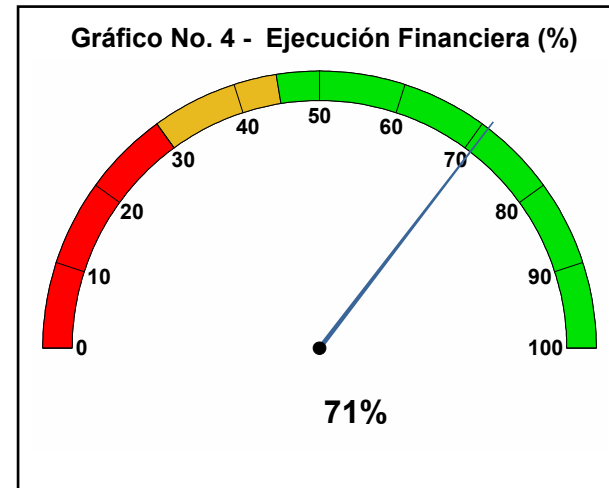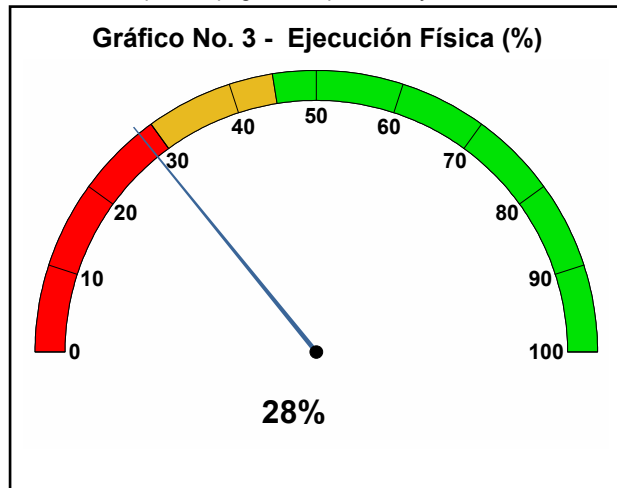

La ejecución financiera comprende pagos, facturas y los compromisos a la fecha de corte. Para el caso de los establecimientos públicos, la Ejecución Financiera se compone de dos cifras: una información obtenida del sistema, que corresponde únicamente a la cifra del presupuesto transferido desde el Municipio al estapúblico, y otra información suministrada por cada entidad que corresponde a los recursos propios invertidos por proyecto.

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana
Reto: 2.2 - En Medellín convive toda la ciudadanía
Programa: 2.2.2 - Promoción de la convivencia
Proyecto PD: 2.2.2.3 Acompañamiento social de proyectos habitacionales
Proyecto: 160500 - Asistencia social para proyectos habitacionales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 85%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 900

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 160 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 160 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 1.060 \$ 1.060 \$ 900

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV00AA Proyectos vip - vis con acompaña. social	Porcentaje	100	100	100%

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios
Reto: 6.5 - Hábitat adecuado para Medellín
Programa: 6.5.1 - Fortalecimiento al Sistema Municipal Habitacional
Proyecto PD: 6.5.1.1 Creación e implementación del Consejo de Política Habitacional
Proyecto: 160483 - Implementación del consejo de política habitacional

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 60%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 30

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 50 \$ 50 \$ 30

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV83AD Consejo de política habitacional implem.	Porcentaje	3	0,75	25%

Observación Proyecto: Se adelantó el proceso de contratación para dar inicio a la ejecución

Proyecto PD: 6.5.1.2 Revisión y ajuste del Plan Estratégico Habitacional de Medellín – PEHMED
Proyecto: 160486 - Actualización del plan estratégico habitacional de medellín - pehmed

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 78%

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 260	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 260	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 156
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 203	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 203	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 203
Información Financiera Total:	\$ 463	\$ 463	\$ 359

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV86AD Pehmed ajustado	Porcentaje	23	5,7	25%

Observación Proyecto: Se adelantó el proceso de contratación para dar inicio a la ejecución

Proyecto PD: 6.5.1.3 Adopción y reglamentación de la política pública de inquilinatos

Proyecto: 160488 - Implementación de la política pública de inquilinatos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 29%

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 70	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 70	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 42
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 76	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 76	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0
Información Financiera Total:	\$ 146	\$ 146	\$ 42

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV88AA Pol. púb. de inquilinatos reglamentada	Porcentaje	20	11,23	56%

Programa: 6.5.2 - Reasentamiento integral de población

Proyecto PD: 6.5.2.1 Reasentamiento de población con soluciones de vivienda definitiva

Proyecto: 160489 - Implementación de soluciones definitivas de vivienda para población de reasentamiento

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 77%

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.082	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.082	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.177
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 979	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 979	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3
Información Financiera Total:	\$ 8.061	\$ 8.061	\$ 6.181

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV89AB Sub. even. naturales, riesgo y desastres	Número	55	7	13%
Observación B / S: Se adelantan las gestiones administrativas necesarias para la valoración de las viviendas y la asignación de los subsidios				
IV89AC Viviendas nuevas iniciadas	Número	117	67	57%
IV89AD Hog. de reasentamie. por o. p. atendidos	Porcentaje	100	100	100%

Observación Proyecto: Se adelantan las gestiones administrativas necesarias para la valoración de las viviendas y la asignación de los subsidios

Proyecto PD: 6.5.2.2 Una solución definitiva para la población en arrendamiento temporal

Proyecto: 160490 - Implementación de soluciones definitivas de vivienda para población en arrendamiento temporal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 11% Ejec. Financiera : 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.041 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.041 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.041

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 16.041 \$ 16.041 \$ 16.041

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV90AA Sub. viv. def. pob. arrendamie. temporal	Número	37	8	22%

Observación B / S: Se adelantan las gestiones administrativas necesarias para la valoración de las viviendas a adquirir y la asignación de los subsidios

IV90AB Viviendas nuevas iniciadas	Número	376	0	0%
-----------------------------------	--------	-----	---	----

Observación B / S: Se ha avanzado en la constitución de fiducias, el modelo para la definición de los desarrolladores de los proyectos y en la estructuración de contratos para estudios y diseños

Proyecto PD: 6.5.2.3 Arrendamiento temporal

Proyecto: 160491 - Aplicación de subsidios para arrendamiento temporal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 76%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.917 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.917 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.917

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.433 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.433 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5

Información Financiera Total: \$ 14.350 \$ 14.350 \$ 10.922

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV91AF Sub. asig. para arrendamiento temporal	Número	4.600	4.429	96%

Programa: 6.5.3 - Gestión de nuevos desarrollos habitacionales de vivienda social

Proyecto PD: 6.5.3.1 Vivienda nueva

Proyecto: 160492 - Aplicación de subsidios y construcción de vivienda nueva para población de demanda libre

Síntesis Proyecto: Eficacia : 30% Ejec. Financiera : 42%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 17.609 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.609 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.314

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0
Información Financiera Total: \$ 17.609 \$ 17.609 \$ 7.314

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV92AA Subsidios para vivienda nueva asignados	Número	548	152	28%
Observación B / S: Se realizó sorteo para la población que será beneficiada con el proyecto Ciudad del Este - VIPA para posteriormente asignar los subsidios. Los subsidios asignados corresponden a población de demanda libre que cuenta con subsidios de cajas de compensación.				
IV92AB Identificación población víctima de desp	Porcentaje	100	46	46%
IV92AC Viviendas nuevas iniciadas	Número	1.609	115	7%
Observación B / S: Se ha avanzado en la constitución de fiducias, el modelo para la definición de los socios inversionistas de los proyectos y en la estructuración de contratos para dar inicio a la ejecución.				
IV92AD Vivienda de interés social construida	Número	1.314	492	37%

Proyecto PD: 6.5.3.2 Gestión del suelo para vivienda social

Proyecto: 160493 - Identificación de suelo para vivienda social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 54%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 434 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 434 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 234

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 434 \$ 434 \$ 234

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV93AA Suelo para vivienda social gestionado	Porcentaje	100	100	100%

Proyecto PD: 6.5.3.3 Fomento a la autoconstrucción e iniciativas comunitarias

Proyecto: 160494 - Apoyo a la autoconstrucción e iniciativas de vivienda comunitaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 70%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.796 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.796 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.264

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 1.796 \$ 1.796 \$ 1.264

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV94AA Acompa. téc. y soc. proyectos de autoc.	Porcentaje	100	100	100%

Programa: 6.5.4 - Mejoramiento integral de barrios

Proyecto PD: 6.5.4.1 Mejoramiento de vivienda

Proyecto: 160495 - Aplicación de subsidios para el mejoramiento de vivienda

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 73%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 37.398 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 37.398 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 27.332

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 37.398 \$ 37.398 \$ 27.332

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV95AA Sub. para mejoram. de vivienda asignados	Número	2.523	0	0%
IV95AB Sub. mej. de viv. asign a victimas despl	Número	133	0	0%
IV95AC Mejoramientos de vivienda ejecutados	Número	2.500	0	0%

Observación Proyecto: El equipo se encuentra en revisión de carpetas de diagnóstico para la posterior expedición de las resoluciones de asignación de subsidios.

Proyecto PD: 6.5.4.2 Mejoramiento del entorno barrial

Proyecto: 160496 - Construcción y mejoramiento del entorno barrial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.339 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.339 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.339

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 3.339 \$ 1.339 \$ 1.339

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV96AA Espacio p. del entorno barrial mejorado	Porcentaje	100	100	100%

Proyecto PD: 6.5.4.3 Titulación de predios

Proyecto: 160497 - Apoyo para la titulación de predios

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 30%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 86 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 86 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 86

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 199 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 199 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 285 \$ 285 \$ 86

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV97AB Predios titulados	Número	713	0	0%
IV97AC Predios titulados a víctimas	Número	38	0	0%

Observación Proyecto: Se están realizando las visitas domiciliarias y la conformación de expedientes para proceder a la verificación jurídica de cumplimiento de requisitos de los ocupantes de acuerdo a la ley 1001 de 2005.

Proyecto PD: 6.5.4.4 Reconocimiento de edificaciones

Proyecto: 160498 - Apoyo para el reconocimiento de edificaciones

Síntesis Proyecto: Eficacia : 7% Ejec. Financiera : 51%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.133 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.133 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.067

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 342 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 342 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 228

Información Financiera Total: \$ 4.475 \$ 4.475 \$ 2.294

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV98AA Edificaciones reconocidas por resolución	Número	3.500	387	11%

Observación B / S: El proceso de radicación de expedientes en Curaduría se ha visto retrasado por el cambio a la curaduría 3a, solo a partir de marzo se inició el proceso por lo que se espera contar con los resultados programados para el segundo semestre del año.

IV98AB Viv. hab. conex. serv. acued. y alcant.	Número	700	18	3%
--	--------	-----	----	----

Observación B / S: Los resultados corresponden a la cantidad de reconocimientos que cruzan con la base de datos de EPM, los bajos resultados se presentan porque el decreto 2339 y el POT restringen las zonas que el Isvimed puede intervenir con reconocimientos.

Proyecto PD: 6.5.4.5 Saneamiento predial – Gestión para la tenencia segura

Proyecto: 160499 - Saneamiento predial y gestión para la tenencia segura

Síntesis Proyecto: Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 71%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 156 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 156 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 93

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 119 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 119 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 103

Información Financiera Total: \$ 275 \$ 275 \$ 196

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV99AC Viviendas escrituradas proyect 2012-2017	Número	1.542	1.043	68%
IV99AD Viv. escrituradas proyectos. ant. 2012	Número	150	83	55%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios
Reto: 6.5 - Hábitat adecuado para Medellín
Programa: 6.5.4 - Mejoramiento integral de barrios
Proyecto PD: 6.5.4.1 Mejoramiento de vivienda
Proyecto: 160657 - 17pp2-mejoramiento de vivienda en santa cruz

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 50%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.001 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.001 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 501

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 1.001 \$ 1.001 \$ 501

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV57AA Sub. para mejoramiento de viv. asignados	Número	71	0	0%
IV57AB Mejoramientos de vivienda ejecutados	Número	71	0	0%

Observación Proyecto: Los operadores se encuentran en etapa de diagnóstico para la posterior expedición de la respectiva resolución que asigna el subsidio

Proyecto: 160658 - 17pp50-mejoramiento de vivienda en san sebastián de palmitas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 50%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 481 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 481 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 241

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 481 \$ 481 \$ 241

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV58AA Sub. para mejoramiento de viv. asignados	Número	29	0	0%
IV58AB Mejoramientos de vivienda ejecutados	Número	29	0	0%

Observación Proyecto: Los operadores se encuentran en etapa de diagnóstico para la posterior expedición de la respectiva resolución que asigna el subsidio

Proyecto: 160659 - 17pp5-mejoramiento de vivienda en castilla

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 50%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 615 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 615 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 307

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 615 \$ 615 \$ 307

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV59AA Sub. para mejoramiento de viv. asignados	Número	42	0	0%
IV59AB Mejoramientos de vivienda ejecutados	Número	42	0	0%

Observación Proyecto: Los operadores se encuentran en etapa de diagnóstico para la posterior expedición de la respectiva resolución que asigna el subsidio

Proyecto: 160660 - 17pp80-mejoramiento de vivienda en san antonio de prado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 50%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 732 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 732 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 366

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 732 \$ 732 \$ 366

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV60AB Sub. para mejoramiento de viv. asignados	Número	51	0	0%
IV60AC Mejoramientos de vivienda ejecutados	Número	51	0	0%

Observación Proyecto: Los operadores se encuentran en etapa de diagnóstico para la posterior expedición de la respectiva resolución que asigna el subsidio

Proyecto: 160661 - 17pp8-mejoramiento de vivienda en villa hermosa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 50%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.240 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.240 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 620

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 1.240 \$ 1.240 \$ 620

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV61AA Sub. para mejoramiento de viv. asignados	Número	89	0	0%
IV61AB Mejoramientos de vivienda ejecutados	Número	89	0	0%

Observación Proyecto: Los operadores se encuentran en etapa de diagnóstico para la posterior expedición de la respectiva resolución que asigna el subsidio

Proyecto PD: 6.5.4.4 Reconocimiento de edificaciones

Proyecto: 160662 - 17pp3-apoyo para el reconocimiento de edificaciones en manrique

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 64%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 422 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 422 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 272

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 422 \$ 422 \$ 272

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV62AA Edificaciones reconocidas por resolución	Número	597	0	0%

Observación Proyecto: Se realiza audiencia pública la JAL y población de la Comuna 3, quienes enfatizan que la priorización del recurso es para titulación en predios privados, a través de procesos de pertenencia. El Isvimed reitera que no puede adelantar dichos procesos ya que su alcance está enmarcado en la asistencia técnica y asesoría jurídica y no en la representación judicial de los procesos de pertenencia.

Proyecto: 160663 - 17pp6-apoyo para el reconocimiento de edificaciones en doce de octubre

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 131 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 131 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 131



Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 131 \$ 131 \$ 131



Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV63AA Edificaciones reconocidas por resolución	Número	185	0	0%

Observación Proyecto: Los operadores se encuentran en etapa de diagnóstico para la posterior expedición de la respectiva resolución que asigna el subsidio

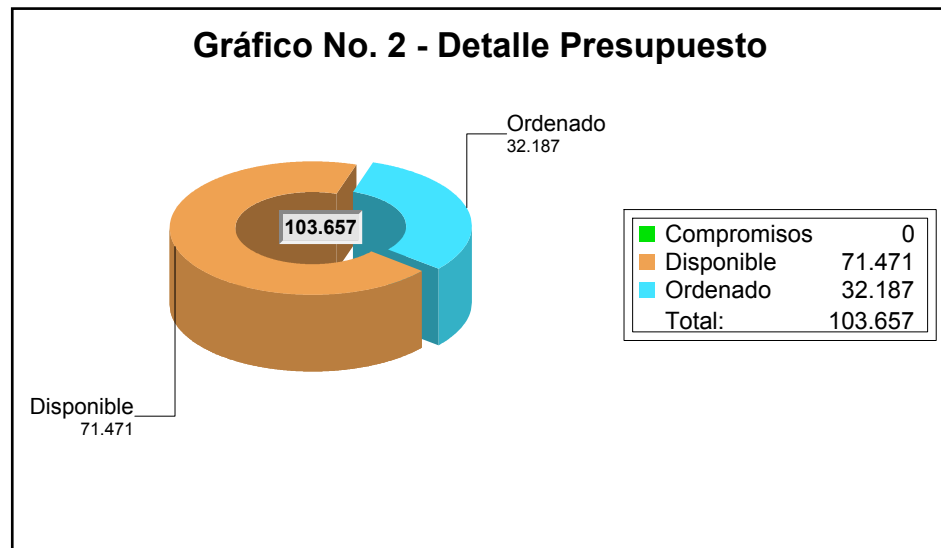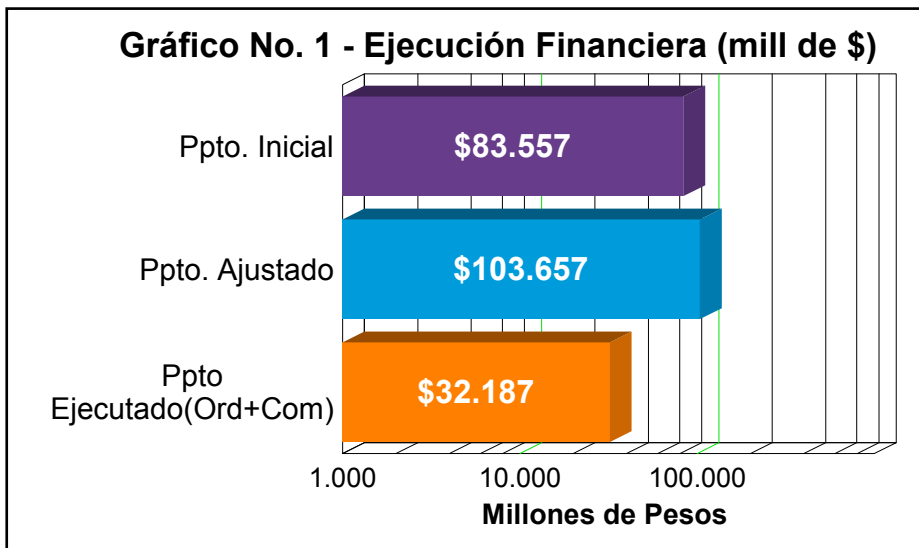

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

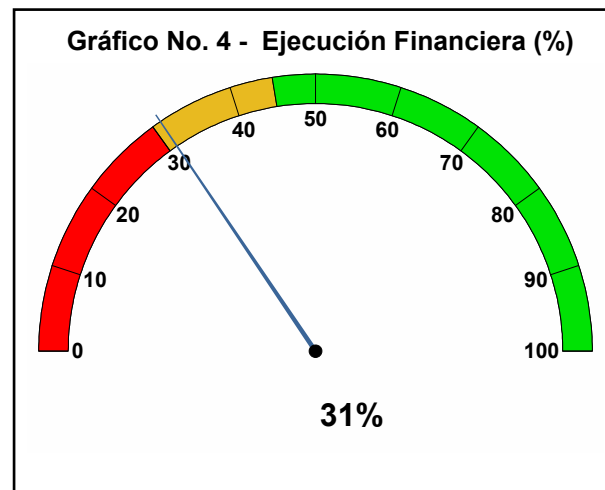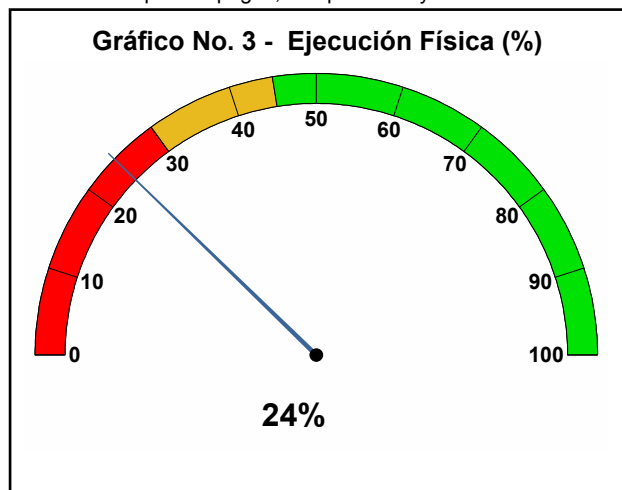

La ejecución financiera comprende pagos, facturas y los compromisos a la fecha de corte. Para el caso de los establecimientos públicos, la Ejecución Financiera se compone de dos cifras: una información obtenida del sistema, que corresponde únicamente a la cifra del presupuesto transferido desde el Municipio al estapúblico, y otra información suministrada por cada entidad que corresponde a los recursos propios invertidos por proyecto.

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.3 - Medellín bien administrado
Programa: 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno
Proyecto PD: 1.3.5.6 Red de observatorios para la trazabilidad del impacto social
Proyecto: 160527 - Fortalecimiento del observatorio de educación superior (odes)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 28% Ejec. Financiera : 38%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 597 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 597 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 228

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 597 \$ 597 \$ 228

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS27AA Bateria de indicadores implementada	Porcentaje	100	20	20%
AS27AB Boletines realizados	Número	9	4	44%
AS27AC Sistema de información es desarrollado	Porcentaje	100	20	20%

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos
Reto: 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa
Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior
Proyecto PD: 4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superior
Proyecto: 160502 - Apoyo para el acceso a la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 9% Ejec. Financiera : 27%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 51.905 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 51.905 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.877

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 51.905 \$ 51.905 \$ 13.877

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS02BB Beneficiarios legalizados epm	Número	837	0	0%
Observación B / S: Actualmente nos encontramos en etapa de legalización, los beneficiarios tienen hasta el 15 de agosto para realizar los trámites correspondientes.				
AS02BC Beneficiarios legalizados extenfronteras	Número	73	0	0%
Observación B / S: Actualmente nos encontramos en etapa de legalización, los beneficiarios tienen hasta el 31 de julio para realizar los trámites correspondientes.				
AS02BD Beneficiarios legalizados enlazamundos	Número	69	0	0%
Observación B / S: Actualmente nos encontramos en etapa de legalización, los beneficiarios tienen hasta el mes de septiembre para realizar los trámites correspondientes.				

AS02BE	Beneficiarios legalizados mejoresbachi	Número	180	0	0%
Observación B / S: Se esperan resultados de las pruebas ICFES en el mes de noviembre para otorgar los beneficios.					
AS02BF	Beneficiarios legalizados formaciónavan	Número	37	0	0%
Observación B / S: Actualmente nos encontramos en etapa de legalización, los beneficiarios tienen hasta el 31 de julio para realizar los trámites correspondientes.					
AS02BG	Estudiantes en exposapencia	Número	18.000	0	0%
Observación B / S: El evento se realiza en el mes de septiembre.					
AS02BH	Estrategia de comunicaciones	Porcentaje	100	63	63%

Proyecto PD: 4.1.2.2 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superior

Proyecto: 160503 - Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 55%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.186 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.186 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 650

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 1.186 \$ 1.186 \$ 650

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS03BA Estrategias áreas misio sinergia impleme	Número	10	5	50%
AS03BC Eventos realizados en sinergia	Número	6	0	0%
Observación B / S: Los eventos se realizaran en el segundo semestre del año, ya se adelantaron convenios para la realización de los mismos.				
AS03BD Convenios en sinergia realizados	Número	6	3	50%

Proyecto PD: 4.1.2.3 Fortalecimiento de la estrategia de educación superior digital

Proyecto: 160504 - Fortalecimiento de la estrategia de educación superior digital

Síntesis Proyecto: Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 42%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.469 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.469 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 610

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 1.469 \$ 1.469 \$ 610

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS04BB Cursos generados plataforma @medellín	Número	4	4	100%
AS04BD Convenios para financiación es	Número	3	2	67%
AS04BE Proceso de acompañamiento y formación ed	Porcentaje	100	50	50%

Reto: 4.2 - Medellín, camino a la excelencia y la calidad

Programa: 4.2.4 - Ambientes de aprendizaje para la calidad de la educación

Proyecto PD: 4.2.4.2 Apoyo a la red de laboratorios de investigación científica

Proyecto: 160508 - Implementación de una red de laboratorios de investigación científica y desarrollo tecnológico

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 40 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 40 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 40

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 40 \$ 40 \$ 40

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS08BC Laboratorios caracterizados y perfilados	Número	10	0	0%

Observación B / S: Los recursos destinados para este proyecto serán trasladados al proyecto 160526, buscando un impacto directo en el fortalecimiento de los procesos investigativos de las IES, el fortalecimiento de la sinergia, el incremento en calidad y cantidad de la producción científica, como aporte al proceso de acreditación y reacreditación de las tres IES

AS08BD Acciones de promoción realizadas	Número	3	0	0%
---	--------	---	---	----

Observación B / S: Los recursos destinados para este proyecto serán trasladados al proyecto 160526, buscando un impacto directo en el fortalecimiento de los procesos investigativos de las IES, el fortalecimiento de la sinergia, el incremento en calidad y cantidad de la producción científica, como aporte al proceso de acreditación y reacreditación de las tres IES

Reto: 4.4 - Medellín con acceso al empleo

Programa: 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral

Proyecto PD: 4.4.2.5 Formación técnica y tecnológica pertinente -Consolidación del sistema de educación terciaria

Proyecto: 160516 - Consolidación de la formación técnica y tecnológica en el sistema de educación terciaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 26%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 18.217 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 37.717 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.648

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 18.217 \$ 37.717 \$ 9.648

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS16AC Programas tecnológicos ofertados	Número	16	16	100%
AS16AD Plan de trabajo ejecutado	Porcentaje	100	40	40%
AS16AE Alumnos matriculados prog tecnológicos	Número	2.520	0	0%

Observación B / S: Actualmente nos encontramos en etapa de validación de documentos y exámenes de admisión en las IES. El proceso de matrícula será finalizando el mes de julio

Proyecto PD: 4.4.2.6 Alianzas entre el sector productivo, la educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo humano

Proyecto: 160518 - Fortalecimiento de alianzas de cooperación universidad - empresa para el desarrollo humano, científico y del emplec

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 49%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 257 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 257 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 126

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 257 \$ 257 \$ 126

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS18AB Diagnóstico necesidades del sect produc	Porcentaje	100	50	50%
AS18AD Eventos apoyados	Número	2	1	50%
AS18AE Alianzas para el fortalecimiento es	Número	5	1	20%

Reto: 4.5 - Medellín innovadora

Programa: 4.5.4 - Investigación científica y desarrollo tecnológico

Proyecto PD: 4.5.4.2 Internacionalización del sistema de educación superior

Proyecto: 160521 - Apoyo para la internacionalización del sistema de educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 154 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 154 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 154

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 154 \$ 154 \$ 154

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS21AB Misiones internacionales recibidas	Número	4	3	75%
AS21AC Eventos para la internacio apoyados	Número	2	2	100%
AS21AD Alianzas para la internacionalización	Número	6	0	0%

Observación B / S: Se hizo el mapeo de actores y proyectos internacionales pero de acuerdo al nuevo decreto de contratación 092, se debe esperar el procedimiento respectivo para la contratación con entidades sin ánimo de lucro.

Proyecto PD: 4.5.4.3 Fondo local para la investigación científica del sistema de educación superior

Proyecto: 160526 - Implementación del fondo local para la investigación científica del sistema de educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 4%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 446 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 446 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total:

\$ 446

\$ 446

\$ 18

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS26AA Premios entregados a la investigación	Número	13	0	0%
Observación B / S: Los premios se entregan en el mes de noviembre				
AS26AB Proyectos de investigación apoyados ies	Número	100	0	0%
Observación B / S: En este momento se están formalizando los convenios interadministrativos a través de los cuales se financiarán estos proyectos.				

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión:	4	- Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos
Reto:	4.1	- Medellín garantiza su oferta educativa
Programa:	4.1.2	- Fortalecer el sistema de educación técnica y superior
Proyecto PD:	4.1.2.1	Apoyo para el acceso a la educación superior
Proyecto:	160598	- 17pp99-apoyo para el acceso y permanencia en educación superior

Síntesis Proyecto:**Eficacia :** 13%**Ejec. Financiera :** 69%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.287 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.887 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.837

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total:

\$ 9.287

\$ 9.887

\$ 6.837



Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS98BA Beneficiarios legalizados pp comuna 1	Número	17	0	0%
Observación B / S: Actualmente nos encontramos en etapa de legalización, los beneficiarios tienen hasta el 15 de agosto para realizar los trámites correspondientes.				
AS98BB Beneficiarios legalizados pp comuna 2	Número	20	0	0%
Observación B / S: Actualmente nos encontramos en etapa de legalización, los beneficiarios tienen hasta el 15 de agosto para realizar los trámites correspondientes.				
AS98BC Beneficiarios legalizados pp comuna 5	Número	1	0	0%
Observación B / S: Actualmente nos encontramos en etapa de legalización, los beneficiarios tienen hasta el 15 de agosto para realizar los trámites correspondientes.				
AS98BD Beneficiarios legalizados pp comuna 7	Número	45	0	0%
Observación B / S: Actualmente nos encontramos en etapa de legalización, los beneficiarios tienen hasta el 15 de agosto para realizar los trámites correspondientes.				
AS98BE Beneficiarios legalizados pp comuna 8	Número	39	0	0%
Observación B / S: Actualmente nos encontramos en etapa de legalización, los beneficiarios tienen hasta el 15 de agosto para realizar los trámites correspondientes.				
AS98BF Beneficiarios legalizados pp comuna 9	Número	4	0	0%
Observación B / S: Actualmente nos encontramos en etapa de legalización, los beneficiarios tienen hasta el 15 de agosto para realizar los trámites correspondientes.				
AS98BG Beneficiarios legalizados pp comuna 10	Número	38	0	0%
Observación B / S: Actualmente nos encontramos en etapa de legalización, los beneficiarios tienen hasta el 15 de agosto para realizar los trámites correspondientes.				
AS98BH Beneficiarios legalizados pp comuna 11	Número	21	0	0%
Observación B / S: Actualmente nos encontramos en etapa de legalización, los beneficiarios tienen hasta el 15 de agosto para realizar los trámites correspondientes.				
AS98BI Beneficiarios legalizados pp comuna 14	Número	59	0	0%
Observación B / S: Actualmente nos encontramos en etapa de legalización, los beneficiarios tienen hasta el 15 de agosto para realizar los trámites correspondientes.				



AS98BJ	Beneficiarios legalizados pp comuna 15	Número	32	0	0%
Observación B / S: Actualmente nos encontramos en etapa de legalización, los beneficiarios tienen hasta el 15 de agosto para realizar los trámites correspondientes.					
AS98BK	Beneficiarios legalizados pp comuna 50	Número	20	0	0%
Observación B / S: Actualmente nos encontramos en etapa de legalización, los beneficiarios tienen hasta el 15 de agosto para realizar los trámites correspondientes.					
AS98BL	Beneficiarios legalizados pp comuna 70	Número	23	0	0%
Observación B / S: Actualmente nos encontramos en etapa de legalización, los beneficiarios tienen hasta el 15 de agosto para realizar los trámites correspondientes.					
AS98BM	Beneficiarios legalizados pp comuna 80	Número	39	0	0%
Observación B / S: Actualmente nos encontramos en etapa de legalización, los beneficiarios tienen hasta el 15 de agosto para realizar los trámites correspondientes.					
AS98BN	Beneficiarios legalizados pp comuna 90	Número	23	0	0%
Observación B / S: Actualmente nos encontramos en etapa de legalización, los beneficiarios tienen hasta el 15 de agosto para realizar los trámites correspondientes.					
AS98BO	Beneficiarios legalizados pp comuna 60	Número	6	0	0%
Observación B / S: Actualmente nos encontramos en etapa de legalización, los beneficiarios tienen hasta el 15 de agosto para realizar los trámites correspondientes.					
AS98BP	Beneficiarios legalizados pp comuna 12	Número	19	0	0%
Observación B / S: Actualmente nos encontramos en etapa de legalización, los beneficiarios tienen hasta el 15 de agosto para realizar los trámites correspondientes.					
AS98BQ	Derechos de grado apoyados	Número	20	4	20%
AS98BR	Difusión realizada	Número	32	16	50%
AS98BS	Beneficiarios atendidos	Número	406	370	91%
AS98BT	Estrategia de comunicaciones y posicio	Número	16	16	100%

Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2017

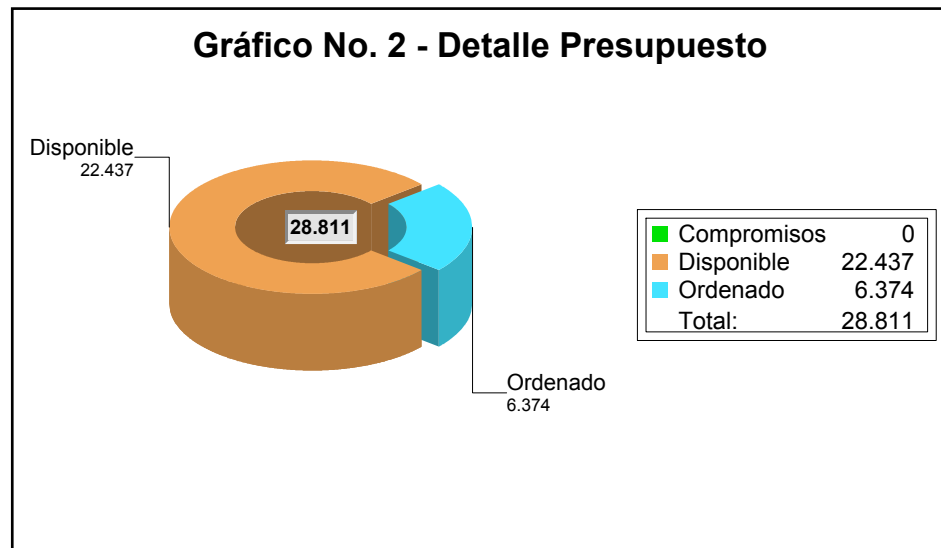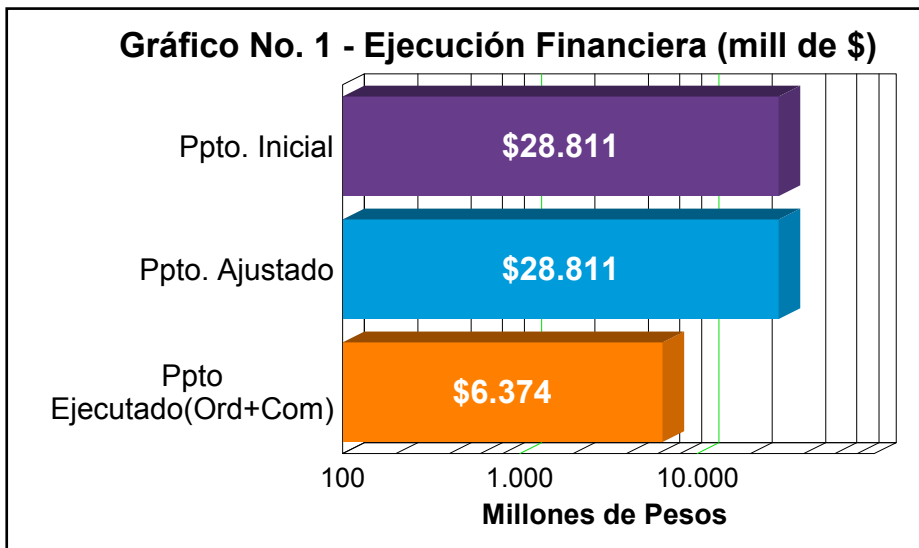

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

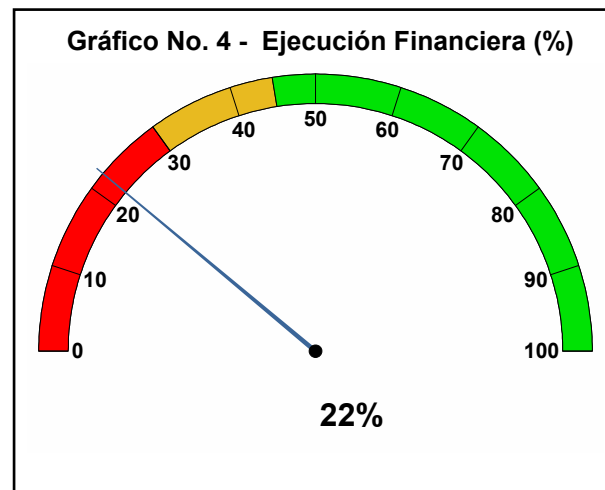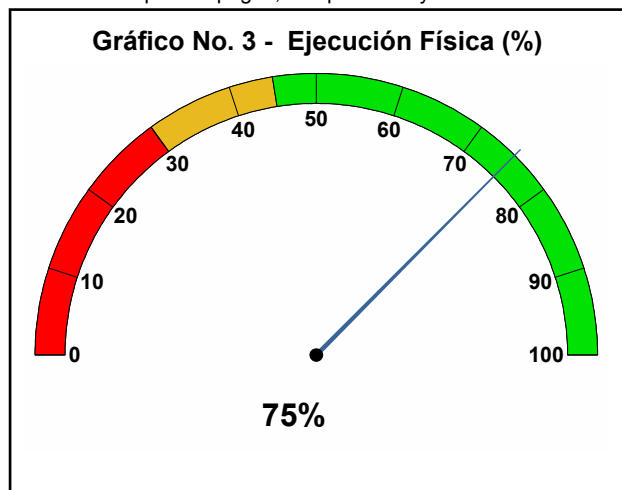

La ejecución financiera comprende pagos, facturas y los compromisos a la fecha de corte. Para el caso de los establecimientos públicos, la Ejecución Financiera se compone de dos cifras: una información obtenida del sistema, que corresponde únicamente a la cifra del presupuesto transferido desde el Municipio al estapúblico, y otra información suministrada por cada entidad que corresponde a los recursos propios invertidos por proyecto.

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.3 - Medellín bien administrado
Programa: 1.3.3 - Excelente manejo de las finanzas y los recursos públicos
Proyecto PD: 1.3.3.4 Medellín le apuesta a las APP's
Proyecto: 160535 - Formulación, evaluación y promoción de alianzas público privadas -app-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 49% Ejec. Financiera : 40%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.566 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.566 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 626

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP35AA Gestión estructuración proyectos Observación B / S: La Agencia APP aprobó el Producto No 1 y No 2 de la estructuración de la Sede de Movilidad.	Porcentaje	100	50	50%
AP35AB Gestión convenios promoción y acomp. Observación B / S: La Agencia APP celebro un Convenio de operación logística para la promoción de proyectos APP, a su vez se encuentra en elaboración de estudios previos para celebrar convenios de acompañamientos a otras entidades del conglomerado	Porcentaje	100	30	30%
AP35AC Gestión convenios eval. y seguimiento. Observación B / S: La Agencia APP esta realizando el seguimiento y evaluación al proyecto USP.	Porcentaje	100	35	35%
AP35AD Gestión de prefactibilidad de proyectos Observación B / S: La Agencia App realizó la prefactibilidad del proyecto Medellín Digital y publico el concurso de méritos de la Granja autosostenible y Plaza Minorista	Porcentaje	100	60	60%
AP35AE Fortalecimiento institucional Observación B / S: La Agencia APP avanza en estandarización de procesos de iniciativa privada y banco de proyectos, implementación tecnologica y promoción de proyectos con evento medellín digital y evento de negocios verdes.	Porcentaje	100	70	70%

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible
Reto: 5.2 - Medellín por una mejor movilidad
Programa: 5.2.2 - Proyectos de infraestructura para la movilidad de la ciudad
Proyecto PD: 5.2.2.9 Gestión realizada para llevar a cabo la conexión bajo el Aeropuerto Enrique Olaya Herrera
Proyecto: 160536 - Desarrollo de la gestión para la conexión bajo el aeropuerto enrique olaya herrera

Síntesis Proyecto: Eficacia : 39% Ejec. Financiera : 30%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.974 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.974 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.192

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP36AA Gestión para la conexión bajo el aoh Observación B / S: La Agencia App Ajusto los pliegos de condiciones y público el concurso de méritos para la contratación de la prefactibilidad.	Porcentaje	38	15	39%

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios
Reto: 6.2 - Proyectos Integrales para Medellín

Programa: 6.2.2 - Implementación de proyectos estratégicos

Proyecto PD: 6.2.2.2 Intervención en zonas de consolidación

Proyecto: 160537 - Recuperación e intervención del espacio público en zonas de consolidación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 9% Ejec. Financiera : 30%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.750 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.750 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 525

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP37AA Propta inter facha. media. culatas rzda	Porcentaje	100	8	8%
Observación B / S: La Agencia App tiene hasta el momento el 70% del diagnostico de las fachadas, medianeria y culatas del proyecto avenida jardín, y se han realizado los estudios ambientales, etnográficos.				
AP37AB Propuesta interv espacio públi realizada	Porcentaje	100	10	10%
Observación B / S: La Agencia App tiene hasta el momento el 70% del diagnostico del espacio público del proyecto avenida jardín, y se han realizado los estudios ambientales, etnográficos.				

Reto: 6.3 - Medellín gestiona su paisaje y patrimonio

Programa: 6.3.2 - Recuperemos nuestro patrimonio y paisaje

Proyecto PD: 6.3.2.1 Gestión del aprovechamiento económico del espacio público

Proyecto: 160538 - Administración del aprovechamiento económico del espacio público

Síntesis Proyecto: Eficacia : 69% Ejec. Financiera : 30%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 642 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 642 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 193

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP38AA Socializaciones realizadas dec 2148-2015	Número	50	20	40%
Observación B / S: La Agencia APP realizó reuniones de acercamiento y comunicación del Decreto con la ciudadanía impactada				
AP38AB Documento plan estrategico gestion aEEP	Porcentaje	60	50	83%
Observación B / S: La Agencia App finalizó la etapa del diagnostico del proyecto, y se encuentra realizando el análisis fisicoespacial.				
AP38AC AEEP celebrados	Número	100	85	85%
Observación B / S: La Agencia App continua incrementando el numero de proyectos facturados de aprovechamiento del espacio público.				

Programa: 6.3.3 - Generando Valor Inmobiliario

Proyecto PD: 6.3.3.1 Gestión económica de los bienes inmuebles

Proyecto: 160539 - Fortalecimiento económico de los bienes inmuebles del municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 352 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 352 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 176

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP39AA Oport inmob viabilizadas y/o evaluadas	Número	1	2	200%

Observación B / S: La Agencia App realizó el análisis de viabilidad del DAGRD (estación de bomberos Libertadores) y el estudio inmobiliario para APEV.

AP39AB Promoción comercial de las oport. inmob. Número 1 0 0%

Observación B / S: La Agencia App esta terminando de definir su portafolio de oportunidades inmobiliarias para realizar evento promocional en el segundo semestre.

Proyecto PD: 6.3.3.2 Estrategias Inmobiliarias para el desarrollo

Proyecto: 160540 - Formulación de estrategias inmobiliarias para el desarrollo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 30%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 545 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 545 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 163

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP40AA Proyectos inmobiliarios ejecutados	Número	2	0	0%
Observación B / S: La Agencia APP se encuentra realizando los convenios interadministrativos para la estructuración de los proyectos entre ellos el proyecto TPM				
AP40AB Estudios y análisis de viab proy inmob	Número	2	0	0%
Observación B / S: La Agencia APP se encuentra revisando la viabilidad para la contratación de los estudios del proyecto Parqueadero Museo de Antioquia				

Reto: 6.4 - Medellín vuelve a su Centro

Programa: 6.4.3 - Rehabilitación del espacio público y el patrimonio

Proyecto PD: 6.4.3.1 Plan Especial de Manejo y Protección del barrio Prado

Proyecto: 160541 - Implementación del plan especial de manejo y protección del barrio prado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 75%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.100

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP41AA Prop interv facha. media. y culatas prdo	Porcentaje	100	46	46%
Observación B / S: La Agencia App realizó el diagnostico del proyecto, y publico el concurso de méritos para realizar la etapa de prefactibilidad.				
AP41AB Prop intervención espacio público prado	Porcentaje	100	46	46%
Observación B / S: La Agencia App esta elaborando los planos urbanos, identificación de problemática, y estrategias urbanas				

Proyecto PD: 6.4.3.3 Consolidación Junín

Proyecto: 160542 - Mejoramiento del espacio público y bienes de carácter patrimonial - consolidación junín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 8%



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 17.183 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.183 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.398

Descripción del Avance:



Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP42AC Gstión rzda mejoras junín/parque bolivar	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: La Agencia App celebró un Contrato Interadministrativo para desarrollar la estructuración técnica del proyecto.				

Museo Casa de la Memoria

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2017

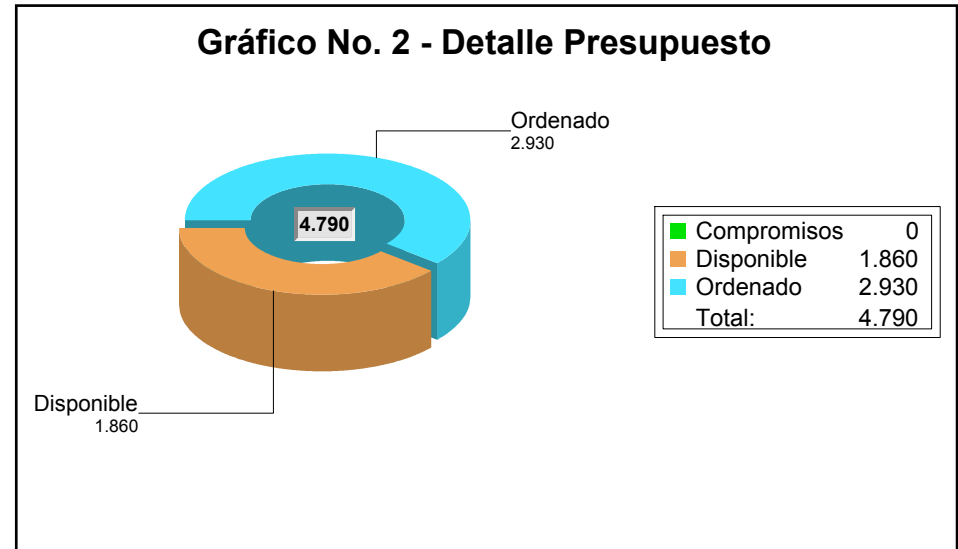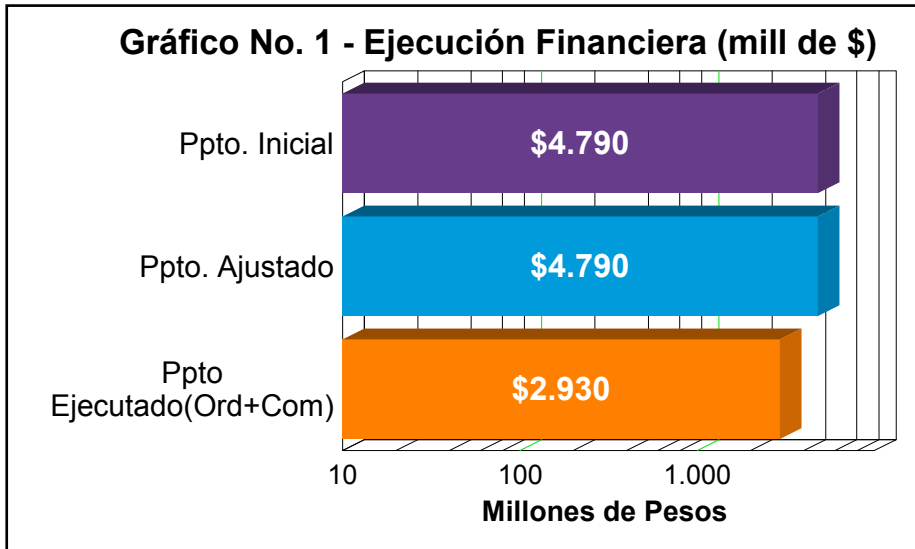

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

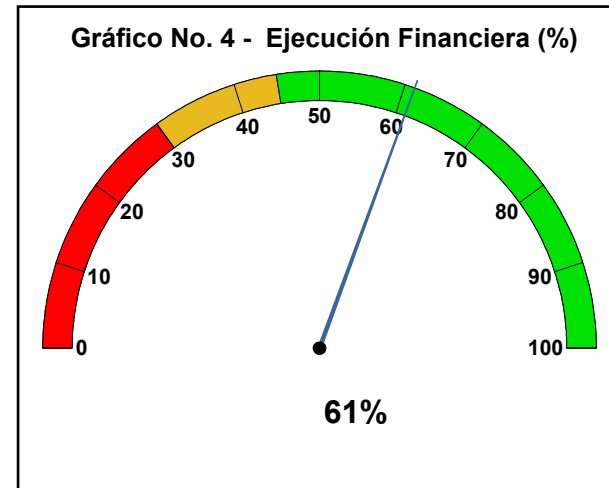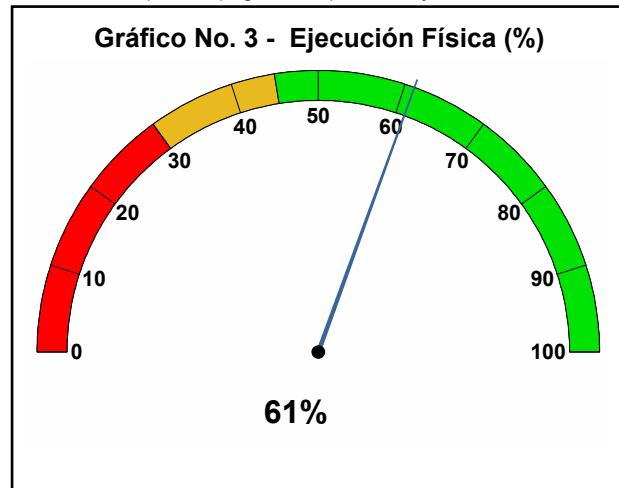

La ejecución financiera comprende pagos, facturas y los compromisos a la fecha de corte. Para el caso de los establecimientos públicos, la Ejecución Financiera se compone de dos cifras: una información obtenida del sistema, que corresponde únicamente a la cifra del presupuesto transferido desde el Municipio al estapúblico, y otra información suministrada por cada entidad que corresponde a los recursos propios invertidos por proyecto.

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana
Reto: 2.3 - Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio
Programa: 2.3.3 - Memoria para la construcción de la paz
Proyecto PD: 2.3.3.1 Construcción participativa de memorias territoriales
Proyecto: 160402 - Construcción participativa de memorias territoriales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 60%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 924 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 924 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 555

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM02AA Memorias construidas	Número	6	2	33%
MM02AB Agendas académicas	Número	4	3	75%
MM02AC Estímulos entregados	Número	5	5	100%
MM02AD Eventos de ciudad	Número	3	1	33%

Proyecto PD: 2.3.3.2 Pedagogía de las memorias para la construcción de paz

Proyecto: 160403 - Implementación de pedagogías y memorias para la construcción de paz

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.344 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.344 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 672

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM03AB Personas que interactúan con contenidos	Número	14.000	20.159	144%
MM03AC Participantes de proc. pedagógicos	Número	800	451	56%
MM03AD Personas formadas en proc. mediación	Número	15	15	100%
MM03AE Estímulos entregados	Número	6	6	100%

Proyecto PD: 2.3.3.3 Ciudadanía activa para el posacuerdo – Gestores (as) de paz

Proyecto: 160405 - Desarrollo de estrategias ciudadanas para el postacuerdo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 62% Ejec. Financiera : 60%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 617 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 617 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 370

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM05AA Act. públ. y priv. en p. de paz	Número	60	32	53%
MM05AB Alianzas y relacionamiento estratégico	Número	4	4	100%

Proyecto PD: 2.3.3.4 Fortalecimiento institucional del Museo Casa de la Memoria

Proyecto: 160406 - Fortalecimiento institucional del museo casa de la memoria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 41% Ejec. Financiera : 70%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.905 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.905 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.333

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM06AA Sistemas dlo organizacional fortalecido	Porcentaje	45	30	67%
MM06AB Procesos adecuación y mtto realizados	Porcentaje	100	4	4%
Observación B / S: Estos mantenimientos estan proyectados para realizarse en el segundo semestre del año.				
MM06AC Personas en redes sociales	Número	13.000	12.324	95%
MM06AD Sist. informacion creados o fortalecidos	Número	1	0	0%
Observación B / S: Ya se han realizado avances en cuetno a diseño, pero al implementación sólo se termina de hacer el el último trimestre del año.				

Seguimiento 30 de junio de 2017

Plan de Acción

Medellín

Cuenta Con Vos



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos
